Gobernación de Nariño	**Fecha**				**Informe: Correspondiente al mes de diciembre de 2022.**
	Día:	**Mes:** Diciembre	**Año:** 2022		
Tipo de informe:	**Parcial:**	X	Final:		

Contratista: JEIBER HUGO GÓMEZ RAMOS


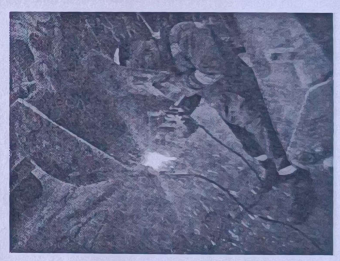
Contrato No. 1850-2022

INFORME

OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	**ACTIVIDADES EJECUTADAS.**
1. Brindar acompañamiento, asistencia técnica, y asesoría para coadyuvar en las acciones de definición, revisión técnica, viabilizarían, seguimiento, y supervisión de los proyectos de inversión de competencia de la Secretaría de Infraestructura y Minas del Departamento en el marco del Convenio 1607-2020 suscrito ente el Departamento de Nariño y el Instituto Nacional de Vías.	El siete (07) de diciembre de 2022, se realiza inspección rutinaria semanal de los vehículos y maquinaria que se encuentra trabajando en la vía, para así poder prevenir una falla y corregirla antes de que el vehículo o maquina quede fuera de servicio por fallas mecánicas. Con esta información podemos realizar la remisión a la empresa contratista encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos adscritos al batallón de ingenieros BIANG 23 y mediante contrato número GN 2383-2021, contratista TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S. para los siguientes equipos:

VEHICULOS A INTERVENIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 1947-2021	
VEHICULO	**PLACA O MODELO**
Volqueta doble troque	OLO 147
Volqueta doble troque	OLO 148
Carro tanque de combustible	WDB902
Carro tanque de agua	VOH 338
Camión NPR para transporte de personal	EAO025
Retrocargador sobre Ruedas	CASE 580SM
Motoniveladora	CATERPILLAR 120 K
Vibro compactador	CATERPILLAR CS533E

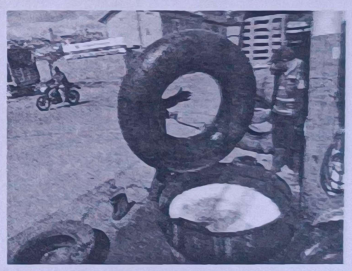
Actividades Realizadas: se realizó diagnóstico de las

	dos volquetas encontrando lo siguiente: Volquetas **OLO 147:** Fuga de aire en uno de los tanques de aire por la válvula de drenado manual Volquetas **OLO 148:** Fuga de aceite por el bocín de la rueda derecha delantera **Estado:** se radicó la solicitud del repuesto a la empresa contratista. **Nota:** se anexa ficha de mantenimientos.
2. Realizar un diagnóstico del estado de la maquinaria y unidades de transporte, para determinar las refacciones y los insumos que se requieren para su reparación, maquinaria de propiedad del Ejercito Comando BINAG 23.	Una vez realizado el diagnóstico del Retrocargador sobre ruedas CASE 580SM se evidencia mediante inspección ocular que el pasador del cilindro estabilizador izquierdo por el movimiento de la máquina se desliza y se salía. **Actividades Realizadas:** El día dos (02) de diciembre del 2022, se realizó intervención al retrocargador CASE 580SM, para realizar el aseguramiento de un pasador del cilindro estabilizador izquierdo, que con la vibración se salía, también se realizó la instalación de un diente del valde.  
3. A solicitud del supervisor, rendir conceptos y presentar informes cuando se requiera resolver situaciones de tipo técnico, financiero, administrativo o contractual relacionadas con los proyectos de inversión de la competencia de la Secretaría de Infraestructura y Minas y por otras dependencias u organismos de control en el marco del Convenio 1607 -2020 suscrito entre el Departamento de	1.1. Se realizo trámite para prórroga del GN2383-2021 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del ejercito batallan de ingenieros BIANG 23, para ejecución del proyecto de mantenimiento y /o mejoramiento de vías terciaria en jurisdicción del departamento de Nariño en el marco del programa Colombia rural convenio 1607-2020 incluyendo suministro de repuestos, transporte y mano de obra" **Estado:** En ejecución.

Nariño e INVIAS.	**Actividades Realizadas:** Se realizo informe de supervisión, justificación de prorroga y recolección de documentación para radicar en el DAC la solicitud de la prórroga. Se radico mediante oficio **SIM 2054-2022** del dos (02) de diciembre de 2022. 1.2. Se realizo trámite para prórroga del Se presenta informe mensual de supervisión del contrato GN1769-2022 "suministro de combustible (gasolina corriente y ACPM) para los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad del ejercito batallón de ingenieros BIANG 23 utilizados en la ejecución del proyecto de mantenimiento y/o mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del departamento de Nariño en el Marco del Programa Colombia Rural Convenio 1607-2020" **Estado:** En ejecución. **Actividades Realizadas:** Se realizo informe de supervisión, justificación de prorroga y recolección de documentación para radicar en el DAC la solicitud de la prórroga. Se radico mediante oficio **SIM 1863-2022** del 05 de diciembre de 2022.
4. Remitir al Departamento Administrativo de Contratación o donde se lo requiera dentro de los tres (03) días siguientes contados a partir de su expedición, toda actuación o acto administrativo que se genere en el desarrollo de proceso de contratación, durante sus etapas precontractual y contractual hasta la liquidación de los proyectos que adelanta la Secretaria de Infraestructura y Minas para su legalización y publicación derivados del Convenio suscrito entre el Departamento de Nariño y el Instituto Nacional de Vías.	El día primero (01) de diciembre del 2022 se radico en el Departamento Administrativo de Contratación DAC el informe mensual del contrato GN2383-2021 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria del ejercito batallan de ingenieros BIANG 23, para ejecución del proyecto de mantenimiento y /o mejoramiento de vías terciaria en jurisdicción del departamento de Nariño en el marco del programa Colombia rural convenio 1607-2020 incluyendo suministro de repuestos, transporte y mano de obra" **Nota:** se anexa oficio de radicación en el archivo del DAC. Se radicara en el Departamento Administrativo de Contratación DAC el informe mensual y documentos

	adicionales para el trámite de pago de acta parcial del contrato GN1769-2022 "suministro de combustible (gasolina corriente y ACPM) para los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad del ejercito batallón de ingenieros BIANG 23 utilizados en la ejecución del proyecto de mantenimiento y/o mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del departamento de Nariño en el Marco del Programa Colombia Rural Convenio 1607-2020" **Nota:** está pendiente el certificado de entrada a almacén para poder radicar la cuenta para pago de la segunda acta parcial
5. Coadyuvar en la proyección de actas de liquidación de los contratos y convenios (con sus respectivos soportes: comprobantes de egreso, certificación de rendimientos financieros cuando se requiera, informes de supervisión y/o interventoría, actas de recibo final y recibo de la comunidad cuando se requiera y demás documentos contractuales requeridos de conformidad a las circulares emitidas por el Departamento Administrativo de Contratación) con el fin de ser tramitados para firma ante el Departamento a través de la Secretaria de Infraestructura y Minas.	Se programa para realizar los radicados de la documentación en la subsecretaria de presupuesto para el trámite de pago de la segunda acta parcial del contrato GN1791-2022 "Suministro y transporte de material granular de adición para las vías priorizadas del proyecto de mantenimiento y/o mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del departamento de Nariño en el marco del Programa Colombia Rural.". **Estado:** En ejecución **Actividades a Realizar:** En la fecha del corte del informe mensual de actividades se procederá a solicitar el cargue a SECOP II y posterior radicación en el archivo del DAC. Se programa para realizar los radicados de la documentación en la subsecretaria de presupuesto para el trámite de pago de la segunda acta parcial del contrato GN1769-2022 "Suministro de combustible (gasolina corriente y ACPM) para los vehículos, maquinarias y equipos de propiedad del ejercito batallón de ingenieros BIANG 23 utilizados en la ejecución del proyecto de mantenimiento y/o mejoramiento de vías terciarias en jurisdicción del departamento de Nariño en el marco del programa Colombia rural convenio 1607-2020 y convenio gn1947-2021 aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento

	Nariño y el ministerio de defensa – ejército nacional – unidades tácticas designadas por el comando de ingenieros a través de la central administrativa y contable – CENAC de ingenieros, con el fin de cooperar en la ejecución de actividades de mantenimiento de las vías terciarias del departamento de Nariño, las cuales serán intervenidas en el marco del programa "Colombia rural". **Estado:** En ejecución **Actividades a Realizar:** En la fecha del corte del informe mensual de actividades se procederá a solicitar el cargue a SECOP II y posterior radicación en el archivo del DAC.
6. Brindar apoyo a la secretaria de Infraestructura y minas del Departamento a través de la participación en Comités, mesas de trabajo virtual y presencial, visitas de campo y reuniones institucionales cuando se requiera.	El día veinte (20) de diciembre de 2022, se realizara reunión con el comité veedor con representantes de la alcaldía, integrantes del BIANG 23 para la entrega del primer corredor vial del municipio de Ospina vía Ospina - Cunchila - San Isidro. Se Realiza visita de campo, con el fin de verificar el estado de la maquinaria y vehículos de propiedad del ejercito batallón de ingenieros BIANG 23 del municipio de Ipiales, mediante una inspección ocular. **Nota:** Se anexa formato de inspección ocular a la maquinaria y vehículos del BIANG 23.
7. Apoyar en el control sobre suministro de combustible, repuestos e insumos de cada equipo relacionando horas de trabajo y rendimiento para los vehículos y Maquinaria amarilla del Comando de Ingenieros BIANG 23.	Se realizó el día primero (01) de diciembre del 2022, cargue de combustible en la estación de servicio El Litoral, perteneciente a COMBUSCOL por la cantidad de 1000 galones de ACPM. Este combustible está siendo utilizado para el trabajo de la maquinaria que está interviniendo en la obra y en el municipio de Ospina vía Ospina - Cunchila - San Isidro. **Nota:** Se anexa control de combustible suministrado a la maquinaria y vehículos del BIANG 23.
8. Informar a la secretaria de Infraestructura y Minas del Departamento de Nariño, sobre las refacciones y los insumos necesarios	Una vez realizado el diagnostico a la maquinaria y vehículos se encuentra fallas en las dos volquetas doble troque, se presenta relación de las refacciones y los insumos necesarios para el mantenimiento correctivo de

para la reparación de la maquinaria y unidades de transporte del comando de ingenieros BIANG 23.	las unidades de transporte del comando de ingenieros BIANG 23, esto se solicita a la empresa contratista TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S.A.S. **Nota:** Se anexa cuadro de diagnóstico de los vehículos.
9. Realizar el seguimiento, control, supervisión y acciones correctivas y preventivas con relación a las horas trabajadas presentadas por los operadores en cuanto a los vehículos y maquinaria del Comando de Ingeniero BIANG 23.	Se realiza recolección de datos del kilometraje y horas de trabajo de la maquinaria, con esta relación podemos tener listo los insumos y refacciones y establecer fechas del mantenimiento preventivo como los cambios de aceite de motor, diferenciales, hidráulico, trasmisión. Filtración de aceite de motor, filtración de aire.
10. Realizar visitas semanales técnicas a los diferentes municipios del Departamento de Nariño, para verificar el correcto funcionamiento de los equipos, comprobar daños y sugerir las acciones para realizar y garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos y maquinaria del Comando de Ingeniero BIANG 23 en el Marco del Convenio 1607-2020.	El día seis (06) del mes de diciembre del 2022 se recibió reporte del operador de la motoniveladora Caterpillar 120K, de que se pinchó la llanta delantera derecha de la máquina, se realizó reparación de la llanta donde se encontró que el neumático tenía dos huecos, se realizó la reparación de la llanta para que la maquina quede en buen estado de funcionamiento.  
11. Hacer parte del equipo de trabajo de sensibilización y socialización del proyecto, participando activamente de las actividades programadas para generar el conocimiento entre la comunidad beneficiada con las actividades del Mantenimiento de la red VIAL terciaria priorizada dentro del marco del Convenio No. 1607-2020, celebrado entre el Departamento de Nariño y el Instituto Nacional de Vías, dentro del Programa Colombia Rural.	Se programa con el equipo de trabajo la entrega del corredor vial del municipio de Ospina, via Ospina – Ospina – Cunchila – San Isidro, para realizar el acta de entrega a satisfaccion a la comunidad representada por el comité veedor conformado para velar por los intereses de la cumunidad y que se realice a cabilidad la ejecucion de la obra. Se realiza programacion de reunion con los operadores de los vehiculos y maquianaria, para conocer a detalle el estado de los mismos y realizar la solicitud de repuestos, e según el plan de necesidades emitido por

	el BIANG 23, donde encontramor elementos con caracteristicas contempladas en el escalonamiento de de mantenimiento vehicular y de maquinaria emitido por el COING para realizar las respectivas correciones de los daños o percances que se les han presentado a cada una de ellas, y atravez de la empresa contratista realizar la gestion para dar las respectivas soluciones y tener una maquinaria trabajando en optimas condiciones, para reiniciar actividades de obra en el proximo año.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizará tramite de pago de segunda acta parcial del contrato GN1791-2022, se radico en departamento de contratación DAC, la documentación necesaria para realizar las prórrogas de los contratos GN2383-2021, GN690-2022, GN1769-2022, GN1791-2022 y demás obligaciones que conlleva el convenio 1607-2020.

NOTA: Se aclara que en mi contrato hasta el momento no manejo contratos en proceso de: liquidaciones, vigencias expiradas.

CONTRATISTA	**Firma**
JEIBER HUGO GÓMEZ RAMOS	
SUPERVISOR	**Firma**
SUBSECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y VIAS	
SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ	
REVISIÓN	**Firma**
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y MINAS (E).	
SONIA ALEJANDRA VELASCO RODRIGUEZ	

Gobernación de Nariño
EN DEFENSA DE LO NUESTRO

SIM- 1334-2022

-1183
GN77

San Juan de Pasto, 01 de diciembre de 2022

Doctor.
CRISTIAN ALEXANDER ROSERO HERNÁNDEZ
Director DAC.
Departamento Administrativo de Contratación.
Gobernación de Nariño.

Asunto: Entrega de documentos correspondientes al contrato Numero GN 2383-2021.

Cordial Saludo

Por medio del presente, se adjunta la documentación que a continuación se relaciona, con el fin de hacer entrega de los documentos que corresponden al contrato de "Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para la maquinaria y/o vehículos de propiedad del ejército batallón de ingenieros BIANG 23, en el marco del programa Colombia rural y del convenio 1607-2020". Mediante la SASI009-2021, se adjudicó a TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA representada por el señor JUAN CARLOS DE LOS RÍOS, con numero de contrato GN 2383-2021.

Documentos:

Informe de supervisión No 8
Informe de supervisión No 9

Cordialmente,

ING. JEIBER HUGO GÓMEZ RAMOS
Profesional Contratista
Secretaria de Infraestructura y Minas

Anexo lo anunciado en 12 folios

Gobernación de Nariño
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
FECHA 1/12/2022
HORA
FIRMA

Proyectó:	Revisó:	Aprobó:
Ing. Jeiber Hugo Gómez Ramos Profesional de Apoyo Convenio 1607-2020	Ing. María Mónica Gómez Salas. Subsecretaria de Infraestructura y Vías (E).	Ing. Sonia Alejandra Velasco Rodriguez Secretaria de Infraestructura y Minas (E).

Calle 19 No 23-78 / Codigo Postal: 520003 | 123
contactenos@narino.gov.co - www.narino.gov.co
Pasto-Nariño-Colombia

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

FICHA 2: FICHA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MÁQUINAS

TIPO DE EQUIPO: MAQUINARIA DE CONTRUCCION	
MARCA: CASE	**REFERENCIA:**
MODELO: 2012	**SERIE:**
OPERADOR: SLP. MARIO LUIS PEREZ CASERES	

FECHA DE REALIZACIÓN (DIA / MES / AÑO)		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	REPUESTOS O INSUMOS UTILIZADOS	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
01/12/2022		Engrase de partes moviles de la maquina	Grasa	Operador
	02/12/2022	Se realizó intervención para realizar el aseguramiento de un pasador del cilindro estabilizador izquierdo, que con la vibración se salía, también se realizó la instalación de un diente del valde.	Soldadura Diente de Valde	Técnico Jhon Muñoz

Nota: El engrase de los sistemas y partes moviles de la maquina se realizan de acuerdo al trabajo de la maquina y el estado del clima, el engrase se viene realizando en un promedio de cada tres dias

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

FICHA 1: FICHA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MÁQUINAS

NOMBRE DEL EQUIPO: MOTONIVELADORA CAT 120K	
TIPO DE EQUIPO: MAQUINARIA DE CONTRUCCION	
MARCA: CATERPILLAR	**REFERENCIA:**
MODELO: 2012	**SERIE:**
OPERADOR: SLP. MONTAÑO MOSQUERA JESUS	

FECHA DE REALIZACIÓN (DIA / MES / AÑO)		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	REPUESTOS O INSUMOS UTILIZADOS	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
07/11/2022		Engrase de partes moviles de la	Grasa	Operador
09/11/2022		se realizó cambio de aceite de motor, filtro de aire primario y secundario, filtro de aceite, filtros de combustible primario y secundario Horometro actual 3486.7 el proximo cambio se programa en 250 horas	Filtro de aire Primario Filtro de aire Secundario Filtro de aceite Filtro de Combustible primario Filtro e combustible secundario Aceite de motor	Operador e Ing Jeiber H Gomez
	06/11/2022	se realizo reparacion de la llanta delantera derecha, para esta reparacion se tubo que transladar hasta el municipio de tuquerres	vulcanizadora	Vulcanizadora Nariño Tuquerres

Nota: El engrase de los sistemas y partes moviles de la maquina se realizan de acuerdo al trabajo de la maquina y el estado del clima, el engrase se viene realizando en un promedio de cada tres dias

GOBERNACION DE NARIÑO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

FICHA 4: FICHA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MÁQUINAS

TIPO DE EQUIPO: MAQUINARIA DE CONTRUCCION	
MARCA: CATERPILLAR	**REFERENCIA:**
MODELO: 2010	**SERIE:** CATCS533PTJL00645
OPERADOR: SLP. JOSELO CHIQUITO	

FECHA DE REALIZACIÓN (DIA / MES / AÑO)		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	REPUESTOS O INSUMOS UTILIZADOS	NOMBRE DEL PROFESIONAL O TÉCNICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
	02/12/2022	se realizo pegado de vidrio panoramico tracero, que se desprendio por la misma vibracion que produce la maquina	silicona automotriz para vidrios	Ing. Jeiber H Gomez y el operador

Nota: El engrase de los sistemas y partes moviles de la maquina se realizan de acuerdo al trabajo de la maquina y el estado del clima, el engrase se viene realizando en un promedio de cada tres dias

GOBERNACION DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
CONVENIO 1607-2020
FUENTES DE RECURSOS INVIAS POR VALOR DE $3.000.000.000,00

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO FIJO, CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS DEL BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N° 23 "GR. AGUSTIN ANGARITA NIÑO" PARA EL MES DE JULIO 2022 "PROYECTO COLOMBIA RURAL"

DENOMINACION	NOVIEMBRE																													TOTAL CONS	TOTAL KM / HORAS RECORRIDOS
	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
COMBUSTIBLE DIESEL ACPM																																
RETROEXCAVADORA CASE			36		32		36	39		32	32			36		34	36	36			36	36	36		36	25		38	35	33	624	109
VIBROCOMPACTADOR 16TON	16		40	37	40		35	40	40	30	38	42			40	38	40	40			40	40	40	40	34			37	38		777	155
MOTONIVELADORA CATERPILLAR	40		35	40	37		40	40	30	30	39	30		30		40	40	40			40	40	40		40			33	40		758	150
VOLQUETA DOBLE TROQUE 147					5		12							6																	23	104
VOLQUETA DOBLE TROQUE 141							11	11			17			15											5			7		2	68	306
CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE FWA									14																						14	63
TRACTOCAMION 7.600 LEA PODEROSA																															0	0
CARROTANQUE DE AGUA FWA					12		6				9										4	4	4								39	176
CAMION CHEVROLET NPR				15						20				15						15										20	85	190
TOTAL CONSUMO	56	0	111	92	126	0	140	130	84	112	135	72	0	110	40	112	116	116	0	15	120	120	120	40	115	25	0	115	105	55	2382	
																																918
																															2382	

INGRESO ACPM AL MES	2382	VALOR	$	8,560.00	TOTAL	$	20,389,920.00
SALDO QUE VIENE	0	VALOR	$	8,560.00	TOTAL	$	-
CONSUMO ACPM EN EL MES	2382	VALOR	$	8,560.00	TOTAL	$	20,389,920.00
SALDO EN GALONES QUE PASAN	0						

GOBERNACION DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS
CONVENIO 1607-2020
FUENTES DE RECURSOS INVIAS POR VALOR DE $3.000.000.000,00

CUADRO DEMOSTRATIVO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE EQUIPO FIJO, CAMPAÑA Y COMBATE DE INGENIEROS DEL BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE N° 23 "GR. AGUSTIN ANGARITA NIÑO" PARA EL MES DE JULIO 2022 "PROYECTO COLOMBIA RURAL"

DENOMINACION	DICIEMBRE																													TOTAL CONS	TOTAL KM / HORAS RECORRIDOS
	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
COMBUSTIBLE DIESEL ACPM																																
RETROEXCAVADORA CASE	38	30	30		34	36	37	37	36	18																					312	69
VIBROCOMPACTADOR 16TON	30	26	25		25	32	36	34	25																						233	47
MOTONIVELADORA CATERPILLAR	40	40	40		40	40	40	40	40																						320	64
VOLQUETA DOBLE TROQUE 147	10								10																						20	30
VOLQUETA DOBLE TROQUE 141	10		17					5	5																						37	157
CARRO TANQUE DE COMBUSTIBLE FWA																															0	0
TRACTOCAMION 7.600 LEA PODEROSA																															0	0
CARROTANQUE DE AGUA FWA	9	6	6			9	9	10	6																						55	248
CAMION CHEVROLET NPR	5		15					15																							35	430
TOTAL CONSUMO	142	110	141	0	99	117	122	141	122	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	
																																3188
																															1012	

INGRESO ACPM AL MES	1012	VALOR	$	8,560.00	TOTAL	$	8,662,720.00
SALDO QUE VIENE	0	VALOR	$	8,560.00	TOTAL	$	-
CONSUMO ACPM EN EL MES	1012	VALOR	$	8,560.00	TOTAL	$	8,662,720.00
SALDO EN GALONES QUE PASAN	0						

Gobernación de Nariño
¡EN DEFENSA DE LO NUESTRO!

GOBERNACION DE NARIÑO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS

FICHA 1: FICHA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MÁQUINAS

NOMBRE DEL EQUIPO: MOTONIVELADORA CAT 120K	
TIPO DE EQUIPO: MAQUINARIA DE CONTRUCCION	
MARCA: CATERPILLAR	**REFERENCIA:**
MODELO: 2012	**SERIE:**
OPERADOR: SLP. MONTAÑO MOSQUERA JESUS	

SISTEMA DE LA MAQUINA	ITEM DE REVISION	N/A	LUNES		OBSERVACIONES
			BIEN	MAL	
ELECTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		x		
	Indicador de temperatura		x		
	Indicador de aceite		x		
	Indicador de batería		x		
	indicador de refrigerante		x		
	indicador de combustible		x		
	indicador de filtro de aire		x		
	*Horometro		x		
LUCES	*Frontales de trabajo		x		quemada la exploradora derecha
	*Traseras de trabajo (Reflector)		x		
	Señales de giro (derecha, izquierda)		x		
	*Baliza		x		
HIDRAULICO	*Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		x		
	*Nivel de aceite en la transmisión (verificar ausencia de fugas		x		
	*Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		x		
	*Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar ausencia de fugas)		x		
	*Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar ausencia		x		
GENERAL	*Espejo central convexo		x		
	*Espejos laterales		x		
	*Alarma de retroceso		x		
	Pito		x		
	* Freno de servicio		x		
	* Freno de estacionamiento		x		
	*Cinturones de seguridad		x		
	Vidrio Panorámico		x		
	*Kit para Derrames		x		
	*Extintor de incendios Capacidad: PQS		x		
	*Cabina antivuelco (R.O.P.S)		x		
	Asiento		x		
	Escaleras y apoyos de acceso		x		
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		x		
	Presión de aire de las llantas		x		
