CAOBA

Diseño Y Construcción

INFORME

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1011-CS-025-2022

MUNICIPIO DE GUARNE

29 de diciembre de 2022

Caoba Diseño y Construcción S.A.S
Calle 37 # 38ª20, San José, Itagüí.
Caoba.dyc@gmail.com
3147697346

CAOBA
Diseño Y Construcción

Por medio del presente informe, conforme al contrato de suministro No. 1011-CS-025-2022 celebrado entre el municipio de Guarne y Caoba Diseño y Construcción S.A.S; se hace entrega del suministro e instalación de mobiliario en las diferentes dependencias de la Administración Municipal de Guarne Antioquia durante la vigencia 2022.

Caoba Diseño y Construcción S.A.S
Calle 37 # 38ª20, San José, Itagüí.
Caoba.dyc@gmail.com
3147697346

CAOBA
Diseño Y Construcción

1 ESCRITORIOS TIPO L

150 cm ancho x 80 cm alto x 150 cm profundo madera melanímica de 15mm importada, con haladera plásticas cromadas, cajonería en madera melanímica 15mm, color según solicitud del cliente, archivador metálico con rieles metálicos, cajones en metal y tapas en madera melanímica de 15 mm, haladeras en pasta plástica cromadas tubería cuadrada metálica 1 1/2", con pintura electrostática en polvo al horno, pestañas para fijación en lámina metálica y refuerzo en alma interna para los ángulos, en tubular de 1" para reforzar las esquinas y deslizadores plásticos.



Entrega de 15 unidades









CAOBA
Diseño Y Construcción

2 FOLDERAMA

190 cm alto x105cm ancho x 46 cm fondo. Con (4) entrepaños graduables en altura formando (6) servicios y (18) divisiones graduables horizontalmente estructura fabricada en lámina cold rolled. acabados en pintura horneable de alta resistencia. Cuenta con 2 puertas con sistema plegable o cortina. Entrepaños graduables y divisiones verticales por cada uno.



Entrega de 20 unidades












CAOBA
Diseño Y Construcción

3 ESCRITORIO SENCILLO


120 cm ancho x 70cm profundo x 80cm alto madera melanímica de 15mm importada, con haladera plásticas cromadas cajonería en madera melanímica 15mm, color según solicitud del cliente archivador metálico con rieles metálicos, cajones en metal y tapas en madera melanímica de 15 mm, haladeras en pasta plástica cromadas tubería cuadrada metálica 1 1/2", con pintura electrostática en polvo al horno, pestañas para fijación en lámina metálica y refuerzo en alma interna para los ángulos, en tubular de 1"para reforzar las esquinas y deslizadores plásticos.

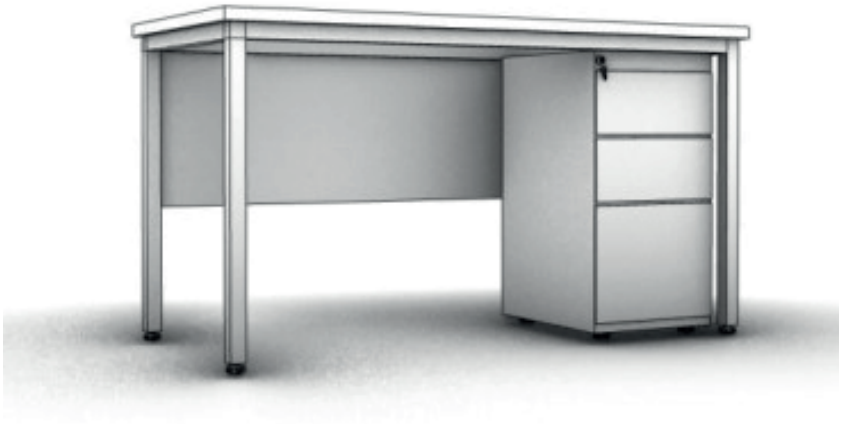


Entrega de 30 unidades





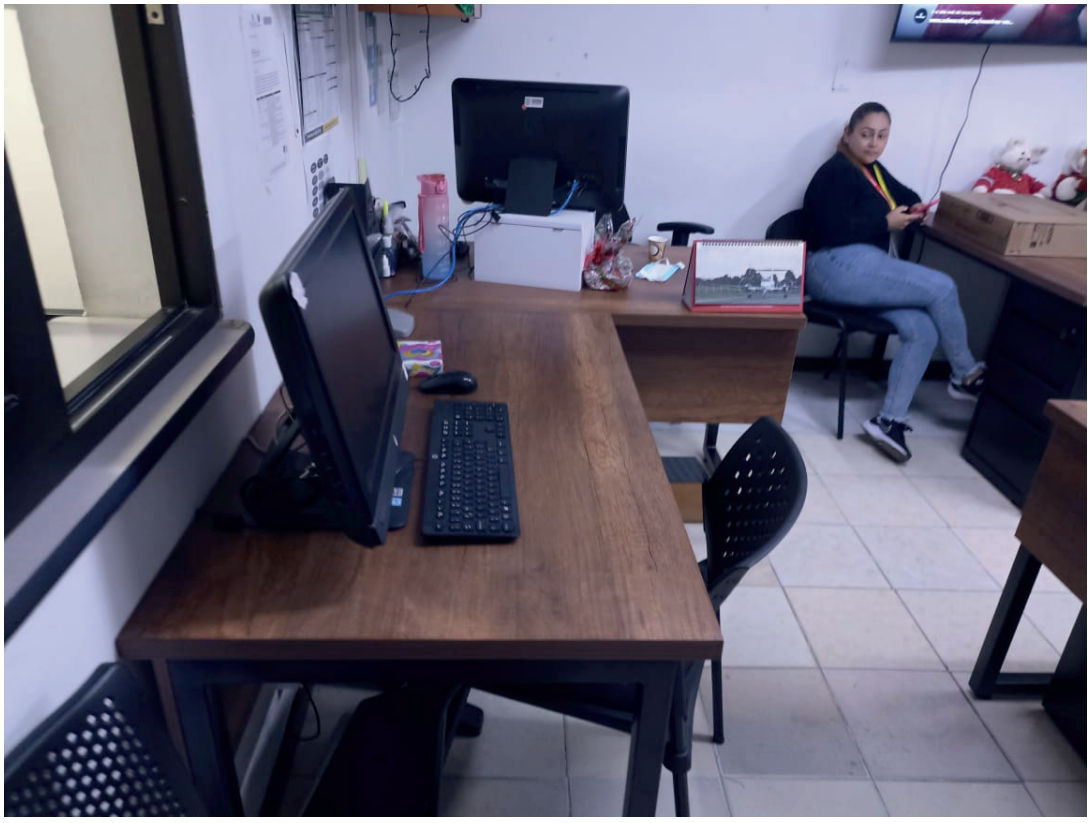


HDMI

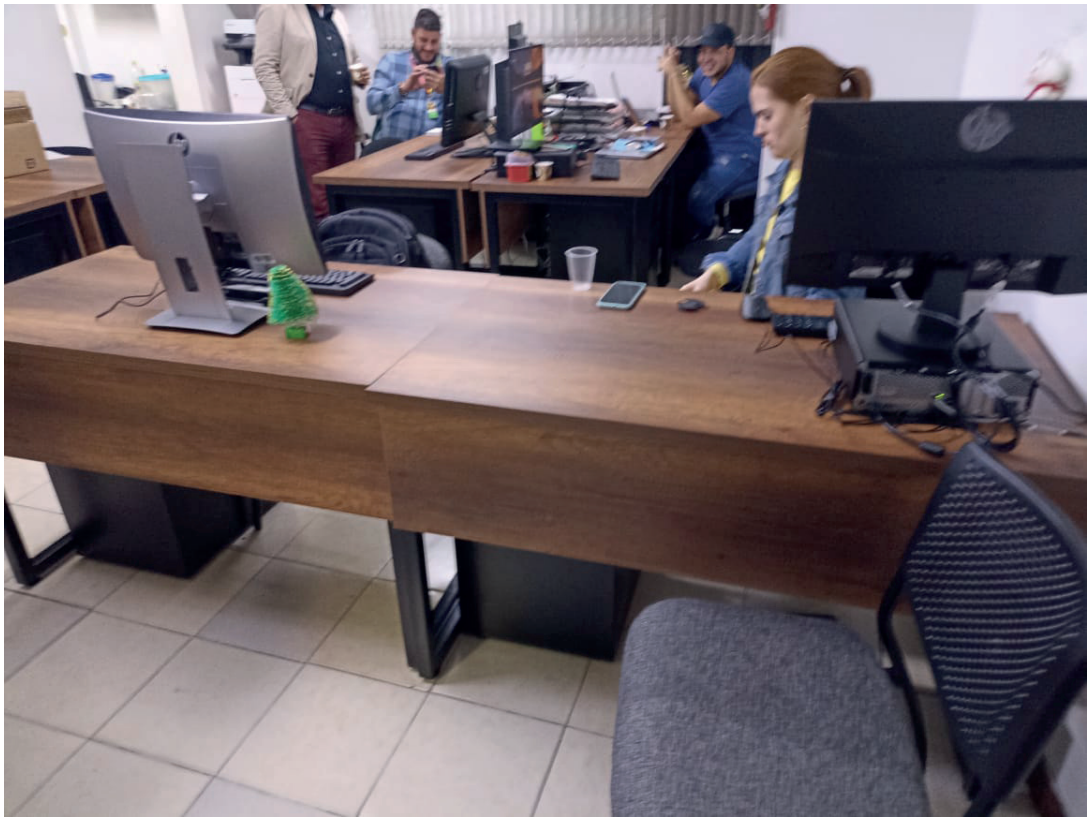

CAOBA
Diseño Y Construcción

4 SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA ERGONOMICA CERTIFICADA CARACTERÍSTICAS

- Estructura metálica cromada
- Tiene regulación y graduación de altura a gas (Nitrógeno comprimido)
- Tapizada en cuero sintético PU
- Base cromada 5 aspas y rodachinas en goma
- Controles debajo del asiento para accionar la graduación de altura
- Posee el mecanismo Syncro que permite la reclinación y bloqueo del espaldar con el que puedes ajustar el ángulo en 4 posiciones.
- Peso Máximo soportado 110 kg.
- 1 Año de garantía por defectos de fabricación



Entrega de 31 unidades





CAOBA
Diseño Y Construcción

5 MUEBLE IMPRESORA Y ARCHIVO

60 cm ancho x 220 cm alto x 60cm profundo madera melanímica de 15mm importada, refuerzo interno agarraderas escondidas y patas en acero color según solicitud del clientey deslizadores plásticos.



Entrega de 1 unidad



CAOBA
Diseño Y Construcción

6 MUEBLE CAFETIN

60cm ancho x 44mc profundo x 87cm alto una repisa 70x30 cmmadera rh melanímica de 15mm importada, refuerzo interno agarraderas escondidas y patas en acero color según solicitud del cliente y deslizadores plásticos.




Entrega de 4 unidades



CAOBA
Diseño Y Construcción

7 MODULO COUNTER DE RECEPCIÓN CON ARCHIVADOR

170 cm anchox 100 cm profundo x 115 cm alto
madera melanímica de 15mm importada,
con haladera plásticas cromadas cajonería
en madera melanímica 15mm, color según
solicitud del cliente
archivador metálico con rieles metálicos,
cajones en metal y tapas en madera
melanímica de 15 mm, haladeras en pasta
plástica cromadas tubería cuadrada metálica
1 1/2", con pintura electrotática en polvo al
horno, pestañas para fijación en lámina
metálica y
refuerzo en alma interna para los
ángulos, en tubular de 1" para reforzar las
esquinas
y deslizadores plásticos

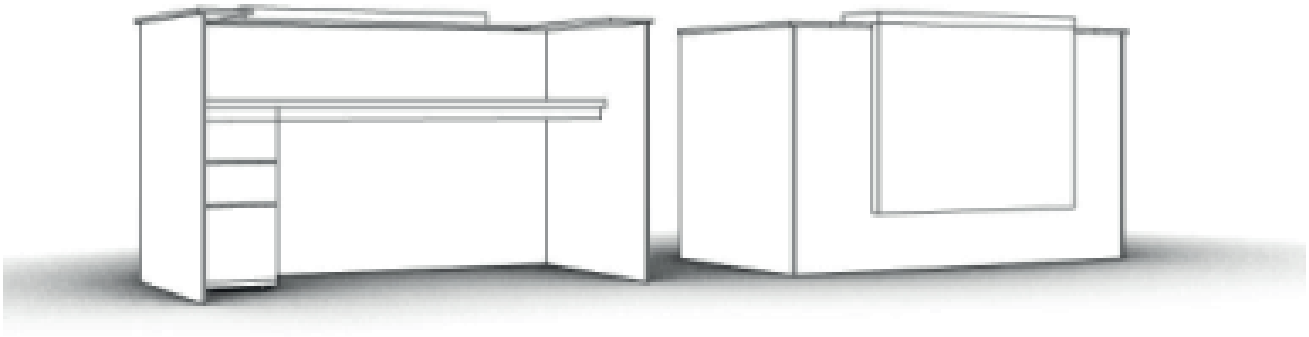

Entrega de 2 unidades






INFORMACIÓN

CAOBA
Diseño Y Construcción

8 ESCRITORIOS ZONA COWORKING

170 ancho x 60 cm profundo x 130 cm alto melaminico 15mm importado color según solicitud tuberia cuadrada 1 1/2" con malla 170cm ancho x 60 cms 98cm alto - pintura electrostática al horno deslizadores plásticos enchufes usb pasta y metal





Entrega de 2 unidades









CAOBA
Diseño Y Construcción

9 MUEBLE IMPRESORA Y ARCHIVO

100 cm ancho x 230 cm alto x 50cm profundo madera melanímica de 15mm importada, refuerzo interno agarraderas escondidas color según solicitud del cliente y deslizadores plásticos



Entrega de 2 unidades



CAOBA
Diseño Y Construcción

11 MUEBLE IMPRESORA Y ARCHIVO

58 cm ancho x 230 cm alto x 50cm profundo m
adera melanímica de 15mm importada,
refuerzo interno agarraderas escondidas color
según solicitud del cliente y
deslizadores plásticos




Entrega de 2 unidades



CAOBA
Diseño Y Construcción

12 MODULO ARCHIVADOR OFICINAS

165 cm ancho x 80 cm alto x 45cm profundo
madera melanímica de 15mm importada,
refuerzo interno agarraderas escondidas
y patas en acero color según solicitud del cliente
y deslizadores plásticos

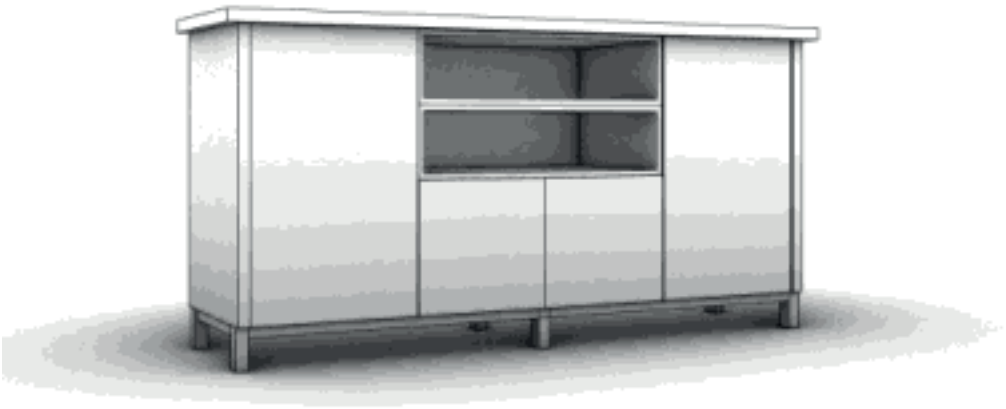


Entrega de 2 unidades



CAOBA
Diseño Y Construcción

10 MUEBLE IMPRESORA Y ARCHIVO

110 cm ancho x205 cm alto 52 cm profundo
madera melanímica de 15mm importada, refuerzo interno agarraderas escondidas
color según solicitud del cliente y deslizadores plásticos

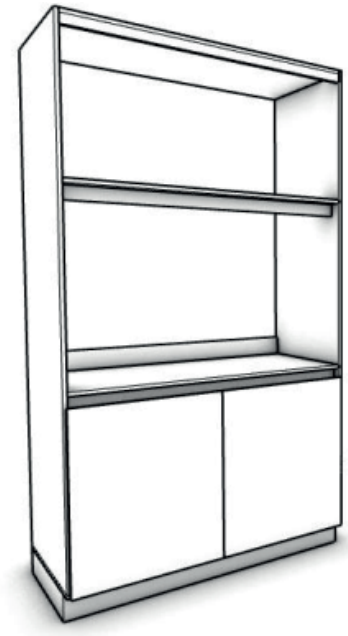


Entrega de 1 unidad



CAOBA
Diseño Y Construcción

13 SILLA X 3

Altura 76 cm, ancho 150 cm, fondo 60 cm acero pintado – paño 3 puestos, patas en media luna en tubo elíptico de 62×31 mm cal 16 pulgadas, pintado con pintura electrostática anticorrosiva, viga rectangular de 7/8 cal 18 pulgadas niveladores plásticos

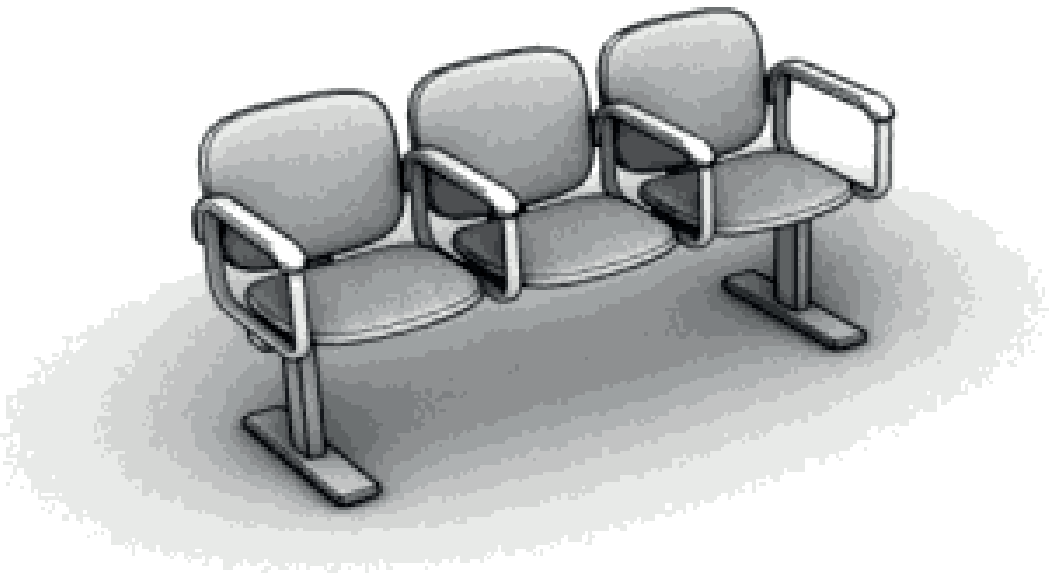

Entrega de 2 unidades

SILLA TANDEM x 3



CAOBA
Diseño Y Construcción

14 ESCRITORIO TIPO L

Madera melanímica de 15mm importada, con heladera plásticas cromadas cajonería en madera melanímica 15mm, color según solicitud del cliente y deslizadores plásticos altura 75 cm, ancho 160 cm, fondo 200 cm



Entrega de 2 unidades





CAOBA
Diseño Y Construcción

15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y SILLAS EXISTENTES

Lo cual implica cambiar ruedas de sillas, soportes, reguladores de altura, deslizadores de cajones, reparación de maderas, chapas, patas entre otras.





CAOBA
Diseño Y Construcción

Cordialmente



Sebastián Moreno Cardona
CC: 1.039.454.068
Representante Legal

Caoba Diseño y Construcción S.A.S
Calle 37 # 38ª20, San José, Itagüí.
Caoba.dyc@gmail.com
3147697346
