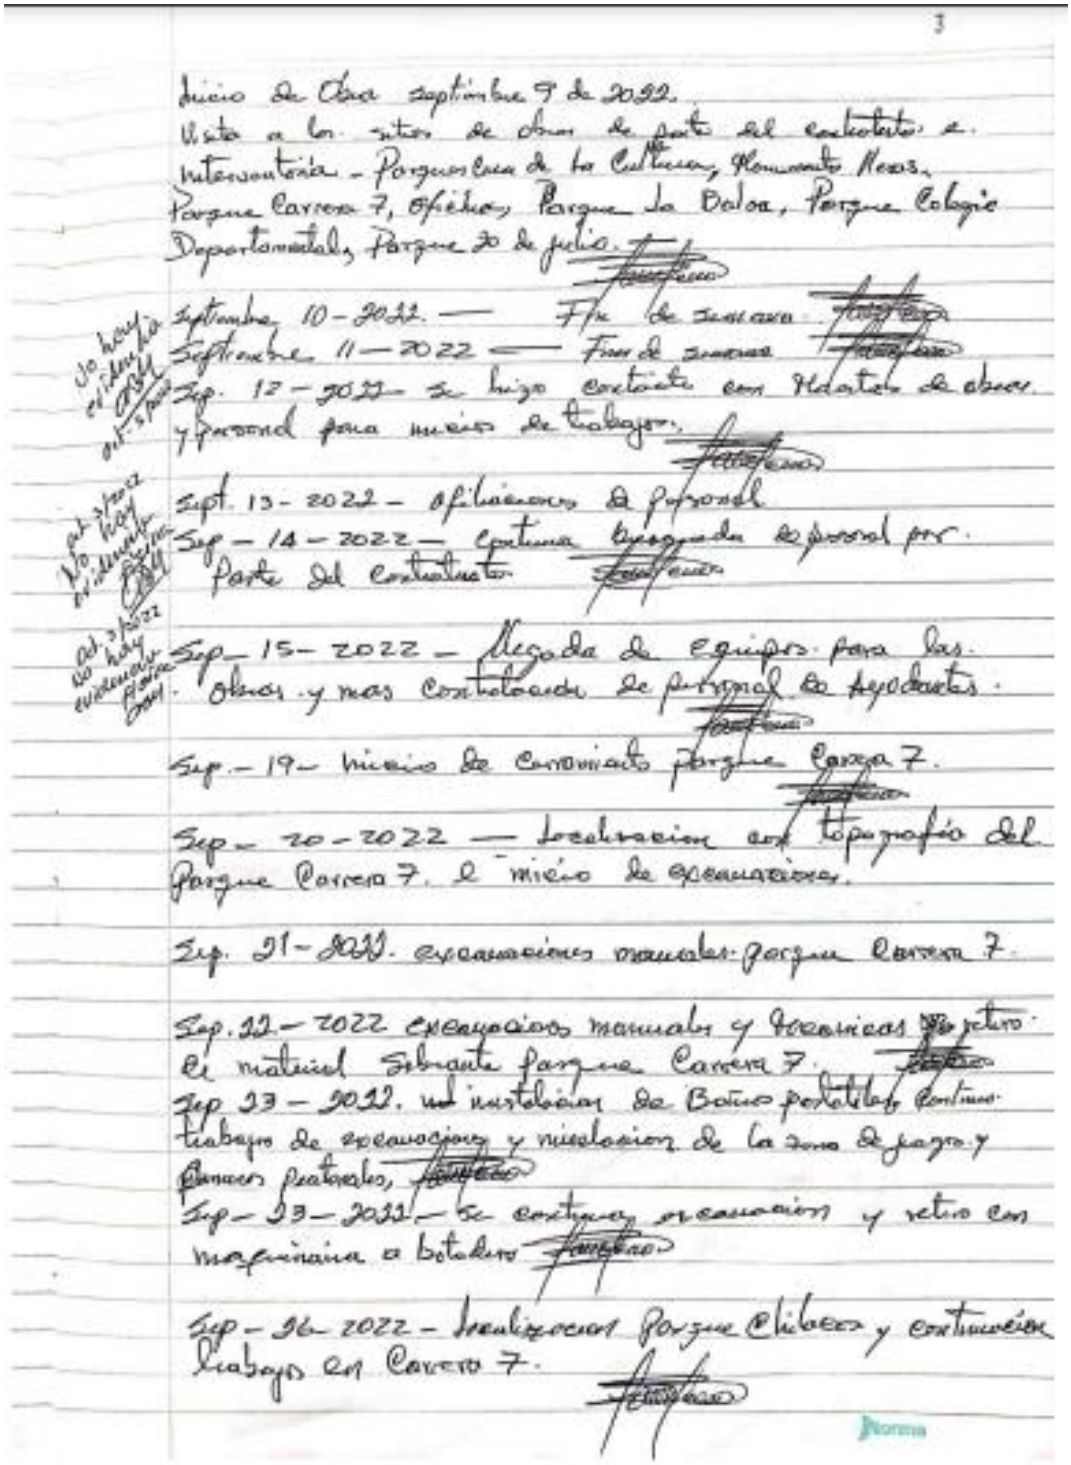


3

Inicio de Obra septiembre 9 de 2022.
Visita a los sitios de obra de parte del contratista e interventoría - Parque Lineal de la Cultura, Monumento Heroes, Parque Carrera 7, Oficinas, Parque La Bolsa, Parque Colegio Departamental, Parque 20 de julio.

Se hace evidencia el día 10 pero no hay

Septiembre 10 - 2022. — Fin de semana
Septiembre 11 — 2022 — Fin de semana
Sep. 12 - 2022 - se hizo contacto con Maestro de obra y personal para inicio de trabajos.

el día 13 pero no hay evidencia

Sept. 13 - 2022 - oficinas & personal
Sep - 14 - 2022 — continua brigada de personal por parte del contratista.

el día 15 2022 no hay evidencia para este

Sep - 15 - 2022 - llegada de equipos para las obras y mas contratación de personal de trabajadores.
Sep. - 19 - inicio de cerramiento parque Carrera 7.
Sep - 20 - 2022 — localización con topografía del Parque Carrera 7. & inicio de excavaciones.
Sep. 21 - 2022. excavaciones manuales: parque Carrera 7.
Sep. 22 - 2022 excavaciones manuales y mecanicas retiro el material sobrante parque Carrera 7.
Sep 23 - 2022. se instalaron dos Baños portatiles continuo trabajos de excavaciones y nivelacion de la zona de juegos y planos peatonales.
Sep - 23 - 2022 - se continua excavacion y retiro con maquinaria a botadero
Sep - 26 2022 - localizacion parque Chicoco y continuación trabajos en Carrera 7.

4

Sep- 27-2022, Cerramiento de parque Chilacos, Subbase para parque Carrera 7.

SEP- 28-2022:
- NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA ZONA DE JUEGOS
- TERMINACIÓN DE CERRAMIENTO EN LONA PARA PARQUE CHILACOS

JOHAN QUIÑONES
A9512014-1072643188

SEP-29-2022
- SE RECIBEN 2 VIAJES DE SUBBASE PARA LAS AREAS DE JUEGOS, PEATONAL Y SENDERO INTERNO
- DISTRIBUCIÓN DE LA SUB-BASE EN LAS ZONAS DEL PEATONAL Y SENDERO INTERNO
- SE NIVELA Y SE COMPACTA ZONA DE JUEGOS, ANDEN Y SENDERO PEATONAL INTERNO
- LLUEVE EN LAS HORAS DE LA TARDE 2:00 pm A 4:30 pm

JOHAN QUIÑONES
A9512014-1072643188

SEP-30-2022
- REPLANTEO Y TRAZADO DEL PARQUE (JUEGOS)
- SE INICIA LA TOMA DE NIVELES Y EXCAVACIÓN PARA IMPLANTAR LOS JUEGOS.
- SE RECIBE MIXTO Y CEMENTO PARA LA CIMENTACIÓN DEL JUEGO DE NIÑOS.
- SIENDO LAS 12:00 M EMPIEZA A LLOVER
- SIENDO LAS 3:30 PM SE REINICIA ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN DE JUEGOS

JOHAN QUIÑONES
A9512014-1072643188

Oct - 03 - 2022

No se ha entregado el Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo. Carolina Bello

3 DE OCTUBRE /2022. – VISITAS DE OBRA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

1. VISITA ADMINISTRATIVA CONTRATO N°

ASISTENTES: ING. SOCARRAS, ING. MAURICIO (ALCALDIA) ING. DIEGO (A) ING. FERNANDO LOZANO (EFICARQ) MG.TS. AMPARO BORRIOS (EFICORQ) ING. CAROLINA BELLO (EFICARQ) MGTS NORMA BORRIOS (EFICARQ)

- REQUERIMIENTOS SOLICITADOS AL CONTRATISTA

10 CARPETAS DE IGUAL NÚMERO DE EMPLEADOS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

A. HOJAS DE VIDA
B. AFILIACIÓN SGSSS
C FOTOCOPIA DE LA CÉDULA
D. CONTRATOS
E. CURSO DE ALTURA (SI ES NECESARIO)
F. PLAN DE CAPACITACIÓN
6. ACTA DE ENTREGA INDIVIDUAL DE EPP DEBIDAMENTE FIRMADOS

CONCLUSIÓN: NO SE HIZO ENTREGA DE DICHOS CARPETAS SEGÚN REQUERIDO EN REUNIÓN DE COMITE EL 26 DE SEP/2022

2. VISITA A OBRA

- SE REALIZÓ VISITA DE INSPECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR PARTE DE:
MGTS. AMPARO BORRIOS MGTS NORMA BORRIOS
ING. CAROLINA BELLO

HALLAZGOS:

A. SE EVIDENCIA CERRAMIENTO EN POLISOMBRA SIN



LA DEBIDA SEÑALIZACION
B. NO EXISTE SEÑALIZACIÓN INTERNA
C. NO EXISTEN ELEMENTOS COMO CANECA, BOMBILLA, ETC
D. EL "CAMPAMENTO" SE EVIDENCIA DESORGANIZADO, ENCHIQUECADO Y CON MATERIALES DE OBRA SIN ORGANIZAR
E. NO HAY RUTA DE EVACUACIÓN
F. LA SALIDA Y ENTRADA A LA OBRA ESTA OBSTACULIZADA POR RIESGO.
G. NO SE EVIDENCIA PLAN DE CUIDADO AMBIENTAL.
H. NO HAY ASEO
I. NO ESTA APROBADO EL MPT.
J. LAS LINEAS DEL PASO PEATONAL SE EVIDENCIAN DETERIORADAS Y EN MALA POSICION
K. NO EXISTE PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
L. NO SE PRESENTÓ A TRABAJAR UN EMPLEADO SIN TENER CONOCIMIENTO DE LA AUSENCIA
J. LOS COLABORADORES NO CUENTAN CON EPP COMPLETO
3. VISITA DE OBRA CHILACOS:

A. SE OBSERVA CERRAMIENTO EN POLISOMBRA
B. NO HAY TRABAJADORES.
C. NO HAY SEÑALIZACIÓN EXTERNA.
D. NO ESTA APROBADO PMT.
E. SE SOLICITA EN LA OBRA VERIFICACIÓN DE FECHAS DE VACUNA
CONSIDERACIONES FINALES:

A. NO ESTÁ EL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. SE DA UN PLAZO AL 10 DE OCTUBRE/2022.

B. LOS CONTRATISTAS ENCARGADOS DE LAS OBRAS HACEN REFERENCIA A QUE EN EL PARQUE INICIARON LAS ACTIVIDADES SIN PLAN DE OBRA, NI PLANOS SINO POR REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ENVIADOS POR WHATSAPP. Y SEGÚN EL CONTRATISTA POR SU EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRAS

4. (VISITA OBRA EL PARAISO. CONTRATO N°) INVALIDADO

FIRMAS:

Cardina Bello

CONCLUSIONES: SE SUGIERE POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR SISO. DE ESTABLECER FECHA DE CUMPLIMIENTO PARA TODO LO REGISTRADO ANTERIORMENTE LUNES 10 DE OCTUBRE / 2022.

Cardina Bello

3-OCT-2022

- SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SARDINEL EN LA ZONA PEATONAL PARQUE CARRERA SEPTIMA
- SE RETIRA MATERIAL HUMEDO

4-OCT-2022

se deja constancia del presunto incumplimiento de los requerimientos iniciales y el acatamiento de comunicados. Toda obra realizada será por riesgo y costo del contratista. Se invita al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8

5- octubre 2022 - Hora 3:45 lluvia total en la ciudad de clima - imposible. trabajo en cielo abierto zanjas llenas de agua.

6-oct-2022

- SE REALIZA TRABAJOS DE PERFILACIÓN DEL TERRENO EN LA ZONA DEL ANDEN PARA INSTALACION DE SARDINEL TIPO A-10 PARQUE CALLE SEPTIMA
- SE PASAN NIVELES PARA INSTALACIÓN DE SARDINEL PARQUE CALLE SEPTIMA.
- SE COMIENZA INSTALACION DE SARDINEL TIPO A-10
- SIENDO LAS 4:00 PM COMIENZA A LLOVER RESTRINGIENDO LAS ACTIVIDADES EN EL LOTE DE LA CARRERA SEPTIMA

- EN EL PARQUE DE DEL 20 DE Julio SE DESMONTA EL ADOQUIN (LADRILLO)
- SE REALIZA NIVELACIÓN EN LA ZONA DEL ADOQUIN (PLAZA)

7-OCT-2022

- SIGUEN LAS LABORES DE INSTALACIÓN DEL SARDINEL TIPO A-10 EN EL AREA DEL ANDEN PARQUE SEPTIMA

- EN EL PARQUE DE LA CARRERA SEPTIMA SIENDO LAS 2:40 DE LA TARDE SE PROCEDE A TAPAR CON PLASTICO LAS AREAS INTERVENIDAS YA QUE EMPIEZA

9

A Mover

- En el parque del 20 de Julio se implanta las areas de excavación para las plataformas de los juegos
- Siendo las 3:00pm se suspende las actividades ya que remiten a Mover


8-OCT-2022

- En el parque del 20 de Julio se inicia labor de excavación y nivelación
- Se suspende actividad por lluvia 11:30 Am
- En el parque de la carrera septima se inicia labores de excavación y perfilación para instalar los bordillo A-80 en la zona del anden.
- Se pasan niveles para poder instalar prefabricado tipo A-80

10-OCT-2022

Visita de Obra Cra 7

1. Se realiza visita de interventoria teniendo en cuenta los hallazgos y plan de reparera de gestión de SST solicitado en las visitas del 26 de septiembre y 3 de Octubre del presente año. En dicha visita se identifico que se continuan presentando anomalias como:

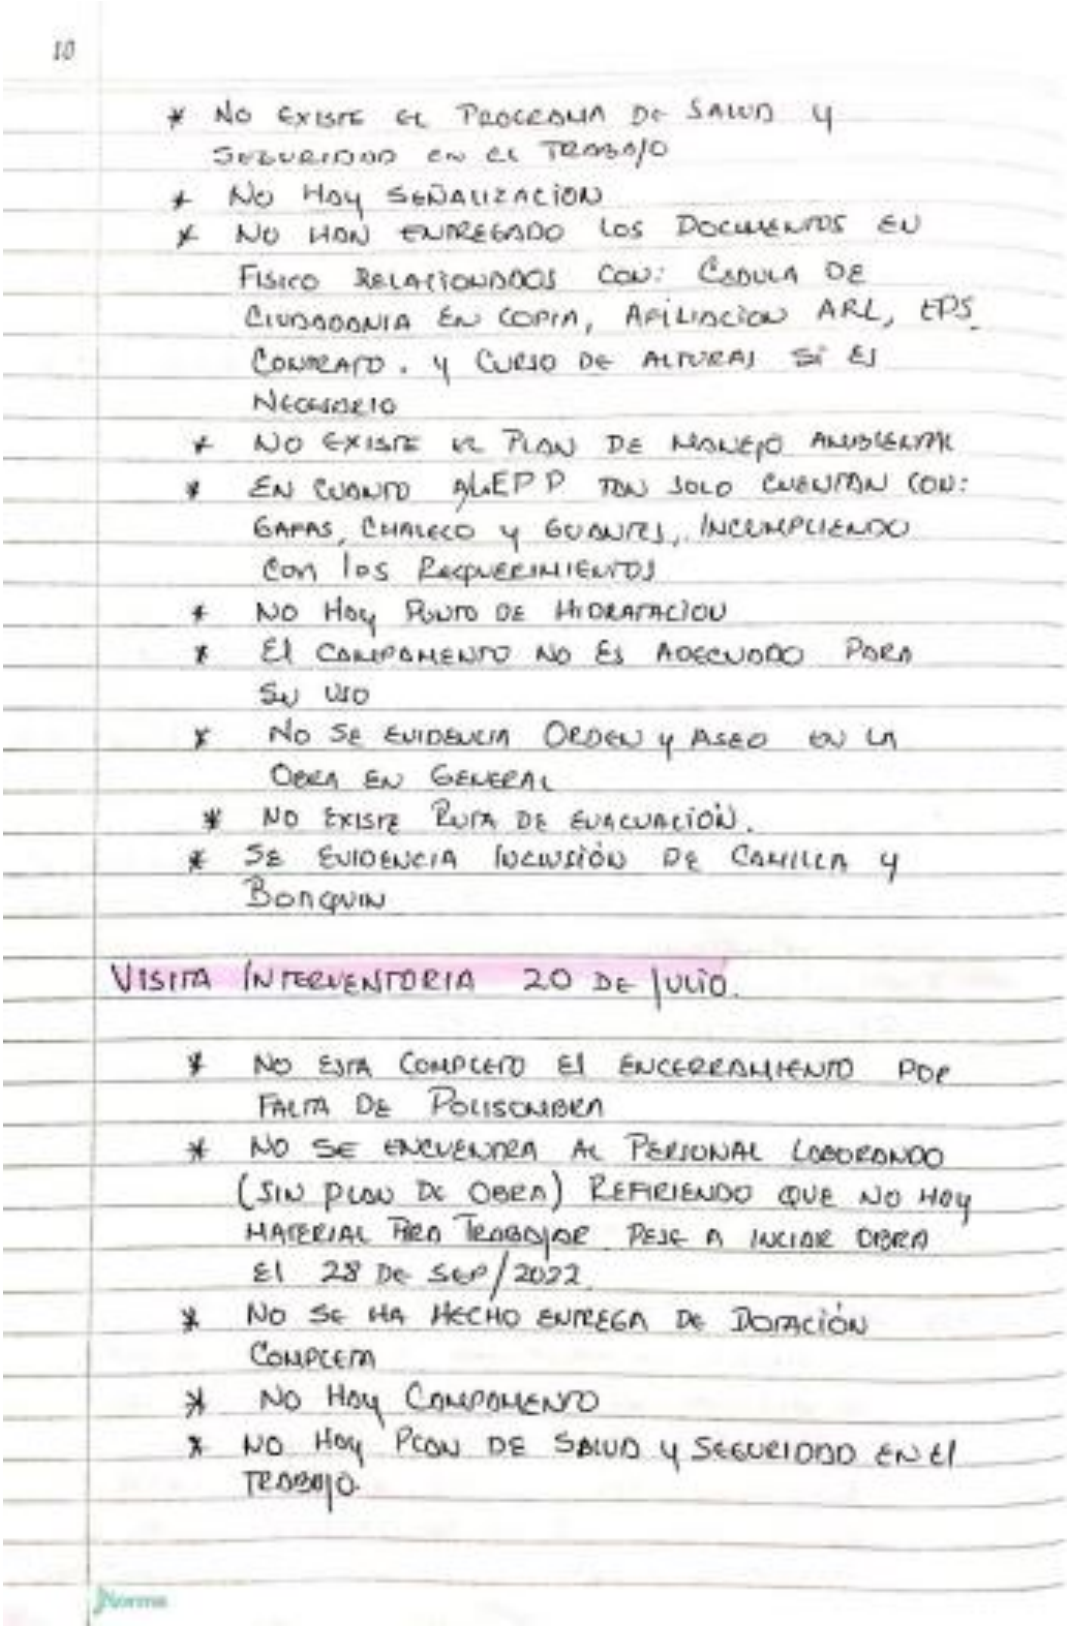


10

* NO EXISTE EL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
* NO HAY SEÑALIZACIÓN
* NO HAN ENTREGADO LOS DOCUMENTOS EN FISICO RELACIONADOS CON: CEDULA DE CIUDADANIA EN COPIA, AFILIACION ARL, EPS, CONTRATO, Y CURSO DE ALTURAS SI ES NECESARIO
* NO EXISTE EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
* EN CUANTO A LOS EPP TAN SOLO CUENTAN CON: GAFAS, CHALECO Y GUANTES, INCUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS
* NO HAY PUNTO DE HIDRATACION
* EL CAMPAMENTO NO ES ADECUADO PARA SU USO
* NO SE EVIDENCIA ORDEN Y ASEO EN LA OBRA EN GENERAL
* NO EXISTE RUTA DE EVACUACIÓN.
* SE EVIDENCIA INCLUSIÓN DE CANILLA Y BONQUIN

VISITA INTERVENTORIA 20 DE JULIO.

* NO ESTA COMPLETO EL ENCERRAMIENTO POR FALTA DE POLISOMBRA
* NO SE ENCUENTRA AL PERSONAL LABORANDO (SIN PLAN DE OBRA) REFIRIENDO QUE NO HAY MATERIAL PARA TRABAJAR. PESE A INICIAR OBRA EL 28 DE SEP/2022.
* NO SE HA HECHO ENTREGA DE DOTACIÓN COMPLETA
* NO HAY COMPROMISO
* NO HAY PCON DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

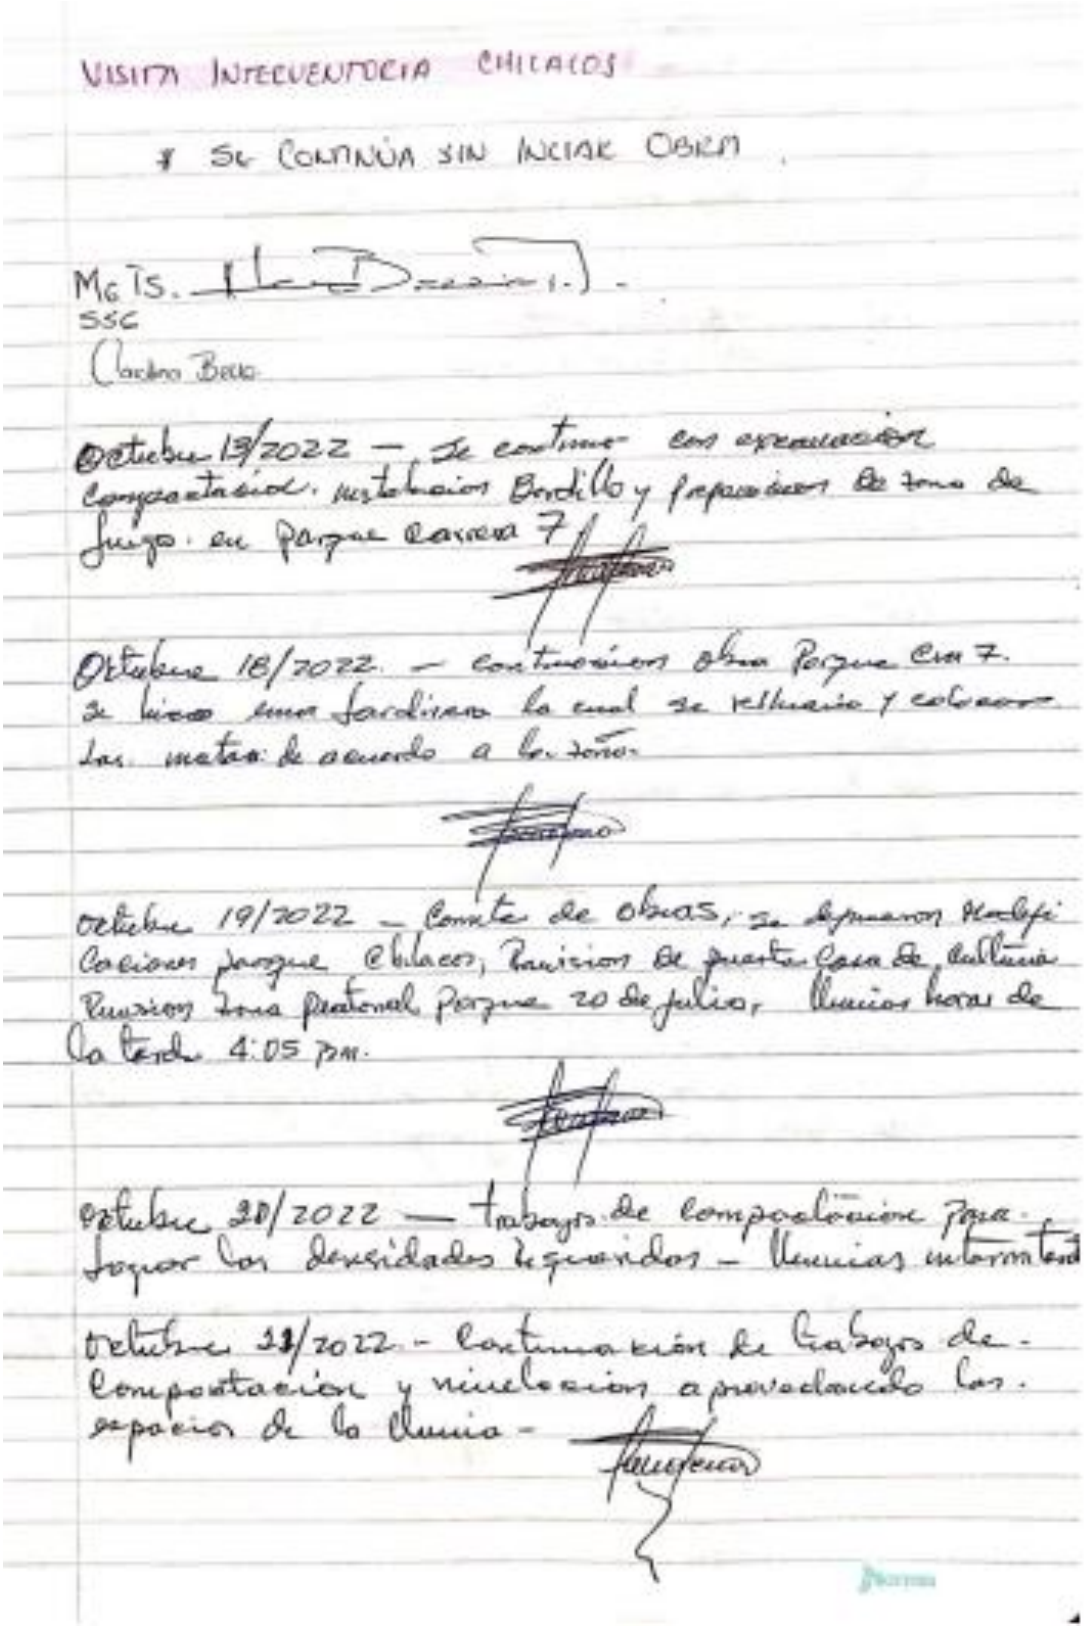

VISITA INTERVENTORIA CHILACOS

* SE CONTINÚA SIN INICIAR OBRA

MG TS. [illegible]
SSC
Cardeno Bello

Octubre 13/2022 — Se continua con excavación compactación, instalación Bordillo y preparación de zona de juego en parque carrera 7

Octubre 18/2022 — continuación obra Parque Cra 7. se hizo una jardinera la cual se rellenaria y colocaron las matas de acuerdo a la zona

octubre 19/2022 — Conteo de obras, se observaron Modificaciones parque Chilacos, Revision de puerta Casa de Cultura Revision zona peatonal Parque 20 de julio, Llueve hora de la tarde 4:05 pm.

octubre 20/2022 — trabajos de compactacion para lograr las densidades requeridas — llueve intermitente

octubre 21/2022 - continuación de trabajos de compactacion y nivelacion aprovechando los espacios de la lluvia -

12

Octubre 24/2022 - Continuacion de mezclas
los Cantaros d Bogueron q' suministro el Material
Granular para actividades por mucho
hasta el dia Lunes 31 de octubre -

Octubre 26/2022
Octubre 27/2022. Se llego material de Bordillos -
para las porras. 20 de julio y Chilacos ademas
Tabletas Gia para las porras. 20 de julio, Chilacos y
Cra 7 - ese suministro se esperaba desde hacia 2
dias

Octubre 31/2022 - Aprovechando la parada de Obreros
del dia domingo y Lunes en la tarde se hizo las pruebas
de densidad en las porras 20 de julio, Cra 7 y Bolsa
ademas se esta instalando Bordillo, hoy se aprobo
la compra de Adoquine de dos Colores en el comite de
obra.

Noviembre 1/2022 — Se retomo el material colocado ayer en
la porras Cra 7, tambien se compacto, se extendio y
compacto porras Chilacos, se continuo con Bordillos en
porras 20 de julio y la Cantera Bogueron no suministra
Granulado hasta el dia jueves -

Noviembre 2/2022. se continuo colocando Bordillos en el
Parque 20 de julio, se repito. Llegada de adoquine para
instalar en Cra 7, 20 de julio y Chilacos, Hunicio toda
la tarde —
