MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT 890,983,922

COMPROBANTE EGRESO No: 7178

FECHA: 27/12/2022

A FAVOR DE: ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE **CEDULA O NIT:** 1,128,401,915

DESCRIPCION: PAGO DEL ACTA 2 DEL CONTRATO 385 DEL 2022 REPARACION Y ADECUACION A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
6865	110939	2,024,000.00	192,280.00	121,440.00	0.00	1,710,280.00
	TOTAL	2,024,000.00	192,280.00	121,440.00	0.00	1,710,280.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
65913	Traslado	2086	BIA.FOND.COMUN.CONV.86125	1,128,401,915	ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE	1,710,280.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%	20,240.00
410508006	Industria y comercio en compras	20,240.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%	80,960.00
410576002	Estampilla procultura 1%	20,240.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%	50,600.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243605006	Servicios no declarantes	121,440.00

PAGO
2022 DIC. 27
ELECTRONICO

FIRMA DEL BENEFICIARIO

laura B.
PAGADOR

ELABORADO POR:NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
OBLIGACION PRESUPUESTAL

ora de Impresión: 11:11:07a. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 6865
FECHA: 27/12/2022

A FAVOR DE: 1128401915 ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE

CONCEPTO: PAGO DEL ACTA 2 DEL CONTRATO 385 DEL 2022 REPARACION Y ADECUACION A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.-

VALOR: (DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 2,024,000.00

COMPROMISO: 4471 **CUENTA X PAGAR:** 110939

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.008.8711001.002.20	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes - Administración central	2,024,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101003	Mantenimientos Generales		1,710,280.00
240722001	Estampilla Prohospital Dpto 1%		20,240.00
243605006	Servicios no declarantes		121,440.00
410508006	Industria y comercio en compras		20,240.00
410576001	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor 4%		80,960.00
410576002	Estampilla procultura 1%		20,240.00
411001007	Tasa Prodeporte y recreación 2,5%		50,600.00
511115005	Mantenimiento	2,024,000.00	

ORDENADOR

Lovia B.
TESORERO

PAGO
2022 DIC. 27
ELECTRONICO

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

(2086)

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO **Nit:** 890983922
Usuario: NORA LUCIA ALVAREZ RODRIGUEZ

27 de Diciembre de 2022 5:07:08 PM
Dirección IP: 186.159.3.105

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de diciembre de 2022 - 12:03 PM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	ActaContratoAnaMileB
Cuenta a debitar:	162-293664-79 - Ahorros Convenio 86125 Fondos Comunes
Valor total:	$1,710,280.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	27/12/2022
Fecha de aplicación:	27/12/2022

Editar/Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	ANAMILEBARRIENTOSA	1128401915	16283963172	$1,710,280.00	☐

Editar/Ver Transacción | Eliminar

Adicionar

Guardar como modelo

Continuar | Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN PEDRO
NIT: 890983922
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ActaContratoAnaMileB
Secuencia: 8
Número de cuenta a debitar: 16229366479

Fecha: 27-12-2022 **Hora:** 17:53:42
Fecha de Generación: 27-12-2022

Fecha de envío del pago: 27-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2022

Impreso por: 43361518

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,710,280.00	**Valor Registros Procesados:** $1,710,280.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
16283963172	Ahorros	1128401915	ANAMILEBARRIENTOSA	1,710,280.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2022

OBRAS.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Dirección de Obras Públicas	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO: VERSIÓN: 0

ACTA Nº 002

CONTRATISTA: ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE - CERRAJERO LOS PUENTES C.C. 1.128.401.915	***Nº CONTRATO: 385 DE 2022***
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	***SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS***

OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA.

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 22.399.800,00	1714	4471	PLAZO: UN (01) MES
OTROSI N°01				
TOTAL	$ 22.399.800,00			

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosi 001	TOTAL	% financiación
Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos y sus partes - Administración Central	2.3.2.02.008.871.1001.002.20	$ 22.399.800		$ 22.399.800	100,00%
TOTALES		**$ 22.399.800**		**$ 22.399.800**	**100,00%**

La suscrita Directora de Obras Publicas encargada **CERTIFICA** que el Contratista cumplió a cabalidad con los actividades relacionadas en el informe que hace parte del presente aval.

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	Cuenta de Cobro	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos y sus partes - Administración Central	2.3.2.02.008.871.1001.002.20	$ 2.024.000		$ 2.024.000	9,04%
TOTALES		**$ 2.024.000**		**$ 2.024.000**	**9,04%**

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos y sus partes - Administración Central	2.3.2.02.008.871.1001.002.20	$ 2.096.200		$ 20.303.600	9,36%
TOTALES		**$ 2.096.200**		**$ 20.303.600**	**9,36%**

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de **DOS MILLONES VINTICUATRO MIL PESOS M/L. ($ 2.024.000).**

Total parcial ejecutado	$	20.303.600
Porcentaje de ejecución		90,64%
Total parcial no ejecutado	$	2.096.200
Porcentaje parcial no ejecutado		9,36%

Informe de Interventoria:

Objetivo: Analizar, verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado.

Hallazgos:Se anexa Cuenta de cobro Nº2, acta parcial de pago N°2 y Final, memorias del suministro a todo costo entregado a la fecha, informe de supervisión Nº2 y Final y planilla de pago de seguridad social, pensiones, ARL y parafiscales.
Los informes e información soporte de este contrato se encuentran archivados en la oficina de la Dirección de Obras Públicas.

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

Fecha: 21 de diciembre de 2022

Nº TRD: 800-10-08

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARÍA DE HACIENDA
2022 DIC. 23
Hora: 4:51 PM
RECIBIDO

CUENTA DE COBRO Nº2

EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ANTIOQUIA

NIT. 890.983.922-2

DEBE A:

ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE

C.C. 1.128.401.915

LA SUMA DE UN DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/L. ($ 2.024.000)

CONCEPTO:

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA PARCIAL Nº2 Y FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 385 DE 2022, CUYO OBJETO ES *"REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA"*

El valor del pago podrá ser consignado en la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA No. 16283963172.

Para constancia se da en el municipio de San Pedro de los Milagros – Antioquia a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

Ana Milé Barrientos Aguirre

ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE
C.C. 1,128.401.915
Rep. Legal CERRAJERO LOS PUENTES
Contratista

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
GUSTAVO MORENO PAVA BARRIENTOS
ALCALDE

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA

ACTA PARCIAL DE PAGO N°2 Y FINAL			FECHA: 21 de diciembre de 2022			ACTA N°1		ACTA N°2		VALORES ACUMULADOS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. TOTAL						
1	Reposición de bases de 6x15 metros, refuerzo de estructura central y reparación de postes y refuerzos de soldaduras. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 1.440.000	$ 1.440.000	1,00	$ 1.440.000	0,00	$ -	1,00	$ 1.440.000
2	Instalación de estabilizadores nuevos en 5/8" con tuerca de 15cm de largo. Incluye retiro de estabilizadores existentes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 7.500.000	$ 7.500.000	1,00	$ 7.500.000	0,00	$ -	1,00	$ 7.500.000
3	Soldadura de arandelas, pines y bujes de la plataforma y estructura. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	un	144,00	$ 15.900	$ 2.289.600	144,00	$ 2.289.600	0,00	$ -	144,00	$ 2.289.600
4	Pintura de tarima en poliuretano catalizado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 7.050.000	$ 7.050.000	1,00	$ 7.050.000	0,00	$ -	1,00	$ 7.050.000
5	Reparación de lona: Incluye parches, refuerzos, cambio de anillos en mal estado y limpieza. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	global	1,00	$ 4.120.000	$ 4.120.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	EXTRA										
S.E. 1	Reconstrucción de cercha principal correspondiente a la estructura de soporte de la lona. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un		$ 780.000				2,00	$ 1.560.000	2,00	$ 1.560.000
S.E. 2	Suministro de tornillo rosca fina 3/8 x 3" con doble tuerca y arandela	un		$ 1.920				40,00	$ 76.800	40,00	$ 76.800
S.E. 3	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/4" con doble tuerca y arandela	un		$ 2.880				40,00	$ 115.200	40,00	$ 115.200
S.E. 4	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/2" con doble tuerca y arandela	un		$ 3.650				40,00	$ 146.000	40,00	$ 146.000
S.E. 5	Suministro de tuerca 3/8" tipo mariposa	un		$ 1.260				100,00	$ 126.000	100,00	$ 126.000
	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)				$ 22.399.800		$ 18.279.600		$ 2.024.000		$ 20.303.600

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas
Supervisora

ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE
Rep. Legal CERRAJERO LOS PUENTES
Contratista

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS									
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**									
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				**NIT O C.C.**					
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				**NIT O C.C.**	1.128.401.915				
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	2		**ELABORÓ**	Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**	**S.E. 1**	Reconstrucción de cercha principal correspondiente a la estructura de soporte de la lona. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**		







Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				2	
Subtotal					2,0
TOTAL					2,0

OBSERVACIONES:

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS									
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**									
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				**NIT O C.C.**					
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				**NIT O C.C.**	1.128.401.915				
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	2		**ELABORÓ**	Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**	**S.E. 2**	Suministro de tornillo rosca fina 3/8 x 3" con doble tuerca y arandela	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**		



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				40	
Subtotal					**40,0**
TOTAL					**40,0**

OBSERVACIONES:

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS									
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**									
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				**NIT O C.C.**					
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				**NIT O C.C.**	1.128.401.915				
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	2		**ELABORÓ**		Ana Mile Barrientos Aguirre			
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**	**S.E. 3**	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/4" con doble tuerca y arandela	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**		



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Tot
	ancho	Alto	Longitud		
				40	
Subtotal					**40,0**
TOTAL					**40,0**

OBSERVACIONES:


	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS								
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**								
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				**NIT O C.C.**				
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				**NIT O C.C.**	1.128.401.915			
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	**2**		**ELABORÓ**	Ana Mile Barrientos Aguirre			
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**		**S.E. 4**	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/2" con doble tuerca y arandela	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**



Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Total**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				40	
Subtotal					40,0
TOTAL					40,0

OBSERVACIONES:

	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS									
OBJETO DEL CONTRATO	**REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA**									
SUPERVISOR CONTRATO	MARIA FERNANDA AVENDAÑO				**NIT O C.C.**					
CONTRATISTA	ANA MILÉ BARRIENTOS AGUIRRE				**NIT O C.C.**	1.128.401.915				
UBICACIÓN	**San Pedro de los Milagros**	**ACTA N°**	**2**		**ELABORÓ**	Ana Mile Barrientos Aguirre				
CONTRATO	Contrato de Suministro N°385 de 2022	**ITEM**		**S.E. 5**	Suministro de tuerca 3/8" tipo mariposa	**UNIDAD**	unidad	**UBICACIÓN**	**San Pedro de los milagros**	

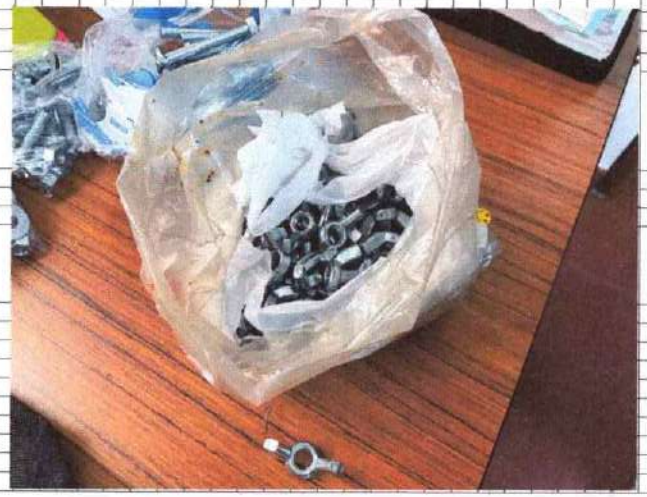

Localización	**Dimensiones**			**No Elem.**	**Medida Tot**
	ancho	**Alto**	**Longitud**		
				100	
Subtotal					**100,0**
TOTAL					**100,0**

OBSERVACIONES:

INFORME DE SUPERVISIÓN N°02 Y FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°385 DE 2022

REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO
GUSTAVO LEÓN ZAPATA BARRIENTOS
Alcalde 2020-2023

MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

DICIEMBRE DE 2022

CONTENIDO

1. *Información General* 3
2. *Localización* 4
3. *Introducción* 4
4. *Valor y Forma de Pago* 5
5. *Plazo* 6
6. *Adiciones y/o prórrogas* 6
7. *Acta de Cambio y/o Ajuste de Ítems y Cantidades* 6
8. *Especificaciones técnicas* 6
8. *Balance financiero del contrato* 8
9. *Garantías* 8
10. *Evidencias fotográficas* 10

1. Información General

Objeto:	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA DE LA TARIMA PARA EVENTOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA.
Supervisora:	María Fernanda Avendaño Sierra Directora de Obras Públicas
Contratista:	Ana Milé Barrientos Aguirre C.C. 1.128.401.915
Valor Final:	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. ($20.303.600).
Plazo:	UN (01) MES, previa suscripción del acta de inicio, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
Fecha de Inicio:	09 de diciembre de 2022
Fecha de Terminación:	22 de diciembre de 2022
Prorrogas:	N.A.
Fecha de Elaboración del Informe:	Diciembre de 2022

2. Localización

La ejecución del presente contrato se llevará a cabo en el municipio de San Pedro de los Milagros, Departamento de Antioquia, región Norte, ubicado geográficamente en la cordillera central de los Andes, Altiplanicie llamada: "Altiplano de los Osos" o "Meseta de los Osos". El objeto del contrato se desarrolló en el Coliseo Tipo B, localizado en el casco urbano del municipio, donde se dispuso la estructura de la tarima para su reparación y acondicionamiento.



Fuente https://geoportal.dane.gov.co/metadatos/descarga_divipola/descargas/jpg/05_Antioquia_pocket.jpg



Fuente http://www.antioquia.gov.co/index.php/antioquia/mapa-de-antioquia

3. Introducción

Dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023 ***"JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO"*** aprobado mediante acuerdo 04 del 09 de junio de 2020 se plasmó la Línea Estratégica 2 Juntos por nuestra Infraestructura y Competitividad en el Programa 2: "El Cambio empieza en los Equipamientos Públicos" y en el indicador de producto: 1) Servicio de mantenimiento de infraestructura cultural.

El MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS requirió contratar el mantenimiento correctivo y preventivo de la estructura de la tarima empleada para la realización de eventos culturales, recreativos y/o eventos protocolarios programados por la Administración Municipal. La intervención comprendió la reparación de los diferentes elementos de la estructura metálica que conforma la tarima tales como: bases, parales verticales, estabilizadores, arandelas, pines y bujes. Igualmente, será tenida en cuenta la pintura general de la estructura en poliuretano catalizado.

Por medio del presente proceso se llevó a cabo la contratación a todo costo del mantenimiento a la estructura de la tarima propiedad del municipio, a la cual se le realizó la reparación de anillos, la instalación de parches y refuerzos, además de una limpieza general. La intervención de la estructura fue priorizada por la Administración Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas del municipio, pues se evidenció un deterioro considerable en sus bases, pines, soldaduras y demás elementos que hacen parte de la armazón que es instalada por personal adscrito a la dependencia en los diferentes eventos culturales y/o protocolarios.

Por solicitud de la Profesional de la Administración Municipal, encargada de Seguridad y Salud en el Trabajo, el pasado 05 de septiembre se llevó a cabo una inspección de la estructura por parte de funcinarios de la Dirección de Obras Públicas, en la cual se evidenció el deterioro y la fatiga de los elementos que conforman la armazón. Igualmente se recomendó no hacer uso de la misma por motivos de seguridad

Conforme con lo anterior el Municipio de San Pedro de los Milagros para el cumplimiento de los procesos misionales y de apoyo, al igual que para dar cumplimiento a los componentes que se encuentran asociados al Plan de Desarrollo para el periodo 2020-2023, contrató los servicios de mantenimiento a todo costo para adecuar y mejorar las condiciones de la estructura de la tarima para eventos propiedad del municipio.

4. Valor Final y Forma de Pago

El valor del contrato ascendió finalmente a la suma de VEINTE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/L. ($20.303.600), quedando un recurso por ejecutar por valor de DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L. ($2.096.200).

El municipio pagará al contratista el valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal N°1714 del 01 de noviembre de 2022. A su vez, conforme al compromiso presupuestal N°4471 del 23 de noviembre de 2022 de acuerdo con el rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.008.8711001.002.20, denominado Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos estructurales y sus partes – Administración central.

Forma de pago: El valor del contrato fue cancelado por medio de actas parciales, una vez se presentó la factura o cuenta de cobro con sus complementos y anexos (factura, soportes, informes y el recibo a satisfacción por parte del supervisor), para lo cual se requirió la certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato.

Impuestos, tasas y contribuciones: Al formular la oferta y posteriormente al firmar el contrato con el municipio, el contratista aceptó que estarían a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de

estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afectaron el contrato y las actividades que de él se derivaron.

Para efectos de la retención en la fuente, el Municipio procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente.

5. Plazo

El objeto del presente contrato se desarrolló finalmente en un periodo de CATORCE (14) DÍAS, contados a partir de la fecha en que se suscribió el acta de iniciación por parte de la Entidad Contratante, una vez se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

6. Adiciones y/o prórrogas

No se realizaron adiciones y/o prórrogas en razón del contrato.

7. Acta de Cambio y/o Ajuste de Ítems y Cantidades

El pasado 20 de diciembre de 2022, se elaboró el acta mediante la cual se establecieron los ítems de pago extra relacionados con la reconstrucción de dos (2) cerchas y el suministro de la tornillería para garantizar el armado de la estructura de la tarima por valor de DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/L. ($2.024.000). Igualmente se tomó la desición, en común acuerdo con el contratista, para no ejecutar el ítem de pago N°5 *"Reparación de lona: Incluye parches, refuerzos, cambio de anillos en mal estado y limpieza. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento".*

8. Especificaciones técnicas

El objeto contractual comprendió el suministro a todo costo correspondiente a las cantidades y especificaciones técnicas descritas a continuación:

PRESUPUESTO OFICIAL					
Ítem	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Vr. Unitario**	**Vr. Total**
1	Reposición de bases de 6x15 metros, refuerzo de estructura central y reparación de postes y refuerzos de soldaduras. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	Global	1	$ 1.440.000	$ 1.440.000
2	Instalación de estabilizadores	Global	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000

	nuevos en 5/8" con tuerca de 15cm de largo. Incluye retiro de estabilizadores existentes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento						
3	Soldadura de arandelas, pines y bujes de la plataforma y estructura. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	Unidad	144	$	15.900	$	2.289.600
4	Pintura de tarima en poliuretano catalizado	Global	1	$	7.050.000	$	7.050.000
5	Reparación de lona: Incluye parches, refuerzos, cambio de anillos en mal estado y limpieza. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	Global	0	$	4.120.000	$	0
S.E. 1	Reconstrucción de cercha principal correspondiente a la estructura de soporte de la lona. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Unidad	2.00	$	780.000	$	1'560.000
S.E. 2	Suministro de tornillo rosca fina 3/8 x 3" con doble tuerca y arandela	Unidad	40.00	$	1.920	$	76.800
S.E. 3	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/4" con doble tuerca y arandela	Unidad	40.00	$	2.880	$	115.200
S.E. 4	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/2" con doble tuerca y arandela	Unidad	40.00	$	3.650	$	146.000
S.E. 5	Suministro de tuerca 3/8" tipo mariposa	Unidad	100.00	$	1.260	$	126.000
COSTO TOTAL (IVA INCLUIDO)						**$**	**20.303.600**

Nota: Se anexa el Acta Parcial de Obra N°02 y Final,en la cual se establecen los valores definitivos ejecutados en el contrato.

9. Balance financiero del contrato

Valor:	$ 22.399.800
Porcentaje total ejecutado acumulado:	**90,64%**
Valor pago Anticipado:	N.A.
Valor Acta de Pago N°01:	$ 18.279.600
Valor Acta de Pago N°02:	$ 2.024.000
Volr total ejecutado y facturado:	**$ 20.303.600**
Saldo del contrato sin facturar y sin ejecutar:	$ 2.096.200

10. Garantías

El asociado presentó a la entidad las garantías exigidas por la Entidad, mediante las pólizas N° 65-44-101217497 y N°65-40-101068456, emitidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A., con los amparos y condiciones descritas a continuación:

- **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y seis (6) meses más.

- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**: Por un monto equivalente al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más.

- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por un monto equivalente al VEINTE PORCIENTO (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) meses más.

- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por un valor equivalente a doscientos (200) SMMLV, con una vigencia por el plazo total de ejecución del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista.

NOTA: La supervisión del contrato verificó que los valores, tiempos y porcentajes establecidos en las pólizas allegadas por el contratista, tal y como se describe a continuación:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.
CONTRATISTA:	Ana Milé Barrientos Aguirre, C.C. 1.128.401.915

TOMADOR:	Ana Milé Barrientos Aguirre, C.C. 1.128.401.915		
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. - NIT. 860.009.578-6		
ASEGURADO(S):	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS NIT. 890.983.922-2		
BENEFICIARIOS:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS		
N° DE PÓLIZA:	65-44-101217497		
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MES/AAAA)	VIGENCIA (DD/MES/AAAA)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$4.479.960,00 (20% del valor total del contrato)	Vigencia 07/12/2022	Hasta 07/07/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$2.239.980,00 (10% del valor total del contrato)	Vigencia 07/12/2022	Hasta 07/01/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$4.479.960,00 (20% del valor total del contrato)	Vigencia 07/12/2022	Hasta 07/04/2023
N° DE PÓLIZA:	65-40-101068456		
GARANTÍAS OTORGADAS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MES/AAAA)	VIGENCIA (DD/MES/AAAA)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$200.000.000,00 (200 SMMLV)	Vigencia 02/12/2022	Hasta 07/01/2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.		

El contratista de obra deberá actualizar las garantías con la fecha del acta de inicio, documento suscrito el pasado 09 de diciembre de 2022.

11. Evidencias fotográficas










Reposición de bases de 6x15 metros, refuerzo de estructura central y reparación de postes y refuerzos de soldaduras.







Instalación de estabilizadores nuevos en 5/8" con tuerca de 15cm de largo.

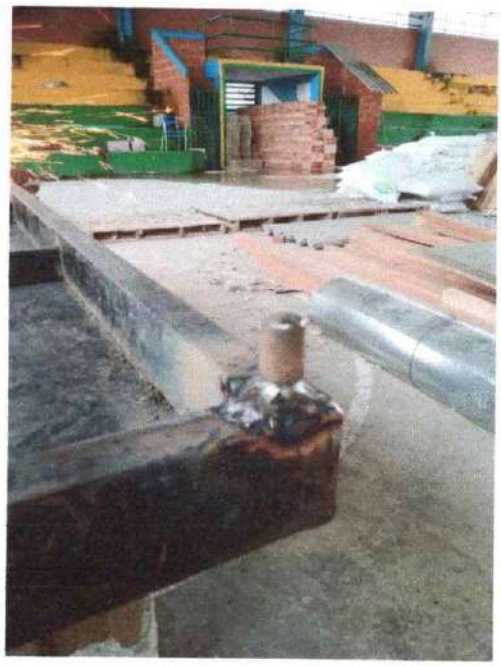







Soldadura de arandelas, pines y bujes de la plataforma y estructura. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.













Pintura de tarima en poliuretano catalizado (estructura metálica de la tarima reparada y terminada en su totalidad).





Reconstrucción de cercha principal correspondiente a la estructura de soporte de la lona. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

	
Suministro de tornillo rosca fina 3/8 x 3" con doble tuerca y arandela.	Suministro de tornillo rosca fina 1 1/4" con doble tuerca y arandela.
	
Suministro de tornillo rosca fina 1 1/2" con doble tuerca y arandela.	Suministro de tuerca 3/8" tipo mariposa.

El contrato fue ejecutado en un 90,64%, teniendo en cuenta que mediante el Acta de Cambio y/o Ajuste de ítems y Cantidades N°01, del pasado 20 de diciembre, la entidad tomó la decisión de ejecutar el suministro correspondiente al ítem de pago 5 *"Reparación de lona: Incluye parches, refuerzos, cambio de anillos en mal estado y limpieza. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento"*, ya que realizará la compra de una lona nueva durante la vigencia 2023.

La intervención de la tarima fue recibida a satisfacción por parte de la supervisión del contrato y la reparación y adecuación de la estructura culminó de manera satisfactoria.

La Dirección de Obras Públicas, dependencia que ejerce la supervisión del contrato, autorizó a su vez, la compra de la tornillería y la elaboración de dos cerchas que se encontraban en malas condiciones, a las cuales no era posible adecuar por la fatia que presentaban sus elementos.

MARIA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Públicas

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Ing. Esteban Chavarría Toro Apoyo a la Dirección de Obras Públicas		22-Dic-2022
Revisó	María Fernanda Avendaño Sierra Directora de Obras Públicas		22-Dic-2022
Aprobó	María Fernanda Avendaño Sierra Directora de Obras Públicas		22-Dic-2022

Nº TRD: 800-16

ARUS®
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-13, 10:32:40 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 59932884

Periodo Cotización: diciembre de 2022 Periodo Servicio: diciembre de 2022

PAGADO 13/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE		
Documento	CC1128401915	Dirección	CR 51 #47 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3113871791
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SAN PEDRO	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
1 Identificación	2 Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128401915	ANA MILE BARRIENTOS AGUIRRE	57	00																	0	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,523	$ 1.000.000	$ 5.300	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA
