CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA

	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
0		**Cronograma de Obra - Avenida Centenario LOTE 2**	
1	1	**CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO - LOTE 2**	**36 MESES**
2	*1.1*	***ACTA DE INICIO***	***HITO***
3	1.2	**PRECONSTRUCCIÓN**	**6 MESES**
4	1.3	**CONSTRUCCIÓN**	**28 MESES**
5	*1.3.1*	***Inicio de Obra***	***Hito***
6	1.3.2	**OBRAS PREVIAS**	**7 meses**
7	1.3.3	**CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 55 HASTA CARRERA 68D**	**19 meses**
8	1.3.3.1	**ETAPA 1 CALZADA NORTE**	**6½ meses**
9	1.3.3.1.1	CONSTRUCCION REDES SECAS	4 meses
10	1.3.3.1.2	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3½ meses
11	1.3.3.1.3	ESPACIO PÚBLICO	5½ meses
12	1.3.3.1.4	CONSTRUCCIÓN VÍAS	3½ meses
13	1.3.3.1.5	SEÑALIZACIÓN	1 mes
14	*1.3.3.1.6*	*FIN ETAPA 1*	*Hito*
15	1.3.3.2	**ETAPA 2 CALZADA SUR**	**6½ meses**
16	1.3.3.2.1	CONSTRUCCION REDES SECAS	4 meses
17	1.3.3.2.2	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3½ meses
18	1.3.3.2.3	ESPACIO PÚBLICO	5½ meses
19	1.3.3.2.4	CONSTRUCCIÓN VÍAS	4 meses
20	1.3.3.2.5	SEÑALIZACIÓN	1 mes
21	*1.3.3.2.6*	*FIN ETAPA 2*	*Hito*
22	1.3.3.3	**ETAPA 3 CALZADA CENTRAL - CORREDOR BRT**	**11 meses**
23	1.3.3.3.1	ESPACIO PÚBLICO	3½ meses
24	1.3.3.3.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	4 meses
25	1.3.3.3.3	**ESTACIONES BRT**	**8 meses**
26	1.3.3.3.3.1	ESTACIÓN CAR. 55	5½ meses
27	1.3.3.3.3.2	ESTACIÓN CAR. 65	5½ meses
28	1.3.3.3.3.3	ESTACIÓN CAR. 68	7 meses
29	1.3.3.3.4	**PUENTES PEATONALES**	**10½ meses**
30	1.3.3.3.4.1	PUENTE ESTACIÓN CAR. 55	4½ meses
31	1.3.3.3.4.2	PUENTE ESTACIÓN CAR. 65	7½ meses
32	1.3.3.3.4.3	PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 ORIENTAL	7½ meses
33	1.3.3.3.4.4	PUENTE ESTACIÓN CAR. 68 OCCIDENTE	7½ meses
34	1.3.3.3.4.5	PUENTE PEATONAL CRUCE AV. 68	6½ meses
35	1.3.3.3.4.6	RAMPA PEATONAL ACCESO OCCIDENTE ESTACION CARRERA 69	3 meses
36	1.3.3.3.5	SEÑALIZACIÓN	2½ meses
37	*1.3.3.3.6*	*FIN ETAPA 3*	*Hito*
38	*1.3.3.4*	*FIN CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 55 HASTA CARRERA 68D*	*Hito*
39	1.3.4	**CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 68D HASTA CARRERA 69B**	**15 meses**
40	1.3.4.1	**ETAPA 1 CALZADA NORTE**	**4 meses**
41	1.3.4.1.1	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	4 meses
42	1.3.4.1.2	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	1½ meses
43	1.3.4.1.3	ESPACIO PÚBLICO	2½ meses
44	1.3.4.1.4	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
45	1.3.4.1.5	SEÑALIZACIÓN	½ mes
46	*1.3.4.1.6*	*FIN ETAPA 1 CN*	*Hito*
47	1.3.4.2	**ETAPA 2 CALZADA SUR**	**5 meses**
48	1.3.4.2.1	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	3 meses
49	1.3.4.2.2	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	3 meses
50	1.3.4.2.3	ESPACIO PÚBLICO	2 meses
51	1.3.4.2.4	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
52	1.3.4.2.5	SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN	½ mes
53	*1.3.4.2.6*	*FIN ETAPA 2 CS*	*Hito*
54	1.3.4.3	**ETAPA 3 CALZADA CENTRAL - CORREDOR BRT**	**8½ meses**
55	1.3.4.3.1	ESPACIO PÚBLICO	3½ meses
56	1.3.4.3.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	3 meses
57	1.3.4.3.3	ESTACIONES BRT Cra.69	5½ meses
58	1.3.4.3.4	PUENTE PEATONAL Cra.69	6 meses
59	1.3.4.3.5	SEÑALIZACIÓN	½ mes
60	*1.3.4.3.6*	*FIN ETAPA 3 CC*	*Hito*
61	*1.3.4.4*	*FIN CORREDOR VIAL DESDE CARRERA 68D HASTA CARRERA 69B*	*Hito*
62	1.3.5	**CORREDOR VIAL DESDE LA CARRERA 68B HASTA LA CARRERA 69F**	**7½ meses**
63	1.3.5.1	**ETAPA 1 CALZADA SUR**	**3 meses**
64	1.3.5.1.1	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	2 meses
65	1.3.5.1.2	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	1½ meses
66	1.3.5.1.3	ESPACIO PÚBLICO	1½ meses
67	1.3.5.1.4	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
68	1.3.5.1.5	SEÑALIZACIÓN	½ mes
69	*1.3.5.1.6*	*FIN ETAPA 1 CS*	*Hito*
70	1.3.5.2	**ETAPA 2 CALZADA NORTE**	**4 meses**
71	1.3.5.2.1	CONSTRUCCIÓN REDES SECAS	2 meses
72	1.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN REDES HÚMEDAS	1½ meses
73	1.3.5.2.3	ESPACIO PÚBLICO	2½ meses
74	1.3.5.2.4	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
75	1.3.5.2.5	SEÑALIZACIÓN	½ mes
76	*1.3.5.2.6*	*FIN ETAPA 2 CN*	*Hito*
77	1.3.5.3	**ETAPA 3 CALZADA CENTRAL - CORREDOR BRT**	**2 meses**
78	1.3.5.3.1	ESPACIO PÚBLICO	2 meses
79	1.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS	1½ meses
80	1.3.5.3.3	SEÑALIZACIÓN	½ mes
81	*1.3.5.3.4*	*FIN ETAPA CENTRAL CC BRT*	*Hito*
82	*1.3.5.4*	*FIN CORREDOR VIAL DESDE LA CARRERA 69B HASTA LA CARRERA 69F*	*Hito*
83	1.3.6	**INTERSECCIÓN CARRERA 68**	**24½ meses**
84	1.3.6.1	OBRAS PREVIAS	5 meses
85	1.3.6.2	**FASE 1 - COSTADO NORTE (A NIVEL)**	**2½ meses**
86	1.3.6.2.1	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
87	1.3.6.3	**FASE 2 - COSTADO NORTE (A DESNIVEL)**	**7 meses**
88	1.3.6.3.1	SUBESTRUCTURAS	3½ meses
89	1.3.6.3.2	SUPERESTRUCTURA	4½ meses
90	1.3.6.3.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 meses
91	1.3.6.4	**FASE 3 - COSTADO SUR (A NIVEL Y DESNIVEL)**	**10½ meses**
92	1.3.6.4.1	REDES SECAS	3½ meses
93	1.3.6.4.2	REDES HÚMEDAS	3½ meses
94	1.3.6.4.3	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
95	1.3.6.4.4	**PUENTE COSTADO SUR**	**8½ meses**
96	1.3.6.4.4.1	SUBESTRUCTURAS	3½ meses
97	1.3.6.4.4.2	SUPERESTRUCTURA	2½ meses
98	1.3.6.4.4.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3½ meses
99	1.3.6.5	**FASE 4 - PUENTE CALZADA CENTRAL**	**7½ meses**
100	1.3.6.5.1	DEMOLICIÓN PUENTE EXISTENTE	3 meses
101	1.3.6.5.2	SUBESTRUCTURAS	3½ meses
102	1.3.6.5.3	SUPERESTRUCTURA	3 meses
103	1.3.6.5.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3½ meses
104	1.3.6.6	SEÑALIZACIÓN	1½ meses
105	*1.3.6.7*	*FIN INTERSECCIÓN CRA.68*	*Hito*
106	1.3.7	**PASO ELEVADO AV. CONSTITUCIÓN**	**17½ meses**
107	1.3.7.1	OBRAS PRELIMINARES	8 meses
108	1.3.7.2	**PASO ELEVADO AV. CONSTITUCIÓN - COSTADO OCCIDENTAL**	**9½ meses**
109	1.3.7.2.1	REDES SECAS	2½ meses
110	1.3.7.2.2	REDES HÚMEDAS	2½ meses
111	1.3.7.2.3	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2 meses
112	1.3.7.2.4	**PUENTE**	**7½ meses**
113	1.3.7.2.4.1	SUBESTRUCTURAS	4 meses
114	1.3.7.2.4.2	SUPERESTRUCTURA	4½ meses
115	1.3.7.2.4.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2½ meses
116	1.3.7.3	**PASO ELEVADO AV. CONSTITUCIÓN - COSTADO ORIENTAL**	**7½ meses**
117	1.3.7.3.1	REDES SECAS	2 meses
118	1.3.7.3.2	REDES HÚMEDAS	2 meses
119	1.3.7.3.3	CONSTRUCCIÓN VÍAS	2½ meses
120	1.3.7.3.4	**PUENTE**	**6½ meses**
121	1.3.7.3.4.1	SUBESTRUCTURAS	3½ meses
122	1.3.7.3.4.2	SUPERESTRUCTURA	3 meses
123	1.3.7.3.4.3	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3 meses
124	1.3.7.4	**PASO A NIVEL AV. CENTENARIO**	**3 meses**
125	1.3.7.4.1	CALZADA NORTE	4 sem
126	1.3.7.4.2	CALZADA SUR	4 sem
127	1.3.7.4.3	CALZADA CENTRAL	4 sem
128	1.3.7.5	SEÑALIZACIÓN	5 sem
129	*1.3.7.6*	*FIN INTERSECCIÓN AV. CONSTITUCIÓN*	*Hito*
130	*1.3.8*	***Fin Construcción***	***Hito***
131	1.4	**RECIBO DE OBRA**	**2 MESES**
132	1.5	**COMPONENTES DE GESTIÓN**	**34 MESES**
133	1.5.1	Gestión Social	34 meses
134	1.5.2	Gestión Ambiental	34 meses
135	1.5.3	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	34 meses
136	1.5.4	Gestión Tránsito	34 meses
137	*1.5.5*	*Fin de Componentes*	*Hito*
138	*1.6*	***FIN DEL CONTRATO***	***HITO***

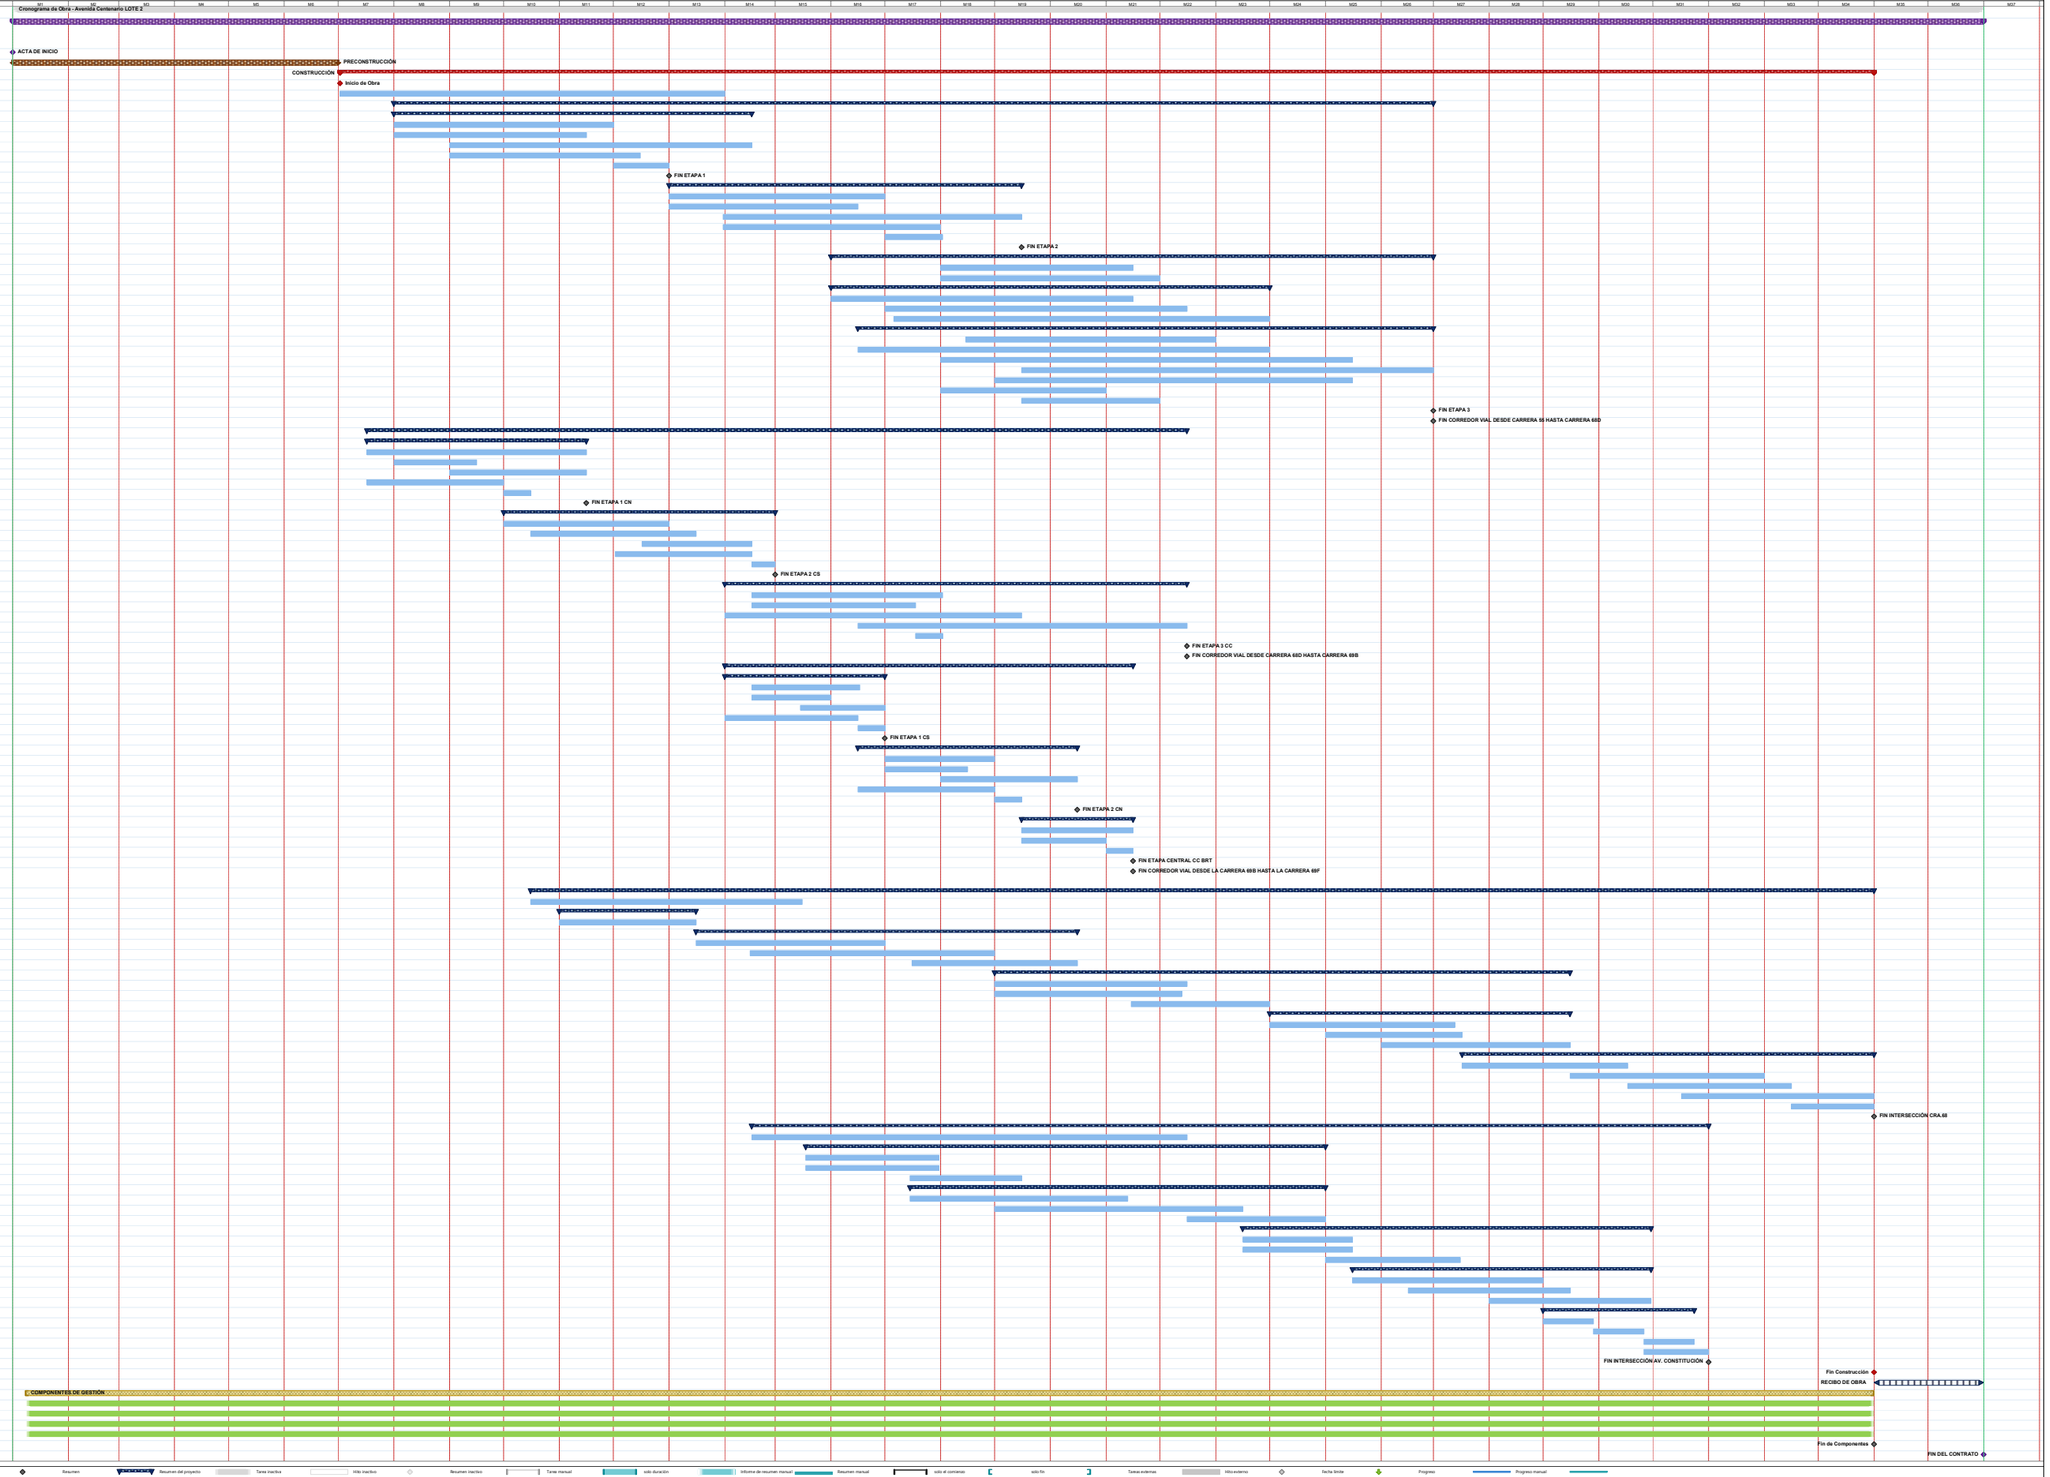

Proyecto: Cronograma de Obra - Avenida Centena
Plazo: 36 MESES

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
