REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



POTRERITOS :7002757 Comité técnico semanal de obra No. 24.



GRAN BRITALIA 8007714: Comité técnico semanal de obra No. 25



REMANSO I. 7002819 Verificación de área para la recuperación espacio publico.



REMANSO I. 7002819 Recuperación espacio publico.



Reunión JAL



REMANSO I. 5008433 Acompañamiento EAAB

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I. 7002589. Instalación bordillos A-80



REMANSO I 7002710. Instalación bordillos A-80



REMANSO I 7002710. Instalación acometidas red acueducto



REMANSO I 7002710. Instalación cajillas y medidores red acueducto



REMANSO I 7002819. Demolición andenes existentes



REMANSO I 7002589. Instalación tubería 6" RDE 21 red acueducto.

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I 7002710. Revisión por parte de la interventoría y EAAB, a empates red acueducto.



REMANSO I 7002589. Empates red acueducto.



REMANSO I 7002819. Excavación, espacio publico



REMANSO I 7002819. Excavación, espacio publico



REMANSO I 7002589. Compactación subrasante, espacio publico.



REMANSO I 7002589. Instalación geotextil, espacio publico.

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



REMANSO I 7002589. Conformación subbase granular reciclada clase B, espacio publico.



REMANSO I 7002819. Conformación subbase granular reciclada clase B, espacio publico.



REMANSO I 7002710. Compactación subbase granular reciclade clase B, espacio publico.



REMANSO I 7002710. Verificación por parte de la interventoría calidad de cargues para pozos red sanitaria



POTRERITOS: 7002858: Construcción cajas de inspección



POTRERITOS: 7002858: Instalación de cajillas y medidores red acueducto

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



POTRERITOS 7002801. Instalación bordillos A-80



POTRERITOS: 7002858: Instalación de bordillos A-80



ISLANDIA 7004385. Excavación e instalación de tubería red sanitaria



ISLANDIA 7004385. Compactación B200 lleno zanja tubería red sanitaria



ISLANDIA 7004370. Mejoramiento de subrasante con piedra rajón e instalación de subbase




ISLANDIA 7004389. Geotextil en calzada e instalación subbase granular B reciclada

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA 7004385. Excavación manual espacio publico

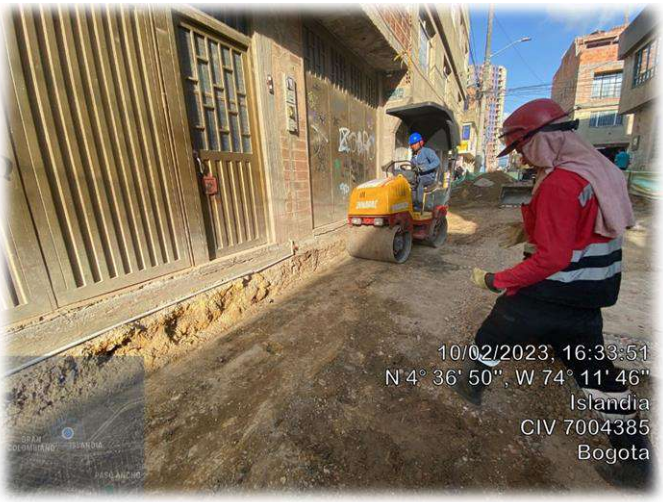

ISLANDIA 7004385. Compactación subrasante espacio publico.



ISLANDIA 7004379: Densidades lleno zanja red sanitaria



ISLANDIA 7004385: Excavación subrasante



ISLANDIA 700438: Mejoramiento subrasante con piedra rajón



ISLANDIA 7004385: Compactación sello piedra rajón

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA 7004385: Instalación de geotextil subbase reciclada en el espacio publico



ISLANDIA 7004385: Compactación subbase reciclada en el espacio publico



ISLANDIA 7004385: Céreo subbase reciclada en el espacio publico



ISLANDIA 7004379: Construcción cajas de inspección



ISLANDIA 7004396: Construcción cajas de inspección, instalación de cajillas y medidores red acueducto.



ISLANDIA 7004389: Construcción cajas de inspección, instalación de cajillas y medidores red acueducto.


REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA 7004401: Construcción espacio publico.



ISLANDIA 7004394: Construcción espacio publico.

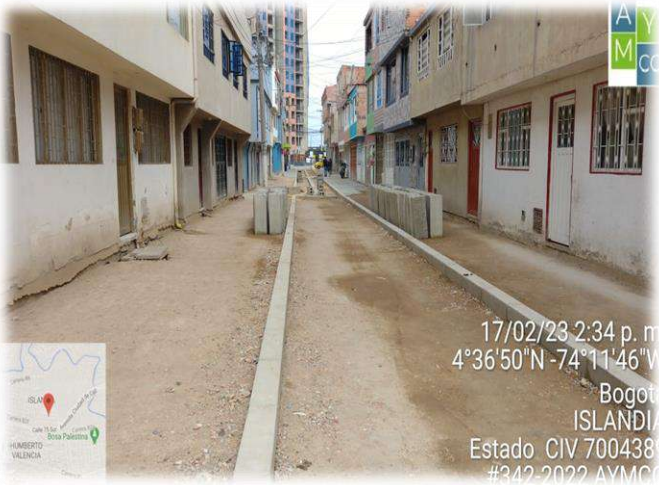

ISLANDIA 7004389: Construcción espacio publico y calzada.



ISLANDIA 7004385: Compactación subbase granular calzada.



ISLANDIA 7004379: Instalación de bordillos A-80.



ISLANDIA 7004370: Instalación de bordillos A-80.

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA 7004371: Instalación de bordillos A-80.



ISLANDIA 7004364: Instalación de bordillos A-80.



ISLANDIA 7004382: Instalación de bordillos A-80, compactación subbase granular B reciclada



ISLANDIA 7004396: Instalación de bordillos A-80.



ISLANDIA 7004408: Instalación de bordillos A-80, compactación subbase granular B reciclada



ISLANDIA 7004416: Instalación de bordillos A-80.

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



ISLANDIA 7004396: Chequeo de niveles de la subbase por parte de la interventoría



ISLANDIA 7004408: Chequeo de niveles de la subbase por parte de la interventoría



SAN DIEGO 7004134: Instalación de cajillas y registros red acueducto



SAN DIEGO 7004134: Compactación base granular B



SAN DIEGO 7004134: Verificación niveles base granular



SAN DIEGO 7004134: Verificación niveles subbase granular

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



SAN DIEGO 7004134: Instalación refuerzo con malla para construcción anden



SAN DIEGO 7004134: Toma de cilindros concreto 3000 PSI



SAN DIEGO 7004134: Prueba asentamiento concreto 3000 PSI



SAN DIEGO 7004134: Toma temperatura de concreto



SAN DIEGO 7004134: Vaciado concreto 3000 PSI para andenes



SAN DIEGO 7004134: Vaciado concreto 3000 PSI para andenes

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



SAN DIEGO 7004134: Vaciado concreto 3000 PSI para andenes




SAN DIEGO 7004134: Vaciado concreto 3000 PSI para andenes



SAN DIEGO 7004134: Vaciado concreto 3000 PSI para andenes



SAN DIEGO 7004134: Construcción andenes en concreto 3000 PSI

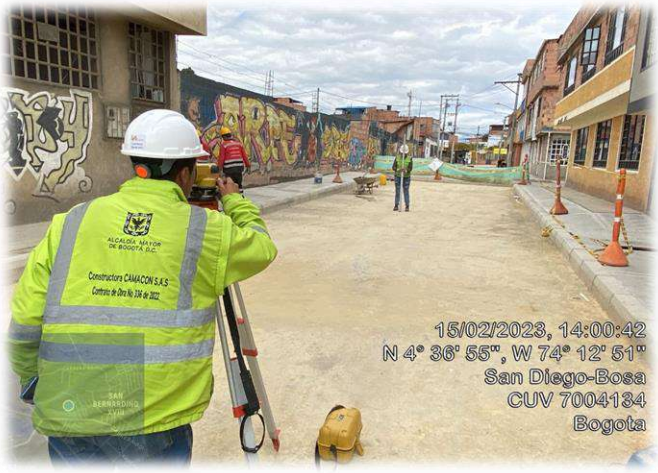

SAN DIEGO 7004134: Chequeo cotas rasante, antes de la instalación MDC



SAN DIEGO 7004134: Verificación densidades, antes de la instalación MDC


REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



SAN DIEGO 7004134: Toma de muestras para ensayos de las MDC



SAN DIEGO 7004134: Chequeo temperaturas MDC

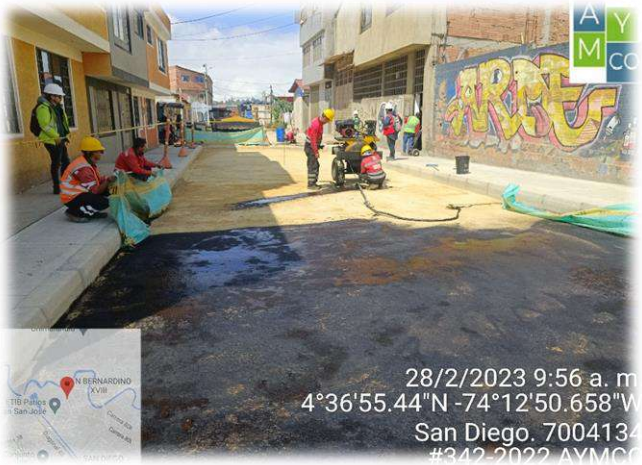

SAN DIEGO 7004134: Imprimación



SAN DIEGO 7004134: Imprimación



SAN DIEGO 7004134: Instalación y compactación MDC-20



SAN DIEGO 7004134: Instalación MDC+GCR

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



SAN DIEGO 7004134: Instalación y compactación MDC+GCR



SAN DIEGO 7004134: Instalación MDC+GCR



SAN DIEGO 7004134: Instalación y compactación MDC



SAN DIEGO 7004134: Instalación y compactación MDC



GRAN BRITALIA 8007764: Implementación PMT



GRAN BRITALIA 8007714: Implementación PMT

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA 8007714: Excavación remplazo tubería red sanitaria



GRAN BRITALIA 8007714: Instalación tubería red sanitaria



GRAN BRITALIA 8007714: Instalación atraque tubería red sanitaria con triturado 3/4"



GRAN BRITALIA 8007714: Instalación lleno tubería red sanitaria con subbase granular B200



GRAN BRITALIA 8007666: Excavación para estructura de pavimento



GRAN BRITALIA 8007666: Excavación para estructura de pavimento

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS



GRAN BRITALIA 8007666: Chequeo por parte de la interventoría a niveles de subrasante



GRAN BRITALIA 8007666: Compactación de la subrasante



GRAN BRITALIA 8007666: Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón



GRAN BRITALIA 8007666: Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón



GRAN BRITALIA 8007714: Excavación manual espacio publico



GRAN BRITALIA 8007714: Excavación manual espacio publico
