CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**

CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630,3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD**	M3


LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
MURO CABEZAL		2.00		2.15	0.30	1.29	1.29	
MURO LATERAL		1.82		1.85	0.30	1.01	1.01	
MURO LATERAL		1.82		1.85	0.30	1.01	1.01	
MUROPANTALLA ATRÀS		2.00		2.15	0.30	1.29	1.29	
PLACA	K11+510	2.00		1.82	0.30	1.09	1.09	
MURO CABEZAL		2.03		2.00	0.30	1.22	1.22	
MURO LATERAL		1.82		1.70	0.30	0.93	0.93	
MURO LATERAL		1.82		1.70	0.30	0.93	0.93	
PLACA		2.03		0.82	0.30	0.50	0.50	
CABEZOTE ENCOLE		1.96		2.62	0.30	1.54	1.54	
ALETA 1 ENCOLE		1.92		2.15	0.30	1.24	1.24	
ALETA 2 ENCOLE		2.04		2.15	0.30	1.32	1.32	
SOLERA ENCOLE	K11+605	3.68		1.60	0.30	1.77	1.77	
CABEZOTE DESCOLE		1.63		2.86	0.30	1.40	1.40	
ALETA 1 DESCOLE		2.22		2.41	0.30	1.61	1.61	
ALETA 2 DESCOLE		2.20		2.41	0.30	1.59	1.59	
CABEZOTE ENCOLE		4.20		1.80	0.30	2.27	2.27	
MURO CABEZAL		2.00		1.85	0.30	1.11	1.11	
MURO TRASERO		2.00		1.90	0.30	1.14	1.14	
MURO LATERAL	K12+035	1.22		1.60	0.30	0.59	0.59	
MURO LATERAL		1.22		1.60	0.30	0.59	0.59	
PISO CAJA		2.00		1.82	0.30	1.09	1.09	
MURO BOX COULVERT		5.55		3.30	0.40	7.33	7.33	
VIGA BOX COULVERT	K12+095	5.60		0.40	1.30	2.91	2.91	
LOSA INFERIOR BOX COULVERT		3.00		1.00	1.82	5.46	5.46	
MURO CABEZAL		1.82		2.62	0.30	1.43	1.43	
MURO TRASERO		1.82		2.62	0.30	1.43	1.43	
MURO LATERAL	K12+150	1.41		2.30	0.30	0.97	0.97	
MURO LATERAL		1.41		2.30	0.30	0.97	0.97	
PISO CAJA		1.82		2.00	0.30	1.09	1.09	
MURO CABEZAL		2.00		2.15	0.30	1.29	1.29	
MURO TRASERO		2.00		2.20	0.30	1.32	1.32	
MURO LATERAL	K12+256	1.20		1.75	0.30	0.63	0.63	
MURO LATERAL		1.20		1.75	0.30	0.63	0.63	
PISO CAJA		2.00		1.82	0.30	1.09	1.09	
MURO CABEZAL		4.70		2.50	0.30	3.53	3.53	
MURO TRASERO		3.89		1.80	0.30	2.10	2.10	
MURO LATERAL		1.68		2.50	0.30	1.26	1.26	
ALETA	K15+940	2.30		1.25	0.30	0.86	0.86	
SOLERA		1.70		0.26	1.80	0.80	0.80	



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ING FELIPE LOMBO
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB	ACTA No. 8	
ITEM DE PAGO 630,3	CAP 5 - DRENAJES	DESCRIPCION	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C
UNIDAD	M3		

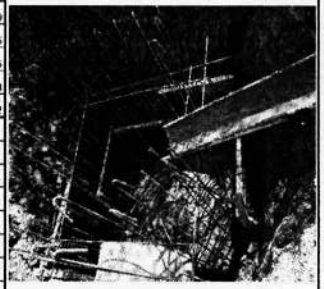
LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
SOLERA		1.30		0.26	1.90	0.64	0.64	
PISO CAJA		4.70		2.26	0.30	3.19	3.19	
MURO CABEZAL	K16+030	1.82		2.74	0.30	1.50	1.50	
ALETA		1.82		2.74	0.3	1.49604	1.49604	
ALETA		1.4		2.45	0.3	1.029	1.029	
SOLERA		1.4		2.45	0.3	1.029	1.029	
CUERPO		1.82		2.02	0.3	1.10292	1.10292	
MURO CABEZAL	K16+620	2.12		3.75	0.30	2.39	2.39	
ALETA		5.7		3.15	0.3	5.3865	5.3865	
ALETA		3.7		3.15	0.3	3.4965	3.4965	
SOLERA		8.6		3.5	0.3	9.03	9.03	
CUERPO		11.1			1.82	20.202	20.202	
CABEZOTE DESCOLE	K16+575	2.20		2.30	0.30	1.52	1.52	
ALETA 1 DESCOLE		1.90		1.90	0.30	1.08	1.08	
ALETA 2 DESCOLE		1.80		1.90	0.30	1.03	1.03	
SOLERA DESCOLE		3.60		1.40	0.30	1.51	1.51	
MURO CABEZAL DESCOLE		2.02		2.55	0.30	1.55	1.55	
MURO TRASERO ENCOLE		2.02		2.60	0.30	1.58	1.58	
MURO LATERAL ENCOLE		1.22		2.25	0.30	0.82	0.82	
MURO LATERAL ENCOLE		1.22		2.25	0.30	0.82	0.82	
PISO CAJA ENCOLE		2.02		1.84	0.30	1.12	1.12	
CABEZOTE DESCOLE	K16+635	1.55		2.00	0.30	0.93	0.93	
ALETA 1 DESCOLE		2.00		1.80	0.30	1.08	1.08	
ALETA 2 DESCOLE		2.20		1.85	0.30	1.22	1.22	
SOLERA DESCOLE		4.00		1.55	0.30	1.86	1.86	
MURO CABEZAL DESCOLE		2.00		2.40	0.30	1.44	1.44	
MURO TRASERO ENCOLE		2.00		2.36	0.30	1.42	1.42	
MURO LATERAL ENCOLE		1.20		2.10	0.30	0.76	0.76	
MURO LATERAL ENCOLE		1.20		2.10	0.30	0.76	0.76	
PISO CAJA ENCOLE		2.00		1.80	0.30	1.08	1.08	
CABEZOTE DESCOLE	K16+765	1.20		2.40	0.30	0.86	0.86	
ALETA 1 DESCOLE		2.20		2.01	0.30	1.33	1.33	
ALETA 2 DESCOLE		2.10		2.05	0.30	1.29	1.29	
SOLERA DESCOLE		3.50		1.50	0.30	1.58	1.58	
MURO CABEZAL DESCOLE		1.81		2.00	0.30	1.09	1.09	
MURO TRASERO ENCOLE		2.00		2.00	0.30	1.20	1.20	
MURO LATERAL ENCOLE		1.40		1.70	0.30	0.71	0.71	
MURO LATERAL ENCOLE		1.40		1.70	0.30	0.71	0.71	
PISO CAJA ENCOLE		1.81		2.00	0.30	1.09	1.09	
CABEZOTE DESCOLE		1.52		2.85	0.30	1.30	1.30	
ALETA 1 DESCOLE		2.15		2.40	0.30	1.55	1.55	

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES	DESCRIPCION	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETA 2 DESCOLE	K22+225	2.05		2.40	0.30	1.48	1.48	
SOLERA DESCOLE		1.67		3.40	0.30	1.70	1.70	
MURO CABEZAL DESCOLE		2.10		2.45	0.30	1.54	1.54	
MURO TRASERO ENCOLE		2.10		2.45	0.30	1.54	1.54	
MURO LATERAL ENCOLE		1.25		2.15	0.30	0.81	0.81	
MURO LATERAL ENCOLE		1.25		2.15	0.30	0.81	0.81	
PISO CAJA ENCOLE		2.10		1.85	0.30	1.17	1.17	
CABEZOTE DESCOLE	K22+275	1.75		2.90	0.30	1.52	1.52	
ALETA 1 DESCOLE		2.15		2.50	0.30	1.61	1.61	
ALETA 2 DESCOLE		1.9		2.50	0.30	1.43	1.43	
SOLERA DESCOLE		4.95		1.36	0.30	1.90	1.90	
MURO CABEZAL DESCOLE		2.08		2.50	0.30	1.56	1.56	
MURO TRASERO ENCOLE		2.08		2.50	0.30	1.56	1.56	
MURO LATERAL ENCOLE		1.25		2.20	0.30	0.83	0.83	
MURO LATERAL ENCOLE		1.25		2.20	0.30	0.83	0.83	
PISO CAJA ENCOLE		2.1		1.90	0.30	1.20	1.20	
CABEZOTE DESCOLE	K22+395	1.76		2.64	0,30	1.39	1.39	
ALETA 1 DESCOLE		2		2.30	0,30	1.38	1.38	
ALETA 2 DESCOLE		2		2.30	0,30	1.38	1.38	
SOLERA DESCOLE		3.91		1.40	0,30	1.64	1.64	
MURO CABEZAL DESCOLE		1.95		2.30	0,30	1.35	1.35	
MURO TRASERO ENCOLE		1.95		2.00	0,30	1.17	1.17	
MURO LATERAL ENCOLE		1.2		2.00	0,30	0.72	0.72	
MURO LATERAL ENCOLE		1.2		2.00	0,30	0.72	0.72	
PISO CAJA ENCOLE		1.95		1.83	0,30	1.07	1.07	
CABEZOTE DESCOLE	K22+455	1.68		2.76	0.30	1.39	1.39	
ALETA 1 DESCOLE		1.8		2.3	0.3	1.242	1.242	
ALETA 2 DESCOLE		2		2.3	0.3	1.38	1.38	
SOLERA DESCOLE		3.15		2.1	0.3	1.9845	1.9845	
MURO CABEZAL DESCOLE		2		2.4	0.3	1.44	1.44	
MURO TRASERO ENCOLE		2		3.05	0.3	1.83	1.83	
MURO LATERAL ENCOLE		1.22		2.1	0.3	0.7686	0.7686	
MURO LATERAL ENCOLE		1.22		2.1	0.3	0.7686	0.7686	
PISO CAJA ENCOLE		2		1.82	0.3	1.092	1.092	
MURO CABEZAL	K22+545	2.05		2.45	0.3	1.51	1.51	
MURO TRASERO		2.05		2.7	0.3	1.66	1.66	
MURO LATERAL		1.22		2.15	0.3	0.79	0.79	
MURO LATERAL		1.22		2.15	0.3	0.79	0.79	
PISO CAJA		1.82		2.05	0.3	1.12	1.12	
MURO CORTINA		4.85		2.2	0.4	4.27	4.27	
VIGA		4.85		2.3	0.26	2.90	2.90	

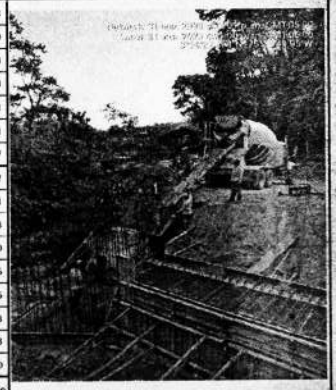



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION** 35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
MURO CABEZAL	K22+667	2.05		2.4	0.3	1.48	1.48	
MURO TRASERO		2.05		2.86	0.3	1.76	1.76	
MURO LATERAL		1.22		2.1	0.3	0.77	0.77	
MURO LATERAL		1.22		2.1	0.3	0.77	0.77	
PISO CAJA		1.85		2.05	0.26	0.99	0.99	
MURO CABEZAL	K22+799	2.05		2.6	0.3	1.599	1.599	
MURO TRASERO		2.05		3	0.3	1.845	1.845	
MURO LATERAL		1.25		2.35	0.3	0.88125	0.88125	
MURO LATERAL		1.25		2.35	0.3	0.88125	0.88125	
PISO CAJA		1.85		2.05	0.30	1.14	1.14	
MURO CABEZAL	K22+901	1.15		2.65	0.30	0.91	0.91	
ALETA		2.28		2.25	0.30	1.54	1.54	
ALETA		4.68		2.25	0.30	3.16	3.16	
SOLERA		6.20		1.60	0.30	2.98	2.98	
MUO PANTALLA		5.40		0.60	0.30	0.97	0.97	
LATERALES DISIPADOR		14.40		0.56	0.15	1.21	1.21	
PISO DISIPADOR		2.4		0.25	0.15	0.09	0.09	
CONTRAHUELLA DISIPADOR		7.2		0.15	1	1.08	1.08	
MURO CORTINA	K23+140	3.30		2.25	0.30	2.23	2.23	
VIGA		3.30		2.30	0.30	2.28	2.28	
MURO CABEZAL		1.62		1.82	0.3	0.88	0.88	
ALETA		2.1		2.3	0.3	1.45	1.449	
ALETA		2.1		2.3	0.3	1.45	1.449	
SOLERA		3.8		1.6	0.3	1.82	1.824	
MURO CABEZAL	K23+520	1.80		2.44	0.30	1.32	1.32	
VIGA		-		-	-	-	-	
ALETA		2.10		2.30	0.30	1.45	1.45	
ALETA		2.10		2.10	0.30	1.32	1.32	
SOLERA		4.45		1.50	0.30	2.00	2.00	
MUO PANTALLA		4.45		0.90	0.30	1.20	1.20	
MURO CABEZAL		1.80		2.70	0.30	1.46	1.46	
ALETA		1.95		2.25	0.30	1.32	1.32	
ALETA		2.00		2.30	0.30	1.38	1.38	
SOLERA		3.95		1.50	0.26	1.54	1.54	
MURO CABEZAL	ALCANTARILLA K23+575	1.45		2.40	0.30	1.04	1.04	
VIGA		-		-	-	-	-	
ALETA		2.22		1.95	0.30	1.30	1.30	
ALETA		2.42		1.95	0.30	1.42	1.42	
SOLERA		4.62		1.20	0.30	1.66	1.66	
MUO PANTALLA		4.62		0.90	0.30	1.25	1.25	
MURO CABEZAL		1.54		2.65	0.30	1.22	1.22	





CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETA		2.10		2.25	0.30	1.42	1.42	
ALETA		1.90		2.25	0.30	1.28	1.28	
SOLERA		4.00		1.40	0.30	1.68	1.68	
MURO CABEZAL	BOX COULVERT K23+665	1.40		2.75	0.30	1.16	1.16	
ALETA		2.35		2.30	0.30	1.62	1.62	
ALETA		1.45		2.30	0.30	1.00	1.00	
SOLERA		4.85		1.56	0.30	2.27	2.27	
MURO CABEZAL		1.45		2.85	0.30	1.24	1.24	
ALETA		2.40		2.40	0.30	1.73	1.73	
ALETA		2.40		2.40	0.30	1.73	1.73	
SOLERA		3.55		1.80	0.30	1.92	1.92	
CUERPO BOX COULVERT		10.00		1.82		18.20	18.20	
MURO CABEZAL	BOX COULVERT K23+735	1.70		3.05	0.30	1.56	1.56	
ALETA		3.30		2.70	0.30	2.67	2.67	
ALETA		2.50		2.65	0.30	1.99	1.99	
SOLERA		5.10		2.13	0.26	2.82	2.82	
MURO CABEZAL		1.60		3.15	0.30	1.51	1.51	
ALETA		2.96		2.70	0.30	2.40	2.40	
ALETA		2.50		2.70	0.30	2.03	2.03	
SOLERA		4.70		2.15	0.26	2.63	2.63	
CUERPO		10.40			1.82	18.93	18.93	
				MENOS TUBERÍA DE TRAMO 1			- 1.08	
CABEZOTE ALETAS DESCOLE	K39+995 OBRA HIDRAULICA No. 63A	1.80		2.66	0.30	1.25	1.25	
ALETAS LADO IZQUIERDO		2.31	1.96	1.90	0.30	1.22	1.22	
ALETAS LADO DERECHO		2.31	1.96	1.90	0.30	1.22	1.22	
SOLERA ENCOLE		4.56	1.80	1.40	0.30	1.34	1.34	
DENTELLON		4.56		0.25	0.30	0.34	0.34	
MURO LATERAL DERECHO CAJA ENCOLE		2.30		1.22	0.30	0.84	0.84	
MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ENCOLE		2.30		1.22	0.30	0.84	0.84	
MURO TALUD CAJA ENCOLE		2.60		2.01	0.30	1.57	1.57	
MURO CABEZOTE CAJA ENCOLE		2.30		2.01	0.30	1.20	1.20	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE		2.00		1.80	0.30	1.08	1.08	
SECCION BOX COULVERT	K39+883 OBRA HIDRAULICA No. 63	2.00	1.50	5.00		8.75	8.75	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	0.25	0.78		0.39	0.39	
ALETA 1 DESCOLE		1.95	1.88	2.23	0.25	1.00	1.00	
ALETA 2 DESCOLE		1.98	1.88	2.23	0.25	1.02	1.02	
SOLERA DESCOLE		4.50	2.00	1.60	0.25	1.30	1.30	
DENTELLON DESCOLE		4.50	0.25	0.20		0.23	0.23	
SECCION 2 BOX COULVERT		2.00	1.50	5.00		8.75	8.75	
GUARDARRUEDA ENCOLE		2.00	0.25	0.75		0.38	0.38	
ALETA 1 ENCOLE		2.70	2.25	2.40	0.25	1.57	1.57	





CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.
CONTRATO No.	1784 DE 2021
FECHA	ENERO 25 DE 2023
SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL
ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES
DESCRIPCION	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C
UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETA 2 ENCOLE		2.70	2.25	2.21	0.25	1.51	1.51	
SOLERA ENCOLE		5.50	2.00	1.10	0.25	1.03	1.03	
DENTELLON ENCOLE		5.50	0.25	0.20		0.28	0.28	
SECCION BOX COULVERT	K39+516 OBRA HIDRAULICA No. 62	2.00	1.50	7.00		12.25	12.25	
GUARDARRUEDA DESCOLE		2.03	0.25	0.65		0.33	0.33	
ALETAS DESCOLE		2.43	1.90	2.20	0.25	1.25	1.25	
ALETAS 2 DESCOLE		1.86	1.90	2.20	0.25	0.95	0.95	
SOLERA DESCOLE		5.07	2.00	1.60	0.25	1.41	1.41	
DENTELLON DESCOLE		2.43	0.25	0.20		0.12	0.12	
SECCION BOX COULVERT SECCION 2		2.00	1.50	7.00		12.25	12.25	
GUARDARRUEDA ENCOLE		2.00		0.75	0.25	0.38	0.38	
ALETA ENCOLE 1		2.60	1.95	1.65	0.25	1.17	1.17	
ALETA ENCOLE 2		3.60	1.96	1.66	0.25	1.63	1.63	
SOLERA ENCOLE		2.30	5.40	2.00	0.25	2.13	2.13	
DENTELLON ENCOLE		5.40		0.20	0.25	0.27	0.27	
SOLERA DESCOLE	K39+416 OBRA HIDRAULICA No. 61	4.10	2.45	1.45	0.30	1.42	1.42	
DENTELLON DESCOLE		4.10		0.25	0.25	0.26	0.26	
ALETA 1 DESCOLE		1.90	1.50	2.15	0.30	1.10	1.10	
ALETA 2 DESCOLE		1.90	1.23	2.20	0.30	1.03	1.03	
CABEZOTE DESCOLE		2.25		1.85	0.30	0.96	0.96	
SOLERA ENCOLE		5.95	1.82	1.50	0.30	1.75	1.75	
DENTELLON ENCOLE		5.95		0.25	0.25	0.37	0.37	
ALETA 1 ENCOLE		2.40	2.25	2.57	0.30	1.79	1.79	
ALETA 2 ENCOLE		2.40	2.28	2.57	0.30	1.80	1.80	
CABEZOTE ENCOLE		2.85		1.82	0.30	1.27	1.27	
PLACA DE MEJORAMIENTO EN DESCOLE		3.00		1.65	0.25	1.24	1.24	
SECCION BOX COULVERT	K39+206 OBRA HIDRAULICA No. 60	2.00	1.50	8.00		14.00	14.00	
GUARDARRUEDA DESCOLE		2.00	0.25	0.76		0.38	0.38	
ALETA 1 DESCOLE		3.05	1.95	2.17	0.25	1.57	1.57	
ALETA 2 DESCOLE		2.60	1.95	2.17	0.25	1.34	1.34	
SOLERA DESCOLE		6.80	2.00	1.60	0.25	1.76	1.76	
DENTELLON DESCOLE		3.05	0.25	0.20		0.15	0.15	
SECCION BOX COULVERT PARTE 2		2.00	1.50	8.00		14.00	14.00	
GUARDARRUEDA ENCOLE		1.92	0.82	0.25		0.39	0.39	
ALETA 1 ENCOLE		2.41	1.95	1.65	0.25	1.08	1.08	
ALETA 2 ENCOLE		3.00	1.97	1.67	0.25	1.37	1.37	
SOLERA ENCOLE		2.40	5.40	2.00	0.25	2.22	2.22	
DENTELLON ENCOLE		5.40		0.20	0.25	0.27	0.27	
						-	-	
SOLERA ALETAS ENCOLE OH 59		4.80	2.20	2.30	0.30	2.42	2.42	
DENTELLON		4.80		0.25	0.25	0.30	0.30	





CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630,3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETA 1	K39+055 OBRA HIDRAULICA N0. 59	4.80	3.00	2.20	0.30	2.57	2.57	
ALETA 2		3.00	2.60	3.20	0.30	2.69	2.69	
CABEZOTE ALETAS ENCOLE OH 59		3.30	2.00		0.30	1.70	1.70	
CONCRETO MEJORAMIENTO SUELO		10.00	0.164		2.00	3.28	3.28	
SOLERA DESCOLE	K38+943 OBRA HIDRULICA No. 58	2.10	4.60	1.50	0.30	1.51	1.51	
ALETA 1 DESCOLE		2.01	1.38	2.28	0.30	1.16	1.16	
ALETA 2 DESCOLE		2.01	1.55	2.28	0.30	1.22	1.22	
CABEZOTE DESCOLE		2.58		1.74	0.30	1.06	1.06	
SOLERA ENCOLE		4.70	2.00	1.60	0.30	1.61	1.61	
DENTELLON ENCOLE		4.70		0.25	0.25	0.29	0.29	
ALETA 1 ENCOLE		2.25	1.60	1.90	0.30	1.10	1.10	
ALETA 2 ENCOLE		2.25	1.60	1.90	0.30	1.10	1.10	
CABEZOTE ENCOLE		2.60		1.40	0.30	0.81	0.81	
SOLERA DESCOLE	K38+916 OBRA HIDRAULICA No. 57	4.60	2.30	1.30	0.30	1.35	1.35	
ALETA 1 DESCOLE		1.30	0.80	1.94	0.30	0.61	0.61	
ALETA 2 DESCOLE		1.35	0.88	1.94	0.30	0.65	0.65	
CABEZOTE DESCOLE		1.67		1.70	0.30	0.57	0.57	
SOLERA ENCOLE		4.80	2.20	1.60	0.30	1.68	1.68	
DENTELLON ENCOLE		4.80		0.25	0.25	0.30	0.30	
ALETA 1 ENCOLE		2.43	1.93	2.00	0.30	1.31	1.31	
ALETA 2 ENCOLE		2.43	1.85	1.78	0.30	1.14	1.14	
CABEZOTE ENCOLE		2.95		2.14	0.30	1.61	1.61	
DISIPADOR 1		0.75	0.20	0.83		0.25	0.25	
DISIPADOR 2		1.10	0.20	0.53		0.23	0.23	
SOLERA DESCOLE	K38+805 OBRA HIDRAULICA No. 56A	4.40	2.65	1.55	0.30	1.64	1.64	
DENTELLON DESCOLE		4.40		0.25	0.25	0.28	0.28	
ALETA 1 DESCOLE		2.20	1.63	1.62	0.30	0.93	0.93	
ALETA 2 DESCOLE		2.20	1.58	1.95	0.30	1.11	1.11	
CABEZOTE DESCOLE		2.53		2.15	0.30	1.35	1.35	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		1.55	1.42	0.30	1.00	0.66	0.66	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		1.20	1.56	0.30	1.00	0.56	0.56	
MURO TALUD		2.66	2.00	0.30	1.00	1.60	1.60	
MURO CABEZOTE		2.02	1.86	0.30	0.19	0.94	0.94	
LOSA INFERIOR ENCOLE		2.00	1.55	0.30		0.93	0.93	
ZARPA DESCOLE		4.02		1.60	0.35	2.25	2.25	
VASTAGO DESCOLE		4.02		2.16	0.30	2.32	2.32	
DENTELLON DESCOLE		3.90		0.40	0.25	0.39	0.39	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		1.55		1.42	0.30	0.66	0.66	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		1.56		1.20	0.30	0.56	0.56	
MURO TALUD ENCOLE		2.66		2.00	0.30	1.60	1.60	
MURO CABEZOTE		2.02		1.86	0.30	1.13	1.13	







CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
LOSA CAJA ENCOLE	K38+654 OBRA HIDRAULICA No. 56	1.55		2.00	0.30	0.93	0.93	
HUELLA 1 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		0.85	0.20	0.43	0.43	
CONTRAHUELLA 1 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		0.96	0.30	0.72	0.72	
HUELLA 2 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		1.27	0.30	0.95	0.95	
CONTRAHUELLA 2 DISIPADOR OH 56		2.50		0.60	0.30	0.45	0.45	
HUELLA 3 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		1.20	0.30	0.90	0.90	
CONTRAHUELLA 3 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		0.60	0.30	0.45	0.45	
HUELLA 4 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		0.60	0.30	0.45	0.45	
CONTRAHUELLA 4 DISIPADOR DESCOLE OH 56		2.50		0.55	0.30	0.41	0.41	
DENTELLON DESCOLE OH 56		2.50		0.50	0.30	0.38	0.38	
PARED DISIPADOR OH 56		0.87		0.51	0.25	0.11	0.11	
LATERALES 1 DISIPADOR OH 56		1.49		1.05	0.25	0.39	0.39	
LATERAL 2 DISIPADOR OH 56		1.47		0.84	0.25	0.31	0.31	
LATERAL 3 DISIPADOR OH 56		0.70		0.81	0.25	0.14	0.14	
ESCALONES DISIPADOR 1	K38+654 OBRA HIDRAULICA No. 55	1.20		0.93	0.20	0.45	0.45	
ESCALONES DISIPADOR 2		0.89		1.40	0.20	0.50	0.50	
ESCALONES DISIPADOR 3		1.06		1.41	0.20	0.60	0.60	
PLACAS		1.20		1.40	0.20	1.68	1.68	
CABEZOTE		1.80		1.50	0.25	0.44	0.44	
MURO LATERAL DERECHO CAJA ENCOLE		1.22		2.90	0.30	1.06	1.06	
MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ENCOLE		1.22		2.90	0.30	1.06	1.06	
MURO TALUD CAJA ENCOLE		3.50		2.00	0.30	2.10	2.10	
MURO CABEZOTE CAJA ENCOLE		2.90		2.00	0.30	1.55	1.55	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE		1.80		2.00	0.30	1.08	1.08	
SOLERA DESCOLE	K38+496 OBRA HIDRAULICA No. 54	2.10	4.60	1.44	0.30	1.45	1.45	
DENTELLON DESCOLE		4.60		0.25	0.25	0.29	0.29	
ALETA 1 DESCOLE		1.63	1.30	2.20	0.30	0.97	0.97	
ALETA 2 DESCOLE		1.70	1.30	2.20	0.30	0.99	0.99	
CABEZOTE DESCOLE		2.10		1.40	0.30	0.60	0.60	
MURO LATERAL DERECHO CAJA ENCOLE		3.50	1.22		0.30	1.28	1.28	
MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ENCOLE		3.50		1.22	0.30	1.28	1.28	
MURO TALUD CAJA ENCOLE		4.07	2.00		0.30	2.44	2.44	
MURO CABEZOTE		3.50	2.00		0.30	1.91	1.91	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE		1.80		2.00	0.30	1.08	1.08	
SOLERA DESCOLE	K38+433 OBRA HIDRAULICA No. 53A	2.60	2.50	2.00	0.30	1.53	1.53	
DENTELLON DESCOLE		2.60		0.25	0.25	0.16	0.16	
ALETA 1 DESCOLE		1.90	1.05	2.00	0.30	0.89	0.89	
ALETA 2 DESCOLE		1.90	1.05	2.00	0.30	0.89	0.89	
CABEZOTE DESCOLE		2.00		2.00	0.30	0.91	0.91	
MURO LATERAL DERECHO CAJA ENCOLE		2.25	1.20		0.30	0.81	0.81	
MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ENCOLE		2.25	1.20		0.30	0.81	0.81	

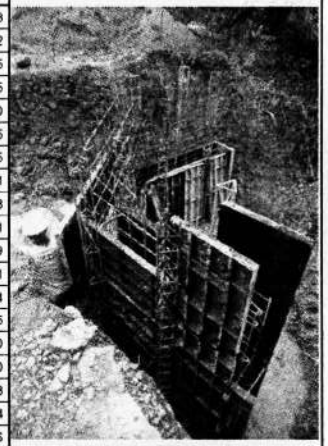

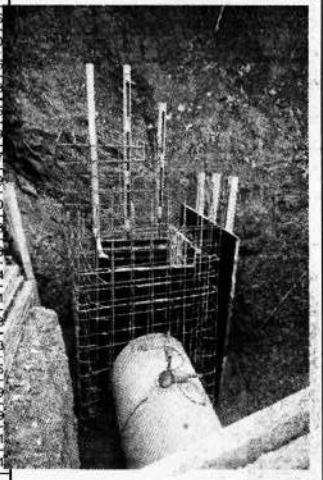


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C **UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
MURO TALUD CAJA ENCOLE		3.30	1.40		0.30	1.39	1.39	
MURO CABEZOTE CAJA ENCOLE		2.40	2.00		0.30	1.25	1.25	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE		2.00		1.80	0.30	1.08	1.08	
SOLERA DESCOLE	K38+285 OBRA HIDRAULICA No. 53	4.35	2.13	1.80	0.30	1.75	1.75	
DENTELLON DESCOLE		4.35		0.25	0.25	0.27	0.27	
ALETA 1 DESCOLE		1.75	1.10	2.00	0.30	0.86	0.86	
ALETA 2 DESCOLE		1.75	1.10	2.00	0.30	0.86	0.86	
CABEZOTE DESCOLE		2.05		1.53	0.30	0.66	0.66	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		2.00		2.03	0.30	1.22	1.22	
MURO TALUD ENCOLE		2.65		2.00	0.30	1.59	1.59	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		1.60		1.20	0.30	0.58	0.58	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		1.70		1.20	0.30	0.61	0.61	
PLACA DE FONDO		2.00		1.80	0.30	0.79	0.79	
ZARPA MURO PANTALLA	K38+216 OBRA HIDRAULICA No. 52	3.00	7.00		0.40	8.40	8.40	
DENTELLON DESCOLE		3.05	7.00		0.40	8.16	8.16	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE		2.00	1.80		0.30	1.08	1.08	
MURO LATERAL DERECHO CAJA ENCOLE OH 52		3.00	1.50		0.30	1.35	1.35	
MURO LATERAL IZQUIERDO CAJA ENCOLE OH 52		3.00	1.50		0.30	1.35	1.35	
MURO LADO TALUD CAJA ENCOLE OH 52		4.02	2.00		0.30	2.41	2.41	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE OH 52		3.32	2.00		0.30	1.71	1.71	
LOSA INFERIOR CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		2.00	1.80		0.30	1.08	1.08	
HUELLA 1 DISIPADOR DESCOLE OH 52		2.00	1.00		0.10	0.20	0.20	
CONTRAHUELLA 1 DISIPADOR DESCOLE OH 52		2.00	0.90		0.40	0.72	0.72	
HUELLA 2 DISIPADOR DESCOLE OH 52		2.00	1.20		0.60	1.44	1.44	
CONTRAHUELLA 2 DISIPADOR OH 52		2.00	0.90		0.40	0.72	0.72	
HUELLA 3 DISIPADOR DESCOLE OH 52		2.00	2.00		0.60	2.40	2.40	
CONTRAHUELLA 3 DISIPADOR DESCOLE OH 52		2.00	0.85		0.40	0.68	0.68	
DENTELLON DISIPADOR OH 52		2.00	0.70		0.40	0.56	0.56	
PARED DISIPADOR OH 52		1.01	0.51		0.25	0.13	0.13	
LATERAL 1 DISIPADOR OH 52		1.33	1.16		0.25	0.38	0.38	
LATERAL 2 DISIPADOR OH 52		2.18	1.04		0.25	0.56	0.56	
SOLERA ENCOLE OH 50	K37+640 OBRA HIDRAULICA No. 50	5.19	2.00	1.80	0.25	1.62	1.62	
DENTELLON ENCOLE OH 50		0.25	0.25	5.19		0.32	0.32	
ALETA 1 ENCOLE OH 50		2.67	2.29	2.27	0.25	1.41	1.41	
ALETA 2 ENCOLE OH 50		2.67	2.29	3.14	0.25	1.95	1.95	
CABEZOTE ENCOLE OH 50		1.95	1.24		0.25	0.60	0.60	
CUERPO DESCOLE BOX COULVERT		2.00	1.50	11.50	0.25	20.13	20.13	
SOLERA DESCOLE		2.70	2.00	1.50	0.30	1.06	1.06	
DENTELLON DESCOLE		2.70		0.25	0.25	0.17	0.17	
ALETA 1 DESCOLE		1.65	1.90	1.70	0.30	0.91	0.91	
ALETA 2 DESCOLE		1.65	1.90	1.60	0.30	0.85	0.85	

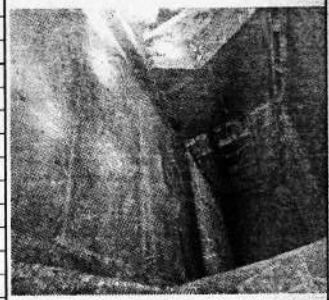



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.
CONTRATO No.	1784 DE 2021
FECHA	ENERO 25 DE 2023
SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL
ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB
ITEM DE PAGO 630,3	CAP 5 - DRENAJES
DESCRIPCION	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C
UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
CABEZOTE DESCOLE	K37+595 OBRA HIDRAULICA No. 49	2.20		2.00	0.30	1.03	1.03	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		1.40		2.11	0.30	0.60	0.60	
MURO TALUD ENCOLE		2.67		1.40	0.30	1.12	1.12	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		2.00		1.73	0.30	1.04	1.04	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		2.00		1.73	0.30	1.04	1.04	
PLACA DE FONDO		2.00		2.00	0.30	1.20	1.20	
SOLERA DESCOLE	K37+495 OBRA HIDRAULICA No. 48	3.60	2.02	1.50	0.30	1.26	1.26	
DENTELLON DESCOLE		3.60		0.25	0.25	0.23	0.23	
ALETA 1 DESCOLE		2.45	2.25	1.62	0.30	1.14	1.14	
ALETA 2 DESCOLE		2.45	2.25	1.62	0.30	1.14	1.14	
CABEZOTE DESCOLE		2.75		2.02	0.30	1.38	1.38	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		1.40		2.40	0.30	0.72	0.72	
MURO TALUD ENCOLE		2.67		1.40	0.30	1.12	1.12	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		2.02		2.05	0.30	1.24	1.24	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		2.02		2.05	0.30	1.24	1.24	
PLACA DE FONDO		2.02		2.05	0.30	1.24	1.24	
SOLERA DESCOLE	K37+427 OBRA HIDRAULICA No. 47	3.60	1.95	1.42	0.30	1.18	1.18	
DENTELLON DESCOLE		3.60		0.25	0.25	0.23	0.23	
ALETA 1 DESCOLE		2.90	2.53	1.70	0.30	1.38	1.38	
ALETA 2 DESCOLE		2.90	2.53	1.60	0.30	1.30	1.30	
CABEZOTE DESCOLE		3.20		1.95	0.30	1.59	1.59	
SOLERA ENCOLE		4.00	2.00	1.90	0.30	1.71	1.71	
DENTELLON ENCOLE		4.00		0.25	0.25	0.25	0.25	
ALETA 1 ENCOLE		2.40	2.12	1.80	0.30	1.22	1.22	
ALETA 2 ENCOLE		2.40	2.20	1.80	0.30	1.24	1.24	
CABEZOTE ENCOLE		3.28		2.05	0.30	1.73	1.73	
SOLERA DESCOLE	K37+348 OBRA HIDRAULICA No. 46	4.15	2.13	1.44	0.30	1.36	1.36	
DENTELLON DESCOLE		4.15		0.25	0.25	0.26	0.26	
ALETA 1 DESCOLE		2.92	2.53	1.70	0.30	1.39	1.39	
ALETA 2 DESCOLE		2.92	2.53	1.62	0.30	1.32	1.32	
CABEZOTE DESCOLE		3.22		2.13	0.30	1.77	1.77	
SOLERA ENCOLE		5.05	2.05	2.00	0.30	2.13	2.13	
DENTELLON ENCOLE		5.05		0.25	0.25	0.32	0.32	
ALETA 1 ENCOLE		2.98	2.60	2.95	0.30	2.47	2.47	
ALETA 2 ENCOLE		2.98	2.70	2.15	0.30	1.83	1.83	
CABEZOTE ENCOLE		3.28		2.05	0.30	1.73	1.73	
ZARPA MURO PANTALLA DESCOLE	K37+316 OBRA HIDRAULICA No.	5.40	2.30		0.30	3.73	3.73	
DENTELLON MURO PANTALLA DESCOLE		5.40	0.25		0.25	0.34	0.34	
VASTAGO MURO PANTALLA DESCOLE		5.40	2.40		0.38	4.92	4.92	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		1.20		2.18	0.30	0.50	0.50	



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
MURO TALUD ENCOLE	45	1.20		1.83	0.30	0.66	0.66	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		1.80		1.83	0.30	0.99	0.99	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		1.80		1.83	0.30	0.99	0.99	
PLACA DE FONDO		1.80		1.80	0.30	0.97	0.97	
CUERPO BOX COULVERT OH 42 A	K37+100 OBRA HIDRAULICA N° 42A	2.00	1.50	10.55		18.46	18.46	
ZARPA 1 MURO PANTALLA OH 42A		2.95		1.95	0.40	2.30	2.30	
ZARPA 2 MURO PANTALLA OH 42A		2.95		2.21	0.40	2.61	2.61	
VASTAGO MURO PANTALLA OH 42 A		3.70		5.70	0.40	8.44	8.44	
DENTELLON MURO PANTALLA OH 42 A		5.70		0.35	0.30	0.60	0.60	
SOLERA ENCOLE		6.70	2.00	1.00	0.25	1.09	1.09	
DENTELLON ENCOLE		6.70		0.25	0.25	0.42	0.42	
ALETA 1 ENCOLE		2.70	2.03	2.53	0.25	1.50	1.50	
ALETA 2 ENCOLE		2.70	2.03	2.53	0.25	1.50	1.50	
CABEZOTE ENCOLE		2.00		1.30	0.25	0.65	0.65	
MURO DERECHO DISIPADOR		12.534			0.15	1.88	1.88	
MURO IZQUIERDO DISIPADOR		12.94			0.15	1.94	1.94	
LOSA HUELLA DISIPADOR		16.97			0.15	2.55	2.55	
CONTRAHUELLA 1		1.58			0.15	0.24	0.24	
CONTRAHUELLA 2		1.96			0.15	0.29	0.29	
DENTELLON		1.80		0.25	0.25	0.11	0.11	
PLACA DISIPADOR DESCOLE OH 42	K36+4949 OBRA HIDRAULICA N° 42	2.00		7.10	0.20	2.84	2.84	
MURO 1 DISIPADOR DESCOLE OH 42		0.60		7.10	0.15	0.64	0.64	
MURO 2 DISIPADOR DESCOLE OH 42		0.60		7.10	0.15	0.64	0.64	
RECALCE MURO 11 OH 42		0.25		4.08	0.38	0.39	0.39	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE OH 42		2.53	2.00		0.30	1.52	1.52	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE OH 42		2.53	2.00		0.30	1.52	1.52	
MURO ESPALDAR ENCOLE OH 42		3.50	1.20		0.30	1.26	1.26	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE OH 42		2.83	1.20		0.30	0.74	0.74	
LOSA INFERIOR ENCOLE OH 42		2.00	1.80		0.30	1.08	1.08	
CUERPO BOX COULVERT OH 41 A	K36+874 OBRA HIDRAULICA N° 41A	2.00	1.50	10.50		18.38	18.38	
SOLERA ENCOLE		4.12	2.00	1.65	0.25	1.26	1.26	
DENTELLON ENCOLE		4.12	0.30		0.30	0.37	0.37	
ALETA 1 ENCOLE		2.65	2.22	1.97	0.25	1.20	1.20	
ALETA 2 ENCOLE		2.65	2.22	2.43	0.25	1.48	1.48	
CABEZOTE ENCOLE		2.00		1.20	0.25	0.60	0.60	
SOLERA DESCOLE OH 41A		2.05		1.80	0.38	1.40	1.40	
ALETA 1 DESCOLE OH 41A		2.35	1.24	1.80	0.25	0.81	0.81	
ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.35	1.24	1.80	0.25	0.81	0.81	
CABEZOTE DESCOLE OH 41A		2.05		1.36	0.38	0.53	0.53	
ZARPA MURO PANTALLA OH 41A		2.80		5.00	0.40	5.60	5.60	
DENTELLON MURO PANTALLA OH 41A		0.30		5.00	0.30	0.45	0.45	







CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630,3	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
VASTAGO MURO PANTALLA OH 41A		3.00		5.00	0.38	5.70	5.70	
SOLERA DESCOLE	K36+728 OBRA HIDRAULICA N° 41	4.20	2.03	1.30	0.30	1.21	1.21	
DENTELLON DESCOLE		4.20	0.30		0.30	0.38	0.38	
ALETA 1 DESCOLE		3.40	3.10	1.86	0.30	1.81	1.81	
ALETA 2 DESCOLE		3.40	3.10	1.90	0.30	1.85	1.85	
CABEZOTE DESCOLE		3.70		2.03	0.30	2.02	2.02	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		3.32		1.20	0.30	0.91	0.91	
MURO TALUD ENCOLE		3.90		1.20	0.30	1.40	1.40	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		3.01		2.02	0.30	1.82	1.82	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		3.01		2.02	0.30	1.82	1.82	
PLACA DE FONDO		2.02		1.80	0.30	1.09	1.09	
SOLERA DESCOLE OH 38	K36+582 OBRA HIDRAULICA N° 38	2.80		2.50	0.38	2.66	2.66	
ALETA 1 DESCOLE OH 38		2.65		1.80	0.38	1.81	1.81	
ALETA 2 DESCOLE OH 38		2.55		2.50	0.38	2.42	2.42	
CABEZOTE DESCOLE OH 38		2.65		2.40	0.38	2.14	2.14	
MURO LATERAL DERECHO OH 38		2.20		2.00	0.30	1.32	1.32	
MURO LATERAL IZQUIERDO OH 38		2.20		2.00	0.30	1.32	1.32	
MURO ESPALADAR OH 38 ENCOLE		2.60		1.20	0.30	0.94	0.94	
MURO GUARDARRUEDA OH 38 ENCOLE		2.60		1.20	0.30	0.66	0.66	
LOSA INFERIOR OH 38 ENCOLE		2.00		1.80	0.30	1.08	1.08	
CUERPO BOX COULVERT OH 37	K36+492 OBRA HIDRAULICA N° 37	2.00	1.50	18.50	0.25	32.38	32.38	
SOLERA ENCOLE OH 37		6.77	2.00	3.15	0.30	4.14	4.14	
ALETA 1 ENCOLE OH 37		4.00	2.90	4.04	0.30	4.18	4.18	
ALETA 2 ENCOLE OH 37		4.00	4.00	3.92	0.30	4.70	4.70	
CABEZOTE ENCOLE OH 37		2.25	2.00		0.30	1.35	1.35	
MEJORAMIENTO SUELO CUERPO ALCANTARILLA	K35+940 OBRA HIDRAULICA N° 35A	12.00	0.16		2.00	3.94	3.94	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE		3.22	2.00		0.30	1.93	1.93	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		3.22	2.00		0.30	1.93	1.93	
ESPALDAR CAJA ENCOLE		3.94	1.20		0.30	1.42	1.42	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		3.52	1.20		0.30	1.27	1.27	
LOSA INFERIOR ENCOLE		2.00	1.80		0.30	1.08	1.08	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE	K35+179 OBRA HIDRAULICA N° 27	2.02	1.72		0.30	1.04	1.04	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		2.02	1.72		0.30	1.04	1.04	
ESPALDAR CAJA ENCOLE		1.98	1.23		0.30	0.73	0.73	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		1.98	1.23		0.30	0.45	0.45	
LOSA INFERIOR ENCOLE		2.02	1.83		0.30	1.11	1.11	
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE	K34+405 OBRA HIDRAULICA N° 15	2.60	2.00		0.30	1.56	1.56	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		2.60	2.00		0.30	1.56	1.56	
ESPALDAR CAJA ENCOLE		2.95	1.25		0.30	1.11	1.11	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		2.95	1.25		0.30	0.83	0.83	
LOSA INFERIOR ENCOLE		2.00	1.85		0.30	1.11	1.11	



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630,3	CAP 5 - DRENAJES	DESCRIPCION	35 - CONCRETO RESISTENCIA 28 MPa C	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LADO MAYOR	LADO MENOR	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
MURO LATERAL DERECHO ENCOLE	K33+657 OBRA HIDRAULICA N° 5	2.88	2.00		0.30	1.73	1.73	
MURO LATERAL IZQUIERDO ENCOLE		2.88	2.00		0.30	1.73	1.73	
ESPALDAR CAJA ENCOLE		3.24	1.22		0.30	1.19	1.19	
MURO GUARDARRUEDA ENCOLE		3.20	1.22		0.30	0.89	0.89	
LOSA INFERIOR ENCOLE		2.01	1.82		0.30	1.10	1.10	
					Volumen presente obra		869.00	
					Volumen Acumulado Hoja Anterior		501.00	
					Volumen Acumulado		368.00	

INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		

ITEM DE PAGO 630.5	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	36 - CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa D (SOLADO)	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
CUERPO DE TUBERIA	K11+510	10.5	1.9		0.1	2.00	2.00	
ALETAS ENCOLE	K11+510	2	1.8		0.1	0.36	0.36	
ALETAS DESCOLE	K11+510	2	1.8		0.1	0.36	0.36	
CUERPO DE TUBERIA	K11+605	10.5	1.9		0.1	2.00	2.00	
ALETAS ENCOLE	K11+605	3.68	1.6		0.1	0.59	0.59	
ALETAS DESCOLE	K11+605	4.2	1.8		0.1	0.76	0.76	
CUERPO DE TUBERIA	K12+035	10.5	2		0.1	2.1	2.1	
CAJAS ENCOLE	K12+035	2	2		0.1	0.4	0.4	
CUERPO DE TUBERIA	K12+150	11	2		0.1	2.2	2.2	
CAJAS ENCOLE	K12+150	2	1.8		0.1	0.36	0.36	
CUERPO DE TUBERIA	K12+256	10.5	1.8		0.1	1.89	1.89	
CAJAS ENCOLE	K12+256	2	1.8		0.1	0.36	0.36	
CUERPO BOX COULVERT	K15+940	10.50	1.80		0.10	1.89	1.89	
ALETAS ENCOLE	K15+940	3.00	3.70		0.10	1.11	1.11	
CUERPO BOX COULVERT	K16+040	10.50	1.80		0.10	1.89	1.89	
ALETAS ENCOLE	K16+040	2.00	1.90		0.10	0.38	0.38	
CUERPO BOX COULVERT	K16+575	11.10	2.10		0.25	5.83	5.83	
ALETAS ENCOLE	K16+575	8.60	3.50		0.10	3.01	3.01	
ALETAS ENCOLE	K16+575	8.60	3.50		0.10	3.01	3.01	
CAJA ENCOLE	K16+575	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
DESCOLE	K16+575	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
CAJA ENCOLE	K16+635	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
DESCOLE	K16+635	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
CAJA ENCOLE	K16+635	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
DESCOLE	K16+638	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
CAJA ENCOLE	K16+575	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
DESCOLE	K16+575	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
CAJA ENCOLE	K22+395	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
CAJA DESCOLE	K22+395	1.90	4.30		0.10	0.82	0.82	
CUERPO DE TUBERIA	K22+395	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50	
CAJA ENCOLE	K22+455	2.30	2.00		0.10	0.46	0.46	
CAJA DESCOLE	K22+455	1.90	4.30		0.10	0.82	0.82	
CUERPO DE TUBERÍA	K22+455	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50	
MURO - CORTINA ENCOLE	K22+665	2.50	4.95		0.10	1.24	1.24	
MURO - CORTINA DESCOLE	K22+665	2.55	4.85		0.10	1.24	1.24	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 630.5	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	36 - CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa D (SOLADO) **UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL
CUERPO DE TUBERIA	K22+665	4.00	1.50		0.10	0.60	0.60
DESCOLE	K22+225	2.15	3.53		0.10	0.76	0.76
DESCOLE	K22+275	2.00	3.85		0.10	0.77	0.77
MURO CORTINA DESCOLE	K23+150	3.30	2.00		0.10	0.66	0.66
SOLADO PROTECCIÓN LLUVIA	K22+800	6.00	3.20		0.10	1.92	1.92
CUERPO	K23+665	6.00	2.30		0.10	1.38	1.38
ENTRE ALETAS	K23+665	2.15	4.30		0.10	0.92	0.92
CUERPO	K23+730	6.00	2.30		0.10	1.38	1.38
ENTRE ALETAS	K23+730	2.15	4.30		0.10	0.92	0.92
CUERPO	K23+520	6.00	1.60		0.10	0.96	0.96
ENTRE ALETAS	K23+520	1.80	3.25		0.10	0.59	0.59
CUERPO	K22+355	6.00	1.60		0.10	0.96	0.96
ENTRE ALETAS	K22+355	1.80	3.25		0.10	0.59	0.59
OBRA 63A SOLADO TUBERIA	K39+995	5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 63A SOLADO TUBERIA ENCOLE Y CAJA		5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 63A SOLADO CAJA ENCOLE		2.00	2.00		0.05	0.20	0.20
OBRA 63A SOLADO ALETAS		1.60	5.00	1.50	0.05	0.26	0.26
SOLADO MODULO 4 MURO 15	K39+883	19.00	2.00		0.10	3.80	3.80
			1.50	1.50	0.05	0.06	0.06
MURO 15 SOLADO SECCION 2 Y 3.		29.60	1.90		0.05	2.81	2.81
MURO 15 SOLADO SECCION 1		12.80	1.60		0.05	1.02	1.02
MURO 15 SOLADO MEJORAMIENTO SECCION 1		12.80	1.60		0.09	1.84	1.84
OBRA 63 SOLADO BOX	K39+883	5.00	2.00		0.10	1.00	1.00
OBRA 63 SOLADO ALETAS		4.50	2.00	1.60	0.05	0.26	0.26
OBRA 63 SOLADO CUERPO ENCOLE		5.00	2.00		0.10	1.00	1.00
OBRA 63 SOLADO ALETAS ENCOLE		5.00	1.50	1.50	0.05	0.24	0.24
OBRA 62 CUERPO ENCOLE	K39+516	6.45	2.00		0.15	1.94	1.94
OBRAS 62 SOLADO BOX		7.00	2.00		0.15	2.10	2.10
OBRA 62 SOLADO ALETAS ENCOLE		1.60	5.07	2.00	0.05	0.28	0.28
OBRA 62 SOLADO ALETAS DESCOLE		2.30	5.40	2.00	0.05	0.43	0.43
SOLADO ALETAS DESCOLE OBRA 61	K39+402	1.25	4.10	2.45	0.10	0.41	0.41
SOLADO TUBERIA OBRA 61		12.00	1.50		0.05	0.90	0.90
SOLADO MEJORAMIENTO OBRA 61		3.50	1.50		0.25	1.31	1.31
SOLADO ALETAS ENCOLE OBRA 61		1.50	5.95	1.82	0.10	0.58	0.58
OBRA 60 SOLADO ALETAS DESCOLE		1.60	6.80	2.00	0.05	0.35	0.35

REGISTRO FOTOGRAFICO



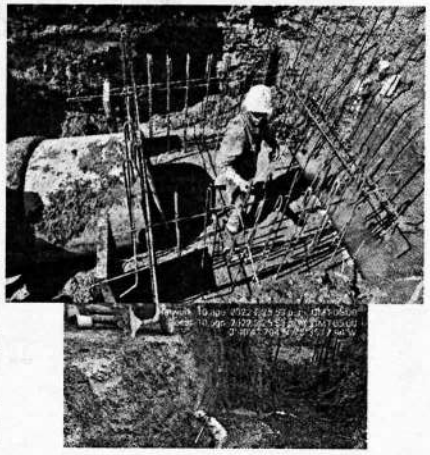

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)** ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 630.5	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	36 - CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa D (SOLADO) **UNIDAD** M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL
OBRA 60 SOLADO ALETAS ENCOLE	K39+206	2.40	5.40	2.00	0.05	0.44	0.44
OBRA 60 CUERPO ENCOLE		6.45	2.00		0.10	1.29	1.29
OBRA 60 SOLADO BOX		8.50	2.00		0.10	1.70	1.70
SOLADO TUBERIA OH 59	K39+055	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50
SOLADO CAJA ENCOLE OH 59		2.00	4.50	2.00	0.10	0.65	0.65
OBRA 58 SOLADO TUBOS	K38+943	12.00	1.50		0.10	1.80	1.80
OBRA 58 SOLADO ALETAS DESCOLE		1.50	4.40	1.80	0.05	0.23	0.23
OBRA 58 SOLADO ALETAS ENCOLE		1.50	4.40	1.80	0.05	0.23	0.23
OBRA 57 SOLADO TUBOS	K38+916	11.00	1.50		0.05	0.83	0.83
OBRA 57 SOLADO ALETAS ENCOLE		1.50	4.40	1.80	0.05	0.23	0.23
OBRA 56A SOLADO TUBERIA	K38+805	8.00	1.50		0.05	0.60	0.60
OBRA 56A ALETAS DESCOLE		1.50	4.40	1.80	0.05	0.23	0.23
OBRA 56A CAJA ENCOLE		1.80	2.00		0.05	0.18	0.18
OBRA 56 SOLADO TUBERIA	K38+654	9.00	1.50		0.05	0.68	0.68
OBRA 56 SOLADO MURO PANTALLA		3.80	1.50		0.05	0.29	0.29
OBRA 56 SOLADO CAJA ENCOLE		2.00	1.80		0.05	0.18	0.18
OBRA 55 SOLADO TUBERIA ENCOLE	K38+557	5.00	1.50		0.10	0.75	0.75
OBRA 55 SOLADO CAJA ENCOLE		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40
OBRA 55 SOLADO TUBERIA		6.00	1.50		0.05	0.45	0.45
OBRA 55 SOLADO DISIPADOR		5.00	1.40		0.05	0.35	0.35
OBRA 54 SOLADO ENCOLE TUBERIA	K38+496	6.00	1.50		0.10	0.90	0.90
OBRA 54 SOLADO CAJA ENCOLE		2.00	2.00		0.05	0.20	0.20
OBRA 54 SOLADO TUBERIA		5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 54 SOLADO ALETAS DESCOLE		1.50	4.40	1.80	0.05	0.23	0.23
OBRA 53A SOLADO TUBERIA	K38+433	5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 53A SOLADO ALETAS		2.00	2.40		0.05	0.24	0.24
OBRA 53A SOLADO ENCOLE TUBERIA		4.00	1.50		0.05	0.30	0.30
OBRA 53A SOLADO CAJA ENCOLE		2.00	1.80		0.05	0.18	0.18
OBRA 53 SOLADO TUBERIA ENCOLE	K38+256	5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 53 CAJA ENCOLE		5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 53 SOLADO TUBERIA		9.00	1.50		0.05	0.68	0.68
OBRA 53 SOLADO ALETAS		1.50	4.40	1.80	0.05	0.33	0.33
OBRA 52 TUBERIA	K38+216	5.00	1.50		0.05	0.38	0.38
OBRA 52 SOLADO MURO PANTALLA		7.00	3.00		0.05	1.05	1.05
OBRA 52 TUBERIA ENCOLE Y CAJA		5.50	2.00		0.05	0.55	0.55

REGISTRO FOTOGRAFICO





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.			
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB			

ITEM DE PAGO 630.5	CAP 5 - DRENAJES	DESCRIPCION	36 - CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa D (SOLADO)	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL
OBRA 50 SOLADO DESCOLE BOX	K37+640	6.00	2.00		0.10	1.20	1.20
OBRA 50 SOLADO ENCOLE BOX		5.50	2.00		0.10	1.10	1.10
OBRA 50 ALETAS ENCOLE BOX		1.80	5.19	2.00	0.10	0.65	0.65
SOLADO TUBERIA OH 49	K37+595	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50
SOLADO ALETAS DESCOLE OH 49		2.00	2.00	4.00	0.10	0.60	0.60
SOLADO CAJA ENCOLE OH 49		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40
SOLADO TUBERIA OH 48	K37+495	10.50	1.50		0.10	1.58	1.58
SOLADO ALETAS DESCOLE OH 48		1.50	2.10	4.20	0.10	0.47	0.47
SOLADO CAJA ENCOLE OH 48		2.00	2.00		0.10	0.20	0.20
SOLADO ALETAS DESCOLE OH 47	K37+427	1.72	3.60	1.95	0.10	0.48	0.48
SOLADO CUERPO DESCOLE OH 47		7.00	1.50		0.10	1.05	1.05
SOLADO CUERPO ENCOLE OH 47		7.00	1.50		0.10	1.05	1.05
SOLADO ALETAS ENCOLE OH 47		1.90	4.00	2.00	0.10	0.57	0.57
SOLADO ALETAS DESCOLE OH 47	K37+348	1.44	4.15	2.13	0.10	0.45	0.45
SOLADO CUERPO DESCOLE OH 46		7.00	1.50		0.10	1.05	1.05
SOLADO CUERPO ENCOLE OH 46		5.00	1.50		0.10	0.75	0.75
SOLADO ALETAS ENCOLE OH 46		2.00	5.05	2.05	0.10	0.71	0.71
SOLADO CUERPO DESCOLE OH 45	K37+316	6.00	1.50		0.10	0.90	0.90
SOLADO CUERPO ENCOLE OH 45		5.00	1.50		0.10	0.75	0.75
SOLADO CAJA ENCOLE OH 45		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40
SOLADO ZARPA DESCOLE OH 45		6.50	2.40		0.10	1.56	1.56
SOLADO BOX COULVERT OH 42A	K37+100	10.55	2.20		0.10	2.32	2.32
SOLADO ZARPA MURO PANTALLA OH 42A		2.95	1.93		0.10	0.57	0.57
SOLADO ALETAS OH 42A ENCOLE		1.00	2.03	6.70	0.10	0.44	0.44
SOLADO TUBERIA OH 42	K36+949	11.00	1.50		0.10	1.65	1.65
SOLADO CAJA ENCOLE OH 42		2.00	1.80		0.10	0.36	0.36
SOLADO ALETAS ENCOLE OH 41A	K36+874	1.60	4.60	2.00	0.10	0.53	0.53
SOLADO BOX COULVERT OH 41A		10.50	1.50		0.10	1.58	1.58
SOLADO MURO PANTALLA DESCOLE OH 41A		5.00	2.80		0.10	1.40	1.40
SOLADO ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	1.10		0.10	0.22	0.22
SOLADO TUBERIA OH 41	K36+728	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50
SOLADO ALETAS OH 41		2.00	4.50	2.00	0.10	0.65	0.65
SOLADO CAJA ENCOLE OH 41		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40
SOLADO TUBERIA OH 38	K36+582	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50
SOLADO CAJA ENCOLE OH 38		2.00	1.80		0.10	0.36	0.36

REGISTRO FOTOGRAFICO






MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	**ACTA No. 8**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.5	CAP 5 - DRENAJES	**DESCRIPCION**	36 - CONCRETO RESISTENCIA 14 MPa D (SOLADO)	**UNIDAD**	M3

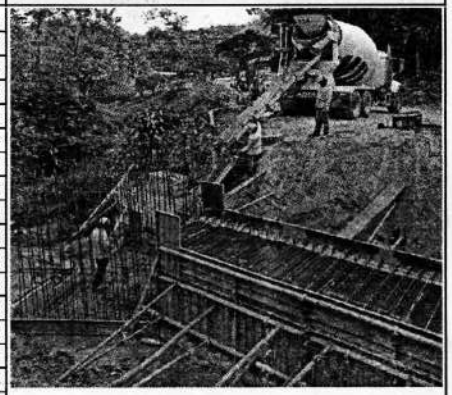LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	ESPESOR	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
SOLADO DESCOLE OH 38		2.50	2.80		0.10	0.70	0.70	
SOLADO ENCOLE OH 37	K36+490	9.00	2.20		0.10	1.98	1.98	
SOLADO ALETAS ENCOLE OH 37		3.15	6.77	2.00	0.10	1.38	1.38	
SOLADO DESCOLE OH 37		9.50	2.20	0.10		2.09	2.09	
MURO 9B MODULO 1 AL 6	36+010	36.60	2.00		0.10	7.32	7.32	
MURO 9A MODULO 3	K35+970	16.80	1.90		0.10	3.19	3.19	
MURO 9A MODULO 4		21.00	1.90		0.10	3.99	3.99	
SOLADO TUBERIA OH 35A	K35+940	12.00	1.50		0.10	1.80	1.80	
SOLADO CAJA OH 35A		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40	
SOLADO TUBERIA OH 27	K35+180	9.00	1.50		0.10	1.35	1.35	
ATRAQUE TUBERIA OH 27 AL TERCIO DEL TUBO		9.00	2.00		0.16	2.88	2.88	
SOLADO CAJA OH 27		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40	
SOLADO TUBERIA OH 15	K34+405	10.00	1.50		0.10	1.50	1.50	
ATRAQUE TUBERIA OH 15 AL TERCIO DEL TUBO		10.00	2.00		0.16	3.20	3.20	
SOLADO CAJA OH 15		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40	
SOLADO TUBERIA OH 5	K33+657	12.00	1.50		0.10	1.80	1.80	
SOLADO CAJA OH 5		2.00	2.00		0.10	0.40	0.40	

Cantidad Acumulada	**161.00**
Cantidad Paga Actas Anteriores	**103.74**
Cantidad Para Pago Presente Acta	**57.26**

INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA


CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS MAURICIO LÓPEZ DÁEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACÉRO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

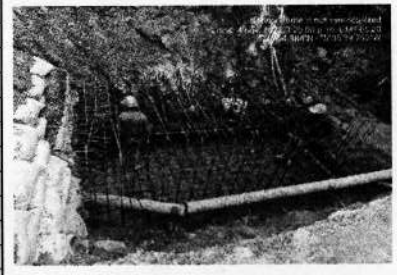LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
SALIDA PUENTE CAJA	K11+510	10	4	3.62	36.20	
		10	4	4.62	46.20	
		10	4	2.3	23.00	
		10	4	2.3	23.00	
		10	4	2.12	21.20	
		10	4	2.12	21.20	
		10	4	2.9	29.00	
		10	4	3.31	33.10	
		10	4	2.15	21.50	
		10	4	2.15	21.50	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	3.11	34.21	
		11	4	2.45	26.95	
		11	4	2.45	26.95	
		11	4	3.61	39.71	
		11	4	2.3	25.30	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
SALIDA PUENTE CAJA	K11+510	9	4	8.65	32.85	
		9	4	4.65	41.85	
		9	4	2.33	20.97	
		9	4	2.33	20.97	
		9	4	2.12	19.08	
		9	4	2.12	19.08	
		10	4	2.765	27.65	
		10	4	3.16	31.60	
		10	4	2	20.00	
		10	4	2	20.00	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	2.96	32.56	
		11	4	2.3	25.30	
		11	4	2.3	25.30	
		11	4	3.46	38.06	
		11	4	2.33	25.63	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		7	4	-0.55	- 3.85	
LA GUANABANERA ENCOLE	K11+605	2	4	5.15	10.30	
		2	4	4.63	9.26	
		2	4	4.37	8.73	
		2	4	4.11	8.21	
		2	4	3.84	7.69	
		2	4	3.58	7.17	
		2	4	3.32	6.64	
		13	4	1.90	24.70	
		13	4	1.90	24.70	
		4	4	1.58	6.33	
		4	4	1.27	5.07	
		4	4	0.95	3.80	
		5	4	0.63	3.17	
		2	4	2.60	5.20	
		2	4	2.72	5.45	
		2	4	2.79	5.57	
		2	4	2.85	5.70	
		2	4	2.91	5.82	
		2	4	2.97	5.94	
		2	4	3.03	6.07	
		2	4	3.10	6.19	
		2	4	2.60	5.20	
		2	4	2.72	5.45	
		2	4	2.79	5.57	
		2	4	2.85	5.70	
		2	4	2.91	5.82	
		2	4	2.97	5.94	
		10	4	2.60	26.00	
		16	4	5.70	91.20	
		10	4	2.60	26.00	
		10	4	3.22	32.20	
		10	4	1.77	17.70	
		2	4	5.30	10.60	
		2	4	4.78	9.56	
		2	4	4.52	9.04	
		2	4	4.26	8.52	
		2	4	4.00	8.00	
		2	4	3.74	7.48	
		2	4	3.48	6.96	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
LA GUANABANERA DESCOLE	K11+605	12	4	2.10	25.20	
		12	4	2.10	25.20	
		4	4	1.80	7.20	
		4	4	1.50	6.00	
		4	4	1.20	4.80	
		5	4	0.90	4.50	
		2	4	3.46	6.92	
		2	4	3.36	6.72	
		2	4	3.31	6.61	
		2	4	3.26	6.51	
		2	4	3.21	6.41	
		2	4	3.15	6.31	
		2	4	3.10	6.21	
		2	4	3.05	6.11	
		2	4	3.46	6.92	
		2	4	3.35	6.70	
		2	4	3.29	6.58	
		2	4	3.24	6.47	
		2	4	3.18	6.36	
		2	4	3.12	6.25	
		10	4	2.74	27.35	
		14	4	5.67	79.38	
		10	4	2.44	24.35	
		6	4	3.46	20.76	
		10	4	2.01	20.10	
		0	4			
LA GUANABANERA ALCANTARILLA 36	K12+035	9	4	3.62	32.58	
		9	4	4.62	41.58	
		9	4	2.12	19.08	
		9	4	2.12	19.08	
		9	4	2.3	20.70	
		9	4	2.3	20.70	
		11	4	2.56	28.16	
		11	4	3.15	34.65	
		11	4	1.9	20.90	
		11	4	1.9	20.90	
		11	4	2.3	25.30	
		10	4	2.9	29.00	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		10	4	2.15	21.50	
		10	4	2.45	24.50	
		10	4	3.7	37.00	
		10	4	2.12	21.20	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
LA GUANABANERA ALCANTARILLA 36	K12+150	12	4	3.63	43.56	
		12	4	4.63	55.56	
		12	4	2.31	27.72	
		12	4	2.31	27.72	
		12	4	2.12	25.44	
		12	4	2.12	25.44	
		10	4	3.355	33.55	
		10	4	3.76	37.60	
		10	4	2.6	26.00	
		10	4	2.6	26.00	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	3.58	39.38	
		11	4	2.92	32.12	
		11	4	2.92	32.12	
		11	4	4.08	44.88	
		11	4	2.31	25.41	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
LA GUANABANERA ALCANTARILLA 36	K12+256	9	4	3.6	32.40	
		9	4	4.6	41.40	
		9	4	2.1	18.90	
		9	4	2.1	18.90	
		9	4	2.3	20.70	
		9	4	2.3	20.70	
		11	4	2.7	29.70	
		11	4	3.3	36.30	
		11	4	2.05	22.55	
		11	4	2.05	22.55	
		11	4	2.3	25.30	
		10	4	3.25	32.50	

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		10	4	2.5	25.00	
		10	4	2.45	24.50	
		10	4	3.7	37.00	
		10	4	2.1	21.00	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
TRAMO 1 SECTOR CRÍTICO UNO ALCANTARILLA 36 CALA ENCOLE	K16+030	13	4	3.62	47.06	
		13	4	4.62	60.06	
		13	4	2.3	29.90	
		13	4	2.3	29.90	
		13	4	2.12	27.56	
		13	4	2.12	27.56	
		10	4	3.5	35.00	
		10	4	3.91	39.10	
		10	4	2.75	27.50	
		10	4	2.75	27.50	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	3.7	40.70	
		11	4	3.04	33.44	
		11	4	3.04	33.44	
		11	4	4.2	46.20	
		11	4	2.3	25.30	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
TRAMO 1 SECTOR CRÍTICO UNO CAJA ENCOLE	K16+575	18.00	4.00	3.50	63.00	
		6.00	4.00	3.80	22.80	
		20.00	4.00	2.55	51.00	
		6.00	4.00	2.85	17.10	
		6.00	4.00	4.05	24.30	
		8.00	4.00	1.50	12.00	
		34.00	4.00	2.10	71.40	
		24.00	4.00	2.30	55.20	
		30.00	4.00	4.00	120.00	
		2.00	4.00	1.90	3.80	
		10.00	4.00	3.15	31.50	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR CRÍTICO UNO CAJA ENCOLE	K16+635	18.00	4.00	3.50	63.00	
		6.00	4.00	3.80	22.80	
		20.00	4.00	2.55	51.00	
		6.00	4.00	2.85	17.10	
		6.00	4.00	4.05	24.30	
		8.00	4.00	1.50	12.00	
		34.00	4.00	2.10	71.40	
		24.00	4.00	2.30	55.20	
		30.00	4.00	4.00	120.00	
		2.00	4.00	1.90	3.80	
		10.00	4.00	3.15	31.50	
TRAMO 1 SECTOR CRÍTICO UNO DESCOLE	K16+575	12.00	4.00	1.97	23.64	
		20.00	4.00	2.90	58.00	
		20.00	4.00	3.75	75.00	
		6.00	4.00	4.60	27.60	
		21.00	4.00	1.40	29.40	
		24.00	4.00	1.70	40.80	
		4.00	4.00	1.40	5.60	
		4.00	4.00	1.15	4.60	
		4.00	4.00	0.80	3.20	
		2.00	4.00	3.40	6.80	
		2.00	4.00	3.73	7.46	
		2.00	4.00	4.03	8.06	
		2.00	4.00	4.15	8.30	
		2.00	4.00	4.66	9.32	
		4.00	4.00	2.60	10.40	
		4.00	4.00	2.50	10.00	
		12.00	4.00	3.40	40.80	
		4.00	4.00	3.60	14.40	
		4.00	4.00	3.58	14.32	
		4.00	4.00	3.56	14.24	
		4.00	4.00	3.54	14.16	
		4.00	4.00	3.52	14.08	
		4.00	4.00	3.50	14.00	
		4.00	4.00	3.48	13.92	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
		12.00	4.00	1.97	23.64	
		20.00	4.00	2.90	58.00	
		20.00	4.00	3.75	75.00	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR CRÍTICO UNO DESCOLE	K16+635	6.00	4.00	4.60	27.60	
		21.00	4.00	1.40	29.40	
		24.00	4.00	1.70	40.80	
		4.00	4.00	1.40	5.60	
		4.00	4.00	1.15	4.60	
		4.00	4.00	0.80	3.20	
		2.00	4.00	3.40	6.80	
		2.00	4.00	3.73	7.46	
		2.00	4.00	4.03	8.06	
		2.00	4.00	4.15	8.30	
		2.00	4.00	4.66	9.32	
		4.00	4.00	2.60	10.40	
		4.00	4.00	2.50	10.00	
		12.00	4.00	3.40	40.80	
		4.00	4.00	3.60	14.40	
		4.00	4.00	3.58	14.32	
		4.00	4.00	3.56	14.24	
		4.00	4.00	3.54	14.16	
		4.00	4.00	3.52	14.08	
		4.00	4.00	3.50	14.00	
		4.00	4.00	3.48	13.92	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL DESCOLE	K22+225	12.00	4.00	1.97	23.64	
		20.00	4.00	2.90	58.00	
		20.00	4.00	3.75	75.00	
		6.00	4.00	4.60	27.60	
		21.00	4.00	1.40	29.40	
		24.00	4.00	1.70	40.80	
		4.00	4.00	1.40	5.60	
		4.00	4.00	1.15	4.60	
		4.00	4.00	0.80	3.20	
		2.00	4.00	3.40	6.80	
		2.00	4.00	3.73	7.46	
		2.00	4.00	4.03	8.06	
		2.00	4.00	4.15	8.30	
		2.00	4.00	4.66	9.32	
		4.00	4.00	2.60	10.40	
		4.00	4.00	2.50	10.00	
		12.00	4.00	3.40	40.80	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		4.00	4.00	3.60	14.40	
		4.00	4.00	3.58	14.32	
		4.00	4.00	3.56	14.24	
		4.00	4.00	3.54	14.16	
		4.00	4.00	3.52	14.08	
		4.00	4.00	3.50	14.00	
		4.00	4.00	3.48	13.92	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
STRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA ENCOLE	K22+225	11	4	3.75	41.25	
		11	4	4.75	52.25	
		11	4	2.4	26.40	
		11	4	2.4	26.40	
		11	4	2.15	23.65	
		11	4	2.15	23.65	
		10	4	3.25	32.50	
		10	4	3.625	36.25	
		10	4	2.45	24.50	
		10	4	2.45	24.50	
		10	4	2.15	21.50	
		11	4	3.425	37.68	
		11	4	2.75	30.25	
		11	4	2.75	30.25	
		11	4	3.925	43.18	
		11	4	2.4	26.40	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		12.00	4.00	1.97	23.64	
		20.00	4.00	2.90	58.00	
		20.00	4.00	3.75	75.00	
		6.00	4.00	4.60	27.60	
		21.00	4.00	1.40	29.40	
		24.00	4.00	1.70	40.80	
		4.00	4.00	1.40	5.60	
		4.00	4.00	1.15	4.60	
		4.00	4.00	0.80	3.20	
		2.00	4.00	3.40	6.80	
		2.00	4.00	3.73	7.46	



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL DESCOLE	K22+275	2.00	4.00	4.03	8.06	
		2.00	4.00	4.15	8.30	
		2.00	4.00	4.66	9.32	
		4.00	4.00	2.60	10.40	
		4.00	4.00	2.50	10.00	
		12.00	4.00	3.40	40.80	
		4.00	4.00	3.60	14.40	
		4.00	4.00	3.58	14.32	
		4.00	4.00	3.56	14.24	
		4.00	4.00	3.54	14.16	
		4.00	4.00	3.52	14.08	
		4.00	4.00	3.50	14.00	
		4.00	4.00	3.48	13.92	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
		4.00	4.00	3.46	13.84	
STRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA ENCOLE	K22+275	12	4	3.73	44.76	
		12	4	4.73	56.76	
		12	4	2.38	28.56	
		12	4	2.38	28.56	
		12	4	2.15	25.80	
		12	4	2.15	25.80	
		10	4	3.29	32.90	
		10	4	3.675	36.75	
		10	4	2.5	25.00	
		10	4	2.5	25.00	
		10	4	2.15	21.50	
		11	4	3.475	38.23	
		11	4	2.8	30.80	
		11	4	2.8	30.80	
		11	4	3.975	43.73	
		11	4	2.38	26.18	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		11	4	3.5	38.50	
		11	4	4.5	49.50	
		11	4	2.2	24.20	
		11	4	2.2	24.20	
		11	4	2.1	23.10	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA ENCOLE	K22+395	11	4	2.1	23.10	
		10	4	3	30.00	
		10	4	3.45	34.50	
		10	4	2.3	23.00	
		10	4	2.3	23.00	
		10	4	2.1	21.00	
		10	4	2.95	29.50	
		10	4	2.3	23.00	
		10	4	2.6	26.00	
		10	4	3.75	37.50	
		10	4	2.2	22.00	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA DESCOLE	K22+395	2	4	4.20	8.40	
		2	4	3.95	7.89	
		2	4	3.69	7.38	
		2	4	3.44	6.88	
		2	4	3.18	6.37	
		2	4	2.93	5.86	
		11	4	1.85	20.35	
		11	4	1.85	20.35	
		4	4	1.54	6.17	
		4	4	1.23	4.93	
		4	4	0.93	3.70	
		5	4	0.62	3.08	
		2	4	3.00	6.00	
		2	4	2.96	5.92	
		2	4	2.94	5.88	
		2	4	2.92	5.84	
		2	4	2.90	5.80	
		2	4	2.88	5.76	
		2	4	2.86	5.72	
		2	4	2.84	5.68	
		2	4	3.00	6.00	
		2	4	2.96	5.92	
		2	4	2.94	5.88	
		2	4	2.92	5.84	
		2	4	2.90	5.80	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
		2	4	2.88	5.76	
		10	4	2.58	25.80	
		12	4	5.66	67.92	
		10	4	2.58	25.80	
		8	4	3.24	25.92	
		10	4	1.79	17.90	
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA ENCOLE	K22+455	11	4	3.62	39.82	
		11	4	4.62	50.82	
		11	4	2.3	25.30	
		11	4	2.3	25.30	
		11	4	2.12	23.32	
		11	4	2.12	23.32	
		10	4	3.15	31.50	
		10	4	3.56	35.60	
		10	4	2.4	24.00	
		10	4	2.4	24.00	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	4.01	44.11	
		11	4	3.35	36.85	
		11	4	2.7	29.70	
		11	4	3.86	42.46	
		11	4	2.3	25.30	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		2	4	3.97	7.94	
		2	4	3.58	7.16	
		2	4	3.38	6.77	
		2	4	3.19	6.38	
		2	4	2.99	5.98	
		2	4	2.80	5.59	
		2	4	2.60	5.20	
		10	4	1.98	19.80	
		10	4	1.98	19.80	
		4	4	1.49	5.94	
		4	4	0.99	3.96	
		4	4	0.50	1.98	
		2	4	3.02	6.04	
		2	4	2.97	5.93	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA DESCOLE	K22+455	2	4	2.94	5.88	
		2	4	2.91	5.83	
		2	4	2.89	5.77	
		2	4	2.86	5.72	
		2	4	2.83	5.67	
		2	4	2.81	5.61	
		2	4	3.03	6.05	
		2	4	2.98	5.95	
		2	4	2.95	5.90	
		2	4	2.93	5.85	
		2	4	2.90	5.80	
		2	4	2.88	5.75	
		10	4	2.34	23.40	
		12	4	5.38	64.56	
		10	4	2.54	25.40	
		6	4	3.36	20.16	
		10	4	1.91	19.10	
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA	K22+545	11	4	3.67	40.37	
		11	4	4.67	51.37	
		11	4	2.35	25.85	
		11	4	2.35	25.85	
		11	4	2.12	23.32	
		11	4	2.12	23.32	
		10	4	3.225	32.25	
		10	4	3.61	36.10	
		10	4	2.45	24.50	
		10	4	2.45	24.50	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	3.66	40.26	
		11	4	3	33.00	
		11	4	2.75	30.25	
		11	4	3.91	43.01	
		11	4	2.35	25.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		11	4	3.67	40.37	
		11	4	4.67	51.37	
		11	4	2.35	25.85	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA ENCOLE	K22+667	11	4	2.35	25.85	
		11	4	2.12	23.32	
		11	4	2.12	23.32	
		10	4	3.175	31.75	
		10	4	3.56	35.60	
		10	4	2.4	24.00	
		10	4	2.4	24.00	
		10	4	2.12	21.20	
		11	4	3.82	42.02	
		11	4	3.16	34.76	
		11	4	2.7	29.70	
		11	4	3.86	42.46	
		11	4	2.35	25.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL CAJA	K22+799	12	4	3.7	44.40	
		12	4	4.7	56.40	
		12	4	2.35	28.20	
		12	4	2.35	28.20	
		12	4	2.15	25.80	
		12	4	2.15	25.80	
		10	4	3.425	34.25	
		10	4	3.825	38.25	
		10	4	2.65	26.50	
		10	4	2.65	26.50	
		10	4	2.15	21.50	
		11	4	3.975	43.73	
		11	4	3.3	36.30	
		11	4	2.9	31.90	
		11	4	4.075	44.83	
		11	4	2.35	25.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		7	4	-0.55	- 3.85	
		2	4	6.50	13.00	
		2	4	5.23	10.46	
		2	4	4.59	9.19	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL DESCOLE	K22+901	2	4	3.96	7.91	
		2	4	3.32	6.64	
		2	4	2.69	5.37	
		2	4	2.05	4.10	
		9	4	1.45	13.05	
		9	4	1.45	13.05	
		4	4	1.32	5.27	
		4	4	1.19	4.75	
		4	4	1.05	4.22	
		5	4	0.92	4.61	
		2	4	3.25	6.50	
		2	4	3.18	6.35	
		2	4	3.14	6.28	
		2	4	3.10	6.21	
		2	4	3.07	6.14	
		2	4	3.03	6.06	
		2	4	3.00	5.99	
		2	4	2.96	5.92	
		2	4	3.25	6.50	
		2	4	3.22	6.43	
		2	4	3.20	6.40	
		2	4	3.18	6.36	
		2	4	3.16	6.33	
		2	4	3.15	6.29	
		10	4	2.56	25.55	
		12	4	8.01	96.12	
		10	4	4.96	49.55	
		2	4	3.25	6.50	
		10	4	1.80	18.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE	K23+150	18.00	4.00	2.30	41.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		8.00	4.00	1.80	14.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		8.00	4.00	2.70	21.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		14.00	4.00	0.90	12.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		12.00	4.00	0.60	7.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		10.00	4.00	0.60	6.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		10.00	4.00	0.90	9.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		18.00	4.00	3.20	57.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		24.00	5.00	3.75	139.50	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		6.00	4.00	2.30	13.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	2.50	10.00	


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE	K23+520	12.00	4.00	1.97	23.64	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		20.00	4.00	2.90	58.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		20.00	4.00	3.75	75.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		6.00	4.00	4.60	27.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		21.00	4.00	1.40	29.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		24.00	4.00	1.70	40.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	1.40	5.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	1.15	4.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	0.80	3.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	3.40	6.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	3.73	7.46	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	4.03	8.06	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	4.15	8.30	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	4.66	9.32	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	2.60	10.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	2.50	10.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		12.00	4.00	3.40	40.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.60	14.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.58	14.32	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.56	14.24	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.54	14.16	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.52	14.08	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.50	14.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.48	13.92	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.46	13.84	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.44	13.76	
		2.00	5.30	5.30	10.60	
		2.00	4.72	4.72	9.44	
		2.00	4.43	4.43	8.87	
		2.00	4.14	4.14	8.29	
		2.00	3.86	3.86	7.71	
		2.00	3.57	3.57	7.13	
		2.00	3.28	3.28	6.56	
		12.00	1.80	1.80	21.60	
		12.00	1.80	1.80	21.60	
		4.00	1.54	1.54	6.17	
		4.00	1.29	1.29	5.14	
		4.00	1.03	1.03	4.11	
		5.00	0.77	0.77	3.86	
		2.00	2.95	2.95	5.90	



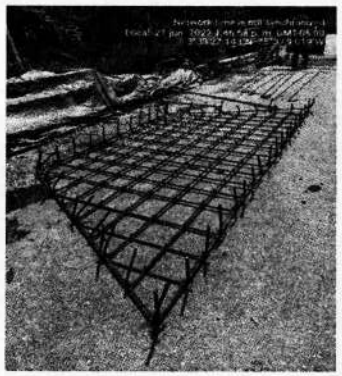




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL ENCOLE	K23+520	2.00	2.91	2.91	5.82	
		2.00	2.89	2.89	5.78	
		2.00	2.87	2.87	5.74	
		2.00	2.85	2.85	5.70	
		2.00	2.83	2.83	5.66	
		2.00	2.81	2.81	5.62	
		2.00	2.79	2.79	5.58	
		2.00	3.00	3.00	6.00	
		2.00	2.96	2.96	5.92	
		2.00	2.94	2.94	5.88	
		2.00	2.92	2.92	5.84	
		2.00	2.90	2.90	5.80	
		2.00	2.88	2.88	5.76	
		10.00	2.55	2.55	25.50	
		12.00	5.65	5.65	67.80	
		10.00	2.60	2.60	26.00	
		8.00	3.30	3.30	26.40	
		10.00	1.85	1.85	18.50	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE	K23+575	12.00	4.00	1.97	23.64	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		20.00	4.00	2.90	58.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		20.00	4.00	3.75	75.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		6.00	4.00	4.60	27.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		21.00	4.00	1.40	29.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		24.00	4.00	1.70	40.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	1.40	5.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	1.15	4.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	0.80	3.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	3.40	6.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	3.73	7.46	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	4.03	8.06	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	4.15	8.30	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		2.00	4.00	4.66	9.32	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	2.60	10.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	2.50	10.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		12.00	4.00	3.40	40.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.60	14.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.58	14.32	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.56	14.24	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.54	14.16	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.52	14.08	

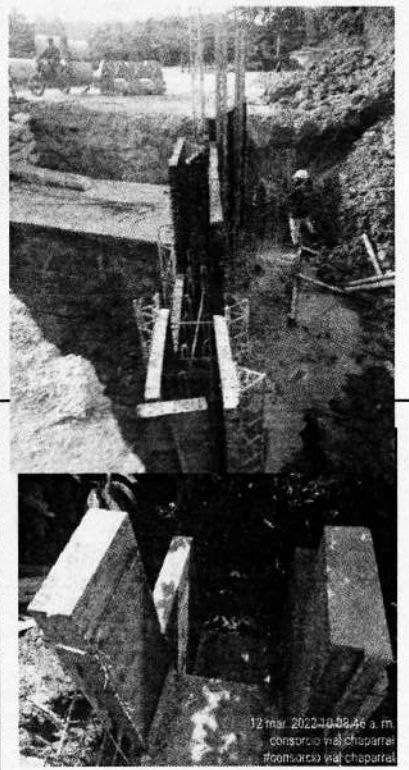

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.50	14.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.48	13.92	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.46	13.84	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE		4.00	4.00	3.44	13.76	
TRAMO 1 SECTOR EL HELECHAL ENCOLE	K23+575	2.00	4.00	5.35	10.70	
		2.00	4.00	4.62	9.23	
		2.00	4.00	4.25	8.50	
		2.00	4.00	3.88	7.77	
		2.00	4.00	3.52	7.03	
		2.00	4.00	3.15	6.30	
		2.00	4.00	2.78	5.57	
		9.00	4.00	1.80	16.20	
		9.00	4.00	1.80	16.20	
		4.00	4.00	1.58	6.30	
		4.00	4.00	1.35	5.40	
		4.00	4.00	1.13	4.50	
		5.00	4.00	0.90	4.50	
		2.00	4.00	3.25	6.50	
		2.00	4.00	3.16	6.32	
		2.00	4.00	3.11	6.23	
		2.00	4.00	3.07	6.14	
		2.00	4.00	3.02	6.05	
		2.00	4.00	2.98	5.95	
		2.00	4.00	2.93	5.86	
		2.00	4.00	2.89	5.77	
		2.00	4.00	3.25	6.50	
		2.00	4.00	3.15	6.30	
		2.00	4.00	3.10	6.20	
		2.00	4.00	3.05	6.10	
		2.00	4.00	3.00	6.00	
		2.00	4.00	2.95	5.90	
		10.00	4.00	2.58	25.75	
		12.00	4.00	5.45	65.40	
		10.00	4.00	2.38	23.75	
		6.00	4.00	3.25	19.50	
		10.00	4.00	1.80	18.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		116.00	4.00	2.60	301.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		116.00	4.00	2.40	278.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		48.00	4.00	7.90	379.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	5.40	10.80	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	5.15	10.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.90	9.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.65	9.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.40	8.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.15	8.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.90	7.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.65	7.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.40	6.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.15	6.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	2.65	5.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT	K23+665	26.00	4.00	1.40	36.40
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.95	3.90
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.75	3.50
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.50	3.00
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.30	2.60
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.10	2.20
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		11.00	4.00	2.20	24.20
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.70	6.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.60	6.40
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.50	6.00
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.40	5.60
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.20	4.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.00	4.00
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	0.80	3.20
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	0.60	2.40
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	0.40	1.60
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		116.00	4.00	2.60	301.60
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		116.00	4.00	2.40	278.40
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		48.00	4.00	7.90	379.20
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	5.40	10.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	5.15	10.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.90	9.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.65	9.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.40	8.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	4.15	8.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.90	7.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.65	7.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.40	6.80
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	3.15	6.30
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	2.65	5.30

REGISTRO FOTOGRAFICO



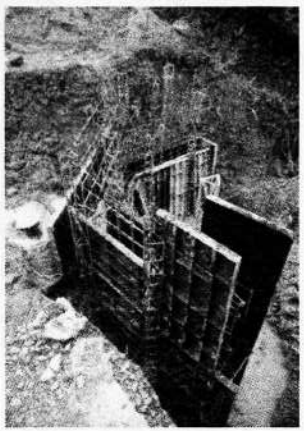

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT	K23+730	26.00	4.00	1.40	36.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.95	3.90	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.75	3.50	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.50	3.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.30	2.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		2.00	4.00	1.10	2.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		11.00	4.00	2.20	24.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.70	6.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.60	6.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.50	6.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.40	5.60	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.20	4.80	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	1.00	4.00	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	0.80	3.20	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	0.60	2.40	
TRAMO 1 - SECTOR EL HELECHAL DESCOLE BOX COULVERT		4.00	4.00	0.40	1.60	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		20.00	4.00	1.90	38.00	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	4.86	19.44	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	4.17	16.68	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	3.83	15.30	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	3.48	13.92	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	3.14	12.54	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		9.00	4.00	2.79	25.11	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		9.00	4.00	2.45	22.01	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.10	8.40	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	3.50	14.00	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	3.90	15.60	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	4.30	8.60	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		7.00	4.00	4.60	32.20	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.60	10.40	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.53	10.12	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		1.00	4.00	5.80	5.80	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		1.00	4.00	5.70	5.70	
ACERO SOLERA Y DENTELLON ALETAS DESCOLE		22.00	3.00	1.50	18.48	
ACERO ALETAS DESCOLE		12.00	4.00	2.55	30.60	
ACERO ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.25	9.00	
ACERO ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.15	8.60	
ACERO ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.05	8.20	
ACERO ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	1.95	7.80	







MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ACERO ALETAS DESCOLE	K39+995 OBRA HIDRAULICA 63A	4.00	4.00	1.85	7.40	
ACERO ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	1.75	3.50	
ACERO ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	1.65	3.30	
ACERO ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	1.55	3.10	
ACERO ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	1.45	2.90	
ALETAS Y CABEZOTE DESCOLE		4.00	4.00	5.80	23.20	
ALETAS Y CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	5.00	10.00	
ALETAS Y CABEZOTE DESCOLE		16.00	4.00	2.50	40.00	
ALETAS Y CABEZOTE DESCOLE		8.00	4.00	1.10	8.80	
ALETAS Y CABEZOTE DESCOLE		6.00	4.00	1.70	10.20	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	4.00	44.00	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	2.10	23.10	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	4.00	44.00	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	2.10	23.10	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	2.30	25.30	
HORIZONTAL CAJA		6.00	4.00	2.30	13.80	
HORIZONTAL CAJA		5.00	4.00	0.60	3.00	
HORIZONTAL CAJA		5.00	4.00	0.60	3.00	
HORIZONTAL CAJA		3.00	4.00	2.30	6.90	
HORIZONTAL CAJA		2.00	4.00	2.30	4.60	
VERTICAL		6.00	4.00	3.45	20.70	
VERTICAL		6.00	4.00	2.45	14.70	
VERTICAL		6.00	4.00	3.45	20.70	
VERTICAL		6.00	4.00	2.45	14.70	
TRANSVERSAL LOSA		11.00	4.00	2.30	25.30	
VERTICAL		11.00	4.00	4.00	44.00	
VERTICAL		11.00	4.00	3.00	33.00	
VERTICAL		5.00	4.00	3.30	16.50	
VERTICAL		5.00	4.00	2.30	11.50	
VERTICAL		8.00	4.00	2.20	17.60	
VERTICAL		8.00	4.00	1.20	9.60	
TRANSVERSAL LOSA		11.00	4.00	2.10	23.10	
BASTON 2.25 CUERPO BOX COULVERT		90.00	4.00	2.25	202.50	
FLEJE DE 7.95 CUERPO BOX COULVERT		25.00	4.00	7.95	198.75	
LONGITUDINAL DE 5.45 CUERPO BOX COULVERT		88.00	3.00	5.45	268.58	
SOLERA Y DENTELLON		20.00	4.00	3.75	75.00	
SOLERA Y DENTELLON		28.00	3.00	1.55	24.30	
SOLERA Y DENTELLON		12.00	3.00	0.90	6.05	
SOLERA Y DENTELLON		24.00	4.00	1.50	36.00	
SOLERA Y DENTELLON		5.00	4.00	2.00	10.00	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÒN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETAS DESCOLE		20.00	4.00	2.40	48.00	
ALETAS DESCOLE		28.00	4.00	2.00	56.00	
ALETAS DESCOLE		20.00	4.00	2.45	49.00	
ALETAS DESCOLE		28.00	3.00	2.00	31.36	
ALETAS DESCOLE		28.00	3.00	0.90	14.11	
ALETAS DESCOLE		12.00	4.00	1.90	22.80	
CABEZOTE DESCOLE		22.00	4.00	1.87	41.14	
CABEZOTE DESCOLE		4.00	4.00	1.61	6.44	
CABEZOTE DESCOLE		4.00	4.00	1.36	5.44	
CABEZOTE DESCOLE		4.00	4.00	0.84	3.36	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	2.50	5.00	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	2.90	5.80	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.10	6.20	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.40	6.80	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.80	7.60	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	4.00	8.00	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	4.38	8.76	
CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	4.90	9.80	
BASTON 2.25 CUERPO BOX COULVERT	K39+883 OBRA HIDRAULICA N° 63	24.00	4.00	1.62	38.88	
FLEJE DE 7.95 CUERPO BOX COULVERT		90.00	4.00	2.25	202.50	
LONGITUDINAL DE 5.45 CUERPO BOX COULVERT		25.00	4.00	7.95	198.75	
SOLERA Y DENTELLON		88.00	3.00	5.45	268.58	
SOLERA Y DENTELLON		20.00	4.00	3.75	75.00	
SOLERA Y DENTELLON		28.00	3.00	1.55	24.30	
SOLERA Y DENTELLON		12.00	3.00	0.90	6.05	
SOLERA Y DENTELLON		24.00	4.00	1.80	43.20	
ALETAS ENCOLE		5.00	4.00	2.20	11.00	
ALETAS ENCOLE		20.00	4.00	2.60	52.00	
ALETAS ENCOLE		28.00	4.00	2.20	61.60	
ALETAS ENCOLE		20.00	4.00	2.35	47.00	
ALETAS ENCOLE		28.00	3.00	2.10	32.93	
ALETAS ENCOLE		28.00	3.00	0.90	14.11	
CABEZOTE ENCOLE		12.00	4.00	1.90	22.80	
CABEZOTE ENCOLE		22.00	4.00	1.87	41.14	
CABEZOTE ENCOLE		4.00	4.00	1.61	6.44	
CABEZOTE ENCOLE		4.00	4.00	1.36	5.44	
CABEZOTE ENCOLE		4.00	4.00	0.84	3.36	
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	2.50	5.00	
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	2.90	5.80	
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	3.10	6.20	






MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	3.40	6.80
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	3.80	7.60
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	4.00	8.00
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	4.38	8.76
CABEZOTE ENCOLE		2.00	4.00	4.90	9.80
CABEZOTE ENCOLE		24.00	4.00	1.62	38.88
VERTICAL INTERNO VASTAGO	K39+833	85.00	5.00	2.82	373.93
VERTICAL INTERNO VASTAGO 2		85.00	5.00	2.12	281.11
VERTICAL EXTERNO VASTAGO		127.00	3.00	2.82	200.56
FLEJE VIGA GRANDE		148.00	5.00	4.50	1,038.96
FLEJE VIGA PEQUEÑO		85.00	4.00	2.92	248.20
LONGITUDINAL VIGA		20.00	5.00	12.00	374.40
LONGITDINAL VIGA		20.00	3.00	9.40	293.28
LONGITUDINAL VIGA 2		4.00	4.00	12.00	48.00
LONGITUDINAL VIGA 2		4.00	4.00	9.40	37.60
LONGITUDINAL VASTAGO		18.00	3.00	12.00	120.96
LONGITUDINAL VASTAGO		18.00	3.00	9.40	94.75
BASTON 2.25 CUERPO BOX COULVERT	K39+516 OBRA HIDRAULICA N° 62	117.00	4.00	2.25	263.25
FLEJE DE 7.95 CUERPO BOX COULVERT		28.00	4.00	7.95	222.60
LONGITUDINAL DE 5.45 CUERPO BOX COULVERT		88.00	3.00	7.45	367.14
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		20.00	4.00	5.44	108.80
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		28.00	3.00	1.60	25.09
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		12.00	3.00	0.90	6.05
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		34.00	4.00	1.50	51.00
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		2.00	4.00	6.61	13.22
ALETAS DESCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44
ALETAS DESCOLE		28.00	4.00	2.40	67.20
ALETAS DESCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44
ALETAS DESCOLE		28.00	3.00	2.40	37.63
CABEZOTE		28.00	4.00	0.90	14.11
CABEZOTE		12.00	4.00	1.90	12.77
BASTON 2.25 CUERPO BOX COULVERT		117.00	4.00	2.25	263.25
FLEJE DE 7.95 CUERPO BOX COULVERT		28.00	4.00	7.95	222.60
LONGITUDINAL DE 5.45 CUERPO BOX COULVERT		88.00	3.00	7.45	367.14
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		20.00	4.00	5.44	108.80
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		28.00	3.00	1.60	25.09
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		12.00	3.00	0.90	6.05
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		34.00	4.00	1.50	51.00
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	6.61	13.22
ALETAS ENCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44

REGISTRO FOTOGRAFICO

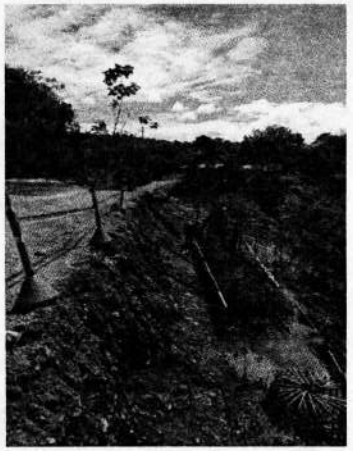



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETAS ENCOLE		28.00	4.00	2.40	67.20	
ALETAS ENCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44	
ALETAS ENCOLE		28.00	3.00	2.40	37.63	
CABEZOTE ENCOLE		28.00	4.00	0.90	14.11	
CABEZOTE ENCOLE		12.00	4.00	1.90	12.77	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 DESCOLE		2.00	4.00	4.40	8.80	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 DESCOLE		2.00	4.00	3.93	7.86	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 DESCOLE		2.00	4.00	3.69	7.39	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 DESCOLE		2.00	4.00	3.46	6.91	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 DESCOLE		2.00	4.00	3.22	6.44	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 DESCOLE		2.00	4.00	2.99	5.97	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 61 DESCOLE		2.00	4.00	2.75	5.50	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 61 DESCOLE		12.00	4.00	1.55	18.60	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 61 DESCOLE		12.00	4.00	1.55	18.60	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 61 DESCOLE		4.00	4.00	1.16	4.65	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 61 DESCOLE		4.00	4.00	0.78	3.10	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 61 DESCOLE		4.00	4.00	0.39	1.55	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.75	5.50	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.69	5.38	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.66	5.31	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.63	5.25	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.59	5.19	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.56	5.13	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.53	5.06	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	2.50	5.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 61 ENCOLE		2.00	4.00	2.80	5.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	2.70	5.40	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	2.65	5.30	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	2.60	5.20	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	2.55	5.10	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	2.50	5.00	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	2.13	21.25	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	4.48	44.80	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	1.86	18.55	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		8.00	4.00	2.85	22.80	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		10.00	4.00	1.40	14.00	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	6.25	12.50	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	5.47	10.93	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	5.07	10.15	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	4.68	9.36	








MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

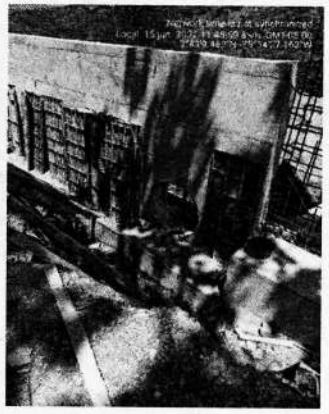LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE	K39+402 OBRA HIDRAULICA N° 61	2.00	4.00	4.29	8.58	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	3.90	7.79	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	3.50	7.01	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	3.11	6.22	
VARILLAS LONGITUDINALES 61 ENCOLE		2.00	4.00	2.72	5.44	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		12.00	4.00	1.80	21.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		12.00	4.00	1.80	21.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		4.00	4.00	1.60	6.40	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		4.00	4.00	1.40	5.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		4.00	4.00	1.20	4.80	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		5.00	4.00	1.00	5.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 61 ENCOLE		2.00	4.00	3.17	6.34	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.14	6.28	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.12	6.25	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.11	6.22	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.09	6.19	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.08	6.15	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.06	6.12	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.05	6.09	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.03	6.06	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.02	6.03	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.00	6.00	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.17	6.34	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.14	6.28	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.12	6.25	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.11	6.22	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		2.00	4.00	3.09	6.19	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		2.00	4.00	3.08	6.15	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		2.00	4.00	3.06	6.12	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		2.00	4.00	3.05	6.09	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE OH 61		2.00	4.00	3.03	6.06	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.02	6.03	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.00	6.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		10.00	4.00	2.88	28.75	
VARILLAS CABEZOTE VERTICALES CABEZOTE		14.00	4.00	6.28	87.92	
VARILLAS CABEZOTE VERTICALES CABEZOTE		10.00	4.00	2.91	29.05	
VARILLAS CABEZOTE VERTICALES CABEZOTE		8.00	4.00	2.85	22.80	
VARILLAS CABEZOTE VERTICALES CABEZOTE		10.00	4.00	1.40	14.00	
BASTON 2.25 CUERPO BOX COULVERT		135.00	4.00	2.25	303.75	
FLEJE DE 7.95 CUERPO BOX COULVERT		38.00	4.00	7.95	302.10	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
LONGITUDINAL DE 5.45 CUERPO BOX COULVERT	K39+206 OBRA HIDRAULICA N° 60	88.00	3.00	8.45	416.42
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		20.00	4.00	5.44	108.80
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		28.00	3.00	1.60	25.09
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		24.00	3.00	0.90	12.10
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		34.00	4.00	1.50	51.00
SOLERA Y DENTELLON DESCOLE		2.00	4.00	6.61	13.22
ALETAS DESCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44
ALETAS DESCOLE		28.00	4.00	2.40	67.20
ALETAS DESCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44
ALETAS DESCOLE		28.00	4.00	2.40	67.20
CABEZOTE DESCOLE		28.00	4.00	0.90	25.20
CABEZOTE DESCOLE		12.00	4.00	1.90	22.80
BASTON 2.25 CUERPO BOX COULVERT		135.00	4.00	2.25	303.75
FLEJE DE 7.95 CUERPO BOX COULVERT		38.00	4.00	7.95	302.10
LONGITUDINAL DE 5.45 CUERPO BOX COULVERT		88.00	3.00	8.45	416.42
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		20.00	4.00	5.44	108.80
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		28.00	3.00	1.60	25.09
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		24.00	3.00	0.90	12.10
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		34.00	4.00	1.50	51.00
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	6.61	13.22
ALETAS ENCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44
ALETAS ENCOLE		28.00	4.00	2.40	67.20
ALETAS ENCOLE		7.00	4.00	4.92	34.44
ALETAS ENCOLE		28.00	4.00	2.40	67.20
CABEZOTE ENCOLE		28.00	4.00	0.90	25.20
CABEZOTE ENCOLE		12.00	4.00	1.90	22.80
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	3.00	6.00
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.84	5.69
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.77	5.53
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.69	5.38
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.61	5.22
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.53	5.07
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.46	4.91
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.38	4.76
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.30	4.60
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		10.00	4.00	1.80	18.00
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		10.00	4.00	1.80	18.00
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		4.00	4.00	0.90	3.60
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.50	5.00
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.44	4.89

REGISTRO FOTOGRAFICO



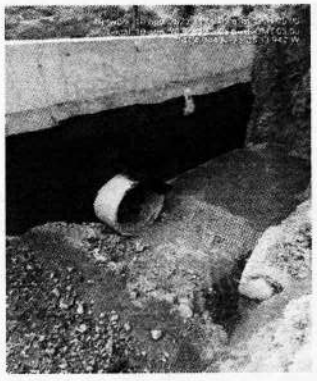


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.42	4.83	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59	K39+055 OBRA HIDRAULICA N° 59	2.00	4.00	2.39	4.78	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.36	4.72	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.33	4.67	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.31	4.61	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.28	4.56	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.50	5.00	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.43	4.85	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.39	4.78	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.31	4.63	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		2.00	4.00	2.28	4.55	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		10.00	4.00	2.50	25.00	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		6.00	4.00	5.40	32.40	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		10.00	4.00	2.40	24.00	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		12.00	4.00	2.60	31.20	
VARILLAS ALETAS ENCOLE OH 59		10.00	4.00	1.15	11.50	
"SOLERA Y DENTELLON" 1		20.00	4.00	1.90	38.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 2		4.00	4.00	1.70	6.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 3		4.00	4.00	1.50	6.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 4		4.00	4.00	1.30	5.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 5		4.00	4.00	1.10	4.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 6		4.00	4.00	0.90	3.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 7		2.00	4.00	2.30	4.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 8		2.00	4.00	2.70	5.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 9		2.00	4.00	3.10	6.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 10		2.00	4.00	3.50	7.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 11		2.00	4.00	3.90	7.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 12		2.00	4.00	4.30	8.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 13		7.00	4.00	4.60	32.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 14		4.00	4.00	2.60	10.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 15		4.00	4.00	2.53	10.12	
"SOLERA Y DENTELLON" 16		1.00	4.00	5.80	5.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 17		1.00	4.00	5.70	5.70	
"SOLERA Y DENTELLON" 18		22.00	3.00	1.50	18.48	
ALETA 1		12.00	4.00	3.00	36.00	
ALETA 2		4.00	4.00	2.70	10.80	
ALETA 3		4.00	4.00	2.60	10.40	
ALETA 4		4.00	4.00	2.50	10.00	
ALETA 5		4.00	4.00	2.40	9.60	



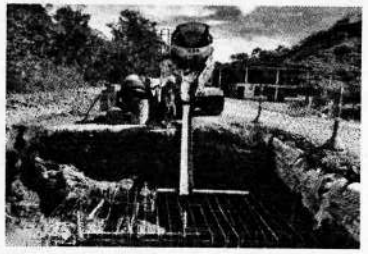

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETA 6	K38+943 OBRA HIDRAULICA N° 58	4.00	4.00	2.30	9.20	
ALETA 7		2.00	4.00	2.20	4.40	
ALETA 8		2.00	4.00	2.10	4.20	
ALETA 9		2.00	4.00	2.00	4.00	
ALETA 10		2.00	4.00	1.90	3.80	
CABEZOTE 1		8.00	4.00	2.00	16.00	
CABEZOTE 2		4.00	4.00	5.80	23.20	
CABEZOTE 3		16.00	4.00	2.50	40.00	
CABEZOTE 4		8.00	4.00	1.60	12.80	
CABEZOTE 5		4.00	4.00	1.20	4.80	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		20.00	4.00	2.50	50.00	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	2.30	9.20	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	2.10	8.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.90	7.60	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.70	6.80	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.50	6.00	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	2.50	5.00	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	2.70	5.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	2.90	5.80	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	3.10	6.20	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	3.30	6.60	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	3.50	7.00	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		7.00	4.00	3.70	25.90	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	3.90	15.60	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	4.10	16.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		1.00	4.00	4.30	4.30	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	5.70	11.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		22.00	3.00	1.50	18.48	
ALETAS ENCOLE		12.00	4.00	2.30	27.60	
ALETAS ENCOLE		8.00	4.00	2.25	18.00	
ALETAS ENCOLE		8.00	4.00	2.20	17.60	
ALETAS ENCOLE		8.00	4.00	2.15	17.20	
ALETAS ENCOLE		8.00	4.00	2.10	16.80	
ALETAS ENCOLE		8.00	4.00	2.05	16.40	
ALETAS ENCOLE		8.00	4.00	2.00	16.00	
					-	
CABEZOTE ENCOLE		8.00	4.00	3.00	24.00	
CABEZOTE ENCOLE		16.00	4.00	1.80	28.80	
CABEZOTE ENCOLE		8.00	4.00	1.60	12.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 1		20.00	4.00	1.90	38.00	








MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
"SOLERA Y DENTELLON" 2		4.00	4.00	1.70	6.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 3		4.00	4.00	1.50	6.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 4		4.00	4.00	1.30	5.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 5		4.00	4.00	1.10	4.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 6		4.00	4.00	0.90	3.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 7		2.00	4.00	2.30	4.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 8		2.00	4.00	2.70	5.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 9		2.00	4.00	3.10	6.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 10		2.00	4.00	3.50	7.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 11		2.00	4.00	3.90	7.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 12		2.00	4.00	4.30	8.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 13		7.00	4.00	4.60	32.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 14		4.00	4.00	2.60	10.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 15		4.00	4.00	2.53	10.12	
"SOLERA Y DENTELLON" 16		1.00	4.00	5.80	5.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 17		1.00	4.00	5.70	5.70	
"SOLERA Y DENTELLON" 18		22.00	3.00	1.50	18.48	
ALETA 1		12.00	4.00	2.20	26.40	
ALETA 2		4.00	4.00	1.95	7.80	
ALETA 3		4.00	4.00	1.85	7.40	
ALETA 4		4.00	4.00	1.70	6.80	
ALETA 5		4.00	4.00	1.65	6.60	
ALETA 6		4.00	4.00	1.60	6.40	
ALETA 7		2.00	4.00	1.55	3.10	
ALETA 8		2.00	4.00	1.50	3.00	
ALETA 9		2.00	4.00	1.45	2.90	
ALETA 10		2.00	4.00	1.40	2.80	
CABEZOTE 1		4.00	4.00	2.10	8.40	
CABEZOTE 2		8.00	4.00	0.70	5.60	
CABEZOTE 3		1.00	4.00	5.80	5.80	
CABEZOTE 4		1.00	4.00	5.70	5.70	
CABEZOTE 5	K38+916 OBRA HIDRAULICA N° 57	16.00	3.00	1.50	13.44	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		14.00	3.00	0.40	3.14	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		20.00	4.00	2.00	40.00	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.80	7.20	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.60	6.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.40	5.60	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.20	4.80	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	1.00	4.00	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	2.50	5.00	

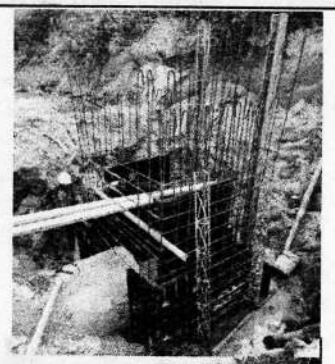






MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	2.90	5.80	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	3.30	6.60	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	3.70	7.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	3.90	7.80	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		2.00	4.00	4.20	8.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		7.00	4.00	4.50	31.50	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	4.80	19.20	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		4.00	4.00	5.10	20.40	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		1.00	4.00	5.30	5.30	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		1.00	4.00	5.30	5.30	
SOLERA Y DENTELLON ENCOLE		22.00	3.00	1.50	18.48	
ALETAS ENCOLE		12.00	4.00	2.40	28.80	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.75	11.00	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.65	10.60	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.55	10.20	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.45	9.80	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.40	9.60	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.35	9.40	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.30	9.20	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.25	9.00	
ALETAS ENCOLE		4.00	4.00	2.15	8.60	
CABEZOTE ENCOLE		4.00	4.00	3.30	13.20	
CABEZOTE ENCOLE		16.00	4.00	5.80	92.80	
CABEZOTE ENCOLE		8.00	4.00	1.95	15.60	
CABEZOTE ENCOLE		4.00	4.00	2.05	8.20	
CABEZOTE ENCOLE					-	
"SOLERA Y DENTELLON" 1 DESCOLE		7.00	4.00	1.47	10.29	
"SOLERA Y DENTELLON" 2 DESCOLE		7.00	4.00	1.47	10.29	
"SOLERA Y DENTELLON" 3 DESCOLE		11.00	4.00	3.42	37.62	
"SOLERA Y DENTELLON" 4 DESCOLE		8.00	4.00	1.90	15.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 5 DESCOLE		7.00	4.00	1.47	10.29	
"SOLERA Y DENTELLON" 6 DESCOLE		2.00	4.00	2.90	5.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 7 DESCOLE		7.00	4.00	1.47	10.29	
"SOLERA Y DENTELLON" 8 DESCOLE		7.00	4.00	1.47	10.29	
"SOLERA Y DENTELLON" 9 DESCOLE		11.00	4.00	3.42	37.62	
"SOLERA Y DENTELLON" 10 DESCOLE		8.00	4.00	1.90	15.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 11 DESCOLE		7.00	4.00	1.47	10.29	
"SOLERA Y DENTELLON" 12 DESCOLE		2.00	4.00	2.90	5.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 13 DESCOLE		22.00	4.00	1.50	33.00	
SOLERA Y DENTELLON 14 DESCOLE		2.00	4.00	4.60	9.20	



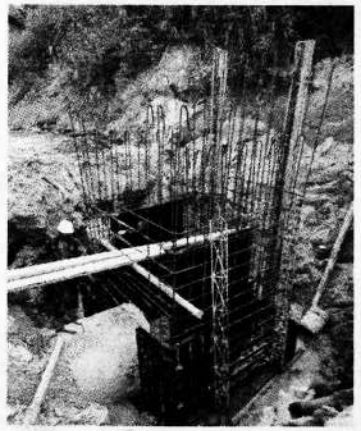




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETAS Y CABEZOTE 1 DESCOLE	K38+805 OBRA HIDRAULICA N° 56A	36.00	4.00	2.90	104.40	
ALETAS Y CABEZOTE 2 DESCOLE		8.00	4.00	3.20	25.60	
ALETAS Y CABEZOTE 3 DESCOLE		12.00	4.00	1.70	20.40	
ALETAS Y CABEZOTE 4 DESCOLE		6.00	4.00	4.18	25.08	
ALETAS Y CABEZOTE 5 DESCOLE		9.00	4.00	5.95	53.55	
ALETAS Y CABEZOTE 6 DESCOLE		4.00	4.00	2.20	8.80	
ALETAS Y CABEZOTE 7 DESCOLE		16.00	4.00	2.65	42.40	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 1		11.00	4.00	4.00	44.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 2		11.00	4.00	2.10	23.10	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 3		11.00	4.00	4.00	44.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 4		11.00	4.00	2.10	23.10	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 5		11.00	4.00	2.30	25.30	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 6		6.00	4.00	2.30	13.80	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 7		5.00	4.00	0.60	3.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 8		5.00	4.00	0.60	3.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 9		3.00	4.00	2.30	6.90	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 10		2.00	4.00	2.30	4.60	
VERTICAL CAJA ENCOLE 1		5.00	4.00	3.45	17.25	
VERTICAL CAJA ENCOLE 2		5.00	4.00	2.45	12.25	
VERTICAL CAJA ENCOLE 3		5.00	4.00	3.45	17.25	
VERTICAL CAJA ENCOLE 4		5.00	4.00	2.45	12.25	
TRANSVERSAL LOSA		11.00	4.00	2.30	25.30	
VERTICAL CAJA ENCOLE 5		11.00	4.00	4.00	44.00	
VERTICAL CAJA ENCOLE 6		11.00	4.00	3.00	33.00	
VERTICAL CAJA ENCOLE 7		4.00	4.00	3.30	13.20	
VERTICAL CAJA ENCOLE 8		4.00	4.00	2.30	9.20	
VERTICAL CAJA ENCOLE 9		7.00	4.00	2.20	15.40	
VERTICAL CAJA ENCOLE 10		7.00	4.00	1.20	8.40	
TRANSVERSAL LOSA ENCOLE 2		11.00	4.00	2.10	23.10	
ZARPA DESCOLE 1		19.00	4.00	4.20	79.80	
ZARPA DESCOLE 2		40.00	4.00	1.80	72.00	
ZARPA DESCOLE 3		20.00	4.00	1.50	30.00	
ZARPA DESCOLE 4		28.00	4.00	2.60	72.80	
VASTAGO DESCOLE 1		10.00	4.00	4.30	43.00	
VASTAGO DESCOLE 2		10.00	4.00	2.50	25.00	
VASTAGO DESCOLE 3		10.00	4.00	1.10	11.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 1		11.00	4.00	4.00	44.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 2		11.00	4.00	2.10	23.10	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 3		11.00	4.00	4.00	44.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 4		11.00	4.00	2.10	23.10	



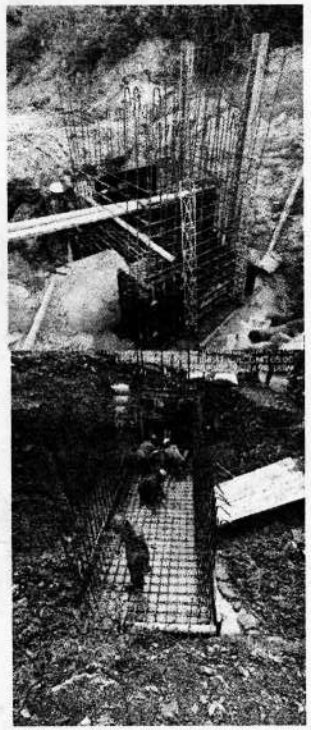




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 5	K38+654 OBRA HIDRAULICA N° 56	11.00	4.00	2.30	25.30	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 6		6.00	4.00	2.30	13.80	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 7		5.00	4.00	0.60	3.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 8		5.00	4.00	0.60	3.00	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 9		3.00	4.00	2.30	6.90	
HORIZONTAL CAJA ENCOLE 10		2.00	4.00	2.30	4.60	
VERTICAL CAJA ENCOLE 1		5.00	4.00	3.45	17.25	
VERTICAL CAJA ENCOLE 2		5.00	4.00	2.45	12.25	
VERTICAL CAJA ENCOLE 3		5.00	4.00	3.45	17.25	
VERTICAL CAJA ENCOLE 4		5.00	4.00	2.45	12.25	
TRANSVERSAL LOSA		11.00	4.00	2.30	25.30	
VERTICAL CAJA ENCOLE 5		11.00	4.00	4.00	44.00	
VERTICAL CAJA ENCOLE 6		11.00	4.00	3.00	33.00	
VERTICAL CAJA ENCOLE 7		4.00	4.00	3.30	13.20	
VERTICAL CAJA ENCOLE 8		4.00	4.00	2.30	9.20	
VERTICAL CAJA ENCOLE 9		7.00	4.00	2.20	15.40	
VERTICAL CAJA ENCOLE 10		7.00	4.00	1.20	8.40	
TRANSVERSAL LOSA ENCOLE 2		11.00	4.00	2.10	23.10	
ZARPA DESCOLE 1		30.00	4.00	3.29	98.70	
ZARPA DESCOLE 2		24.00	4.00	3.24	77.76	
ZARPA DESCOLE 3		34.00	3.00	4.90	93.30	
ZARPA DESCOLE 4		60.00	4.00	3.86	231.60	
VASTAGO DESCOLE 1		46.00	4.00	1.68	77.28	
VASTAGO DESCOLE 2		60.00	3.00	6.90	231.84	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	1.90	20.90	
HORIZONTAL CAJA		10.00	4.00	2.30	23.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	5.00	30.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.10	24.60	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	5.50	60.50	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	4.70	51.70	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	4.66	55.92	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	3.70	44.40	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	4.30	43.00	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	2.30	23.00	
VERTICAL		16.00	4.00	2.40	38.40	
VERTICAL		10.00	4.00	3.20	32.00	
VERTICAL		10.00	4.00	2.40	24.00	
VERTICAL		10.00	4.00	2.00	20.00	
TRANSVERSAL LOSA		8.00	4.00	2.30	18.40	
ACERO DISIPADOR 1		8.00	3.00	2.20	9.86	

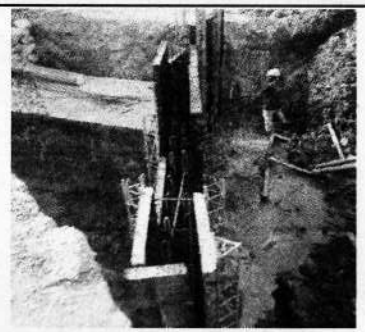



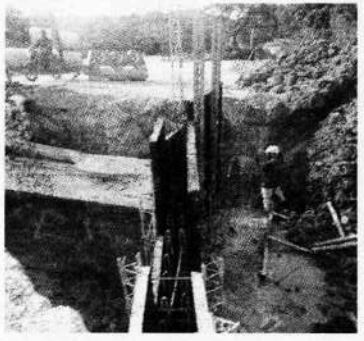


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ACERO DISIPADOR 2	K38+557 OBRA HIDRAULICA N° 55	30.00	3.00	1.30	21.84	
ACERO DISIPADOR 3		2.00	4.00	2.30	4.60	
ACERO DISIPADOR 4		20.00	4.00	0.60	12.00	
ACERO DISIPADOR 5		20.00	4.00	1.60	32.00	
ACERO DISIPADOR 6		14.00	4.00	2.20	30.80	
ACERO DISIPADOR 7		12.00	4.00	1.80	21.60	
ACERO DISIPADOR 8		24.00	3.00	1.90	25.54	
ACERO DISIPADOR 9		60.00	3.00	1.60	53.76	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	1.90	20.90	
HORIZONTAL CAJA		10.00	4.00	2.30	23.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.50	27.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	3.60	21.60	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	5.15	56.65	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	4.30	47.30	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	4.10	49.20	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	3.20	38.40	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	3.80	38.00	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	2.10	21.00	
VERTICAL		16.00	4.00	2.30	36.80	
VERTICAL		10.00	4.00	3.10	31.00	
VERTICAL		10.00	4.00	2.30	23.00	
VERTICAL		10.00	4.00	1.90	19.00	
TRANSVERSAL LOSA		8.00	4.00	2.20	17.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 1 DESCOLE		20.00	4.00	1.90	38.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 2 DESCOLE		4.00	4.00	1.70	6.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 3 DESCOLE		4.00	4.00	1.50	6.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 4 DESCOLE		4.00	4.00	1.30	5.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 5 DESCOLE		4.00	4.00	1.10	4.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 6 DESCOLE		4.00	4.00	0.90	3.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 7 DESCOLE		2.00	4.00	2.30	4.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 8 DESCOLE		2.00	4.00	2.70	5.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 9 DESCOLE		2.00	4.00	3.10	6.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 10 DESCOLE		2.00	4.00	3.50	7.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 11 DESCOLE		2.00	4.00	3.90	7.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 12 DESCOLE		2.00	4.00	4.30	8.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 13 DESCOLE		7.00	4.00	4.60	32.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 14 DESCOLE		4.00	4.00	2.60	10.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 15 DESCOLE		4.00	4.00	2.53	10.12	
"SOLERA Y DENTELLON" 16 DESCOLE		1.00	4.00	5.80	5.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 17 DESCOLE		1.00	4.00	5.70	5.70	



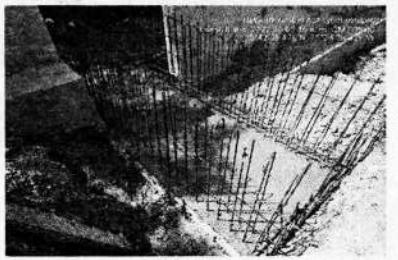

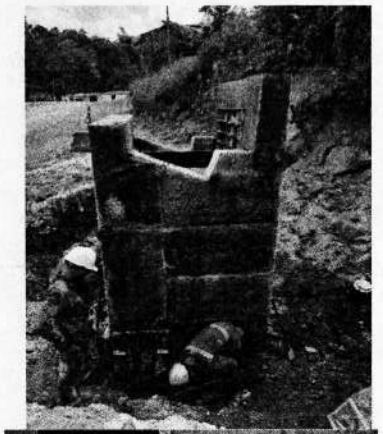



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
"SOLERA Y DENTELLON" 18 DESCOLE	K38+496 OBRA HIDRAULICA N° 54	22.00	3.00	1.50	18.48
ALETAS Y CABEZOTE 1 DESCOLE		12.00	4.00	2.55	30.60
ALETAS Y CABEZOTE 2 DESCOLE		4.00	4.00	2.25	9.00
ALETAS Y CABEZOTE 3 DESCOLE		4.00	4.00	2.15	8.60
ALETAS Y CABEZOTE 4 DESCOLE		4.00	4.00	2.05	8.20
ALETAS Y CABEZOTE 5 DESCOLE		4.00	4.00	1.95	7.80
ALETAS Y CABEZOTE 6 DESCOLE		4.00	4.00	1.85	7.40
ALETAS Y CABEZOTE 7 DESCOLE		2.00	4.00	1.75	3.50
ALETAS Y CABEZOTE 8 DESCOLE		2.00	4.00	1.65	3.30
ALETAS Y CABEZOTE 9 DESCOLE		2.00	4.00	1.55	3.10
ALETAS Y CABEZOTE 10 DESCOLE		2.00	4.00	1.45	2.90
ALETAS Y CABEZOTE 11 DESCOLE		4.00	4.00	5.80	23.20
ALETAS Y CABEZOTE 12 DESCOLE		2.00	4.00	5.00	10.00
ALETAS Y CABEZOTE 13 DESCOLE		16.00	4.00	2.50	40.00
ALETAS Y CABEZOTE 14 DESCOLE		8.00	4.00	1.10	8.80
ALETAS Y CABEZOTE 15 DESCOLE		6.00	4.00	1.70	10.20
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	1.90	20.90
HORIZONTAL CAJA		10.00	4.00	2.30	23.00
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.70	28.20
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	3.80	22.80
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	5.35	58.85
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	4.40	48.40
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	4.33	51.96
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	3.40	40.80
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	4.00	40.00
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	2.10	21.00
VERTICAL		16.00	4.00	2.30	36.80
VERTICAL		10.00	4.00	3.10	31.00
VERTICAL		10.00	4.00	2.30	23.00
VERTICAL		10.00	4.00	1.90	19.00
TRANSVERSAL LOSA		8.00	4.00	2.20	17.60
"SOLERA Y DENTELLON" 1 DESCOLE		42.00	4.00	2.30	96.60
"SOLERA Y DENTELLON" 2 DESCOLE		4.00	4.00	2.70	10.80
"SOLERA Y DENTELLON" 3 DESCOLE		4.00	4.00	2.60	10.40
"SOLERA Y DENTELLON" 4 DESCOLE		10.00	3.00	1.50	8.40
"SOLERA Y DENTELLON" 5 DESCOLE		12.00	4.00	2.60	31.20
"SOLERA Y DENTELLON" 6 DESCOLE		4.00	4.00	2.30	9.20
"SOLERA Y DENTELLON" 7 DESCOLE		4.00	4.00	2.20	8.80
"SOLERA Y DENTELLON" 8 DESCOLE		4.00	4.00	2.10	8.40
"SOLERA Y DENTELLON" 9 DESCOLE		4.00	4.00	2.00	8.00

REGISTRO FOTOGRAFICO



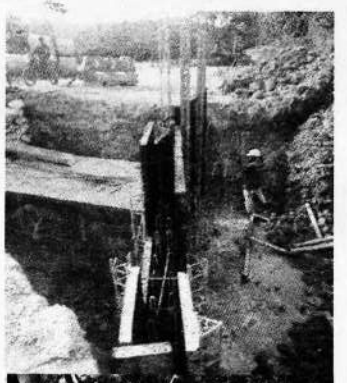





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
"SOLERA Y DENTELLON" 10 DESCOLE	K38+433 OBRA HIDRAULICA N° 53A	4.00	4.00	1.90	7.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 11 DESCOLE		2.00	4.00	1.80	3.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 12 DESCOLE		2.00	4.00	1.70	3.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 13 DESCOLE		2.00	4.00	1.60	3.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 14 DESCOLE		2.00	4.00	1.50	3.00	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	1.90	20.90	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	2.30	25.30	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.00	24.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	3.10	10.42	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	4.65	51.15	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	3.70	40.70	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	3.65	43.80	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	2.70	32.40	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	4.00	40.00	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	2.10	21.00	
VERTICAL		16.00	4.00	2.30	36.80	
VERTICAL		10.00	4.00	3.10	31.00	
VERTICAL		10.00	4.00	2.30	23.00	
VERTICAL		10.00	4.00	1.90	19.00	
TRANSVERSAL LOSA		8.00	4.00	1.40	11.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 1 DESCOLE		20.00	4.00	1.90	38.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 2 DESCOLE		4.00	4.00	1.70	6.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 3 DESCOLE		4.00	4.00	1.50	6.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 4 DESCOLE		4.00	4.00	1.30	5.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 5 DESCOLE		4.00	4.00	1.10	4.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 6 DESCOLE		4.00	4.00	0.90	3.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 7 DESCOLE		2.00	4.00	2.30	4.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 8 DESCOLE		2.00	4.00	2.70	5.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 9 DESCOLE		2.00	4.00	3.10	6.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 10 DESCOLE		2.00	4.00	3.50	7.00	
"SOLERA Y DENTELLON" 11 DESCOLE		2.00	4.00	3.90	7.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 12 DESCOLE		2.00	4.00	4.30	8.60	
"SOLERA Y DENTELLON" 13 DESCOLE		7.00	4.00	4.60	32.20	
"SOLERA Y DENTELLON" 14 DESCOLE		4.00	4.00	2.60	10.40	
"SOLERA Y DENTELLON" 15 DESCOLE		4.00	4.00	2.53	10.12	
"SOLERA Y DENTELLON" 16 DESCOLE		1.00	4.00	5.80	5.80	
"SOLERA Y DENTELLON" 17 DESCOLE		1.00	4.00	5.70	5.70	
"SOLERA Y DENTELLON" 18 DESCOLE		22.00	3.00	1.50	18.48	
ALETAS Y CABEZOTE 1 DESCOLE		12.00	4.00	2.60	31.20	
ALETAS Y CABEZOTE 2 DESCOLE		4.00	4.00	2.30	9.20	

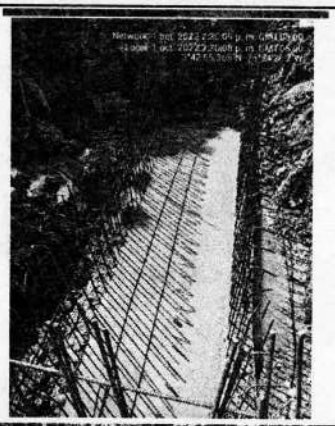

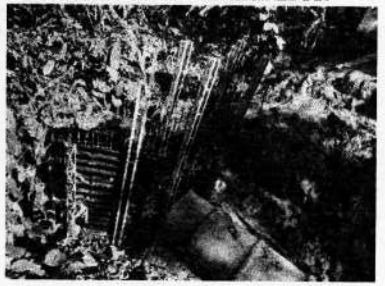




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETAS Y CABEZOTE 3 DESCOLE	K38+285 OBRA HIDRAULICA N° 53	4.00	4.00	2.20	8.80	
ALETAS Y CABEZOTE 4 DESCOLE		4.00	4.00	2.10	8.40	
ALETAS Y CABEZOTE 5 DESCOLE		4.00	4.00	2.00	8.00	
ALETAS Y CABEZOTE 6 DESCOLE		4.00	4.00	1.90	7.60	
ALETAS Y CABEZOTE 7 DESCOLE		4.00	4.00	1.80	7.20	
ALETAS Y CABEZOTE 8 DESCOLE		4.00	4.00	1.70	6.80	
ALETAS Y CABEZOTE 9 DESCOLE		4.00	4.00	1.60	6.40	
ALETAS Y CABEZOTE 10 DESCOLE		4.00	4.00	1.50	6.00	
ALETAS Y CABEZOTE 11 DESCOLE		8.00	4.00	2.00	16.00	
ALETAS Y CABEZOTE 12 DESCOLE		4.00	4.00	5.80	23.20	
ALETAS Y CABEZOTE 13 DESCOLE		16.00	4.00	2.50	40.00	
ALETAS Y CABEZOTE 14 DESCOLE		8.00	4.00	1.60	12.80	
ALETAS Y CABEZOTE 15 DESCOLE		4.00	4.00	1.20	4.80	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	1.90	20.90	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	2.30	25.30	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.00	24.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	2.70	16.20	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	4.35	47.85	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	3.40	37.40	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	3.35	40.20	
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	2.40	28.80	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	3.70	37.00	
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	1.90	19.00	
VERTICAL		16.00	4.00	2.10	33.60	
VERTICAL		10.00	4.00	2.90	29.00	
VERTICAL		10.00	4.00	2.10	21.00	
VERTICAL		10.00	4.00	1.70	17.00	
TRANSVERSAL LOSA		8.00	4.00	1.40	11.20	
FLEJE PARRILLA SUPERIOR DESCOLE		30.00	4.00	3.29	98.70	
FLEJE PARRILLA INFERIOR DESCOLE		24.00	4.00	3.24	77.76	
BASTONES LONGITUDINALES DESCOLE		34.00	4.00	4.90	166.60	
MURO Y VASTAGO DENTELLON DESCOLE		60.00	4.00	3.86	231.60	
MURO Y VASTAGO DENTELLON DESCOLE		46.00	4.00	1.68	77.28	
MURO Y VASTAGO DENTELLON DESCOLE		60.00	3.00	6.90	231.84	
HORIZONTAL CAJA		11.00	4.00	1.90	20.90	
HORIZONTAL CAJA		10.00	4.00	2.30	23.00	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.90	29.40	
VERTICAL CAJA		6.00	4.00	4.00	24.00	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	5.55	61.05	
VERTICAL CAJA		11.00	4.00	4.60	50.60	








MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
VERTICAL CAJA	K38+216 OBRA HIDRAULICA N° 52	12.00	4.00	4.43	53.16
VERTICAL CAJA		12.00	4.00	3.60	43.20
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	4.10	41.00
VERTICAL CAJA		10.00	4.00	2.30	23.00
VERTICAL		16.00	4.00	2.30	36.80
VERTICAL		10.00	4.00	3.10	31.00
VERTICAL		10.00	4.00	2.30	23.00
VERTICAL		10.00	4.00	1.90	19.00
TRANSVERSAL LOSA		8.00	4.00	2.20	17.60
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		16.00	4.00	3.60	57.60
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		16.00	4.00	4.60	73.60
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		16.00	4.00	2.10	33.60
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		16.00	4.00	2.10	33.60
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		16.00	4.00	2.30	36.80
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		16.00	4.00	2.30	36.80
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		11.00	4.00	4.57	50.27
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		11.00	4.00	3.67	40.37
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		11.00	4.00	4.32	47.52
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		11.00	4.00	5.77	63.47
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 52 REPOSICION		11.00	4.00	2.10	23.10
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	5.49	10.98
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	4.85	9.70
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	4.53	9.07
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	4.21	8.43
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.90	7.79
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.58	7.15
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.26	6.51
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.94	5.88
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.62	5.24
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.30	4.60
ALETAS ENCOLE OH 50		10.00	4.00	2.10	21.00
ALETAS ENCOLE OH 50		10.00	4.00	2.10	21.00
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	1.84	7.35
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	1.58	6.30
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	1.31	5.25
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	1.05	4.20
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	0.79	3.15
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	0.53	2.10
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.27	6.54
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.20	6.40

REGISTRO FOTOGRAFICO

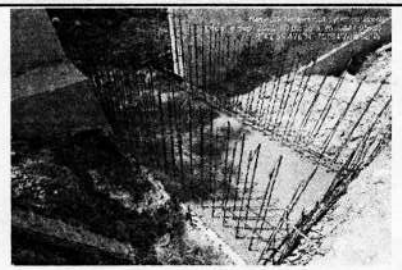

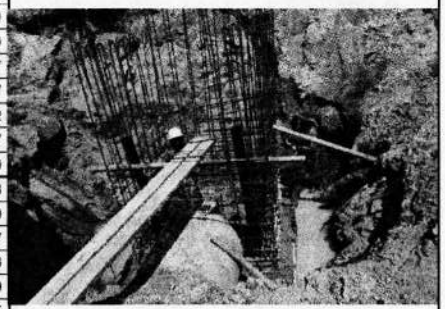

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ALETAS ENCOLE OH 50	K37+640 OBRA HIDRAULICA N° 50	2.00	4.00	3.17	6.33	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.13	6.26	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.10	6.19	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.06	6.13	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.03	6.06	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.99	5.99	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.96	5.92	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.92	5.85	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.89	5.78	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.27	6.54	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.22	6.45	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.20	6.40	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.18	6.35	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.15	6.30	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.13	6.26	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.10	6.21	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.08	6.16	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.06	6.11	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.03	6.07	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	3.01	6.02	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.99	5.97	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.97	5.94	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.95	5.90	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.93	5.86	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.91	5.82	
ALETAS ENCOLE OH 50		2.00	4.00	2.89	5.78	
ALETAS ENCOLE OH 50		10.00	4.00	2.95	29.45	
ALETAS ENCOLE OH 50		12.00	4.00	7.26	87.12	
ALETAS ENCOLE OH 50		10.00	4.00	3.82	38.15	
ALETAS ENCOLE OH 50		10.00	4.00	1.84	18.40	
ALETAS ENCOLE OH 50		10.00	4.00	0.39	3.90	
ALETAS ENCOLE OH 50		4.00	4.00	0.26	1.05	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH DESCOLE 50		58.00	4.00	2.25	130.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT DESCOLE OH 50		58.00	4.00	2.25	130.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT DESCOLE OH 50		58.00	4.00	7.95	461.10	
CUERPO DEL BOX COULVERT DESCOLE OH 50		46.00	4.00	2.25	103.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT DESCOLE OH 50		46.00	4.00	2.25	103.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT DESCOLE OH 50		88.00	3.00	6.50	320.32	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	3.00	6.00	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.84	5.69	




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.77	5.53	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.69	5.38	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.61	5.22	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.53	5.07	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.46	4.91	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	2.38	4.76	
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 49		2.00	4.00	1.80	3.60	
VARILLAS TRANSVERSALES DESCOLE OH 49		10.00	4.00	1.80	18.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.50	5.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.44	4.89	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.42	4.83	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.39	4.78	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.36	4.72	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.33	4.67	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.31	4.61	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	2.28	4.56	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.50	5.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.43	4.85	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.39	4.78	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2	K37+595 OBRA HIDRAULICA N° 49	2.00	4.00	2.31	4.63	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.28	4.55	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE OH 49		10.00	4.00	2.50	25.00	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE OH 49		6.00	4.00	5.40	32.40	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE OH 49		10.00	4.00	2.40	24.00	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE OH 49		12.00	4.00	2.60	31.20	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE OH 49		10.00	4.00	1.15	11.50	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE OH 49		9.00	4.00	3.80	34.20	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 49		9.00	4.00	4.80	43.20	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 49		9.00	4.00	2.30	20.70	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 49		9.00	4.00	2.30	20.70	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 49		9.00	4.00	2.30	20.70	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 49		9.00	4.00	2.30	20.70	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 49		8.00	4.00	3.08	24.64	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 49		8.00	4.00	3.58	28.64	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 49		8.00	4.00	2.08	16.64	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 49		8.00	4.00	2.08	16.64	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 49		8.00	4.00	2.30	18.40	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 49		11.00	4.00	4.02	44.22	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 49		11.00	4.00	3.02	33.22	

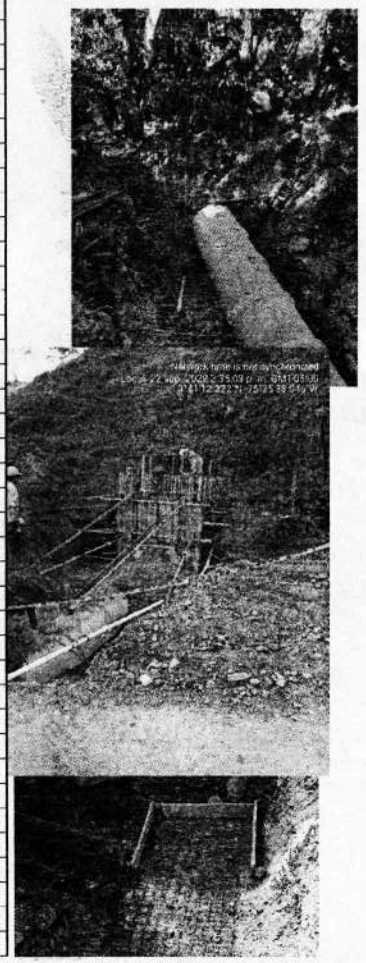

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 49		11.00	4.00	2.41	26.51
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 49		11.00	4.00	3.96	43.56
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 49		11.00	4.00	2.30	25.30
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	3.90	7.80
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	3.55	7.10
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	3.37	6.75
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	3.20	6.40
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	3.02	6.04
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	2.85	5.69
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	2.67	5.34
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	2.50	4.99
VARILLAS LONGITUDINALES DESCOLE OH 48		2.00	4.00	2.32	4.64
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		10.00	4.00	1.80	18.00
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		10.00	4.00	1.80	18.00
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		4.00	4.00	1.35	5.40
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		4.00	4.00	0.90	3.60
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		5.00	4.00	0.45	2.25
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.05	6.10
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.00	5.99
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.97	5.94
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.94	5.88
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.91	5.83
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.89	5.77
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	2.86	5.72
VARILLAS VERTICALES ALETA 2	K37+495 OBRA HIDRAULICA N° 48	2.00	4.00	2.83	5.66
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE OH 48		10.00	4.00	2.31	23.10
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE OH 48		12.00	4.00	5.14	61.68
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE OH 48		10.00	4.00	2.33	23.30
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE OH 48		10.00	4.00	3.35	33.50
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE OH 48		10.00	4.00	1.90	19.00
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 48		11.00	4.00	3.82	42.02
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 48		11.00	4.00	4.82	53.02
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 48		11.00	4.00	2.30	25.30
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 48		11.00	4.00	2.30	25.30
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 48		11.00	4.00	2.32	25.52
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE OH 48		11.00	4.00	2.32	25.52
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 48		8.00	4.00	3.41	27.28
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 48		8.00	4.00	3.91	31.28
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 48		8.00	4.00	2.40	19.20
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 48		8.00	4.00	2.40	19.20

REGISTRO FOTOGRAFICO



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE OH 48		8.00	4.00	2.32	18.56	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 48		12.00	4.00	4.60	55.20	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 48		12.00	4.00	3.60	43.20	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 48		12.00	4.00	2.70	32.40	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 48		12.00	4.00	4.25	51.00	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE OH 48		12.00	4.00	2.30	27.60	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	3.90	7.80	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	3.49	6.98	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	3.28	6.56	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	3.08	6.15	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	2.87	5.74	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	2.66	5.33	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	2.46	4.91	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	2.25	4.50	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		10.00	4.00	1.72	17.20	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		10.00	4.00	1.72	17.20	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		4.00	4.00	1.29	5.16	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		4.00	4.00	0.86	3.44	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		4.00	4.00	0.43	1.72	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.50	7.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.42	6.84	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.38	6.75	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.34	6.67	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.29	6.59	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.25	6.51	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.21	6.42	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE		2.00	4.00	3.17	6.34	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.50	7.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.41	6.82	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.36	6.72	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.32	6.63	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.27	6.54	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE		2.00	4.00	3.22	6.45	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	2.38	23.75	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		16.00	4.00	5.15	82.40	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	2.28	22.75	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		10.00	4.00	3.80	38.00	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		10.00	4.00	2.35	23.50	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	4.30	8.60	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	3.94	7.87	




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	3.75	7.51	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE	K37+427 OBRA HIDRAULICA 47	2.00	4.00	3.57	7.15	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	3.39	6.78	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	3.21	6.42	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	3.03	6.05	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.85	5.69	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.66	5.33	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.48	4.96	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.30	4.60	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		10.00	4.00	2.20	22.00	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		10.00	4.00	2.20	22.00	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.76	7.04	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.32	5.28	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.88	3.52	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.44	1.76	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.00	6.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.94	5.88	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.91	5.81	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.88	5.75	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.84	5.69	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.81	5.63	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.78	5.56	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.75	5.50	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.72	5.44	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.00	6.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.96	5.91	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.93	5.87	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.91	5.82	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.89	5.78	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.87	5.73	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.84	5.69	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.82	5.64	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.80	5.60	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	2.53	25.25	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		12.00	4.00	5.55	66.60	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 DESCOLE		10.00	4.00	2.53	25.25	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		10.00	4.00	3.88	38.80	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		10.00	4.00	2.43	24.30	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	4.45	8.90	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE		2.00	4.00	3.95	7.89	

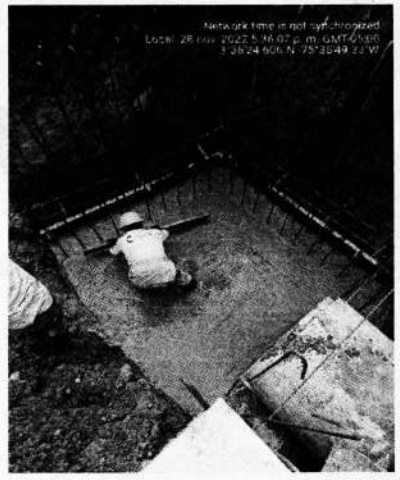

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA		CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE			2.00	4.00	3.69	7.39	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE			2.00	4.00	3.44	6.88	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE			2.00	4.00	3.19	6.38	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE			2.00	4.00	2.94	5.87	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE			2.00	4.00	2.68	5.37	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA DESCOLE			2.00	4.00	2.43	4.86	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE			11.00	4.00	1.74	19.14	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE			11.00	4.00	1.74	19.14	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE			4.00	4.00	1.39	5.57	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE			4.00	4.00	1.04	4.18	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE			4.00	4.00	0.70	2.78	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE			4.00	4.00	0.35	1.39	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.52	7.04	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.43	6.87	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.39	6.78	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.35	6.69	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.30	6.61	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.26	6.52	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.22	6.43	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.17	6.35	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.13	6.26	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 DESCOLE			2.00	4.00	3.52	7.04	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.42	6.85	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.37	6.75	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.33	6.65	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.28	6.55	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.23	6.46	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.18	6.36	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 DESCOLE			2.00	4.00	3.13	6.26	
VARILLAS TRANSVERSALES 1 Y 2			10.00	4.00	2.47	24.65	
VARILLAS TRANSVERSALES 1 Y 2			16.00	4.00	5.35	85.60	
VARILLAS TRANSVERSALES 1 Y 2			10.00	4.00	2.39	23.85	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE			12.00	4.00	3.82	45.84	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE			10.00	4.00	2.37	23.70	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE			2.00	4.00	5.35	10.70	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE			2.00	4.00	4.80	9.61	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE			2.00	4.00	4.53	9.06	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE			2.00	4.00	4.26	8.52	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE			2.00	4.00	3.99	7.97	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE	K37+348	OBRA HIDRAULICA	2.00	4.00	3.71	7.43	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE	46	2.00	4.00	3.44	6.88	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	3.17	6.34	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.90	5.79	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.62	5.25	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA ENCOLE		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		10.00	4.00	2.30	23.00	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		10.00	4.00	2.30	23.00	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	2.01	8.05	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.73	6.90	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.44	5.75	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.15	4.60	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.86	3.45	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.58	2.30	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.29	1.15	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.58	7.16	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.53	7.06	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.50	7.01	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.48	6.96	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.45	6.91	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.43	6.86	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.40	6.81	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.38	6.75	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.35	6.70	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.33	6.65	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.30	6.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.28	6.55	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.53	5.05	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.58	7.16	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.53	7.06	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.50	7.01	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.48	6.96	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.45	6.91	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.43	6.85	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.40	6.80	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.38	6.75	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.35	6.70	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.33	6.65	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 ENCOLE		10.00	4.00	3.68	36.75	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 ENCOLE		16.00	4.00	7.05	112.80	
VARILLA TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 ENCOLE		10.00	4.00	2.88	28.75	



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLA VERTICALES CABEZOTE		10.00	4.00	3.88	38.80	
VARILLA VERTICALES CABEZOTE		10.00	4.00	2.43	24.30	
VERTICAL INTERNA VASTAGO		22.00	5.00	3.00	102.96	
REFUERZO VERTICAL INTERNA VASTAGO		22.00	5.00	1.95	66.92	
VERTICAL EXTERNA VASTAGO		22.00	5.00	3.00	102.96	
ZARPA SUPERIOR TRASNVERSAL		27.00	3.00	2.49	37.65	
ZARPA INFERIOR TRANSVERSAL		22.00	3.00	2.49	30.68	
LONGITUDINAL ZARPA		22.00	3.00	5.40	66.53	
LONGITUDINAL VASTAGO		16.00	5.00	5.40	134.78	
FLEJES DENTELLON		27.00	4.00	1.53	41.31	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	3.40	34.00	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	4.40	44.00	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.10	21.00	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.10	21.00	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE	K37+316 OBRA HIDRAULICA N° 45	10.00	4.00	2.10	21.00	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.10	21.00	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		7.00	4.00	3.08	21.56	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		7.00	4.00	3.58	25.06	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		7.00	4.00	2.18	15.26	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		7.00	4.00	2.18	15.26	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		7.00	4.00	2.10	14.70	
VARILAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	3.08	30.80	
VARILAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.18	21.80	
VARILAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.48	24.80	
VARILAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	3.93	39.30	
VARILAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.10	21.00	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 42A		54.00	4.00	2.25	121.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 42A		54.00	4.00	2.25	121.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 42A		54.00	4.00	7.95	429.30	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 42A		43.00	4.00	2.25	96.75	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 42A		43.00	4.00	2.25	96.75	
CUERPO DEL BOX COULVERT		88.00	3.00	11.00	542.08	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		14.00	4.00	2.99	41.86	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		14.00	3.00	2.99	23.44	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		14.00	3.00	3.76	29.48	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		11.00	3.00	3.76	23.16	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		12.00	4.00	1.67	20.04	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		14.00	5.00	3.90	85.18	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		14.00	5.00	2.25	49.14	
MURO PANTALLA DESCOLE OH 42A		14.00	5.00	3.90	85.18	



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS LONGITUDINALES ALETA 42 A ENCOLE	K37+100 OBRA HIDRAULICA N° 42A	2.00	4.00	7.00	14.00	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETA 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.13	6.27	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETA 42 A ENCOLE		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETA 42 A ENCOLE		2.00	4.00	1.57	3.13	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETA 42 A ENCOLE		2.00	4.00	0.78	1.57	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 42 A ENCOLE		10.00	4.00	1.30	13.00	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 42 A ENCOLE		10.00	4.00	1.30	13.00	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 42 A ENCOLE		4.00	4.00	1.19	4.77	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 42 A ENCOLE		4.00	4.00	1.08	4.33	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 42 A ENCOLE		5.00	4.00	0.98	4.88	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 42 A ENCOLE		6.00	4.00	0.87	5.20	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.30	6.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.87	7.73	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.82	7.63	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.76	7.53	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.71	7.42	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.66	7.32	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.61	7.22	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.56	7.12	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.30	6.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.20	6.39	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.15	6.29	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.09	6.19	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	3.04	6.08	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 OH 42 A ENCOLE		2.00	4.00	2.99	5.98	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 OH 42 A ENCOLE		10.00	4.00	3.23	32.30	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 OH 42 A ENCOLE		10.00	4.00	6.98	69.80	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 OH 42 A ENCOLE		10.00	4.00	3.25	32.50	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 Y 2 OH 42 A ENCOLE		10.00	4.00	1.90	19.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 Y 2 OH 42 A ENCOLE		10.00	4.00	0.45	4.50	
ACERO DISIPADOR HUELLAS LONGITUDINAL		13.00	3.00	3.93	28.61	
ACERO DISIPADOR HUELLAS LONGITUDINAL		13.00	3.00	3.58	26.06	
ACERO DISIPADOR HUELLAS LONGITUDINAL		13.00	3.00	3.10	22.57	
ACERO TRANSCERSAL DISIPADOR		23.00	3.00	2.99	38.45	
ACERO TRANSCERSAL DISIPADOR		21.00	3.00	2.96	34.81	
ACERO TRANSCERSAL DISIPADOR		23.00	3.00	3.17	40.83	
ACERO TRANSVERSAL DISIPADOR		47.00	3.00	3.00	78.96	
ACERO LONGITUDINAL DISIPADOR		20.00	3.00	7.00	78.40	
ACERO HORIZONTAL CAJA ENCOLE OH 42		13.00	4.00	3.60	46.80	
ACERO HORIZONTAL CAJA ENCOLE OH 42		13.00	4.00	4.60	59.80	






MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
ACERO HORIZONTAL CAJA ENCOLE OH 42	K36+949 OBRA HIDRAULICA N° 42	13.00	4.00	2.10	27.30	
ACERO HORIZONTAL CAJA ENCOLE OH 42		13.00	4.00	2.10	27.30	
ACERO HORIZONTAL CAJA ENCOLE OH 42		13.00	4.00	2.30	29.90	
ACERO HORIZONTAL CAJA ENCOLE OH 42		13.00	4.00	2.30	29.90	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		11.00	4.00	3.48	38.28	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		11.00	4.00	4.08	44.88	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		11.00	4.00	2.83	31.13	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		11.00	4.00	2.83	31.13	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		11.00	4.00	2.30	25.30	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		10.00	4.00	4.55	45.50	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		10.00	4.00	3.80	38.00	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		10.00	4.00	3.13	31.30	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		10.00	4.00	4.38	43.80	
ACERO LATERAL CAJA ENCOLE OH 42		10.00	4.00	2.10	21.00	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 41A		54.00	4.00	2.25	121.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 41A		54.00	4.00	2.25	121.50	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 41A		54.00	4.00	7.95	429.30	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 41A		41.00	4.00	2.25	92.25	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 41A		41.00	4.00	2.25	92.25	
CUERPO DEL BOX COULVERT OH 41A		88.00	3.00	11.05	544.54	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	4.42	8.84	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.93	7.86	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.68	7.37	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.44	6.88	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.19	6.38	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	2.95	5.89	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	2.70	5.40	
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	2.46	4.91	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		10.00	4.00	1.95	19.50	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		10.00	4.00	1.95	19.50	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.63	6.50	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	1.30	5.20	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.98	3.90	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.65	2.60	
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA ENCOLE		4.00	4.00	0.33	1.30	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	4.59	9.18	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	4.37	8.73	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	4.15	8.29	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.93	7.85	

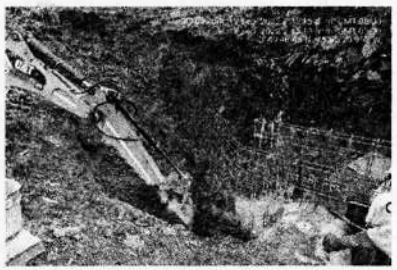



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.70	7.41	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.48	6.97	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.26	6.52	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	3.04	6.08	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1 ENCOLE		2.00	4.00	2.82	5.64	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.18	6.36	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.14	6.29	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.11	6.21	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.07	6.14	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.04	6.07	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	3.00	6.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.96	5.93	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.93	5.86	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.89	5.78	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.86	5.71	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2 ENCOLE		2.00	4.00	2.82	5.64	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 ENCOLE		10.00	4.00	2.63	26.25	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 ENCOLE	K36+874 OBRA HIDRAULICA N° 41A	12.00	4.00	6.21	74.52	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2 ENCOLE		10.00	4.00	3.09	30.85	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE ENCOLE		10.00	4.00	1.80	18.00	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE ENCOLE		10.00	4.00	1.35	13.50	
VARILLA VERTICAL INTERNA MURO VOLADIZO		21.00	5.00	3.86	126.45	
VARILLA VERTICAL INTERNA REFUERZO MURO VOLADIZO		21.00	5.00	2.65	86.81	
VARILLA VERTICAL EXTERNA REFUERZO MURO VOLADIZO		21.00	5.00	3.86	126.45	
VARILLA ZARPA		42.00	4.00	3.10	130.20	
VARILLA ZARPA LONGITUDINAL		16.00	4.00	4.90	78.40	
VARILLA LONGITUDINAL VASTAGO		26.00	4.00	4.90	127.40	
VARILLA DENTELLON		18.00	4.00	1.65	29.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS LONGITUDINALES ALETAS DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.35	4.70	
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.95	5.90	





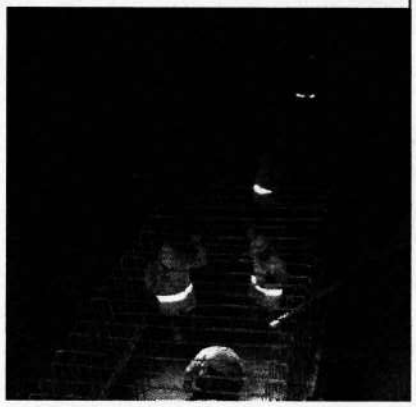


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 540.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.70	5.41
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.58	5.16
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.46	4.91
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.33	4.67
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.21	4.42
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.09	4.17
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	1.96	3.93
VARILLAS VERTICALES ALETA DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	1.84	3.68
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.95	5.90
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	3.68	7.37
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	3.56	7.12
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	3.44	6.87
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	3.31	6.63
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	3.19	6.38
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	3.07	6.13
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.94	5.89
VARILLAS VERTCILAES ALETA 2 DESCOLE OH 41A		2.00	4.00	2.82	5.64
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		10.00	4.00	2.53	25.25
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		2.00	4.00	5.55	11.10
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		10.00	4.00	2.53	25.25
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE OH 41A		10.00	4.00	1.96	19.60
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE OH 41A		10.00	4.00	1.51	15.10
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	4.50	9.00
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.96	7.92
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.69	7.37
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.42	6.83
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	3.14	6.29
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	2.87	5.75
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	2.60	5.20
VARILLAS LONGITUDINALES SOLERA		2.00	4.00	2.33	4.66
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		10.00	4.00	1.60	16.00
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		10.00	4.00	1.60	16.00
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		4.00	4.00	1.28	5.12
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		4.00	4.00	0.96	3.84
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		5.00	4.00	0.64	3.20
VARILLAS TRANSVERSALES SOLERA DESCOLE		6.00	4.00	0.32	1.92
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.00	8.00
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.93	7.87
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.90	7.80
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.87	7.73

REGISTRO FOTOGRAFICO

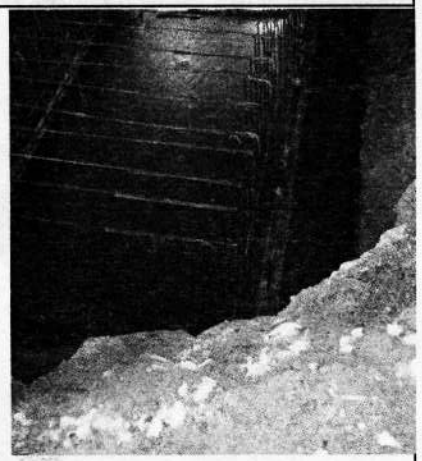

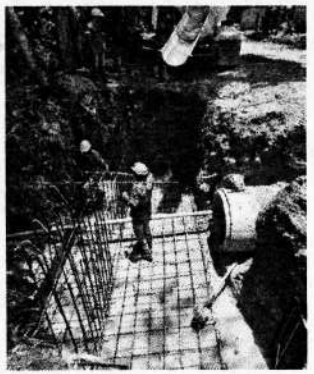


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.83	7.67	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.80	7.60	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.77	7.53	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.73	7.47	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.70	7.40	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	4.00	8.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.94	7.88	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.91	7.82	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.88	7.76	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2	K36+728 OBRA HIDRAULICA N° 41	2.00	4.00	3.85	7.70	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.82	7.64	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.79	7.58	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.76	7.52	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.73	7.46	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		2.00	4.00	3.70	7.40	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		10.00	4.00	2.58	25.75	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		22.00	4.00	5.69	125.18	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		10.00	4.00	2.62	26.15	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE		10.00	4.00	4.30	43.00	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE DESCOLE		10.00	4.00	2.85	28.50	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		16.00	4.00	3.62	57.92	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		16.00	4.00	4.62	73.92	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		16.00	4.00	2.10	33.60	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		16.00	4.00	2.10	33.60	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		16.00	4.00	2.32	37.12	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		16.00	4.00	2.32	37.12	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		11.00	4.00	3.96	43.56	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		11.00	4.00	4.57	50.27	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		11.00	4.00	3.31	36.41	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		11.00	4.00	3.31	36.41	
VARILLAS VERTICALES CAJA ENCOLE		11.00	4.00	2.32	25.52	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	4.96	49.60	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	4.20	42.00	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	3.62	36.20	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	4.88	48.80	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		10.00	4.00	2.10	21.00	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	

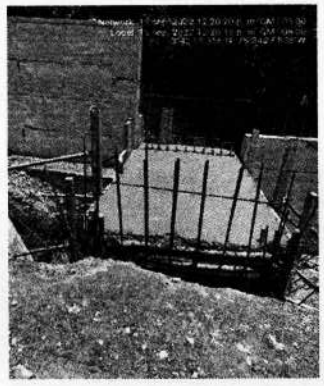




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.10	6.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		14.00	4.00	2.80	39.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		14.00	4.00	2.80	39.20	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.25	6.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38	K36+582 OBRA HIDRAULICA N°38	2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		2.00	4.00	3.15	6.30	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		10.00	4.00	2.70	27.00	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		16.00	4.00	6.60	105.60	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		10.00	4.00	3.40	34.00	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		14.00	4.00	3.25	45.50	
VARILLAS ALETAS DESCOLE OH 38		10.00	4.00	1.80	18.00	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		12.00	4.00	3.60	43.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		12.00	4.00	4.60	55.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		12.00	4.00	2.10	25.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		12.00	4.00	2.10	25.20	

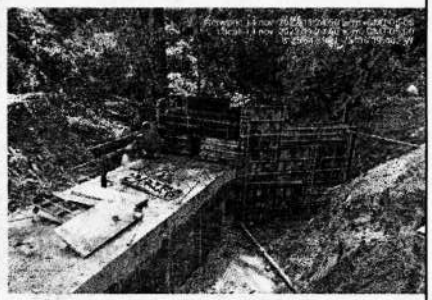

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		12.00	4.00	2.30	27.60	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		12.00	4.00	2.30	27.60	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		11.00	4.00	3.15	34.65	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		11.00	4.00	3.75	41.25	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		11.00	4.00	2.50	27.50	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		11.00	4.00	2.50	27.50	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		11.00	4.00	2.30	25.30	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		10.00	4.00	3.65	36.50	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		10.00	4.00	2.90	29.00	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		10.00	4.00	2.90	29.00	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		10.00	4.00	4.15	41.50	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 38		10.00	4.00	2.10	21.00	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		93.00	4.00	2.25	209.25	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		93.00	4.00	2.25	209.25	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		93.00	4.00	7.95	739.35	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		74.00	4.00	2.25	166.50	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		74.00	4.00	2.25	166.50	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		88.00	3.00	8.40	413.95	
CUERPO BOX COULVERT OH 37		88.00	3.00	9.50	468.16	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	7.07	14.14	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	6.51	13.02	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	6.23	12.46	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	5.95	11.90	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	5.67	11.33	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	5.39	10.77	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	5.11	10.21	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	4.83	9.65	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	4.54	9.09	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	4.26	8.53	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	3.98	7.97	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	3.70	7.41	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	3.42	6.84	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	3.14	6.28	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	2.86	5.72	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	2.58	5.16	
VARILLAS LONGITUDINALES OH 37 ALETAS DESCOLE		2.00	4.00	2.30	4.60	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		10.00	4.00	3.45	34.50	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		10.00	4.00	3.45	34.50	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	3.16	12.65	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.88	11.50	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.59	10.35	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.30	9.20	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	2.01	8.05	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE	K36+490 OBRA HIDRAULICA N° 37	4.00	4.00	1.73	6.90	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	1.44	5.75	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	1.15	4.60	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	0.86	3.45	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	0.58	2.30	
VARILLAS TRANSVERSALES OH 37 ALETAS DESCOLE		4.00	4.00	0.29	1.15	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.60	9.20	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.49	8.98	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.44	8.87	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.38	8.76	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.33	8.65	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.27	8.54	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.22	8.43	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.16	8.32	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.11	8.21	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.05	8.10	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	4.00	7.99	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		2.00	4.00	3.94	7.88	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		3.00	4.00	3.89	11.66	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		4.00	4.00	3.83	15.32	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		5.00	4.00	3.78	18.88	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		6.00	4.00	3.72	22.32	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		7.00	4.00	3.67	25.66	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		8.00	4.00	3.61	28.88	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		9.00	4.00	3.56	32.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 1		10.00	4.00	3.50	35.00	
VARILLAS VERTICALES ALETA 2		40.00	4.00	4.60	184.00	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		10.00	4.00	4.74	47.40	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		20.00	4.00	9.86	197.20	
VARILLAS TRANSVERSALES ALETA 1 Y 2		10.00	4.00	4.62	46.20	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE OH 37		10.00	4.00	1.90	19.00	
VARILLAS VERTICALES CABEZOTE OH 37		10.00	4.00	0.45	4.50	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	3.60	61.20	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	4.60	78.20	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	2.10	35.70	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	2.10	35.70	
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	2.30	39.10	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS HORIZONTALES CAJA ENCOLE	K35+940 OBRA HIDRAULICA N° 35A.	17.00	4.00	2.30	39.10	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	4.17	70.89	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	4.77	81.09	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	3.52	59.84	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	3.52	59.84	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	2.30	39.10	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	4.99	84.83	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	4.24	72.08	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	3.82	64.94	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	5.07	86.19	
VARILLAS LATERALES CAJA ENCOLE		17.00	4.00	2.10	35.70	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27	K35+179 OBRA HIDRAULICA N° 27	9.00	4.00	3.65	32.85	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		9.00	4.00	4.65	41.85	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		9.00	4.00	2.13	19.17	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		9.00	4.00	2.13	19.17	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		9.00	4.00	2.32	20.88	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		9.00	4.00	2.32	20.88	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		7.00	4.00	3.08	21.56	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		7.00	4.00	3.58	25.06	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		7.00	4.00	2.07	14.49	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		7.00	4.00	2.07	14.49	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		7.00	4.00	2.32	16.24	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		11.00	4.00	3.25	35.70	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		11.00	4.00	2.33	25.63	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		11.00	4.00	2.28	25.08	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		11.00	4.00	3.75	41.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 27		11.00	4.00	2.13	23.43	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15	K34+404 OBRA HIDRAULICA N° 15	14.00	4.00	3.60	50.40	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		14.00	4.00	4.60	64.40	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		14.00	4.00	2.10	29.40	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		14.00	4.00	2.10	29.40	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		14.00	4.00	2.30	32.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		14.00	4.00	2.30	32.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		7.00	4.00	3.95	27.65	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		7.00	4.00	4.45	31.15	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		7.00	4.00	2.95	20.65	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		7.00	4.00	2.95	20.65	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		7.00	4.00	2.30	16.10	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		11.00	4.00	4.20	46.20	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		11.00	4.00	3.30	36.30	

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSOCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO 25 DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 640.1	CAP 5- DRENAJES	DESCRIPCION	38 - ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	UNIDAD	Kg

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		11.00	4.00	3.25	35.75	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		11.00	4.00	4.70	51.70	
VARILLAS CAJA ENCOLE OH 15		11.00	4.00	2.10	23.10	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5	K366+657 OBRA HIDRAULICA N° 5	15.00	4.00	3.63	54.45	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		15.00	4.00	4.63	69.45	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		15.00	4.00	2.12	31.80	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		15.00	4.00	2.12	31.80	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		15.00	4.00	2.31	34.65	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		15.00	4.00	2.31	34.65	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		7.00	4.00	4.24	29.65	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		7.00	4.00	4.74	33.15	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		7.00	4.00	3.23	22.61	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		7.00	4.00	3.23	22.61	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		7.00	4.00	2.31	16.17	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		11.00	4.00	4.50	49.50	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		11.00	4.00	3.59	39.49	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		11.00	4.00	3.50	38.50	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		11.00	4.00	4.96	54.56	
VARIILAS CAJA ENCOLE OH 5		11.00	4.00	2.12	23.32	
		Presente Acta.			57,530.00	
		Pago Actas Anteriores			39,015.00	
		Pago Presente Acta			18,515.00	

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	25 DE ENERO DE 2023	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCIÓN	54. Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	UNIDAD	M3

ACTA #	ITEM	M3 / KM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACTA N°01	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	1497.95	
ACTA N°01	5. Remoción de Derrumbes	407.40	
ACTA N°01	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	76.65	
ACTA N°02	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	42.06	
ACTA N°05	5. Remoción de Derrumbes	80.08	
ACTA N°07	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)		
ACTA N°08	5. Remoción de Derrumbes	92.40	
	CANTIDAD ACUMULADA M3 / KM	2196.54	
	CANTIDAD PAGA ACTAS ANTERIORES M3 / KM	0.00	
	CANTIDAD ACUMULADA M3 / KM	2196.54	

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:


Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCIÓN	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	UNIDAD	M3

ACTA #	ITEM	M3 / KM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACTA N°01	4. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	5891.12	
ACTA N°01	5. Remoción de Derrumbes	6983.71	
ACTA N°01	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	24506.94	
ACTA N°01	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	127046.62	
ACTA N°01	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	15686.35	
ACTA N°01	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	5247.53	
ACTA N°01	34. Concreto Resistencia 21MPa (D) (drenaje)	1542.02	
ACTA N°01	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	1454.65	
ACTA N°02	5. Remoción de Derrumbes	1115.24	
ACTA N°02	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	12155.14	
ACTA N°02	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	26010.76	
ACTA N°02	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	1880.98	
ACTA N°02	25. Material Granular Drenante	5044.64	
ACTA N°02	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	7329.80	
ACTA N°02	34. Concreto Resistencia 21MPa (D) (drenaje)	2022.29	
ACTA N°02	35. Concreto Resistencia 28MPa © (drenaje)	202.27	
ACTA N°02	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	12230.40	
ACTA N°03	18. Rellenos Para Estructuras con Recebo.	3497.51	
ACTA N°03	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	30013.28	
ACTA N°03	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	33943.67	
ACTA N°03	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	3682.52	
ACTA N°03	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	4414.65	
ACTA N°03	25. Material Granular Drenante	2335.67	
ACTA N°03	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	13750.33	
ACTA N°03	34. Concreto Resistencia 21MPa (D) (drenaje)	202.27	
ACTA N°03	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	3543.88	
ACTA N°03	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	446.29	
ACTA N°03	41. Material Granular Drenante (drenaje)	7657.69	
ACTA N°04	18. Rellenos Para Estructuras con Recebo.	9394.90	

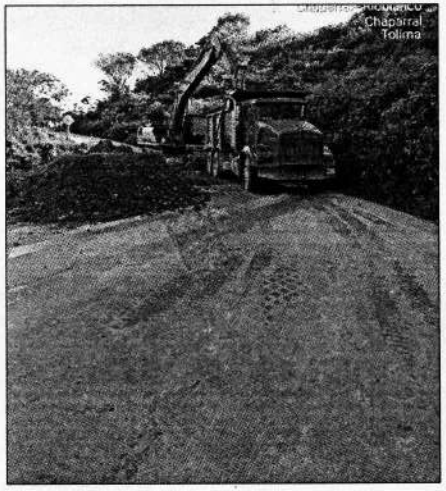






CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCIÓN	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	UNIDAD	M3

ACTA #	ITEM	M3 / KM
ACTA N°04	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	13292.33
ACTA N°04	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	27744.78
ACTA N°04	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	2844.29
ACTA N°04	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	2230.87
ACTA N°04	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	3035.73
ACTA N°04	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	8344.90
ACTA N°04	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	1375.33
ACTA N°04	41. Material Granular Drenante (drenaje)	274.19
ACTA N°05	5. Remoción de Derrumbes	4243.40
ACTA N°05	18. Rellenos Para Estructuras con Recebo.	5440.48
ACTA N°05	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	36626.52
ACTA N°05	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	19491.02
ACTA N°05	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	3442.53
ACTA N°05	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	2465.48
ACTA N°05	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	3673.72
ACTA N°05	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	2113.27
ACTA N°05	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	448.64
ACTA N°05	41. Material Granular Drenante (drenaje)	1944.50
ACTA N°06	18. Rellenos Para Estructuras con Recebo.	25215.21
ACTA N°06	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	48883.97
ACTA N°06	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	3173.70
ACTA N°06	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	677.96
ACTA N°06	25. Material Granular Drenante	59127.25
ACTA N°06	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	6274.77
ACTA N°06	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	3235.76
ACTA N°06	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	366.91
ACTA N°07	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	6885.47
ACTA N°08	5. Remoción de Derrumbes	58847.40
ACTA N°08	18. Rellenos Para Estructuras con Recebo.	18766.72
ACTA N°08	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	8043.25
ACTA N°08	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	9372.72

REGISTRO FOTOGRÁFICO

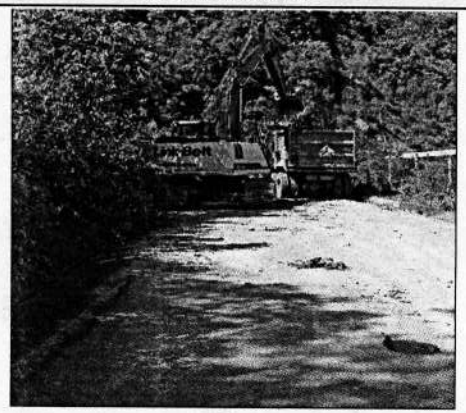





CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCIÓN	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	UNIDAD	M3

ACTA #	ITEM	M3 / KM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ACTA N°08	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C . incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo) (excavación)	569.17	
ACTA N°08	33. Rellenos Para Estructuras con Recebo. (drenaje)	6686.48	
ACTA N°08	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	21638.40	
ACTA N°08	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	3366.89	

CANTIDAD ACUMULADA M3 / KM	789030.22
CANTIDAD PAGA ACTAS ANTERIORES M3 / KM	400900.00
CANTIDAD ACUMULADA M3 / KM	388130.22

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	DICIEMBRE DE 2022	**ACTA No. 8**		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	**DESCRIPCION**	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	**UNIDAD**	M3

FECHA	ZODME	RECIBO	PLACA	VOLUMEN	ORIGEN	DESTINO	KM	M3 / KM
21-nov	LOS NARANJOS	4734	SZZ-332	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4735	SZZ-332	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4736	SZZ-332	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4737	SZZ-332	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4738	WGA-112	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4883	SLG-021	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4884	SLG-021	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4885	WGA-112	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4886	SZZ-332	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
21-nov	LOS NARANJOS	4887	SZZ-331	15	K8+100	K39+740	K31+640	474,60
22-nov	LOS NARANJOS	4941	SLG-021	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
22-nov	LOS NARANJOS	4942	WGA-112	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
22-nov	LOS NARANJOS	5152	SZZ-331	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
22-nov	LOS NARANJOS	5153	SZZ-333	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
22-nov	LOS NARANJOS	5154	WGA-112	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
22-nov	LOS NARANJOS	5155	SZZ-331	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
22-nov	LOS NARANJOS	5156	SZZ-333	15	K17+000	K39+740	K22+740	341,10
23-nov	LOS NARANJOS	5157	SZZ-331	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	5158	SZZ-333	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	4739	SZZ-332	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	4740	SZZ-332	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	4888	SZZ-332	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	4889	SZZ-332	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	4943	TFT-956	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
23-nov	LOS NARANJOS	4944	SZZ-333	15	K22+500	K39+740	K17+240	258,60
24-nov	LOS NARANJOS	4945	SZZ-331	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4946	SLG-021	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4947	WGA-112	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4948	SZZ-332	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10

REGISTRO FOTOGRÁFICO

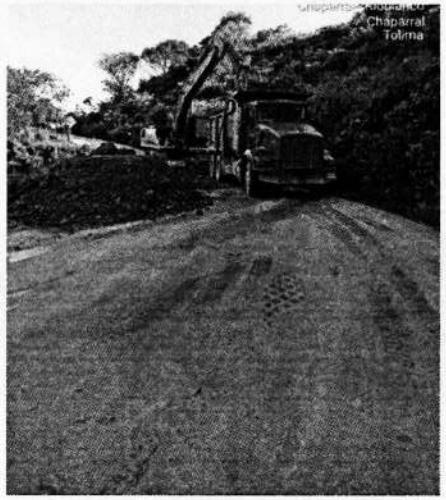




CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	DICIEMBRE DE 2022	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCION	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	UNIDAD	M3

FECHA	ZODME	RECIBO	PLACA	VOLUMEN	ORIGEN	DESTINO	KM	M3 / KM
24-nov	LOS NARANJOS	4949	SZZ-333	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4950	SLG-021	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4951	SZZ-331	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4952	TFT-956	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4953	WGA-112	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4954	SZZ-332	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4741	SZZ-332	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4890	SZZ-332	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
24-nov	LOS NARANJOS	4955	SZZ-332	15	K27+400	K39+740	K12+340	185,10
25-nov	LOS NARANJOS	4956	SZZ-331	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	4957	SZZ-331	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	4958	SZZ-331	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5159	SLG-021	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5160	SZZ-331	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5161	WGA-112	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5162	SZZ-333	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5163	SLG-021	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5164	WGA-112	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	5166	SZZ-332	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
25-nov	LOS NARANJOS	4742	SZZ-332	15	K40+300	K39+740	K0+560	8,40
26-nov	LOS NARANJOS	4743	SZZ-332	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	4744	SZZ-332	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	4745	SZZ-332	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	4959	WGA-112	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	5165	SLG-021	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	5167	SZZ-332	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	5168	SZZ-331	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	5169	SLG-021	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13
26-nov	LOS NARANJOS	5170	SZZ-331	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO

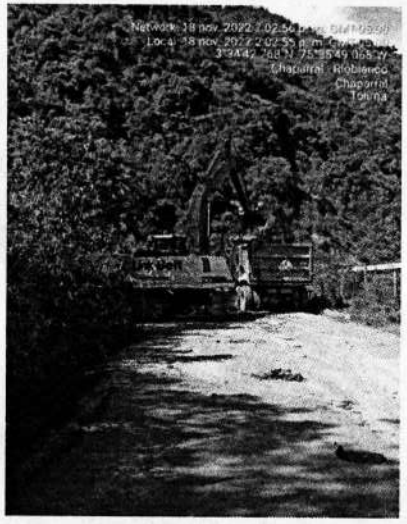

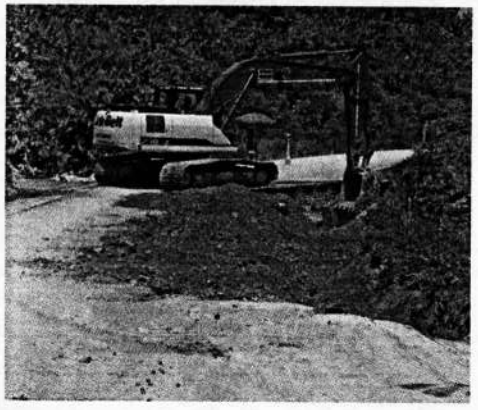

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	DICIEMBRE DE 2022	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCION	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	UNIDAD	M3

FECHA	ZODME	RECIBO	PLACA	VOLUMEN	ORIGEN	DESTINO	KM	M3 / KM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
26-nov	LOS NARANJOS	5171	TFT-956	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13	
26-nov	LOS NARANJOS	5172	SLG-021	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13	
26-nov	LOS NARANJOS	5173	WGA-112	15	K41+015	K39+740	K1+275	19,13	
27-nov	LOS NARANJOS	5174	WGA-112	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	4746	SZZ-332	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	4747	SZZ-332	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	4891	TDV-437	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	4960	SZZ-332	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	4961	TDV-437	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	5175	SZZ-332	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	5176	SLG-021	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	5177	WGA-112	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	5178	SLG-021	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
27-nov	LOS NARANJOS	5179	WGA-112	15	K41+300	K39+740	K1+560	23,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5180	TFT-956	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5181	SZZ-331	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5182	SZZ-333	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5183	SLG-021	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5184	WGA-112	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5185	WGA-112	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5186	TFT-956	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5187	SZZ-333	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5188	SLG-021	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	5189	SZZ-331	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
28-nov	LOS NARANJOS	4748	SZZ-332	15	K41+900	K39+740	K2+160	32,40	
29-nov	SAN MARTÍN	4749	WGA-112	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	4750	SZZ-332	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	4892	SLG-021	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	4893	TDV-437	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	






CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN) / ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	DICIEMBRE DE 2022	ACTA No. 8
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCION	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia. / UNIDAD: M3

FECHA	ZODME	RECIBO	PLACA	VOLUMEN	ORIGEN	DESTINO	KM	M3 / KM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
29-nov	SAN MARTÍN	4962	SLG-021	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	4963	SLG-021	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	4964	SLG-021	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	5001	WGA-112	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	5190	SLG-021	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	5191	TDV-437	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
29-nov	SAN MARTÍN	5192	SZZ-331	15	K43+100	K11+800	K31+300	469,50	
30-nov	SAN MARTÍN	5193	TFT-956	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	5194	SZZ-333	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	5195	SZZ-331	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	5196	TDV-437	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4894	TFT-956	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4895	TDV-437	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4896	SLG-021	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4897	TDV-437	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4965	SZZ-333	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4966	SZZ-331	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4967	TDV-437	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
30-nov	SAN MARTÍN	4968	SLG-021	15	K43+600	K11+800	K31+800	477,00	
1-dic	SAN MARTÍN	4969	TFT-956	15	K45+300	K11+800	K33+500	502,50	
1-dic	SAN MARTÍN	4970	WGA-112	15	K45+300	K11+800	K33+500	502,50	
1-dic	SAN MARTÍN	4971	TFT-956	15	K45+300	K11+800	K33+500	502,50	
1-dic	SAN MARTÍN	4972	SLG-021	15	K45+300	K11+800	K33+500	502,50	
1-dic	LOS NARANJOS	4973	TDV-437	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40	
1-dic	LOS NARANJOS	4974	WGA-112	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40	
1-dic	LOS NARANJOS	5002	SZZ-332	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40	
1-dic	LOS NARANJOS	5003	WGA-112	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40	
1-dic	LOS NARANJOS	5197	SZZ-331	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40	
1-dic	LOS NARANJOS	5198	SZZ-333	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40	

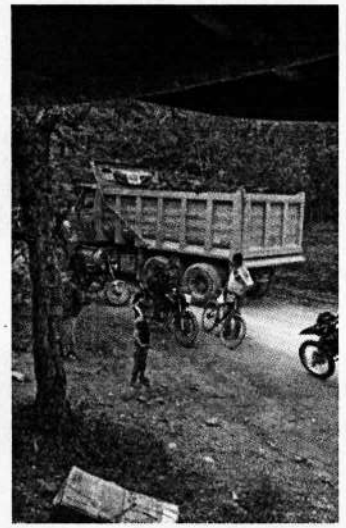


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN) / ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	DICIEMBRE DE 2022	ACTA No. 8
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES / DESCRIPCION: Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.		UNIDAD: M3

FECHA	ZODME	RECIBO	PLACA	VOLUMEN	ORIGEN	DESTINO	KM	M3 / KM
1-dic	LOS NARANJOS	4898	TDV-437	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40
1-dic	LOS NARANJOS	4975	SZZ-331	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40
1-dic	LOS NARANJOS	4976	TFT-956	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40
1-dic	LOS NARANJOS	4977	TDV-437	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40
1-dic	LOS NARANJOS	4978	WGA-112	15	K45+300	K39+740	K5+560	83,40
2-nov	LOS NARANJOS	4979	TDV-437	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
2-nov	LOS NARANJOS	4980	SZZ-331	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
2-nov	LOS NARANJOS	4981	TFT-956	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
2-nov	LOS NARANJOS	4982	WGA-112	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
2-nov	LOS NARANJOS	4983	TDV-437	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
2-nov	LOS NARANJOS	5199	TDV-437	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
2-nov	LOS NARANJOS	5200	SLG-021	15	K46+200	K39+740	K6+460	96,90
3-dic	LOS NARANJOS	5201	SZZ-333	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4899	TDV-437	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4900	TDV-437	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4984	TDV-437	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4985	SZZ-331	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4986	TFT-956	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4987	SLG-021	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4988	WGA-112	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4989	SZZ-331	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4990	TFT-956	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4991	WGA-112	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
3-dic	LOS NARANJOS	4992	TDV-437	15	K46+500	K39+740	K6+760	101,40
4-dic	LOS NARANJOS	4993	SLG-021	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40
4-dic	LOS NARANJOS	4994	SZZ-331	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40
4-dic	LOS NARANJOS	4995	TFT-956	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40
4-dic	LOS NARANJOS	5004	SLG-021	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40
4-dic	LOS NARANJOS	5005	WGA-112	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40

REGISTRO FOTOGRÁFICO

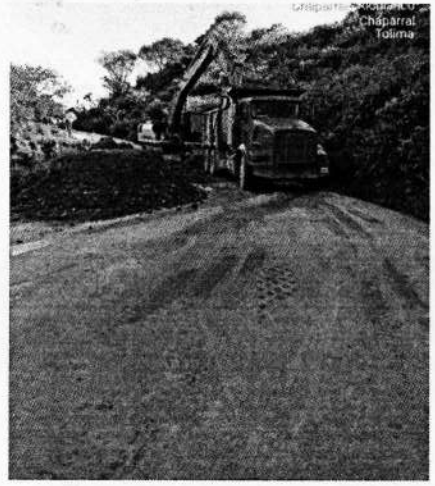



CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN) / ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	DICIEMBRE DE 2022	ACTA No. 8
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCION	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia. / UNIDAD: M3

FECHA	ZODME	RECIBO	PLACA	VOLUMEN	ORIGEN	DESTINO	KM	M3 / KM	REGISTRO FOTOGRÁFICO
4-dic	LOS NARANJOS	5115	TDV-437	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40	
4-dic	LOS NARANJOS	5202	SZZ-333	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40	
4-dic	LOS NARANJOS	5203	SZZ-333	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40	
4-dic	LOS NARANJOS	5204	TAX-355	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40	
4-dic	LOS NARANJOS	5205	TAX-358	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40	
4-dic	LOS NARANJOS	5206	TAX-350	15	K47+100	K39+740	K7+360	110,40	
							TOTAL M3 / KM	29.469,90	

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: JUAN H. FERNÁNDEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCIÓN	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	UNIDAD	M3

ACTA #	ITEM	M3	KM	M3 KM
ACTA N°01	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	416.78	6.82	2842.44
ACTA N°01	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	2160.66	6.82	14735.70
ACTA N°01	34. Concreto Resistencia 21MPa (D) (drenaje)	26.22	6.82	178.82
ACTA N°01	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	24.74	6.82	168.73
ACTA N°02	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	206.72	6.82	1409.83
ACTA N°02	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	442.36	6.82	3016.90
ACTA N°02	34. Concreto Resistencia 21MPa (D) (drenaje)	3.44	6.82	23.46
ACTA N°02	35. Concreto Resistencia 28MPa © (drenaje)	208.00	6.82	1418.56
ACTA N°02	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	34.39	6.82	234.54
ACTA N°03	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	510.43	6.82	3481.13
ACTA N°03	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	534.06	6.82	3642.29
ACTA N°03	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	65.96	6.82	449.85
ACTA N°03	34. Concreto Resistencia 21MPa (D) (drenaje)	3.44	6.82	23.46
ACTA N°03	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	60.27	6.82	411.04
ACTA N°03	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	7.59	6.82	51.76
ACTA N°04	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	266.06	6.82	1814.53
ACTA N°04	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	471.85	6.82	3218.02
ACTA N°04	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	37.94	6.82	258.75
ACTA N°04	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	141.92	6.82	967.89
ACTA N°04	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	23.39	6.82	159.52
ACTA N°05	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	622.90	6.82	4248.18
ACTA N°05	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	331.48	6.82	2260.69

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES	DESCRIPCIÓN	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	UNIDAD	M3

ACTA #	ITEM	M3	KM	M3 KM
ACTA N°05	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	41.93	6.82	285.96
ACTA N°05	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	35.94	6.82	245.11
ACTA N°05	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	8.27	6.82	56.38
ACTA N°06	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	831.36	6.82	5669.88
ACTA N°06	22. Concreto Resistencia 14MPa (F)	11.53	6.82	78.63
ACTA N°06	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	55.03	6.82	375.30
ACTA N°06	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	6.24	6.82	42.56
ACTA N°08	19. Concreto Resistencia 28MPa (C)	136.79	6.82	932.91
ACTA N°08	20. Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	159.40	6.82	1087.11
ACTA N°08	35. Concreto Resistencia 28MPa (c) (drenaje)	368.00	6.82	2509.76
ACTA N°08	36. Concreto Resistencia 14MPa (F) (drenaje)	57.26	6.82	390.51
	CANTIDAD ACUMULADA M3 / KM			56690.20
	CANTIDAD PAGA ACTAS ANTERIORES M3 / KM			49520.00
	CANTIDAD ACUMULADA M3 / KM			7170.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.

CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No.8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.4	CAP 8 - OBRAS VARIAS	DESCRIPCION	51 - CERCA DE ALAMBRE DE PUAS	UNIDAD	M

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		LONGITUD	AREA SECCION	ALTO	LONGITUD	TOTAL
TRAMO 2:	CERCA ZODME LOS NARANJOS	K39+740		150			150.00	150.00
TRAMO 2:	K38+690 AL K38+770 LADO IZQUIERDO	K38+690 AL K38+770		80			80.00	80.00
TRAMO 2:	K37+680 AL ALK37+704 LADO DERECHO	K37+680 AL K37+704		24			24.00	24.00
TRAMO 2:	K37+540 AL K37+700 LADO IZQUIERDO	K37+540	K37+700	130			130.00	130.00
TRAMO 2:	K37+427 AL K37+450	K37+427	K37+450	23			23.00	23.00
TRAMO 2:	K39+930 AL K40+000 LADO IZQUIERDO	K39+930	K40+00	70			70.00	70.00
TRAMO 2:	K37+540 AL K37+665 LADO DERECHO	K37+540	K37+665	125			125.00	125.00
							-	-

Presente Acta.	602.00
Pago Actas Anteriores	407.00
Pago Presente Acta	195.00

REGISTRO FOTOGRAFICO





INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LÓPEZ PÁEZ

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		**ENERO 25 DE 2023**	**ACTA No.8**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO NP 9	NO PREVISTOS	**DESCRIPCION**	NP 8 - Tubería de Concreto Reforzado 28 Mpa de 900 mm de diametro interior	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
GUANABANERA	K11+605	11				11.00	
	K12+035	11				11.00	
	K12+150	11				11.00	
	K12+256	11				11.00	
SECTOR CRITICO 1	K15+940	10				10.00	
	K16+030	10				10.00	
SITIO CRÍTICO 2 TUBERÍA	K16+675	10				10.00	
	K16+635	10				10.00	
	K16+575	11				11.00	
	K16+635	10				10.00	
	K16+765	10				10.00	
EL HELECHAL TUBERÍA	K22+225	10				10.00	
	K22+275	10				10.00	
	K23+150	10				10.00	
	K22+455	10				10.00	
	K22+901	15				15.00	
	K23+395	10				10.00	
	K23+520	10				10.00	
	K23+575	10				10.00	
	K22+545	11				11.00	
	K22+799	11				11.00	
	K22+665	10				10.00	
OBRA 63A	K40+015	11				11.00	
OBRA 61	K39+402	12				12.00	
OBRA 59	K39+055	10				10.00	
OBRA 58	K38+943	12				12.00	
OBRA 57	K38+916	11				11.00	
OBRA 56A	K38+805	8				8.00	
OBRA 56	K38+654	9				9.00	
OBRA 55	K38+557	12				12.00	





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.

CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023	ACTA No.8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO NP 9	NO PREVISTOS	DESCRIPCION	NP 8 - Tubería de Concreto Reforzado 28 Mpa de 900 mm de diametro interior	UNIDAD	UND

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
OBRA 54	K38+497	10				10.00	
OBRA 53A	K38+397	10				10.00	
OBRA 53	K38+285	10				10.00	
OBRA 52	K38+216	10				10.00	
OBRA 49	K37+595	11				11.00	
OBRA 48	K37+540	10				10.00	
OBRA 47	K37+427	16				16.00	
OBRA 46	K37+348	14				14.00	
OBRA 45	K37+316	10				10.00	
OBRA 42	K36+949	11				11.00	
OBRA 41	K36+728	11				11.00	
OBRA 38	K36+582	10				10.00	
OBRA 35A	K35+940	12				12.00	
OBRA 27	K35+180	9				9.00	
OBRA 15	K35+404	11				11.00	
OBRA 5	K33+657	12.00				12.00	
					Acumulado Presente Acta	494.00	
					Pago Actas Anteriores	377.00	
					Pago Presente Acta	117.00	



INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	**Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.**				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		**FECHA**	**SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)**	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		**ENERO 25 DE 2023**	**ACTA No.8**	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 630.4	NO PREVISTOS	**DESCRIPCION**	70 - PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO IV	**UNIDAD**	UND

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		CANTIDAD	AREA SECCION	AMBOS LADOS	LONGITUD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1:	SECTOR LA GUANABANERA	K12+150	K12+160	4	1.000	1	4.00	4.00	
TRAMO 2:	SECTOR EL VISO	K37+700	K37+800	4	1.000	1	4.00	4.00	
TRAMO 2:	SECTOR EL MESON	K39+000	K39+600	17	1.000	1	17.00	17.00	
TRAMO 2:	SECTOR ICARCÓ	K36+700	K37+350	12	1.000	1	12.00	12.00	
TRAMO 1:	SECTOR HELECHAL	KM 22+520 - KM 22+530		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 22+ 640 - KM 22+660		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR HELECHAL	KM 23+360		1	1.000	1	1.00	1.00	
	SECTOR LA GUANABANERA	KM 11+510		1	1.000	1	1.00	1.00	





	SECTOR LA GUANABANERA	KM 11+510	1	.000	1	1.00	1.00
	SECTOR PUENTE VERDE	K11+300 AL K11+437	16	5.000	1.00	16.00	16.00
	SECTOR BARRIALOZA	KM 35+170	1	.000	1.00		-
	SECTOR BARRIALOZA	KM 35+170	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR BARRIALOZA	KM 35+170	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR BARRIALOZA	KM 35+170	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR BARRIALOZA	KM 35+170	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR ICARCÓ	KM 36+490	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR ICARCÓ	KM 36+490	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR ICARCÓ	KM 36+490	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR ICARCÓ	KM 36+490	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR ICARCÓ	KM 36+490	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR ICARCÓ	KM 36+490	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL VISO	KM 38+110	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL VISO	KM 38+110	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL VISO	KM 38+110	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL VISO	KM 38+110	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL VISO	KM 38+110	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL VISO	KM 38+110	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL MESON	KM 39+060	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL MESON	KM 39+350	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL MESON	KM 39+350	1	.000	1.00	1.00	1.00
	SECTOR EL MESON	KM 39+400	1	.000	1.00	1.00	1.00
						Presente Acta.	99.00
						Pago Actas Anteriores	37.00
						Pago Presente Acta	62.00



INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre:LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.

CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA		SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO 25 DE 2023		ACTA No.8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO NP-14	NO PREVISTOS	DESCRIPCION	NP 14 - Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes	UNIDAD	ML

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA INICIAL	ABSCISADO REFERENCIA FINAL	LI	LD	CANTIDAD (M)
PUENTE SANTANA	K7+400	K7+600	0.20	0.20	400.0
GUANABANERA	K11+450	K12+400	0.95	0.95	1900.0
BALASTRERA	K21+200	K21+800	0.60	0.60	1200.0
ICARCO	K36+000	K37+000	1.00	1.00	2000.0
EL VISO	K37+000	K38+000	1.00	1.00	2000.0
CANTERA CHAPARRAL	K3+100	K3+500	0.4	0.0	400.0
CANTERA CHAPARRAL	K3+500	K3+650	0.0	0.2	150.0
CANTERA CHAPARRAL	K4+250	K4+800	0.6	0.0	550.0
CRUCE DE MAITO	K5+200	K6+150	1.0	1.0	1900.0
CRUCE DE MAITO	K6+250	K6+650	0.0	0.4	400.0
CRUCE DE MAITO	K6+350	K6+600	0.3	0.0	250.0
SANTANA	K6+800	K6+900	0.0	0.1	100.0
SANTANA	K7+050	K7+200	0.2	0.0	150.0
SANTANA	K7+900	K8+900	0.0	1.0	1000.0
SANTANA	K9+200	K9+400	0.2	0.2	400.0
SANTANA	K9+400	K10+000	0.0	0.6	600.0
GUANABANERA	K12+500	K12+600	0.1	0.0	100.0
GUANABANERA	K12+650	K12+800	0.2	0.0	150.0
GUANABANERA	K13+200	K13+250	0.1	0.0	50.0
GUANABANERA	K13+250	K13+350	0.0	0.1	100.0
GUANABANERA	K13+600	K13+800	0.0	0.2	200.0
GUANABANERA	K13+750	K13+850	0.1	0.0	100.0

Presente Acta.	14,100.00
Pago Actas Anteriores	-
Pago Presente Acta	14,100.00

REGISTRO FOTOGRAFICO

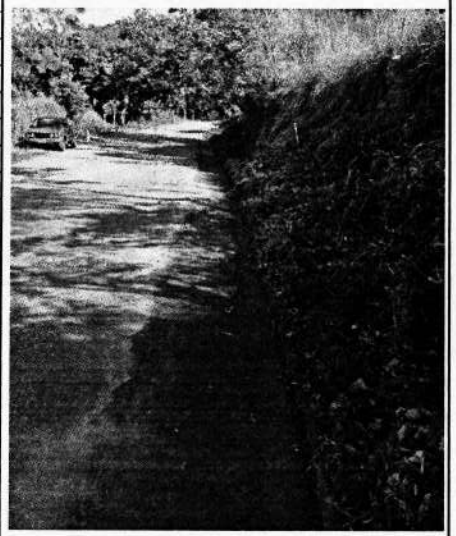

INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA

CONTRATISTA

Firma:


Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: FEBRERO 2023
	HOJA 1 DE 1

MEMORIAS DE CALCULOS - CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.

1. LOCALIZACION Y REPLANTEO.

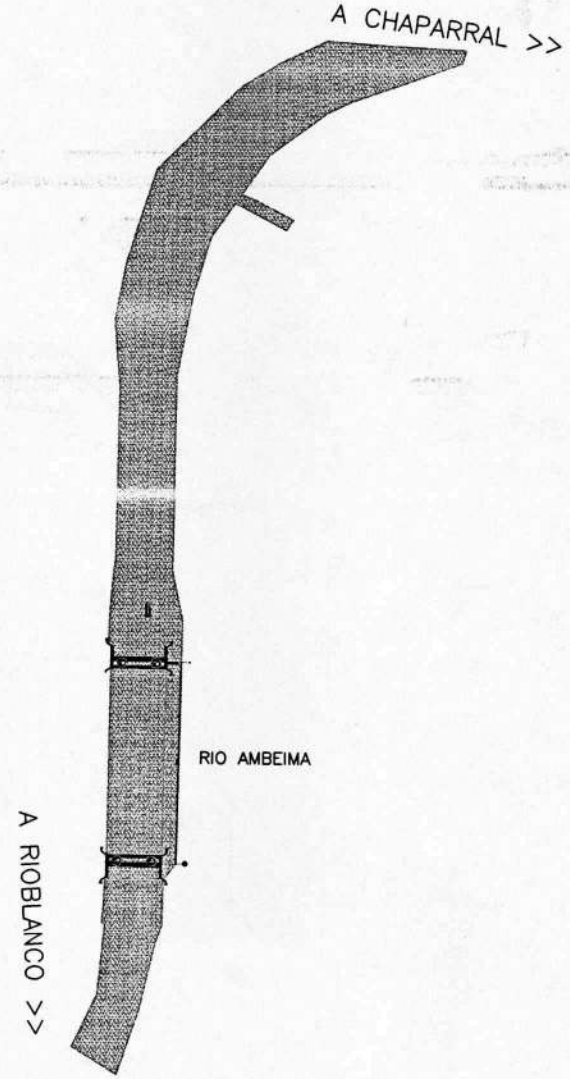

AREA TOTAL =2271.89 m2.


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL- RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: FEBRERO 2023 HOJA 1 DE 1

MEMORIAS DE CALCULOS - CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.

2. DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS

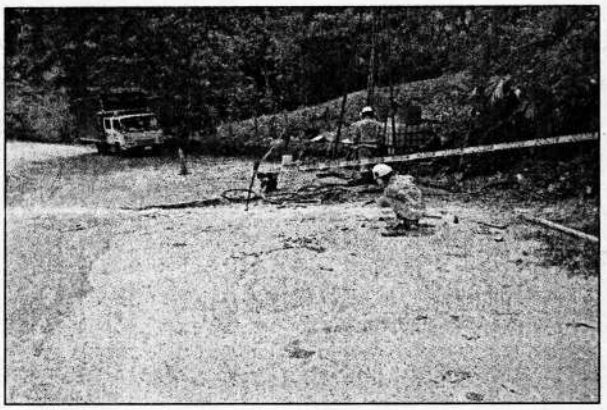

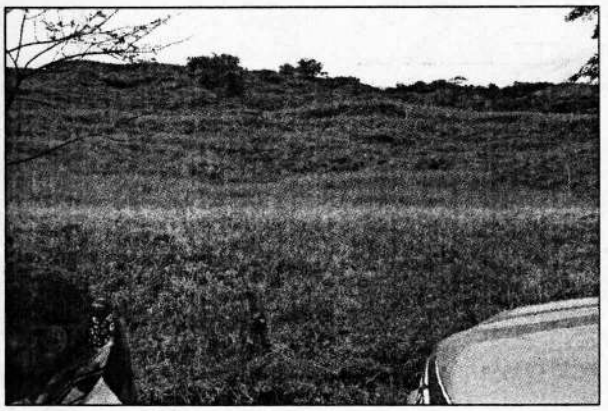




AREA TOTAL =2227 .89 m2.

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
ITEM DE PAGO 630.5	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1P	DESCRIPCION	32. - Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga cabezal		

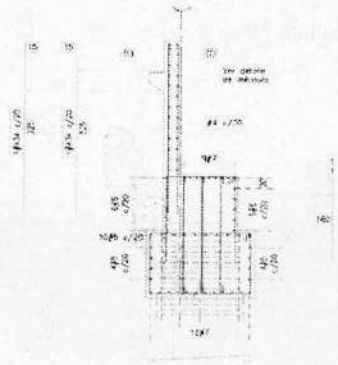LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	CANTIDAD	VOLUMEN (M3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 - PUENTE VERDE - VIGA CABEZAL	K11+437 - K11+472	9.65	1.30	1.90	2.00	47.67	47.67	
TRAMO 1 - PUENTE VERDE - VIGA CABEZAL	K11+437 - K11+472	9.65	1.05	1.30	2.00	26.34	26.34	

Cantidad Acumulada	74.02
Cantidad Paga Actas Anteriores	48.00
Cantidad Para Pago Presente Acta	26.02

INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ
DIRECTOR DE OBRA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
ITEM DE PAGO 630.3.10P	PUENTE VEHICULAR Capitulo 5. Estructura Principal - 630.3.10P	DESCRIPCION	35. - Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro aleta		

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA	LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	CANTIDAD	VOLUMEN (M3)	TOTAL
TRAMO 1 - PUENTE VERDE - VIGA CABEZAL	K11+437 - K11+472	1.90	1.30	0.25	2.00	1.24	1.24
TRAMO 1 - PUENTE VERDE - VIGA CABEZAL	K11+437 - K11+472	1.00	- 1.00	0.25	2.00	- 0.50	- 0.50
		2.20	1.05	0.25	2.00	1.16	1.16

REGISTRO FOTOGRAFICO

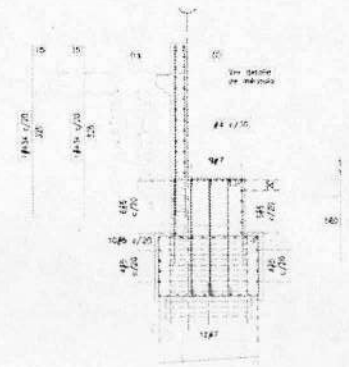

Cantidad Acumulada	1.89
Cantidad Paga Actas Anteriores	-
Cantidad Para Pago Presente Acta	1.89

INTERVENTORÍA:

Firma:
Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA ~~VALDERRAMA~~
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.		
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN) / ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO DE 2023	ACTA No. 8
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1 P	DESCRIPCION: Acero de refuerzo 420mMPA	UNIDAD: M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	No. DE VARILLA	PESO / ML	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 PUENTE RIO AMBEIMA	CAISSON 1 Y 2	2	REFUERZO TRANSVERSAL	5	1.55	198.00	5.40	3,314.52	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	12.00	4,300.80	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	8.60	3,082.24	
		36	AROS ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	14.00	5.80	1,636.99	
			BASTONES ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	22.00	1.10	487.87	
TRAMO 1 PUENTE RIO AMBEIMA	CAISSON 3 y 4	2	REFUERZO TRANSVERSAL	5	1.55	198.00	5.40	3,314.52	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	12.00	4,300.80	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	8.60	3,082.24	
		36	AROS ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	14.00	5.80	1,636.99	
			BASTONES ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	22.00	1.10	487.87	
							14,766.08		

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1 P	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 420mMPA	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	No. DE VARILLA	PESO / ML	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		CANTIDAD	NÚMERO DE LA VARILLA	PESO / ML	LONGITUD		PESO TOTAL (KG)	FIGURA
		INICIAL	FINAL							
TRAMO 1 - PUENTE VERDE		K11+437	K11+472	52	4	1.00	9.55		496.60	
				48	4	1.00	4.80		230.40	
				8	4	1.00	4.60		36.80	
				8	4	1.00	4.40		35.20	
				8	4	1.00	4.20		33.60	
				8	4	1.00	4.00		32.00	
				8	4	1.00	3.80		30.40	
				160	4	1.00	3.80		608.00	
				8	4	1.00	3.65		29.20	
				9	4	1.00	3.45		31.05	
				192	4	1.00	3.40		652.80	
				8	4	1.00	3.25		26.00	
				40	4	1.00	3.15		126.00	
				8	4	1.00	3.05		24.40	
				8	4	1.00	2.85		22.80	
				32	4	1.00	2.20		70.40	
				28	4	1.00	1.80		50.40	
				8	4	1.00	1.15		9.20	
				38	5	1.56	11.80		699.50	
				20	5	1.56	10.05		313.56	

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1 P	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 420mMPA	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	No. DE VARILLA	PESO / ML	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		CANTIDAD	NÚMERO DE LA VARILLA	PESO / ML	LONGITUD		PESO TOTAL (KG)	FIGURA
		INICIAL	FINAL							
				120	5	1.56	6.20		1,160.64	
				120	5	1.56	3.00		561.60	
				264	5	1.56	2.50		1,029.60	
				120	5	1.56	1.80		336.96	
				96	5	1.56	1.40		209.66	
				42	7	3.06	10.15		1,304.48	
				28.00	7.00	3.06	1.80		154.22	

Cantidad Acumulada Redondeada	33,960.33
Cantidad Paga Actas Anteriores	31,261.28
Cantidad Para Pago Presente Acta	2,699.00

INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA

Firma:


Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO DE 2023	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1 P	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 420mMPA	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	No. DE VARILLA	PESO / ML	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO
TRAMO 1 PUENTE RIO AMBEIMA	CAISSON 1 Y 2	2	REFUERZO TRANSVERSAL	5	1.55	198.00	5.40	3,314.52	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	12.00	4,300.80	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	8.60	3,082.24	
		36	AROS ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	14.00	5.80	1,636.99	
			BASTONES ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	22.00	1.10	487.87	
TRAMO 1 PUENTE RIO AMBEIMA	CAISSON 3 y 4	2	REFUERZO TRANSVERSAL	5	1.55	198.00	5.40	3,314.52	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	12.00	4,300.80	
			REFUERZO LONGITUDINAL	10	6.40	28.00	8.60	3,082.24	
		36	AROS ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	14.00	5.80	1,636.99	
			BASTONES ANILLOS EXTERNOS	3	0.56	22.00	1.10	487.87	
							14,766.08		

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.									
CONTRATO No.	1784 DE 2021			FECHA		SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)		ING FELIPE LOMBO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL			ENERO DE 2023		ACTA No. 8				
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB		CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA							
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1 P		DESCRIPCION	Acero de refuerzo 420mMPA					UNIDAD	M3
LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	No. DE VARILLA	PESO / ML	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO	






LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		CANTIDAD	NÚMERO DE LA VARILLA	PESO / ML	LONGITUD		PESO TOTAL (KG)	FIGURA
		INICIAL	FINAL							
TRAMO 1 - PUENTE VERDE		K11+437	K11+472	52	4	1.00	9.55		496.60	9.55
				48	4	1.00	4.80		230.40	4.80
				8	4	1.00	4.60		36.80	4.60
				8	4	1.00	4.40		35.20	4.40
				8	4	1.00	4.20		33.60	4.20
				8	4	1.00	4.00		32.00	4.00
				8	4	1.00	3.80		30.40	3.80
				160	4	1.00	3.80		608.00	0.20 3.40 0.20
				8	4	1.00	3.65		29.20	0.20 3.25 0.20
				9	4	1.00	3.45		31.05	0.20 3.05 0.20
				192	4	1.00	3.40		652.80	0.10 3.20
				8	4	1.00	3.25		26.00	0.20 2.85 0.20
				40	4	1.00	3.15		126.00	3.15
				8	4	1.00	3.05		24.40	0.20 2.65 0.20
				8	4	1.00	2.85		22.80	0.20 2.45 0.20
				32	4	1.00	2.20		70.40	h b t=0.25 h=0.65 e=0.20
				28	4	1.00	1.80		50.40	0.30 1.50
				8	4	1.00	1.15		9.20	0.25 0.65 0.25
				38	5	1.56	11.80		699.50	1.20 9.40 1.20
				20	5	1.56	10.05		313.56	0.25 9.55 0.25

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+550 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 5. Estructura Principal - 621.1 P	DESCRIPCION	Acero de refuerzo 420mMPA	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UBICACIÓN	No. DE VARILLA	PESO / ML	CANTIDAD	LONGITUD	TOTAL PESO	REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA		CANTIDAD	NÚMERO DE LA VARILLA	PESO / ML	LONGITUD		PESO TOTAL (KG)	FIGURA
		INICIAL	FINAL							
				120	5	1.56	6.20		1,160.64	
				120	5	1.56	3.00		561.60	
				264	5	1.56	2.50		1,029.60	
				120	5	1.56	1.80		336.96	
				96	5	1.56	1.40		209.66	
				42	7	3.06	10.15		1,304.48	
				28.00	7.00	3.06	1.80		154.22	
								Cantidad Acumulada Redondeada	33,960.33	
								Cantidad Paga Actas Anteriores	31,261.28	
								Cantidad Para Pago Presente Acta	2,699.00	

INTERVENTORIA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ


DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 1 DE 7

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

PLANTA TRAMO 1

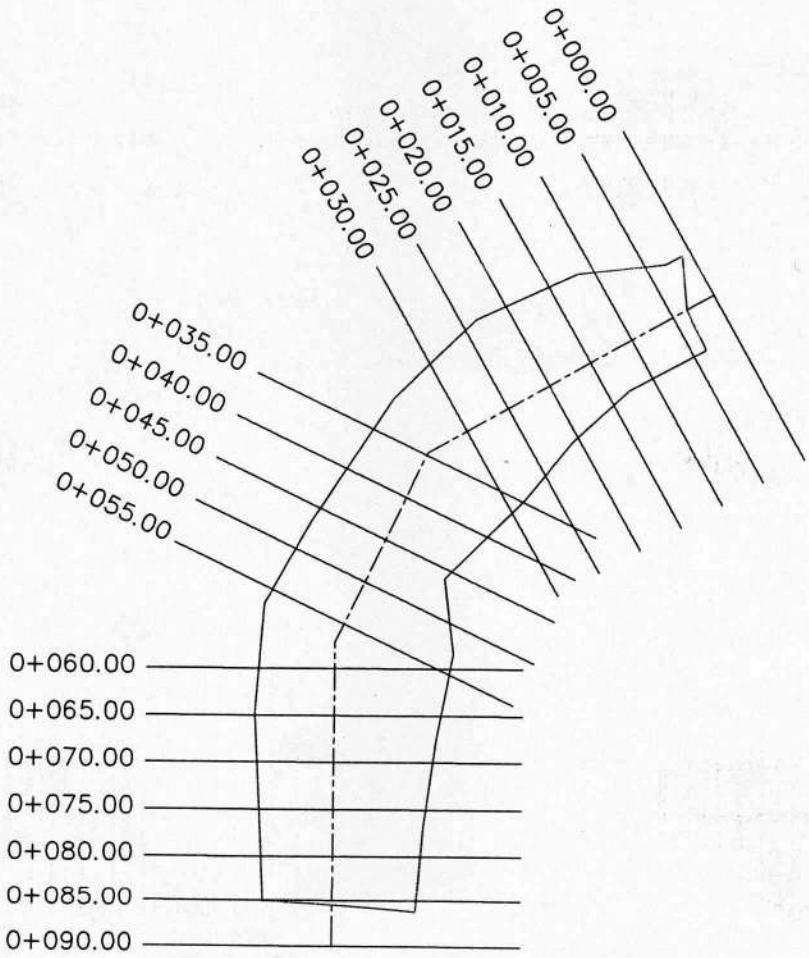

K11+300.00–K11+480.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 2 DE 7

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.


AREA CORTE

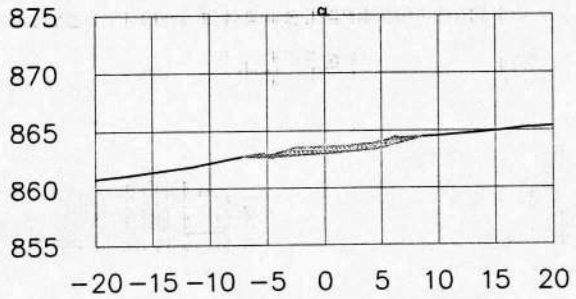


K0+005.00

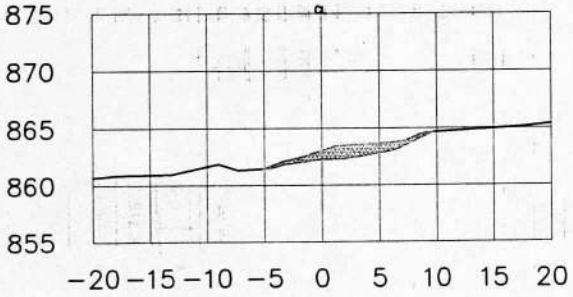

K0+015.00

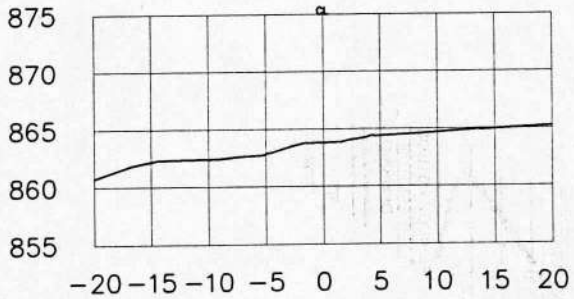

K0+000.00

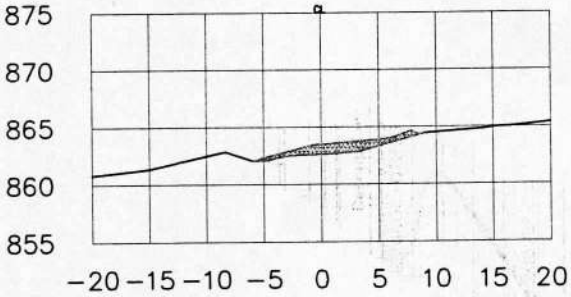

K0+010.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 3 DE 7

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.


AREA CORTE

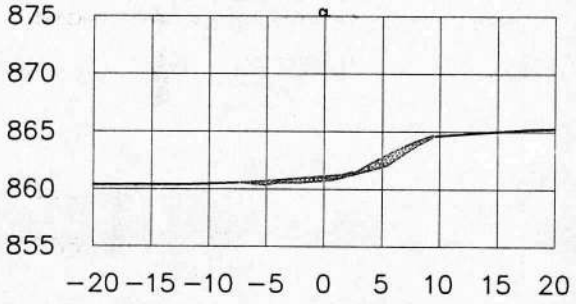


K0+025.00

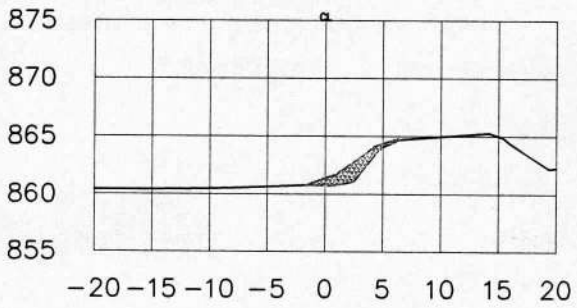

K0+035.00

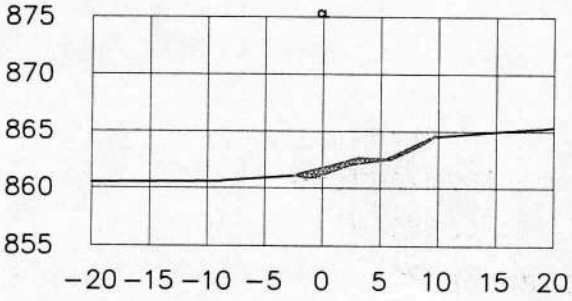

K0+020.00

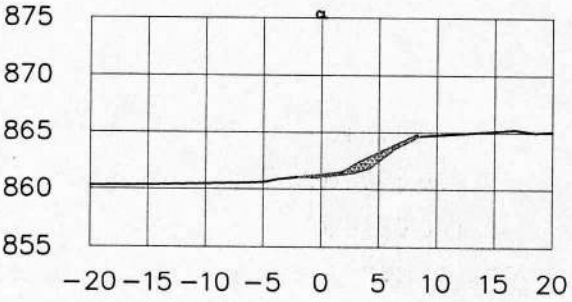


K0+030.00

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 4 DE 7


MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

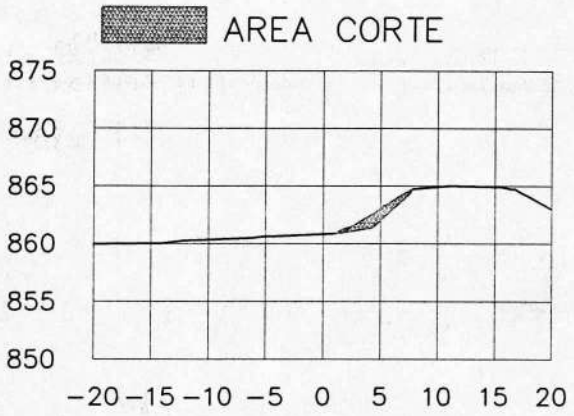


K0+045.00

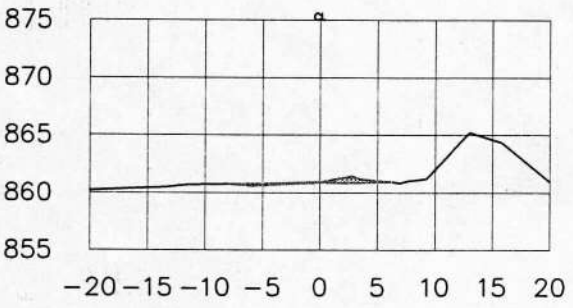

K0+055.00

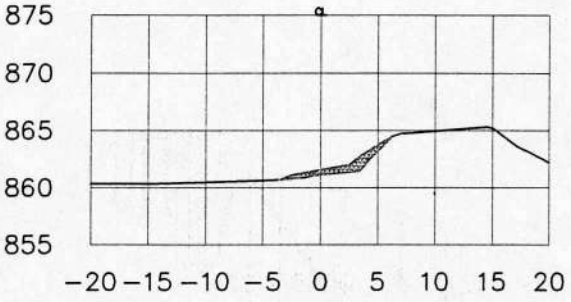

K0+040.00

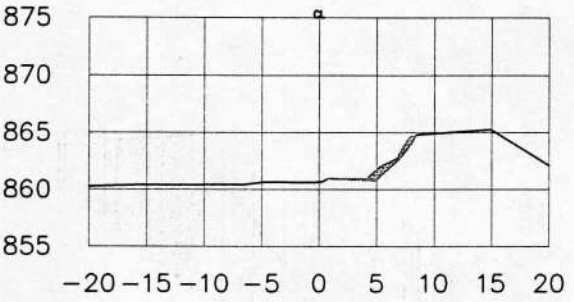

K0+050.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 5 DE 7

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.


AREA CORTE




K0+065.00



K0+075.00

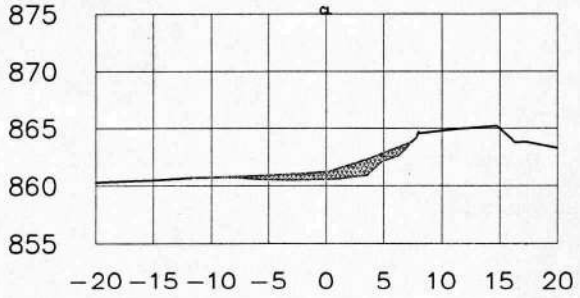

K0+060.00



K0+070.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 6 DE 7

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.


AREA CORTE



K0+085.00



K0+080.00



K0+090.00

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 7 DE 7

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

CALCULO DE VOLUMEN LLENO.
MEJORAMIENTO VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO.
58.EXCAVACION K11+200

ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION	
		AREA	VOL
K0+00		0.00	
	5.00		13.75
K0+005		5.50	
	5.00		26.88
K0+010		5.25	
	5.00		30.13
K0+015		6.80	
	5.00		28.25
K0+020		4.50	
	5.00		27.93
K0+025		6.67	
	5.00		27.70
K0+030		4.41	
	5.00		26.58
K0+035		6.22	
	5.00		28.73
K0+040		5.27	
	5.00		24.03
K0+045		4.34	

CALCULO DE VOLUMEN LLENO.
MEJORAMIENTO VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO.
58.EXCAVACION K11+200

ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION	
		AREA	VOL
K0+045		4.34	
	5.00		17.28
K0+050		2.57	
	5.00		12.78
K0+055		2.54	
	5.00		28.63
K0+060		8.91	
	5.00		32.85
K0+065		4.23	
	5.00		21.33
K0+070		4.30	
	5.00		22.25
K0+075		4.60	
	5.00		22.38
K0+080		4.35	
	5.00		14.00
K0+085		1.25	
	5.00		3.13
K0+090		0.00	
			EXCAVACION
VOLUMEN TOTAL (M3)			**408.55**


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 1 DE 5

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

PLANTA TRAMO 1

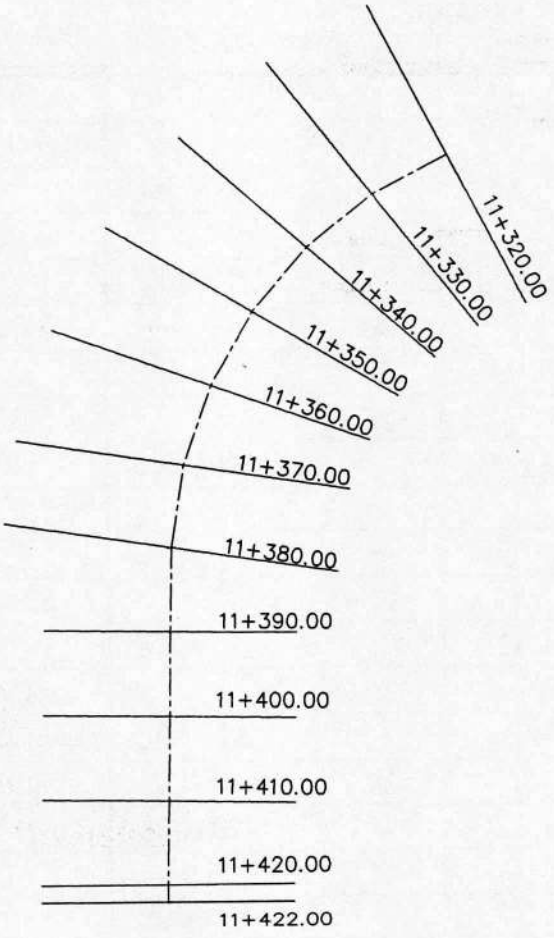


K11+320–K11+422

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 2 DE 5


MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

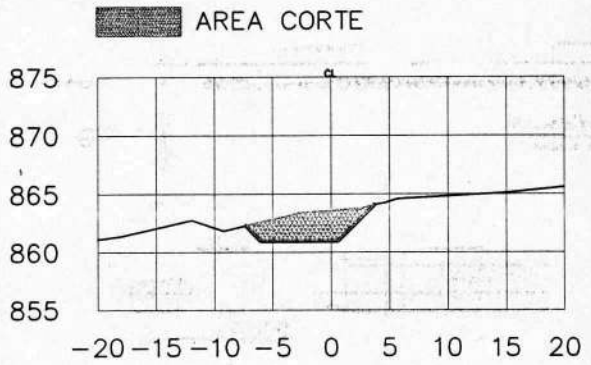


K11+330.00

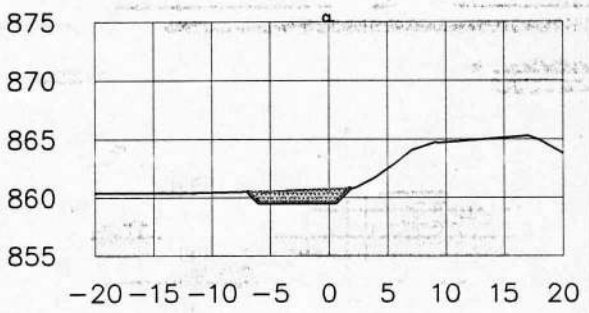

K11+350.00

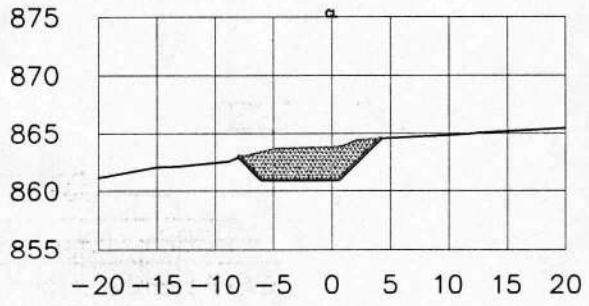

K11+320.00

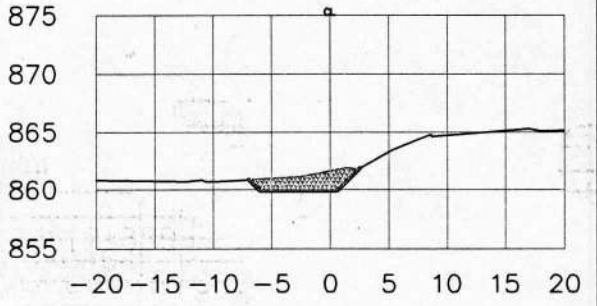

K11+340.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 3 DE 5

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.


AREA CORTE

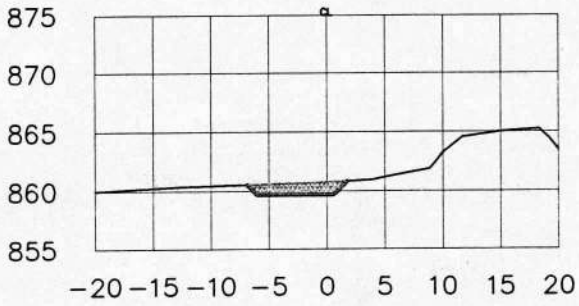


K11+370.00



K11+390.00



K11+360.00



K11+380.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 4 DE 5

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.


AREA CORTE

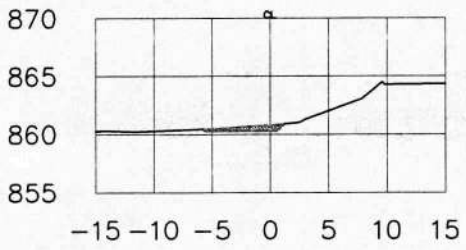


K11+410.00

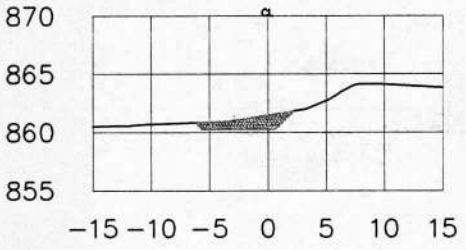

K11+422.00



K11+400.00

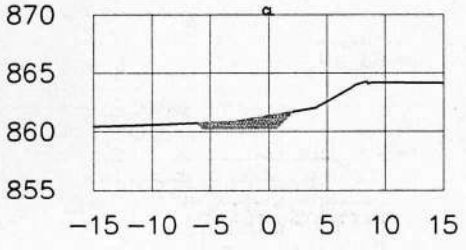

K11+420.00

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 5 DE 5

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

CALCULO DE VOLUMEN EXCAVACION.			
MEJORAMIENTO VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO.			
58. EXCAVACION K11+320-K11+422			
ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION	
		AREA	VOL
K11+320		25.49	
	10.00		226.35
K11+330		19.78	
	10.00		153.85
K11+340		10.99	
	10.00		94.50
K11+350		7.91	
	10.00		71.30
K11+360		6.35	
	10.00		67.80
K11+370		7.21	
	10.00		67.45
K11+380		6.28	

CALCULO DE VOLUMEN EXCAVACION.			
MEJORAMIENTO VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO.			
58. EXCAVACION K11+320-K11+422			
ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION	
		AREA	VOL
K11+380		6.28	
	10.00		54.80
K11+390		4.68	
	10.00		38.20
K11+400		2.96	
	10.00		25.95
K11+410		2.23	
	10.00		36.95
K11+420		5.16	
	2.00		11.33
K11+422		6.17	
			EXCAVACION
VOLUMEN TOTAL (M3)			848.48


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 1 DE 4

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

PLANTA TRAMO 1

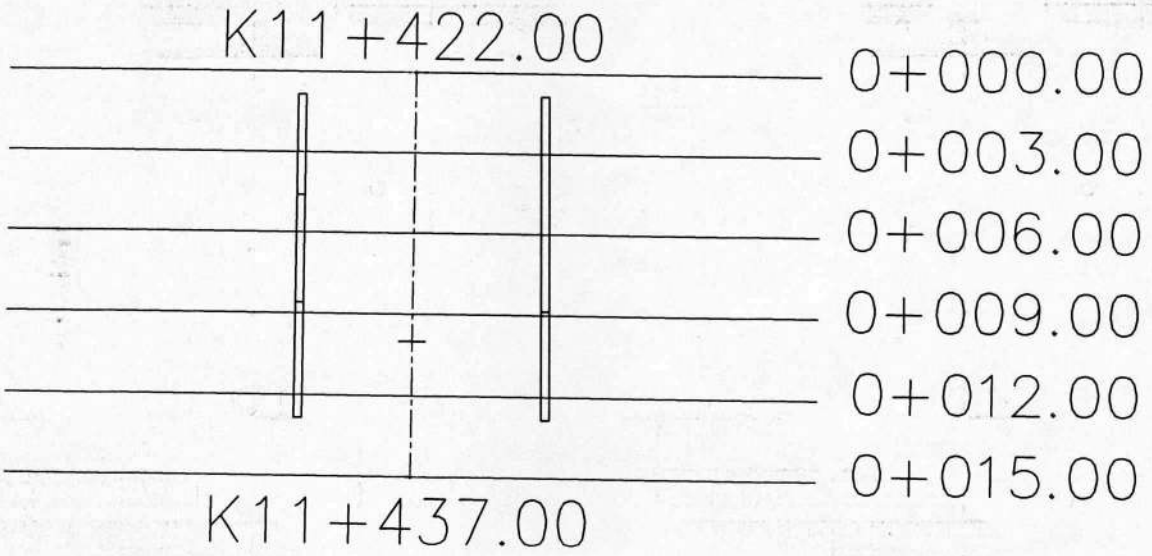


K11+422–K11+437

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 2 DE 4


MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

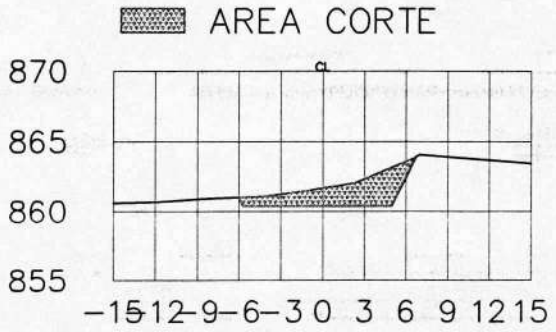


K0+003.00

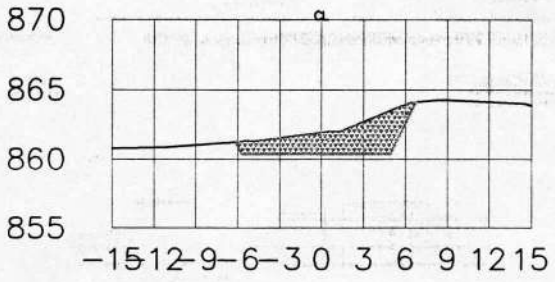

K0+009.00

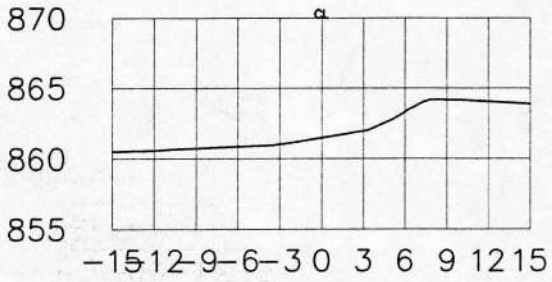

K0+000.00

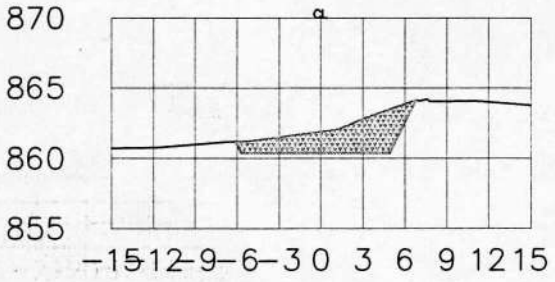

K0+006.00


	ELABORO	APROBO
FIRMA		Escriba el texto aquí
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 3 DE 4

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

AREA CORTE

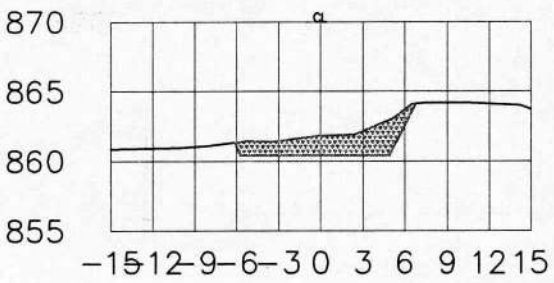

K0+012.00

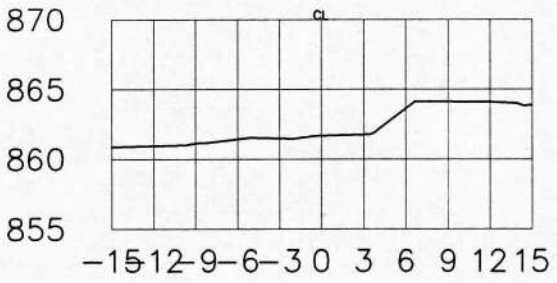

K0+015.00

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023 HOJA 4 DE 4

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

CALCULO DE VOLUMEN EXCAVACION.			
MEJORAMIENTO VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO.			
58. EXCAVACION K11+422-K11+437			
ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION	
		AREA	VOL
K0+00		0.00	
	3.00		24.98
K0+003		16.65	
	3.00		55.23
K0+006		20.17	
	3.00		61.19
K0+009		20.62	
	3.00		57.41
K0+012		17.65	
	3.00		26.48
K0+015		0.00	
			EXCAVACION
VOLUMEN TOTAL (M3)			**225.27**


	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 1 DE 4

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

PLANTA TRAMO 1

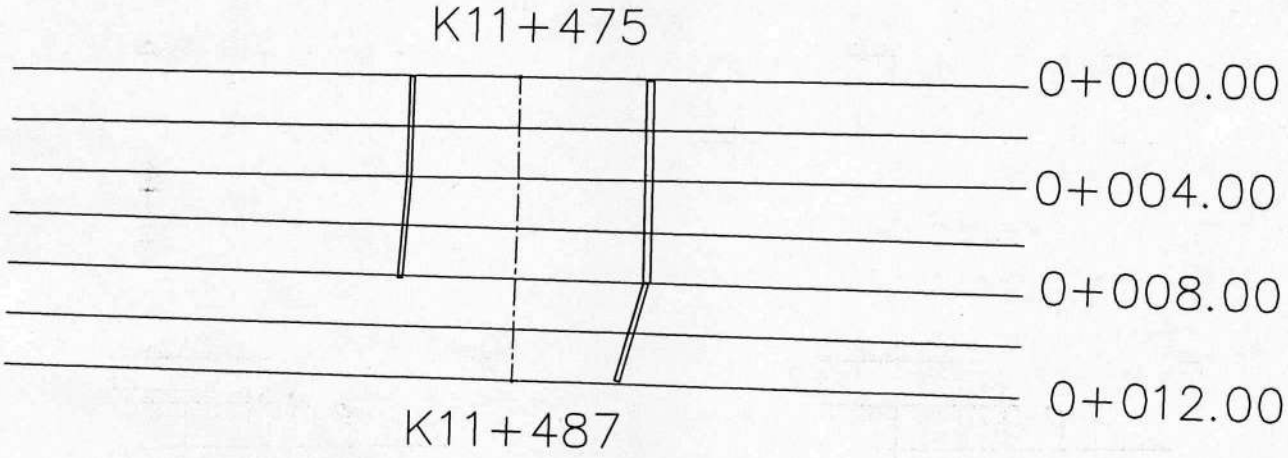


K11+475–K11+487

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 2 DE 4


MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

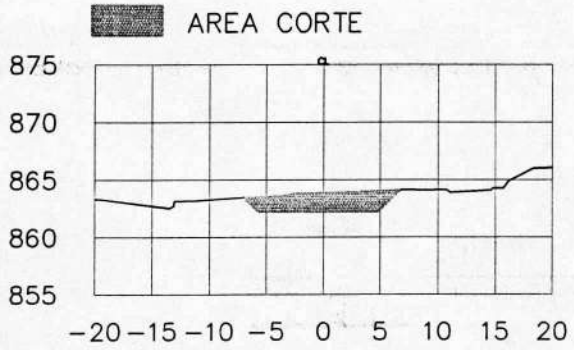


K0+002.00

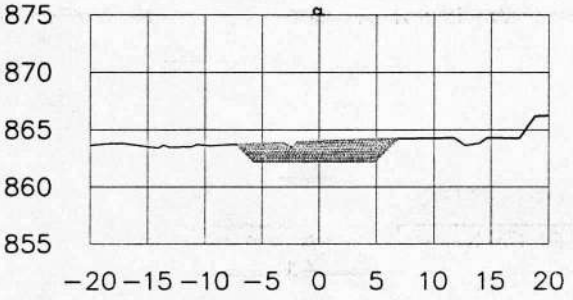

K0+006.00

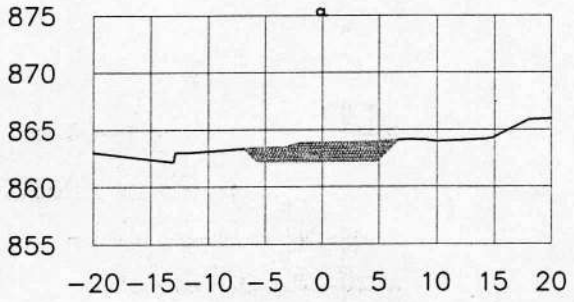

K0+000.00

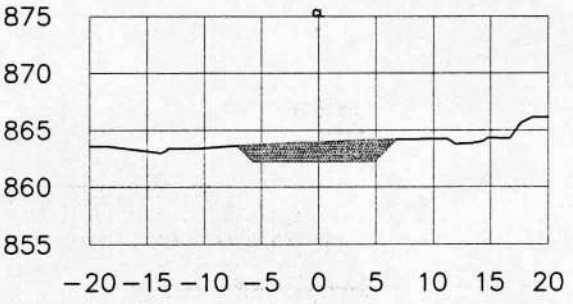


K0+004.00

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL


CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 3 DE 4


MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

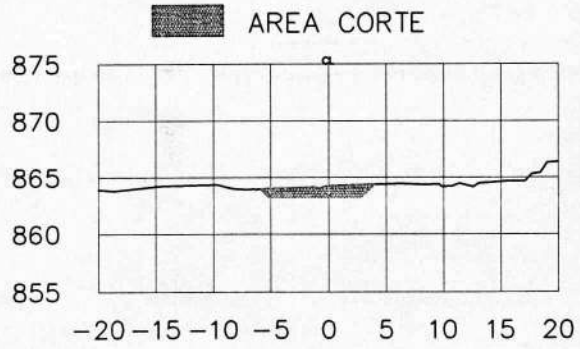

K0+010.00

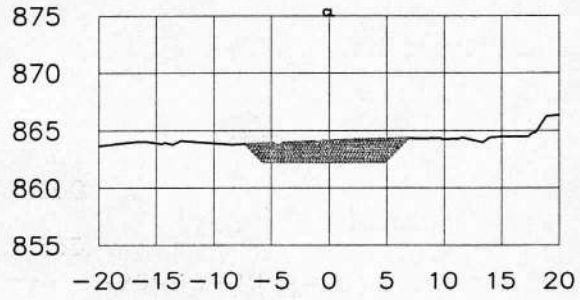

K0+008.00

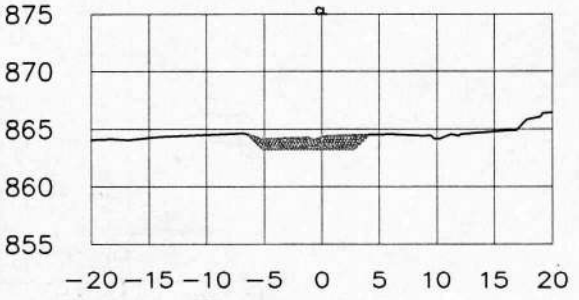

K0+012.00

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONTRATO DE OBRA 1784 2021. MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO. MUNICIPIO DE CHAPARRAL DEPARTAMENTO TOLIMA.	FECHA: ENERO 2023
	HOJA 4 DE 4

MEMORIAS DE CALCULOS – CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA ACTA 8.
58. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR.

CALCULO DE VOLUMEN EXCAVACION.			
MEJORAMIENTO VIA CHAPARRAL-RIOBLANCO.			
58. EXCAVACION K11+475			
ABSCISA	DISTANCIA	EXCAVACION	
		AREA	VOL
K0+00		17.83	
	2.00		36.83
K0+002		19.00	
	2.00		39.28
K0+004		20.28	
	2.00		41.42
K0+006		21.14	
	2.00		43.95
K0+008		22.81	
	2.00		31.05
K0+010		8.24	
	2.00		17.62
K0+012		9.38	
			EXCAVACION
VOLUMEN TOTAL (M3)			**210.15**

TOTAL=1692.45 M3

	ELABORO	APROBO
FIRMA		
NOMBRE	ING. CARLOS ARTURO RIVERA. CONSORCIO IC & CB	ING LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ. CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021	FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	ENERO DE 2022	ACTA No. 8		
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES - PUENTE	DESCRIPCION	61 -Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA INICIAL CUCUANA		PORCENTAJE DE ARENA 70%	LONGITUD	VOLUMEN TOTAL (M3)	ABSCISA CARGUE	RECORRIDO EN KM	TOTAL RECORRIDO (M3/KM) PARA ARENA	REGISTRO FOTOGRAFICO
PUENTE VERDE	CAISSON 1	K0+000		0.70	17.50	37.42	K96+000 SE DESCUENTA 54 KM DEL APU	42.00	1,100.13	
	CAISSON 2			0.70	17.50	37.42		42.00	1,100.13	
	CAISSON 3			0.70	17.50	37.42		42.00	1,100.13	
	CAISSON 4			0.70	17.50	37.42		42.00	1,100.13	
	descabece			0.70	2.00	0.81		42.00	23.90	
			CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN M3			
PUENTE VERDE	VIGA 1	K0+000	1.00	9.65	1.90	1.30	23.84	42.00	700.76	
	VIGA 2		1.00	9.65	1.90	1.30	23.84		700.76	
	VIGA 1-2		1.00	9.65	1.30	1.05	13.17		387.26	
	VIGA 2-2		1.00	9.65	1.30	1.05	13.17		387.26	
	Muro de cierre		2.00	1.90	1.30	0.25	1.24		36.31	
	Muro de cierre		2.00	1.00	-1.00	0.25	0.50		-14.70	
	Muro de cierre		2.00	2.20	1.05	0.25	1.16		33.96	
RESUMEN TRANSPORTE DE ARENA PARA CONCRETO							Cantidad Acumulada Redondeada		6,656.03	

TRANSPORTE DE TRITURADO PARA CONCRETO PORCENTAJE 0,70

PUENTE VERDE	CAISSON 1	K0+000	0.70	17.50	37.42	K96+000 SE DESCUENTA 54 KM DEL APU	42.00	1,100.13	
	CAISSON 2		0.70	17.50	37.42		42.00	1,100.13	
	CAISSON 3		0.70	17.50	37.42		42.00	1,100.13	
	CAISSON 4		0.70	17.50	37.42		42.00	1,100.13	
	descabece		0.70	2.00	0.81		42.00	23.90	

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2022	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	CAP. 7 TRANSPORTES - PUENTE	DESCRIPCION	61 -Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN	ABSCISADO REFERENCIA INICIAL CUCUANA	PORCENTAJE DE ARENA 70%	LONGITUD	VOLUMEN TOTAL (M3)	ABSCISA CARGUE	RECORRIDO EN KM	TOTAL RECORRIDO (M3/KM) PARA ARENA	REGISTRO FOTOGRAFICO
								

CONCRETO VIGAS Y VÁSTAGOS

UBICACIÓN		INICIAL	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN M3	ABSCISA CARGUE	TOTAL RECORRIDO (M3/KM)
PUENTE VERDE	VIGA 1	K0+000	1.00	9.65	1.90	1.30	23.84	42.00	700.76
	VIGA 2		1.00	9.65	1.90	1.30	23.84		700.76
	VIGA 1-2		1.00	9.65	1.30	1.05	13.17		387.26
	VIGA 2-2		1.00	9.65	1.30	1.05	13.17		387.26
	Muro de cierre		2.00	1.90	1.30	0.25	1.24		36.31
	Muro de cierre		2.00	1.00	- 1.00	0.25	- 0.50		-14.70
	Muro de cierre		2.00	2.20	1.05	0.25	1.16		33.96
RESUMEN TRANSPORTE DE ARENA PARA CONCRETO							Cantidad Acumulada Redondeada		6,656.03

TOTAL	13,312.06

RESUMEN GENERAL ARENA Y TRITURADO	
Cantidad Acumulada Redondeada	13,312.06
Cantidad Paga Actas Anteriores	
Cantidad Para Pago Presente Acta Redondeada	13,312.06

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LÓPEZ PÁEZ

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Via Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima.				
CONTRATO No.	1784 DE 2021		FECHA	SUPERVISOR DE PROYECTO (GOBERNACIÓN)	ING FELIPE LOMBO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL		ENERO DE 2023	ACTA No. 8	
INTERVENTOR	CONSORCIO IC & CB				
ITEM DE PAGO 621.1.P	Capitulo 6. Transportes PUENTE	DESCRIPCION	62 - Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	UNIDAD	M3

LOCALIZACIÓN		ABSCISADO REFERENCIA INICIAL		CANTIDAD FUNDIDOS	LONGITUD	VOLUMEN	ABSCISA CARGUE	RECORRIDO EN KM	TOTAL RECORRIDO (M3/KM)	REGISTRO FOTOGRAFICO
SECTOR GUANABANERA	CAISSON 1	K11+437		1.00	17.50	37.42	K26+000	14.56	572.18	
	CAISSON 2			1.00	17.50	37.42		14.56	572.18	
	CAISSON 3	K11+472		1.00	17.50	37.42		14.53	570.81	
	CAISSON 4			1.00	17.50	37.42		14.53	570.81	
	DESCABECE				2.00	1.07		14.56	16.33	
			LONGITUD	LADO MAYOR	LADO MENOR	VOLUMEN				
	VIGA VABEZAL NORTE	K11+437	9.65	1.90	1.30	23.84	K26+000	14.56	364.47	
	VIGA VABEZAL NORTE		9.65	1.05	1.30	13.17		14.56	201.42	
	MURO CIERRE NORTE 1 SON 2		1.90	1.30	0.25	1.24		14.56	18.88	
	MURO CIERRE NORTE 1 SON 2		1.00	- 1.00	0.25	- 0.50		14.56	-7.65	
	MURO CIERRE NORTE 2 SON 2		2.20	1.05	0.25	1.16		14.56	17.66	
	VIGA VABEZAL SUR	K11+472	9.65	1.90	1.30	23.84		14.53	363.60	
	VIGA VABEZAL SUR		9.65	1.05	1.30	13.17		14.53	200.93	
	VIGA VABEZAL SUR NIVEL 1 SON 2		1.90	1.30	0.25	1.24		14.53	18.84	
	VIGA VABEZAL SUR NIVEL 1 SON 2		1.00	- 1.00	0.25	- 0.50		14.53	-7.63	
	VIGA VABEZAL SUR NIVEL 2 SON 2		2.20	1.05	0.25	1.16		14.53	17.62	
							Cantidad Acumulada Redondeada		3,490.00	
							Cantidad Paga Actas Anteriores			
							Cantidad Para Pago Presente Acta		3,490.00	

El Volumen de los concretos de 1.05 en Consideración al APU

INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: CARLOS ARTURO RIVERA URDANETA

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: LUIS MAURICIO LOPEZ PAEZ

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

CONSTRUCCIONES
JUAN CAMILO SILVA R.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo **JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ**, identificado con C.C. 79'946.569 de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía (integrante del CONSORCIO VIAL CHAPARRAL durante la ejecución del Contrato 1784 del 2021 suscrito con la Gobernación del Tolima, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los dieciocho (23) días del mes de Febrero de 2023.

FIRMA ----------
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ
CC. 79.946.569 de Bogotá D.C

FIRMA ----------
MARTHA INES RINCÓN PULIDO
T.P. 56282-T
Contador

WORLD TRADE CENTER BOGOTÁ
Calle 100 No. 8A – 55 TORRE C Of. 401
Tels.: (1) 466 09 06 – 466 14 31
Bogotá D.C.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7864383884	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1838591698

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	22	$ 5,899,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5,899,300	$ 0	$ 5,899,300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 623,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623,100	$ 0	$ 623,100
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1,615,000	$ 0	$ 0	$ 22,000	$ 22,000	$ 0	$ 0	$ 1,659,000	$ 0	$ 1,659,000
230201	230201- PROTECCION	4	$ 839,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839,800	$ 0	$ 839,800
SUBTOTALES:										$ 9,021,200	$ 0	$ 9,021,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195,400	$ 0	$ 0	$ 195,400
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89,900	$ 0	$ 0	$ 89,900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 55,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55,800	$ 0	$ 0	$ 55,800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 833,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 833,500	$ 0	$ 0	$ 833,500
ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91,800	$ 0	$ 0	$ 91,800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 579,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579,900	$ 0	$ 0	$ 579,900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 271,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271,400	$ 0	$ 0	$ 271,400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143,800	$ 0	$ 0	$ 143,800
EPS041	NUEVA EPS CM	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 277,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277,800	$ 0	$ 0	$ 277,800
SUBTOTALES:													$ 2,539,300	$ 0	$ 0	$ 2,539,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3,462,200	$ 3,462,200	$ 0	$ 0	$ 3,462,200
SUBTOTALES:									$ 3,462,200	$ 0	$ 0	$ 3,462,200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	32	$ 2,360,600	$ 0	$ 2,360,600
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 300,000	$ 0	$ 300,000
SUBTOTALES:			$ 2,660,600	$ 0	$ 2,660,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006159122	ISAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI									01-22								
2	CC 1006159122	ISAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI														23-31			
3	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI										07-07							
4	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI									06-22								
5	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI														23-31			
6	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI									01-22								
7	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI														23-31			
8	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI														23-31			
9	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI									01-22								
10	CC 1054551114	RAMIREZ QUIÑONES LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI														23-31			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	22	$ 823,959	$ 131,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131,900
2	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
3	230201-PROTECCION	1	$ 33,334	$ 5,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5,400
4	230201-PROTECCION	21	$ 851,042	$ 136,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136,200
5	230201-PROTECCION	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
6	230301-PORVENIR	22	$ 872,918	$ 139,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 139,700
7	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
8	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
9	230301-PORVENIR	22	$ 886,980	$ 142,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142,000
10	25-14 COLPENSIONES	8	$ 533,334	$ 85,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85,400

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	ESSC62-ASMET SALUD	22	$ 823,959	$ 33,000	$ 0	$ 33,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 823,959		$ 57,400
2	ESSC62-ASMET SALUD	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
3	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 33,334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 33,334		$ 0
4	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 851,042	$ 34,100	$ 0	$ 34,100	14-11 - ARL SURA	21	$ 851,042		$ 59,300
5	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
6	ESSC91-ECOOPSOS EPS	22	$ 872,918	$ 35,000	$ 0	$ 35,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 872,918		$ 60,800
7	ESSC91-ECOOPSOS EPS	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
8	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
9	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	22	$ 886,980	$ 35,500	$ 0	$ 35,500	14-11 - ARL SURA	22	$ 886,980		$ 61,800
10	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 533,334	$ 21,400	$ 0	$ 21,400	14-11 - ARL SURA	8	$ 533,334		$ 0

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	22	$ 823,959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 33,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	1	$ 33,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	21	$ 851,042	CCF48-CONFATOLIMA	$ 34,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	22	$ 872,918	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	22	$ 886,980	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	8	$ 533,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 21,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTA	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7864383884	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838591698

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1054553114	RAMIREZ GUIGNIES LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.466.667	$ 234.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.700	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 58.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.466.667		$ 102.100	$22	$ 1.466.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1057577164	PACAGUA PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 800.000		$ 0	8	$ 800.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1057577164	PACAGUA PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	22	$ 2.200.000		$ 153.200	$22	$ 2.200.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1061542921	MUELAS MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI															23-31		25-14 COLPENSIONES	8	$ 666.667	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.700	ESSC62-ASMET SALUD	8	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 26.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 666.667		$ 0	8	$ 666.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1061542921	MUELAS MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.833.334	$ 293.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.400	ESSC62-ASMET SALUD	22	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 73.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.833.334		$ 127.700	$22	$ 1.833.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	22	$ 880.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.800	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 880.000	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 880.000		$ 61.300	22	$ 880.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI															23-31		230201-PROTECCION	8	$ 320.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.200	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 12.800	14-11 - ARL SURA	8	$ 320.000		$ 0	8	$ 320.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1072752752	VERA CRUZ MICHAEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											01-22						231001-COLFONDOS	30	$ 1.393.750	$ 223.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.393.750	$ 55.800	$ 0	$ 55.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.393.750		$ 97.100	30	$ 1.393.750	CCF48-CONFATOLIMA	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1073873201	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1073873201	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											01-22						230301-PORVENIR	22	$ 816.667	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.700	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 816.667	$ 32.700	$ 0	$ 32.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 816.667		$ 56.900	22	$ 816.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1075262506	MENDEZ RAMOS ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	22	$ 1.833.334	$ 293.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.400	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 73.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.833.334		$ 127.700	$22	$ 1.833.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1075262506	MENDEZ RAMOS ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI															23-31		231001-COLFONDOS	8	$ 666.667	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 26.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 666.667		$ 0	8	$ 666.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1081928067	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI															23-31		230201-PROTECCION	8	$ 373.334	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.800	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 373.334	$ 15.000	$ 0	$ 15.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 373.334		$ 0	8	$ 373.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1081928067	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	22	$ 1.026.667	$ 164.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.300	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1.026.667	$ 41.100	$ 0	$ 41.100	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.026.667		$ 71.500	22	$ 1.026.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1105768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS CM	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1105768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											05-06						230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS037-NUEVA EPS CM	1	$ 33.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 33.334		$ 0	1	$ 33.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1105768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											07-22						230301-PORVENIR	21	$ 891.667	$ 142.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142.700	EPS037-NUEVA EPS CM	21	$ 891.667	$ 35.700	$ 0	$ 35.700	14-11 - ARL SURA	21	$ 891.667		$ 62.100	21	$ 891.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 880.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.800	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 880.000	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 880.000		$ 61.300	22	$ 880.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 320.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.200	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 12.800	14-11 - ARL SURA	8	$ 320.000		$ 0	8	$ 320.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1106783193	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1106783193	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											01-22						230301-PORVENIR	22	$ 840.105	$ 134.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.500	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 840.105	$ 33.700	$ 0	$ 33.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 840.105		$ 58.500	22	$ 840.105	CCF48-CONFATOLIMA	$ 33.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	NUEVA EPS CM	8	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 400.000		$ 0	8	$ 400.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.100.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	NUEVA EPS CM	22	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.100.000		$ 76.600	22	$ 1.100.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1110540768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 933.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.400	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 933.334		$ 0	8	$ 933.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1110540768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 2.566.667	$ 410.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410.700	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 2.566.667	$ 102.700	$ 0	$ 102.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 2.566.667		$ 178.700	$22	$ 2.566.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1111334696	OSORIO CASTANEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI															23-31		230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1111334696	OSORIO CASTANEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											01-22						230301-PORVENIR	22	$ 1.179.689	$ 188.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.800	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.179.689	$ 47.200	$ 0	$ 47.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.179.689		$ 82.200	22	$ 1.179.689	CCF48-CONFATOLIMA	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619	NÚMERO PLANILLA:	7864383884	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTA	TELÉFONO:	4660906	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838591698
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO		REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE TAE	TDP TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
38	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							08-22								
39	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI								05-07							
40	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												23-31			
41	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							01-22								
42	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												23-31			
43	CC 12241397	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI												23-31			
44	CC 12241397	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI							01-22								
45	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							01-22								
46	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												23-31			
47	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												23-31			
48	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							01-22								
49	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												23-31			
50	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							01-22								
51	CC 17352839	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI							01-22								
52	CC 17352839	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI												23-31			
53	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 7.500.000	FIJO			SI												23-31			
54	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 7.500.000	FIJO			SI															
55	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI												23-31			
56	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI							01-22								
57	CC 5884414	ANGEL MARCOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		21					01-20								
58	CC 7316524	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI												23-31			
59	CC 7316524	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI															
60	CC 79554421	FERNANDEZ CASTILLO JUAN HARVEY	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI		22													
61	CC 86049744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI												23-31			
62	CC 86049744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI							01-22								
63	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI							01-22								
64	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI												23-31			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
38	230301-PORVENIR	19	$ 884,376	$ 141,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 141,600
39	230301-PORVENIR	3	$ 100,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16,000
40	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
41	230301-PORVENIR	22	$ 1,063,542	$ 170,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170,200
42	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
43	230301-PORVENIR	8	$ 320,000	$ 51,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51,200
44	230301-PORVENIR	22	$ 1,054,298	$ 168,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168,700
45	230301-PORVENIR	22	$ 823,959	$ 131,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131,900
46	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
47	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
48	230301-PORVENIR	22	$ 1,112,501	$ 178,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 178,100
49	230201-PROTECCION	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
50	230201-PROTECCION	22	$ 1,229,168	$ 196,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196,700
51	230301-PORVENIR	22	$ 1,610,625	$ 257,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257,700
52	230301-PORVENIR	8	$ 480,000	$ 76,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76,800
53			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
54			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
55	230301-PORVENIR	8	$ 506,667	$ 81,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 81,100
56	230301-PORVENIR	22	$ 1,876,251	$ 300,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300,300
57	230301-PORVENIR	21	$ 993,750	$ 159,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159,000
58	230301-PORVENIR	8	$ 933,334	$ 149,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149,400
59	230301-PORVENIR	22	$ 2,566,667	$ 410,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410,700
60	25-14 COLPENSIONES	22	$ 4,400,000	$ 704,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 748,000
61	230301-PORVENIR	8	$ 453,334	$ 72,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72,600
62	230301-PORVENIR	22	$ 1,846,979	$ 295,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295,600
63	25-14 COLPENSIONES	22	$ 925,001	$ 148,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148,100
64	25-14 COLPENSIONES	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
38	ESSC91-ECOOPSOS EPS	19	$ 884,376	$ 35,400	$ 0	$ 35,400	14-11 - ARL SURA	19	$ 884,376		$ 61,600
39	ESSC91-ECOOPSOS EPS	3	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	3	$ 100,000		$ 0
40	ESSC91-ECOOPSOS EPS	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
41	NUEVA EPS CM	22	$ 1,063,542	$ 42,600	$ 0	$ 42,600	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,063,542		$ 74,100
42	NUEVA EPS CM	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
43	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 320,000	$ 12,800	$ 0	$ 12,800	14-11 - ARL SURA	8	$ 320,000		$ 0
44	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1,054,298	$ 42,200	$ 0	$ 42,200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,054,298		$ 73,400
45	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	22	$ 823,959	$ 33,000	$ 0	$ 33,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 823,959		$ 57,400
46	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
47	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
48	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 1,112,501	$ 44,600	$ 0	$ 44,600	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,112,501		$ 77,500
49	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0
50	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1,229,168	$ 49,200	$ 0	$ 49,200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,229,168		$ 85,600
51	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1,610,625	$ 64,500	$ 0	$ 64,500	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,610,625		$ 112,100
52	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 480,000	$ 19,200	$ 0	$ 19,200	14-11 - ARL SURA	8	$ 480,000		$ 0
53	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	8	$ 2,000,000		$ 0
54	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 5,500,000	$ 220,000	$ 0	$ 220,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 5,500,000		$ 382,800
55	EPS008-COMPENSAR	8	$ 506,667	$ 20,300	$ 0	$ 20,300	14-11 - ARL SURA	8	$ 506,667		$ 0
56	EPS008-COMPENSAR	22	$ 1,876,251	$ 75,100	$ 0	$ 75,100	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,876,251		$ 130,600
57	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 993,750	$ 39,800	$ 0	$ 39,800	14-11 - ARL SURA	21	$ 993,750		$ 69,200
58	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 933,334	$ 37,400	$ 0	$ 37,400	14-11 - ARL SURA	8	$ 933,334		$ 0
59	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 2,566,667	$ 102,700	$ 0	$ 102,700	14-11 - ARL SURA	22	$ 2,566,667		$ 178,700
60	EPS008-COMPENSAR	22	$ 4,400,000	$ 176,000	$ 0	$ 176,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 4,400,000		$ 306,300
61	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 453,334	$ 18,200	$ 0	$ 18,200	14-11 - ARL SURA	8	$ 453,334		$ 0
62	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1,846,979	$ 73,900	$ 0	$ 73,900	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,846,979		$ 128,600
63	NUEVA EPS CM	22	$ 925,001	$ 37,100	$ 0	$ 37,100	14-11 - ARL SURA	22	$ 925,001		$ 64,400
64	NUEVA EPS CM	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0

PARAFISCALES

Nº	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
38	19	$ 884,376	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	3	$ 100,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	22	$ 1,063,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 42,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	8	$ 320,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	22	$ 1,054,298	CCF48-CONFATOLIMA	$ 42,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	22	$ 823,959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 33,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	22	$ 1,112,501	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	22	$ 1,229,168	CCF48-CONFATOLIMA	$ 49,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	22	$ 1,610,625	CCF48-CONFATOLIMA	$ 64,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	8	$ 480,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 19,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	8	$ 2,000,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	22	$ 5,500,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 220,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	8	$ 506,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 20,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	22	$ 1,876,251	CCF48-CONFATOLIMA	$ 75,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	21	$ 1,309,028	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	8	$ 933,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	22	$ 2,566,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 102,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	22	$ 7,116,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 284,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	8	$ 453,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 18,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	22	$ 1,846,979	CCF48-CONFATOLIMA	$ 73,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	22	$ 925,001	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7864383884	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DIAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838591608

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
65	CC 93453814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														23-31				230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700	NUEVA EPS CM	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 93453814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22									230301-PORVENIR	22	$ 1,488,542	$ 238,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238,200	NUEVA EPS CM	22	$ 1,488,542	$ 59,600	$ 0	$ 59,600	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,488,542		$ 103,700	22	$ 1,488,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 59,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 17.683.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7869407579	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2023
DIAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905755315

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 751,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 751,000	$ 900	$ 751,900
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1,188,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,500	$ 0	$ 1,188,900	$ 1,500	$ 6,978,900
230301	230301-PORVENIR	24	$ 6,870,100	$ 0	$ 0	$ 50,200	$ 50,200	$ 8,200	$ 200	$ 6,970,500	$ 8,400	$ 672,800
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 672,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 672,000	$ 800	$ 9,594,000
SUBTOTALES:										**$ 9,582,400**	**$ 11,600**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13,600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 13,600	$ 100	$ 0	$ 13,700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 868,500	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 868,500	$ 1,100	$ 0	$ 869,600
ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 98,400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 98,400	$ 200	$ 0	$ 98,600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88,900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 88,900	$ 200	$ 0	$ 89,100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93,400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 93,400	$ 200	$ 0	$ 93,600
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 222,800	$ 0	$ 300	$ 0	$ 222,800	$ 300	$ 0	$ 223,100
EPS041	NUEVA EPS CM	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 289,600	$ 0	$ 400	$ 0	$ 289,600	$ 400	$ 0	$ 290,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276,800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 276,800	$ 400	$ 0	$ 277,200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 706,500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 706,500	$ 900	$ 0	$ 707,400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69,000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 69,000	$ 100	$ 0	$ 69,100
SUBTOTALES:													**$ 2,727,500**	**$ 3,900**	**$ 0**	**$ 2,731,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4,591,700	$ 4,591,700	$ 5,500	$ 0	$ 4,597,200
SUBTOTALES:									**$ 4,591,700**	**$ 5,500**	**$ 0**	**$ 4,597,200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	36	$ 2,742,800	$ 3,300	$ 2,746,100
SUBTOTALES:			**$ 2,742,800**	**$ 3,300**	**$ 2,746,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																											PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006156775	RAMIREZ OCHOA GERZON HERNAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	16								16-30								230301-PORVENIR	15	$ 789,041	$ 126,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 126,300	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	15	$ 789,041	$ 31,600	$ 0	$ 31,600	14-11 - ARL SURA	15	$ 789,041		$ 55,000	15	$ 789,041	CCF48-CONFATOLIMA	$ 31,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006159122	BAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI									01-30/03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,181,751	$ 189,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189,100	ESSC62-ASMET SALUD	29	$ 1,181,751	$ 47,300	$ 0	$ 47,300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,181,751		$ 82,300	29	$ 1,181,751	CCF48-CONFATOLIMA	$ 47,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006159122	BAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	ESSC62-ASMET SALUD	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI									01-30/03-30								230201-PROTECCION	25	$ 996,875	$ 159,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159,500	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 996,875	$ 39,900	$ 0	$ 39,900	14-11 - ARL SURA	25	$ 996,875		$ 69,400	25	$ 996,875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 39,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			230201-PROTECCION	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI													18-21				230201-PROTECCION	4	$ 154,667	$ 24,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24,800	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 154,667	$ 6,200	$ 0	$ 6,200	14-11 - ARL SURA	4	$ 154,667		$ 0	4	$ 154,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI										31-31							230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 38,667	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI									01-30/03-30								230301-PORVENIR	28	$ 1,112,875	$ 178,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 178,100	ESSC91-ECOOPSOS EPS	28	$ 1,112,875	$ 44,600	$ 0	$ 44,600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,112,875		$ 77,500	28	$ 1,112,875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1007137585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI									01-30/03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,151,542	$ 184,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184,300	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	29	$ 1,151,542	$ 46,100	$ 0	$ 46,100	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,151,542		$ 80,200	29	$ 1,151,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7869407579	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905755318

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
11	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI														02-02			
12	CC 1018462952	GUZMAN ROMERO DARIO ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI	03																
13	CC 1052961797	QUINTERO ORTEGA LUMER ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	21								23-30								
14	CC 1054553114	RAMIREZ GUARNIZO LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI														02-02			
15	CC 1054553114	RAMIREZ GUARNIZO LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI								01-30									
16	CC 1057577164	PACAGUA PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	
17	CC 1057577164	PACAGUA PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI														02-02			
18	CC 1061542921	MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI		06															
19	CC 1061542921	MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI														02-02			
20	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI								01-30									
21	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI														02-02			
22	CC 1072752707	VERA CRUZ MICHAEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-3003-30									
23	CC 1073673201	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI														02-02			
24	CC 1073673201	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI										16-16							
25	CC 1073673201	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-3003-30									
26	CC 1075262505	RAMOS MENDEZ ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI														02-02			
27	CC 1075262505	RAMOS MENDEZ ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI								01-30									
28	CC 1083926097	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI								01-30									
29	CC 1083926097	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO		SI														02-02			
30	CC 1106768246	GUACANI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-3003-30									
31	CC 1106768246	GUACANI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI														02-02			
32	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI														02-02			
33	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI								01-30									
34	CC 1106783393	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI								01-3003-30									
35	CC 1106783393	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI														02-02			
36	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI								01-30									
37	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI														02-02			

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	25-14 COLPENSIONES	28	$ 2.333.334	$ 373.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.400	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	28	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 93.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.333.334		$ 162.500	28	$ 2.333.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	230301-PORVENIR	6	$ 321.417	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.500	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 321.417	$ 12.900	$ 0	$ 12.900	14-11 - ARL SURA	6	$ 321.417		$ 22.400	6	$ 321.417	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 83.334		$ 0	1	$ 83.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	25-14 COLPENSIONES	29	$ 2.416.667	$ 386.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386.700	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.416.667	$ 96.700	$ 0	$ 96.700	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.416.667		$ 168.300	29	$ 2.416.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 96.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	230301-PORVENIR	29	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.900.000		$ 201.900	29	$ 2.900.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	230301-PORVENIR	1	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 100.000		$ 0	1	$ 100.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	25-14 COLPENSIONES	5	$ 416.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 66.700	ESSC62-ASMET SALUD	5	$ 416.667	$ 16.700	$ 0	$ 16.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 416.667		$ 29.100	5	$ 930.555	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	25-14 COLPENSIONES	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	ESSC62-ASMET SALUD	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 83.334		$ 0	1	$ 83.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	230201-PROTECCION	29	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.450.000		$ 101.000	29	$ 1.450.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	230201-PROTECCION	1	$ 50.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50.000		$ 0	1	$ 50.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	231001-COLFONDOS	30	$ 1.399.250	$ 223.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.399.250	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.399.250		$ 97.400	30	$ 1.399.250	CCF48-CONFATOLIMA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	230301-PORVENIR	28	$ 1.149.125	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 183.900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.149.125	$ 46.000	$ 0	$ 46.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.149.125		$ 80.000	28	$ 1.149.125	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	231001-COLFONDOS	1	$ 93.334	$ 13.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 93.334	$ 3.800	$ 0	$ 3.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 93.334		$ 0	1	$ 93.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	231001-COLFONDOS	29	$ 2.706.667	$ 433.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 433.100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.706.667	$ 108.300	$ 0	$ 108.300	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.706.667		$ 188.400	29	$ 2.706.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 108.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	230201-PROTECCION	29	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.450.000		$ 101.000	29	$ 1.450.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	230201-PROTECCION	1	$ 50.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50.000		$ 0	1	$ 50.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	230301-PORVENIR	29	$ 1.187.792	$ 190.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190.100	NUEVA EPS CM	29	$ 1.187.792	$ 47.600	$ 0	$ 47.600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.187.792		$ 82.700	29	$ 1.187.792	CCF48-CONFATOLIMA	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	NUEVA EPS CM	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	230301-PORVENIR	1	$ 60.000	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 60.000		$ 0	1	$ 60.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	230301-PORVENIR	29	$ 1.740.000	$ 278.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278.400	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.740.000	$ 69.600	$ 0	$ 69.600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.740.000		$ 121.200	29	$ 1.740.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	230301-PORVENIR	29	$ 1.193.834	$ 191.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191.100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1.193.834	$ 47.800	$ 0	$ 47.800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.193.834		$ 83.100	29	$ 1.193.834	CCF48-CONFATOLIMA	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	230301-PORVENIR	29	$ 1.450.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232.000	NUEVA EPS CM	29	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 58.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.450.000		$ 101.000	29	$ 1.450.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	230301-PORVENIR	1	$ 50.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8.000	NUEVA EPS CM	1	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 2.000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50.000		$ 0	1	$ 50.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7869407579		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905755315

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
64	CC 86502590	VELASQUEZ BELTRAN JUAN PABLO	DEPEND		$ 1,200,000	FIJO			SI	13								13-30								25-14 COLPENSIONES	16	$ 820,625	$ 131,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131,300	EPS017-FAMISANAR	16	$ 820,625	$ 32,900	$ 0	$ 32,900	14-11 - ARL SURA	16	$ 820,625		$ 57,200	16	$ 820,625	CCF48-CONFATOLIMA	$ 32,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 86349744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1,700,000	FIJO			SI									01-30	03-30							230301-PORVENIR	29	$ 2,446,875	$ 391,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391,500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2,446,875	$ 97,900	$ 0	$ 97,900	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,446,875		$ 170,400	29	$ 2,446,875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 97,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 86349744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1,700,000	FIJO			SI														02-02			230301-PORVENIR	1	$ 60,000	$ 9,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9,600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 60,000	$ 2,400	$ 0	$ 2,400	14-11 - ARL SURA	1	$ 60,000		$ 0	1	$ 60,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI									01-30	03-30							25-14 COLPENSIONES	29	$ 1,236,126	$ 197,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197,800	NUEVA EPS CM	29	$ 1,236,126	$ 49,500	$ 0	$ 49,500	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,236,126		$ 86,100	29	$ 1,236,126	CCF48-CONFATOLIMA	$ 49,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			25-14 COLPENSIONES	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	NUEVA EPS CM	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 93451814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	NUEVA EPS CM	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 93451814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI									01-30	03-30							230301-PORVENIR	29	$ 1,878,959	$ 300,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300,700	NUEVA EPS CM	29	$ 1,878,959	$ 75,200	$ 0	$ 75,200	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,878,959		$ 130,800	29	$ 1,878,959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 75,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 19.668.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTA	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7869407579	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905755315

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
38	CC 1110540768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3,500,000	FIJO			SI														02-02			
39	CC 1110540768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3,500,000	FIJO			SI								01-30									
40	CC 1111042459	CAICEDO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	23								23-30								
41	CC 1111334696	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
42	CC 1111334696	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI										23-23							
43	CC 1111334696	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
44	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
45	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
46	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
47	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
48	CC 12241397	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1,200,000	FIJO			SI														02-02			
49	CC 12241397	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1,200,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
50	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
51	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
52	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
53	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
54	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI		11						01-13									
55	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
56	CC 17352839	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
57	CC 17352839	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI														02-02			
58	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 9,000,000	FIJO			SI								01-30									
59	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 9,000,000	FIJO			SI														02-02			
60	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1,900,000	FIJO			SI														02-02			
61	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1,900,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
62	CC 7318524	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3,500,000	FIJO			SI														02-02			
63	CC 7318524	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3,500,000	FIJO			SI								01-30									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

N°	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
38	230301-PORVENIR	1	$ 166,667	$ 26,700	$ 900	$ 900	$ 0	$ 0	Normal	$ 28,500
39	230301-PORVENIR	29	$ 4,833,334	$ 773,400	$ 24,200	$ 24,200	$ 0	$ 0	Normal	$ 821,800
40	230301-PORVENIR	8	$ 339,542	$ 54,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 54,400
41	230301-PORVENIR	1	$ 45,000	$ 7,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,200
42	230301-PORVENIR	1	$ 45,000	$ 7,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,200
43	230301-PORVENIR	28	$ 1,899,140	$ 303,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303,900
44	230301-PORVENIR	29	$ 1,263,917	$ 202,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202,300
45	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
46	230301-PORVENIR	29	$ 1,272,376	$ 203,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 203,600
47	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
48	230301-PORVENIR	1	$ 50,000	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8,000
49	230301-PORVENIR	29	$ 1,481,527	$ 237,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 237,100
50	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
51	230301-PORVENIR	29	$ 1,211,959	$ 194,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194,000
52	230301-PORVENIR	29	$ 1,553,917	$ 248,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248,700
53	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
54	230201-PROTECCION	12	$ 464,000	$ 74,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74,300
55	230201-PROTECCION	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
56	230301-PORVENIR	29	$ 2,093,959	$ 335,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335,100
57	230301-PORVENIR	1	$ 63,334	$ 10,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10,200
58			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
59			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
60	230301-PORVENIR	1	$ 66,667	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10,700
61	230301-PORVENIR	29	$ 2,266,667	$ 362,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 362,700
62	230301-PORVENIR	1	$ 166,667	$ 26,700	$ 900	$ 900	$ 0	$ 0	Normal	$ 28,500
63	230301-PORVENIR	29	$ 4,833,334	$ 773,400	$ 24,200	$ 24,200	$ 0	$ 0	Normal	$ 821,800

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
38	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 166,667	$ 6,700	$ 0	$ 6,700	14-11 - ARL SURA	1	$ 166,667		$ 0
39	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 4,833,334	$ 193,400	$ 0	$ 193,400	14-11 - ARL SURA	29	$ 4,833,334		$ 336,500
40	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	8	$ 339,542	$ 13,600	$ 0	$ 13,600	14-11 - ARL SURA	8	$ 339,542		$ 23,700
41	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 45,000	$ 1,800	$ 0	$ 1,800	14-11 - ARL SURA	1	$ 45,000		$ 0
42	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 45,000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 45,000		$ 0
43	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1,899,140	$ 76,000	$ 0	$ 76,000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,899,140		$ 132,200
44	ESSC91-ECOOPSOS EPS	29	$ 1,263,917	$ 50,600	$ 0	$ 50,600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,263,917		$ 88,000
45	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
46	NUEVA EPS CM	29	$ 1,272,376	$ 50,900	$ 0	$ 50,900	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,272,376		$ 88,600
47	NUEVA EPS CM	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
48	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50,000	$ 2,000	$ 0	$ 2,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50,000		$ 0
49	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1,481,527	$ 59,300	$ 0	$ 59,300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,481,527		$ 103,200
50	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
51	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	29	$ 1,211,959	$ 48,500	$ 0	$ 48,500	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,211,959		$ 84,400
52	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1,553,917	$ 62,200	$ 0	$ 62,200	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,553,917		$ 108,200
53	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
54	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 464,000	$ 18,600	$ 0	$ 18,600	14-11 - ARL SURA	12	$ 464,000		$ 32,300
55	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
56	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2,093,959	$ 83,800	$ 0	$ 83,800	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,093,959		$ 145,800
57	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 63,334	$ 2,600	$ 0	$ 2,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 63,334		$ 0
58	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 8,700,000	$ 348,000	$ 0	$ 348,000	14-11 - ARL SURA	29	$ 8,700,000		$ 605,600
59	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 300,000	$ 12,000	$ 0	$ 12,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 300,000		$ 0
60	EPS008-COMPENSAR	1	$ 66,667	$ 2,700	$ 0	$ 2,700	14-11 - ARL SURA	1	$ 66,667		$ 0
61	EPS008-COMPENSAR	29	$ 2,266,667	$ 90,700	$ 0	$ 90,700	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,266,667		$ 157,800
62	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 166,667	$ 6,700	$ 0	$ 6,700	14-11 - ARL SURA	1	$ 166,667		$ 0
63	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 4,833,334	$ 193,400	$ 0	$ 193,400	14-11 - ARL SURA	29	$ 4,833,334		$ 336,500

PARAFISCALES

N°	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
38	1	$ 166,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 6,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	29	$ 4,833,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 193,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	8	$ 339,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 13,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	1	$ 45,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	1	$ 45,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	28	$ 1,899,140	CCF48-CONFATOLIMA	$ 76,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	29	$ 1,263,917	CCF48-CONFATOLIMA	$ 50,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	29	$ 1,272,376	CCF48-CONFATOLIMA	$ 50,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	1	$ 50,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	29	$ 1,481,527	CCF48-CONFATOLIMA	$ 59,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	29	$ 1,211,959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 48,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	29	$ 1,553,917	CCF48-CONFATOLIMA	$ 62,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	12	$ 485,167	CCF48-CONFATOLIMA	$ 19,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	29	$ 2,093,959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 83,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	1	$ 63,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	29	$ 8,700,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	1	$ 300,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	1	$ 66,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	29	$ 2,266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 90,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	1	$ 166,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 6,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	29	$ 4,833,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 193,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada — ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7869407579			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905755315		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
64	CC 80502500	VELASQUEZ BELTRAN JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI	13								13-30								25-14 COLPENSIONES	18	$ 820.625	$ 131.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.300	EPS017-FAMISANAR	18	$ 820.625	$ 32.900	$ 0	$ 32.900	14-11 - ARL SURA	18	$ 820.625		$ 57.200	18	$ 820.625	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 32.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
65	CC 86049744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI									01-3003-30								230301-PORVENIR	29	$ 2.446.875	$ 391.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.500	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.446.875	$ 97.900	$ 0	$ 97.900	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.446.875		$ 170.400	29	$ 2.446.875	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 97.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 86049744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI														02-02			230301-PORVENIR	1	$ 60.000	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 60.000	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 60.000		$ 0	1	$ 60.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
67	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-3003-30								25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.236.126	$ 197.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 197.800	NUEVA EPS CM	29	$ 1.236.126	$ 49.500	$ 0	$ 49.500	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.236.126		$ 86.100	29	$ 1.236.126	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
68	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02			25-14 COLPENSIONES	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	NUEVA EPS CM	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
69	CC 93451814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02			230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	NUEVA EPS CM	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667		$ 0	1	$ 38.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
70	CC 93451814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-3003-30								230301-PORVENIR	29	$ 1.878.959	$ 300.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.700	NUEVA EPS CM	29	$ 1.878.959	$ 75.200	$ 0	$ 75.200	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.878.959		$ 130.800	29	$ 1.878.959	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 19.668.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI — Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7869407579	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905755315

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 751,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 751,000	$ 900	$ 751,900
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1,188,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,500	$ 0	$ 1,188,900	$ 1,500	$ 1,190,400
230301	230301-PORVENIR	24	$ 6,870,100	$ 0	$ 0	$ 50,200	$ 50,200	$ 8,200	$ 200	$ 6,970,500	$ 8,400	$ 6,978,900
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 672,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 672,000	$ 800	$ 672,800
SUBTOTALES:										$ 9,582,400	$ 11,600	$ 9,594,000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 13,600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 13,600	$ 100	$ 0	$ 13,700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 868,500	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 868,500	$ 1,100	$ 0	$ 869,600
ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 98,400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 98,400	$ 200	$ 0	$ 98,600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88,900	$ 0	$ 200	$ 0	$ 88,900	$ 200	$ 0	$ 89,100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 93,400	$ 0	$ 200	$ 0	$ 93,400	$ 200	$ 0	$ 93,600
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 222,800	$ 0	$ 300	$ 0	$ 222,800	$ 300	$ 0	$ 223,100
EPS041	NUEVA EPS CM	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 289,600	$ 0	$ 400	$ 0	$ 289,600	$ 400	$ 0	$ 290,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276,800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 276,800	$ 400	$ 0	$ 277,200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 706,500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 706,500	$ 900	$ 0	$ 707,400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69,000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 69,000	$ 100	$ 0	$ 69,100
SUBTOTALES:													$ 2,727,500	$ 3,900	$ 0	$ 2,731,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4,591,700	$ 4,591,700	$ 5,500	$ 0	$ 4,597,200
SUBTOTALES:									$ 4,591,700	$ 5,500	$ 0	$ 4,597,200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	36	$ 2,742,800	$ 3,300	$ 2,746,100
SUBTOTALES:			$ 2,742,800	$ 3,300	$ 2,746,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1006156775	RAMIREZ OCHOA GERZON HERNAN	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI	16								16-30								
2	CC 1006159122	ISAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
3	CC 1006159122	ISAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
4	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
5	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
6	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI												18-21					
7	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI										31-31							
8	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI														02-02			
9	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								
10	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI								01-30	03-30								

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	15	$ 789,041	$ 126,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 126,300
2	230301-PORVENIR	29	$ 1,181,751	$ 189,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189,100
3	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
4	230201-PROTECCION	25	$ 996,875	$ 159,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159,500
5	230201-PROTECCION	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
6	230201-PROTECCION	4	$ 154,667	$ 24,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24,800
7	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
8	230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200
9	230301-PORVENIR	28	$ 1,112,875	$ 178,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 178,100
10	230301-PORVENIR	29	$ 1,151,542	$ 184,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 184,300

SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	15	$ 789,041	$ 31,600	$ 0	$ 31,600	14-11 - ARL SURA	15	$ 789,041		$ 55,000
2	ESSC62-ASMET SALUD	29	$ 1,181,751	$ 47,300	$ 0	$ 47,300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,181,751		$ 82,300
3	ESSC62-ASMET SALUD	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
4	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 996,875	$ 39,900	$ 0	$ 39,900	14-11 - ARL SURA	25	$ 996,875		$ 69,400
5	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
6	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 154,667	$ 6,200	$ 0	$ 6,200	14-11 - ARL SURA	4	$ 154,667		$ 0
7	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 38,667	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
8	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0
9	ESSC91-ECOOPSOS EPS	28	$ 1,112,875	$ 44,600	$ 0	$ 44,600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,112,875		$ 77,500
10	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	29	$ 1,151,542	$ 46,100	$ 0	$ 46,100	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,151,542		$ 80,200

PARAFISCALES

Nº	CCF DIAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	15	$ 789,041	CCF48-CONFATOLIMA	$ 31,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	29	$ 1,181,751	CCF48-CONFATOLIMA	$ 47,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	25	$ 996,875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 39,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	4	$ 154,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	1	$ 38,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	28	$ 1,112,875	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	29	$ 1,151,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 46,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada — ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7869407579	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1905755315

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP											CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1018482952	GUZMAN ROMERO DIANA ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	03																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 2,333,334	$ 373,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373,400	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	28	$ 2,333,334	$ 93,400	$ 0	$ 93,400	14-11 - ARL SURA	28	$ 2,333,334		$ 162,500	28	$ 2,333,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 93,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1052983797	QUINTERO CORTES LIDMER ANTONIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	23								23-30									230301-PORVENIR	8	$ 321,417	$ 51,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51,500	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 321,417	$ 12,900	$ 0	$ 12,900	14-11 - ARL SURA	8	$ 321,417		$ 22,400	8	$ 321,417	CCF48-CONFATO LIMA	$ 12,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1054553114	GUARNIZ RAMIREZ LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI														02-02				25-14 COLPENSIONES	1	$ 83,334	$ 13,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13,400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 83,334	$ 3,400	$ 0	$ 3,400	14-11 - ARL SURA	1	$ 83,334		$ 0	1	$ 83,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 3,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1054553114	GUARNIZ RAMIREZ LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30									25-14 COLPENSIONES	29	$ 2,416,667	$ 386,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 386,700	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2,416,667	$ 96,700	$ 0	$ 96,700	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,416,667		$ 168,300	29	$ 2,416,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 96,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1057577164	PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	29	$ 2,900,000	$ 464,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464,000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2,900,000	$ 116,000	$ 0	$ 116,000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,900,000		$ 201,900	29	$ 2,900,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 116,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1057577164	PACAGUI PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 100,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16,000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 100,000	$ 4,000	$ 0	$ 4,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 100,000		$ 0	1	$ 100,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 4,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1061542921	MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		06																25-14 COLPENSIONES	5	$ 416,667	$ 66,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 66,700	ESSC62-ASMET SALUD	5	$ 416,667	$ 16,700	$ 0	$ 16,700	14-11 - ARL SURA	5	$ 416,667		$ 29,100	5	$ 930,555	CCF48-CONFATO LIMA	$ 37,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1061542921	MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI														02-02				25-14 COLPENSIONES	1	$ 83,334	$ 13,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13,400	ESSC62-ASMET SALUD	1	$ 83,334	$ 3,400	$ 0	$ 3,400	14-11 - ARL SURA	1	$ 83,334		$ 0	1	$ 83,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 3,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	29	$ 1,450,000	$ 232,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232,000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1,450,000	$ 58,000	$ 0	$ 58,000	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,450,000		$ 101,000	29	$ 1,450,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI														02-02				230201-PROTECCION	1	$ 50,000	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8,000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50,000	$ 2,000	$ 0	$ 2,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50,000		$ 0	1	$ 50,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1072752702	VERA CRUZ MICHAEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-3003-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1,399,250	$ 223,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223,900	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,399,250	$ 56,000	$ 0	$ 56,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,399,250		$ 97,400	30	$ 1,399,250	CCF48-CONFATO LIMA	$ 56,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1073673211	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1073673211	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										16-16								230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1073673211	RAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-3003-30									230301-PORVENIR	28	$ 1,149,125	$ 183,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 183,900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1,149,125	$ 46,000	$ 0	$ 46,000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,149,125		$ 80,000	28	$ 1,149,125	CCF48-CONFATO LIMA	$ 46,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1075262505	MENDEZ RAMOS ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI														02-02				231001-COLFONDOS	1	$ 93,334	$ 15,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 15,000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 93,334	$ 3,800	$ 0	$ 3,800	14-11 - ARL SURA	1	$ 93,334		$ 0	1	$ 93,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 3,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1075262505	MENDEZ RAMOS ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	29	$ 2,706,667	$ 433,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 433,100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2,706,667	$ 108,300	$ 0	$ 108,300	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,706,667		$ 188,400	29	$ 2,706,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 108,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1083928057	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI									01-30									230201-PROTECCION	29	$ 1,450,000	$ 232,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232,000	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1,450,000	$ 58,000	$ 0	$ 58,000	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,450,000		$ 101,000	29	$ 1,450,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1083928057	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI														02-02				230201-PROTECCION	1	$ 50,000	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8,000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 50,000	$ 2,000	$ 0	$ 2,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50,000		$ 0	1	$ 50,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1106768246	GUALARN SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-3003-30									230301-PORVENIR	29	$ 1,187,792	$ 190,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 190,100	NUEVA EPS CM	29	$ 1,187,792	$ 47,600	$ 0	$ 47,600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,187,792		$ 82,700	29	$ 1,187,792	CCF48-CONFATO LIMA	$ 47,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1106768246	GUALARN SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	NUEVA EPS CM	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 60,000	$ 9,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9,600	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 60,000	$ 2,400	$ 0	$ 2,400	14-11 - ARL SURA	1	$ 60,000		$ 0	1	$ 60,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	29	$ 1,740,000	$ 278,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 278,400	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1,740,000	$ 69,600	$ 0	$ 69,600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,740,000		$ 121,200	29	$ 1,740,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 69,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1106783393	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-3003-30									230301-PORVENIR	29	$ 1,193,834	$ 191,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 191,100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1,193,834	$ 47,800	$ 0	$ 47,800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,193,834		$ 83,100	29	$ 1,193,834	CCF48-CONFATO LIMA	$ 47,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1106783393	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	29	$ 1,450,000	$ 232,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 232,000	NUEVA EPS CM	29	$ 1,450,000	$ 58,000	$ 0	$ 58,000	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,450,000		$ 101,000	29	$ 1,450,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 58,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 50,000	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8,000	NUEVA EPS CM	1	$ 50,000	$ 2,000	$ 0	$ 2,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50,000		$ 0	1	$ 50,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi · Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7864383884	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838591698

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
38	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									06-22								
39	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI										05-07							
40	CC 1151436292	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI														23-31			
41	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-22								
42	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI														23-31			
43	CC 12241397	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI														23-31			
44	CC 12241397	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO		SI									01-22								
45	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-22								
46	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI														23-31			
47	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI														23-31			
48	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-22								
49	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI														23-31			
50	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-22								
51	CC 17352839	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI									01-22								
52	CC 17352839	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI														23-31			
53	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 7.500.000	FIJO		SI														23-31			
54	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 7.500.000	FIJO		SI																	
55	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI														23-31			
56	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI									01-22								
57	CC 5884414	ANGEL MARCOS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	21								01-20								
58	CC 7318524	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI														23-31			
59	CC 7318524	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO		SI																	
60	CC 79554421	FERNANDEZ CASTILLO JUAN HARVEY	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO		SI	22																
61	CC 86049744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI														23-31			
62	CC 86049744	CORREDOR SILVA PEDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI									01-22								
63	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI									01-22								
64	CC 93449877	GIL CRUZ JOSE AUGUSTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI														23-31			

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

N°	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
38	230301-PORVENIR	19	$ 884,376	$ 141,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 141,600
39	230301-PORVENIR	3	$ 100,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16,000
40	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
41	230301-PORVENIR	22	$ 1,063,542	$ 170,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 170,200
42	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
43	230301-PORVENIR	8	$ 320,000	$ 51,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51,200
44	230301-PORVENIR	22	$ 1,054,298	$ 168,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168,700
45	230301-PORVENIR	22	$ 823,959	$ 131,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131,900
46	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
47	230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
48	230301-PORVENIR	22	$ 1,112,501	$ 178,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 178,100
49	230201-PROTECCION	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700
50	230201-PROTECCION	22	$ 1,229,168	$ 196,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196,700
51	230301-PORVENIR	22	$ 1,610,625	$ 257,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 257,700
52	230301-PORVENIR	8	$ 480,000	$ 76,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76,800
53			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
54			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
55	230301-PORVENIR	8	$ 506,667	$ 81,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 81,100
56	230301-PORVENIR	22	$ 1,876,251	$ 300,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300,300
57	230301-PORVENIR	21	$ 993,750	$ 159,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159,000
58	230301-PORVENIR	8	$ 933,334	$ 149,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149,400
59	230301-PORVENIR	22	$ 2,566,667	$ 410,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410,700
60	25-14 COLPENSIONES	22	$ 4,400,000	$ 704,000	$ 22,000	$ 22,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 748,000
61	230301-PORVENIR	8	$ 453,334	$ 72,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72,600
62	230301-PORVENIR	22	$ 1,846,979	$ 295,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295,600
63	25-14 COLPENSIONES	22	$ 925,001	$ 148,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 148,100
64	25-14 COLPENSIONES	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700

SALUD / ARP / PARAFISCALES

N°	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
38	ESSC91-ECOOPSOS EPS	19	$ 884,376	$ 35,400	$ 0	$ 35,400	14-11 - ARL SURA	19	$ 884,376		$ 61,600	19	$ 884,376	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	ESSC91-ECOOPSOS EPS	3	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	3	$ 100,000		$ 0	3	$ 100,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	ESSC91-ECOOPSOS EPS	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	NUEVA EPS CM	22	$ 1,063,542	$ 42,600	$ 0	$ 42,600	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,063,542		$ 74,100	22	$ 1,063,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 42,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	NUEVA EPS CM	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 320,000	$ 12,800	$ 0	$ 12,800	14-11 - ARL SURA	8	$ 320,000		$ 0	8	$ 320,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 12,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1,054,298	$ 42,200	$ 0	$ 42,200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,054,298		$ 73,400	22	$ 1,054,298	CCF48-CONFATOLIMA	$ 42,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	22	$ 823,959	$ 33,000	$ 0	$ 33,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 823,959		$ 57,400	22	$ 823,959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 33,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	EPS002-SALUD TOTAL	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 1,112,501	$ 44,600	$ 0	$ 44,600	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,112,501		$ 77,500	22	$ 1,112,501	CCF48-CONFATOLIMA	$ 44,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1,229,168	$ 49,200	$ 0	$ 49,200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,229,168		$ 85,600	22	$ 1,229,168	CCF48-CONFATOLIMA	$ 49,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1,610,625	$ 64,500	$ 0	$ 64,500	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,610,625		$ 112,100	22	$ 1,610,625	CCF48-CONFATOLIMA	$ 64,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 480,000	$ 19,200	$ 0	$ 19,200	14-11 - ARL SURA	8	$ 480,000		$ 0	8	$ 480,000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 19,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	8	$ 2,000,000		$ 0	8	$ 2,000,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 5,500,000	$ 220,000	$ 0	$ 220,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 5,500,000		$ 382,800	22	$ 5,500,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 220,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	EPS008-COMPENSAR	8	$ 506,667	$ 20,300	$ 0	$ 20,300	14-11 - ARL SURA	8	$ 506,667		$ 0	8	$ 506,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 20,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	EPS008-COMPENSAR	22	$ 1,876,251	$ 75,100	$ 0	$ 75,100	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,876,251		$ 130,600	22	$ 1,876,251	CCF48-CONFATOLIMA	$ 75,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 993,750	$ 39,800	$ 0	$ 39,800	14-11 - ARL SURA	21	$ 993,750		$ 69,200	21	$ 1,309,028	CCF48-CONFATOLIMA	$ 52,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 933,334	$ 37,400	$ 0	$ 37,400	14-11 - ARL SURA	8	$ 933,334		$ 0	8	$ 933,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 2,566,667	$ 102,700	$ 0	$ 102,700	14-11 - ARL SURA	22	$ 2,566,667		$ 178,700	22	$ 2,566,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 102,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	EPS008-COMPENSAR	22	$ 4,400,000	$ 176,000	$ 0	$ 176,000	14-11 - ARL SURA	22	$ 4,400,000		$ 306,300	22	$ 7,116,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 284,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 453,334	$ 18,200	$ 0	$ 18,200	14-11 - ARL SURA	8	$ 453,334		$ 0	8	$ 453,334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 18,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1,846,979	$ 73,900	$ 0	$ 73,900	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,846,979		$ 128,600	22	$ 1,846,979	CCF48-CONFATOLIMA	$ 73,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	NUEVA EPS CM	22	$ 925,001	$ 37,100	$ 0	$ 37,100	14-11 - ARL SURA	22	$ 925,001		$ 64,400	22	$ 925,001	CCF48-CONFATOLIMA	$ 37,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
64	NUEVA EPS CM	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada · SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7864383684	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1838591898

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																						PENSIÓN								SALUD					ARP																									
																									FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																				
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
65	CC 93453814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI													23-31					230301-PORVENIR	8	$ 266,667	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42,700	NUEVA EPS CM	8	$ 266,667	$ 10,700	$ 0	$ 10,700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266,667		$ 0	8	$ 266,667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
66	CC 93453814	BELTRAN LLANOS YIMER FABIAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22									230301-PORVENIR	22	$ 1,488,542	$ 238,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238,200	NUEVA EPS CM	22	$ 1,488,542	$ 59,600	$ 0	$ 59,600	14-11 - ARL SURA	22	$ 1,488,542		$ 103,700	22	$ 1,488,542	CCF48-CONFATOLIMA	$ 59,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 17.683.300

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7864383884			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1838591898

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	22	$ 5.899.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.899.300	$ 0	$ 5.899.300
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 623.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.100	$ 0	$ 623.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.615.000	$ 0	$ 0	$ 22.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 1.659.000	$ 0	$ 1.659.000
230201	230201- PROTECCION	4	$ 839.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 839.800	$ 0	$ 839.800
SUBTOTALES:										**$ 9.021.200**	**$ 0**	**$ 9.021.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	-$ 195.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.400	$ 0	$ 0	$ 195.400
EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 89.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 55.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	13		$ 0		$ 0		$ 0	$ 833.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 833.500	$ 0	$ 0	$ 833.500
ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.800	$ 0	$ 0	$ 91.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 579.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.900	$ 0	$ 0	$ 579.900
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.400	$ 0	$ 0	$ 271.400
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 143.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800	$ 0	$ 0	$ 143.800
EPS041	NUEVA EPS CM	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.800	$ 0	$ 0	$ 277.800
SUBTOTALES:													**$ 2.539.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.539.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.462.200	$ 3.462.200	$ 0	$ 0	$ 3.462.200	
SUBTOTALES:									**$ 3.462.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.462.200**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	32	$ 2.360.600	$ 0	$ 2.360.600
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 300.000	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:			**$ 2.660.600**	**$ 0**	**$ 2.660.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES								
																												PENSIÓN							SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006159122	ISAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22									230301-PORVENIR	22	$ 823.959	$ 131.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.900	ESSC62-ASMET SALUD	22	$ 823.959	$ 33.000	$ 0	$ 33.000	14-11 - ARL SURA	22	$ 823.959		$ 57.400	22	$ 823.959	CCF48-CONFATOLIMA	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1006159122	ISAZA BUENAVENTURA JHOAN CAMILO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														23-31				230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	ESSC62-ASMET SALUD	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											07-07							230201-PROTECCION	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 33.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 33.334		$ 0	1	$ 33.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									08-22									230201-PROTECCION	21	$ 851.042	$ 136.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.200	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 851.042	$ 34.100	$ 0	$ 34.100	14-11 - ARL SURA	21	$ 851.042		$ 59.300	21	$ 851.042	CCF48-CONFATOLIMA	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1007287650	MARTINEZ JIMENEZ YEIMI VIVIANA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														23-31				230201-PROTECCION	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22									230301-PORVENIR	22	$ 872.918	$ 139.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 139.700	ESSC91-ECOOPSOS EPS	22	$ 872.918	$ 35.000	$ 0	$ 35.000	14-11 - ARL SURA	22	$ 872.918		$ 60.800	22	$ 872.918	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1007289829	CARDOZO GONZALEZ DANIELA DEL PILAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														23-31				230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	ESSC91-ECOOPSOS EPS	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI														23-31				230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1007837585	PRIETO BONILLA ANA MARIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22									230301-PORVENIR	22	$ 886.980	$ 142.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142.000	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	22	$ 886.980	$ 35.500	$ 0	$ 35.500	14-11 - ARL SURA	22	$ 886.980		$ 61.800	22	$ 886.980	CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1054551114	RAMIREZ SIMMONES LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI														23-31				25-14 COLPENSIONES	8	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 533.334		$ 0	8	$ 533.334	CCF48-CONFATOLIMA	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901505619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELEFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7864383884			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1838591698

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																						PENSIÓN								SALUD						ARP																							
																						FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
11	CC 1054553114	RAMIREZ GUARDIANES LISETH NATALIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.466.667	$ 234.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 234.700	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.466.667	$ 58.700	$ 0	$ 58.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.466.667		$ 102.100	22	$ 1.466.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1057577164	PACAGUA PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	8	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 128.000	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 800.000		$ 0	8	$ 800.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1057577164	PACAGUA PEREZ JULIAN RICARDO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	22	$ 2.200.000		$ 153.200	22	$ 2.200.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1061542921	MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI											23-31						25-14 COLPENSIONES	6	$ 666.667	$ 100.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.700	ESSC62-ASMET SALUD	6	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 26.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 666.667		$ 0	6	$ 666.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1061542921	MUELAS YULLY ALEJANDRA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	22	$ 1.833.334	$ 293.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.400	ESSC62-ASMET SALUD	22	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 73.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.833.334		$ 127.700	22	$ 1.833.334	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	22	$ 880.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.800	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 880.000	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 880.000		$ 61.300	22	$ 880.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1072189520	BARRAGAN RODRIGUEZ JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI											23-31						230201-PROTECCION	8	$ 320.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.200	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 12.800	14-11 - ARL SURA	8	$ 320.000		$ 0	8	$ 320.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1072752702	VERA CRUZ MICHAEL			$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22								231001-COLFONDOS	30	$ 1.393.750	$ 223.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 223.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.393.750	$ 55.800	$ 0	$ 55.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.393.750		$ 97.100	30	$ 1.393.750	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1073673201	BAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	6	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 266.667		$ 0	6	$ 266.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1073673201	BAYO PRADA YUREIDY PAOLA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22								230301-PORVENIR	22	$ 816.667	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 130.700	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 816.667	$ 32.700	$ 0	$ 32.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 816.667		$ 56.900	22	$ 816.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1075262505	MENDEZ RAMOS ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	22	$ 1.833.334	$ 293.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293.400	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 73.400	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.833.334		$ 127.700	22	$ 1.833.334	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1075262505	MENDEZ RAMOS ERIKA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI											23-31						231001-COLFONDOS	6	$ 666.667	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.700	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 26.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 666.667		$ 0	6	$ 666.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 1083928097	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI											23-31						230201-PROTECCION	8	$ 373.334	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 59.800	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 373.334	$ 15.000	$ 0	$ 15.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 373.334		$ 0	8	$ 373.334	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1083928097	RODRIGUEZ ESPAÑA SAUL	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	22	$ 1.026.667	$ 164.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 164.300	EPS005-SANITAS S.A.	22	$ 1.026.667	$ 41.100	$ 0	$ 41.100	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.026.667		$ 71.500	22	$ 1.026.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1106768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	8	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	NUEVA EPS CM	8	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	8	$ 266.667		$ 0	8	$ 266.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 1106768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI										06-06						230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	NUEVA EPS CM	1	$ 33.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 33.334		$ 0	1	$ 33.334	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 1106768246	GUACARI SANCHEZ ROSA HERMINIA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									07-22								230301-PORVENIR	21	$ 891.667	$ 142.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142.700	NUEVA EPS CM	21	$ 891.667	$ 35.700	$ 0	$ 35.700	14-11 - ARL SURA	21	$ 891.667		$ 62.100	21	$ 891.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 880.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.800	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 880.000	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 880.000		$ 61.300	22	$ 880.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1106775762	CHARRY MORA LADY PAOLA	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	8	$ 320.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.200	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 12.800	14-11 - ARL SURA	8	$ 320.000		$ 0	8	$ 320.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1106783139	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	6	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 266.667		$ 0	6	$ 266.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 1106783139	BELTRAN LLANOS AYDA LUCINDA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22								230301-PORVENIR	22	$ 840.105	$ 134.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 134.500	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 840.105	$ 33.700	$ 0	$ 33.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 840.105		$ 58.500	22	$ 840.105	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 33.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	8	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	NUEVA EPS CM	8	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 400.000		$ 0	8	$ 400.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 1110176708	REYES OSPINA EDITSON RICARDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 1.100.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 176.000	NUEVA EPS CM	22	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 44.000	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.100.000		$ 76.600	22	$ 1.100.000	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 1110540768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	6	$ 933.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.400	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 37.400	14-11 - ARL SURA	6	$ 933.334		$ 0	6	$ 933.334	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 1110540768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	22	$ 2.566.667	$ 410.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 410.700	EPS002-SALUD TOTAL	22	$ 2.566.667	$ 102.700	$ 0	$ 102.700	14-11 - ARL SURA	22	$ 2.566.667		$ 178.700	22	$ 2.566.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 102.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 1111334696	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI											23-31						230301-PORVENIR	6	$ 266.667	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 42.700	EPS037-NUEVA EPS	6	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 10.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 266.667		$ 0	6	$ 266.667	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 1111334696	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI									01-22								230301-PORVENIR	22	$ 1.179.689	$ 188.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 188.800	EPS037-NUEVA EPS	22	$ 1.179.689	$ 47.200	$ 0	$ 47.200	14-11 - ARL SURA	22	$ 1.179.689		$ 82.200	22	$ 1.179.689	$CCF48-CONFATOLIMA	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Constructora FG S.A.S
Ingeniería - Arquitectura - Construcción - Transporte
NIT. 800.209.530 - 3

GS 1142
GA 451
GA 436

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)

MANUEL NAVARRO HERNANDEZ identificado con cedula No. **92.095.487** de Galeras – Sucre y con Tarjeta Profesional No. 67691-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA FG S.A.S. identificada con NIT 800.209.530-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) cuando aplique, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que meencuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Barranquilla, a los 24 días del mes de febrero de 2023.

FIRMA .....

MANUEL NAVARRO HERNANDEZ
Revisor Fiscal
C.C. No. 92.095.487 de Galeras - Sucre
T. P. No. 67691-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901595619
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO VIAL CHAPARRAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHAPARRAL	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 100 8A-55 T C OF 401 -BOGOTÁ	TELÉFONO:	4660906
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7869407579	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905755315

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
38	CC 1119547768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 166,667	$ 26,700	$ 900	$ 900	$ 0	$ 0	Normal	$ 28,500	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 166,667	$ 6,700	$ 0	$ 6,700	14-11 - ARL SURA	1	$ 166,667		$ 0	1	$ 166,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 6,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
39	CC 1119547768	ORTIZ VERA CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	29	$ 4,833,334	$ 773,400	$ 24,200	$ 24,200	$ 0	$ 0	Normal	$ 821,800	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 4,833,334	$ 193,400	$ 0	$ 193,400	14-11 - ARL SURA	29	$ 4,833,334		$ 336,500	29	$ 4,833,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 193,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
40	CC 1111942459	CAICEDO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	23								23-30									230301-PORVENIR	8	$ 339,542	$ 54,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 54,400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	8	$ 339,542	$ 13,600	$ 0	$ 13,600	14-11 - ARL SURA	8	$ 339,542		$ 23,700	8	$ 339,542	CCF48-CONFATO LIMA	$ 13,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
41	CC 1111334606	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 45,000	$ 7,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 45,000	$ 1,800	$ 0	$ 1,800	14-11 - ARL SURA	1	$ 45,000		$ 0	1	$ 45,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
42	CC 1111334606	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI										23-23								230301-PORVENIR	1	$ 45,000	$ 7,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 45,000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	1	$ 45,000		$ 0	1	$ 45,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
43	CC 1111334606	OSORIO CASTAÑEDA EDUAR HERNAN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	28	$ 1,899,140	$ 303,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303,900	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1,899,140	$ 76,000	$ 0	$ 76,000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,899,140		$ 132,200	28	$ 1,899,140	CCF48-CONFATO LIMA	$ 76,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
44	CC 1151436262	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,263,917	$ 202,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 202,300	ESSC91-ECOOPSOS EPS	29	$ 1,263,917	$ 50,600	$ 0	$ 50,600	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,263,917		$ 88,000	29	$ 1,263,917	CCF48-CONFATO LIMA	$ 50,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
45	CC 1151436262	BOTACHE MONTEALEGRE DEIVER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
46	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,272,376	$ 203,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 203,600	NUEVA EPS CM	29	$ 1,272,376	$ 50,900	$ 0	$ 50,900	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,272,376		$ 88,600	29	$ 1,272,376	CCF48-CONFATO LIMA	$ 50,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
47	CC 1193515251	BETANCOURT PERALTA PABLO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	NUEVA EPS CM	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
48	CC 12241197	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 50,000	$ 8,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 8,000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 50,000	$ 2,000	$ 0	$ 2,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 50,000		$ 0	1	$ 50,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
49	CC 12241197	MURCIA DELGADO MILLER	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,481,527	$ 237,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 237,100	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 1,481,527	$ 59,300	$ 0	$ 59,300	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,481,527		$ 103,200	29	$ 1,481,527	CCF48-CONFATO LIMA	$ 59,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
50	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	$ 38,667	$ 1,500	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
51	CC 14281025	SAENZ TRIANA CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,211,959	$ 194,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194,000	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	29	$ 1,211,959	$ 48,500	$ 0	$ 48,500	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,211,959		$ 84,400	29	$ 1,211,959	CCF48-CONFATO LIMA	$ 48,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
52	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 1,553,917	$ 248,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248,700	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1,553,917	$ 62,200	$ 0	$ 62,200	14-11 - ARL SURA	29	$ 1,553,917		$ 108,200	29	$ 1,553,917	CCF48-CONFATO LIMA	$ 62,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
53	CC 14281644	BERMUDEZ DUCUARA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
54	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	11								01-13									230201-PROTECCION	12	$ 464,000	$ 74,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74,300	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 464,000	$ 18,600	$ 0	$ 18,600	14-11 - ARL SURA	12	$ 464,000		$ 32,300	12	$ 485,167	CCF48-CONFATO LIMA	$ 19,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
55	CC 14281847	RUBIO VALENCIA JOSE ALDEMAR	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI														02-02				230201-PROTECCION	1	$ 38,667	$ 6,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38,667	$ 1,600	$ 0	$ 1,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38,667		$ 0	1	$ 38,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 1,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56	CC 17352819	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 2,093,959	$ 335,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335,100	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2,093,959	$ 83,600	$ 0	$ 83,800	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,093,959		$ 145,800	29	$ 2,093,959	CCF48-CONFATO LIMA	$ 83,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
57	CC 17352819	VASQUEZ VASQUEZ GERMAN	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 63,334	$ 10,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10,200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 63,334	$ 2,600	$ 0	$ 2,600	14-11 - ARL SURA	1	$ 63,334		$ 0	1	$ 63,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
58	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 9.000.000	FIJO			SI									01-30											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 8,700,000	$ 348,000	$ 0	$ 348,000	14-11 - ARL SURA	29	$ 8,700,000		$ 605,600	29	$ 8,700,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 348,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
59	CC 19270280	CARDONA TORRES JOSE	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 9.000.000	FIJO			SI														02-02						$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 300,000	$ 12,000	$ 0	$ 12,000	14-11 - ARL SURA	1	$ 300,000		$ 0	1	$ 300,000	CCF48-CONFATO LIMA	$ 12,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
60	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 66,667	$ 10,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10,700	EPS008-COMPENSAR	1	$ 66,667	$ 2,700	$ 0	$ 2,700	14-11 - ARL SURA	1	$ 66,667		$ 0	1	$ 66,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 2,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
61	CC 3055131	RODRIGUEZ CORTES CARLOS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI									01-30	03-30								230301-PORVENIR	29	$ 2,266,667	$ 362,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 362,700	EPS008-COMPENSAR	29	$ 2,266,667	$ 90,700	$ 0	$ 90,700	14-11 - ARL SURA	29	$ 2,266,667		$ 157,800	29	$ 2,266,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 90,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
62	CC 73165241	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI														02-02				230301-PORVENIR	1	$ 166,667	$ 26,700	$ 900	$ 900	$ 0	$ 0	Normal	$ 28,500	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 166,667	$ 6,700	$ 0	$ 6,700	14-11 - ARL SURA	1	$ 166,667		$ 0	1	$ 166,667	CCF48-CONFATO LIMA	$ 6,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
63	CC 73165241	LOPEZ PAEZ LUIS MAURICIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI									01-30									230301-PORVENIR	29	$ 4,833,334	$ 773,400	$ 24,200	$ 24,200	$ 0	$ 0	Normal	$ 821,800	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 4,833,334	$ 193,400	$ 0	$ 193,400	14-11 - ARL SURA	29	$ 4,833,334		$ 336,500	29	$ 4,833,334	CCF48-CONFATO LIMA	$ 193,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800209530	3	CONSTRUCTORA FG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CR 57 NO 84 211	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3785184	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	32073246	9445355490	E	2023/01/10	2023/01/31	BANCOLOMBIA		$47,327,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BARRANQUILLA (83 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: BQ 0,522 (13 Afiliados)																																
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (13 Afiliados)																																
1	CC	1124025939	ACOSTA MEDINA CARLOS CARLOS																			23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
2	CC	1048936310	BELLO PADILLA GLEY																			23020 1	30	EPS048	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
3	CC	72203810	CARDENAS MARTINEZ JUAN CARLOS																			25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
4	CC	32758690	DE LA HOZ FONSECA BLANCA FLOR																			25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
5	CC	32740463	DE LA HOZ FONSECA LUZ DE MARIA																			23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
6	CC	37915533	GONZALEZ DE GONZALEZ CATALINA SUSANA																			25-14	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
7	CC	32772731	MANZANO ORDONEZ CLAUDIA PATRICIA																			25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
8	CC	72328723	MORELO BEDOYA YESIHT MANUEL																			23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
9	CC	32828116	PABON MARTINEZ SAIDA LUZ																			25-14	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
10	CC	26987841	SALTAREN GALEZO GINA ROSA																			23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
11	CC	39098170	VISBAL MARTINEZ CARMEN SOFIA													X						23020 1	5	EPS010	5	CCF06	5	14-25	5	0.000%	5	Si
12	CC	39098170	VISBAL MARTINEZ CARMEN SOFIA													X						23020 1	5	EPS010	5	CCF06	5	14-25	5	0.000%	5	Si
13	CC	39098170	VISBAL MARTINEZ CARMEN SOFIA																			23020 1	20	EPS010	20	CCF06	20	14-25	20	0.522%	20	Si
14	CC	22468104	YEPES FERNANDEZ MILENA DEL SOCORRO								X											25-14	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
15	CC	1143240261	YEPEZ VILLAREAL LORAINE																			23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: BQ 6,96 (70 Afiliados)																																
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (70 Afiliados)																																
16	CC	1065658640	ANGULO AVENDAÑO YIRLEYS JOHANNA										X									23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
17	CC	12630350	ARIZA CASTRO YOANIS																			25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
18	CC	32757587	BARRIOS GARCIA MATILDE ROSA																			23020 1	30	EPS048	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
19	CC	9043214	BERRIO CASIANI ABEL ANTONIO										X									23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
20	CC	1047338287	BOVEA DE LEON HARWINS NICOLAS																			23020 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
21	CC	1129573765	BUENO NAVARRO CRISTIAN JOSE										X									23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
22	CC	1143116175	CARCAMO JIMENEZ YULIANA PATRICIA																			23030 1	30	ESSC07	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
23	CC	72229441	CARDONA FAJARDO YIMMY										X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
24	CC	8690550	CARRENO MILLAN SERAFIN																			25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si

25	CC	1140817602	CASADIEGO ROMERO CARLOS ANDRES	X																	23030 1	15	EPS005	15	CCF06	15	14-25	15	6.960%	15	Si
26	CC	7596522	CHIMAS TORREGROZA YOVANI ALFONSO										X								23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.000%	30	Si
27	CC	1129530174	CONSUEGRA GUTIERREZ JEFRY DE JESUS																		23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
28	CC	72022387	CONSUEGRA POLO WILLIAM GUSTAVO																		23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
29	CC	1080016969	CORONADO MANGA SERGIO LUIS																		23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
30	CC	1234096041	CURIEL GONZALEZ SEBASTIAN																		25-14	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
31	CC	72271354	DAZA JIMENEZ NAYID HUMBERTO																		23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
32	CC	72216341	DE AVILA MEZA JORGE LUIS										X								23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
33	CC	22585074	DE LAS SALAS PEREZ DAMARIS LUZ																		25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
34	CC	72051266	DIAZ PAREJO RILO RAFAEL																		23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
35	CC	1101816658	ECHAVEZ MARQUEZ EDGAR ANDRES										X								23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
36	CC	18000347	GUTIERREZ RAMOS VICTOR MANUEL																		25-14	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
37	CC	44205189	GUZMAN ARIZA MARIA AUXILIADORA													X					23100 1	11	EPS010	11	CCF06	11	14-25	11	0.000%	11	Si
38	CC	44205189	GUZMAN ARIZA MARIA AUXILIADORA										X								23100 1	19	EPS010	19	CCF06	19	14-25	19	6.960%	19	Si
39	CC	8647595	HURTADO ESTRADA FRANCISCO JAVIER										X								23100 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
40	CC	9790388	HURTADO GIRALDO GUSTAVO ENRIQUE																		23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
41	CC	45496866	JAIMES CAMACHO CLAUDIA SORAYA																		23030 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
42	CC	72269379	MAGRIS VASQUEZ JHORMAN ANTONIO																		23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
43	CC	72287471	MARCELES ORDOÑEZ WALTER BERNEY										X								23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
44	CC	8770226	MARIN ORTEGA CARLOS RAFAEL										X								23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
45	CC	1042348740	MARQUEZ CAHUANA MAURICIO DE JESUS										X								25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
46	CC	72178896	MARTINEZ MOVILLA ALBERTO MANUEL																		23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
47	CC	72013540	MARTINEZ JIMENEZ JORGE JAIME																		23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
48	CC	1043930251	MARTINEZ CASTRO MANUEL										X								23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
49	CC	72051456	MARTINEZ GARIZABAL YESID ANTONIO													X					23030 1	8	EPS002	8	CCF06	8	14-25	8	0.000%	8	Si
50	CC	72051456	MARTINEZ GARIZABAL YESID ANTONIO																	X	23030 1	22	EPS002	22	CCF06	22	14-25	22	6.960%	22	Si
51	CC	1143121459	MAURY FONTALVO MERY HELLEN										X								23030 1	30	MIN002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
52	CC	72014821	MEJIA ORTEGA JAIME CESAR										X								25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
53	CC	72216135	MELENDEZ GARCIA GREGORIO EMILIO										X								25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
54	CC	1044393186	MOLINARES DE CASTRO FRANCISCO ALBERTO																		25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
55	CC	1050035281	MONTES URUETA JOSE WILFRIDO										X								23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
56	CC	8743687	NUÑEZ CERVANTES EDILBERTO ENRIQUE																		23100 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si

Planilla Resumen

No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Pensión Codigo	Pensión Dias	Salud Codigo	Salud Dias	CCF Codigo	CCF Dias	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
57	CC	1045696347	OCAMPO MARTINEZ VICTOR MANUEL																		230301	30	[illegible]37	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
58	CC	12560482	OCHOA MARRIAGA NELSON ENRIQUE									X									230201	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
59	CC	73435114	OLIVERA BOLAÑO LUIS CARLOS																		231001	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
60	CC	1043930949	ORELLANO MARTINEZ KELVER JOSE																		230201	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
61	CC	72189977	ORTEGA MARIN MANUEL DOMINGO									X									231001	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
62	CC	15045855	OSTA CASTRO HABIT ALEJANDRO									X									230201	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
63	CC	8671119	PADILLA NATERA EDUARDO ENRIQUE																			0	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
64	CC	19418798	PATIÑO PINEDA CESAR ALBERTO									X									231001	30	EPS048	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
65	CC	1002409659	PEÑALOZA OBESO JOSE LUIS		X							X								X	230301	15	CCFC55	15	CCF06	15	14-25	15	6.960%	15	SI
66	CC	72206978	PEREZ MERCADO ARNEYS DE JESUS									X									230201	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
67	CC	72282545	PEREZ DE LA HOZ HERNAN									X									230201	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
68	CC	85083843	PEREZ PACHECO ROBERTO MIGUEL									X									230301	30	EPS042	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
69	CC	1140896693	PERNETT GARCIA CARLOS ALBERTO									X									230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
70	CC	72264924	PULGARIN CASTAÑO FIDEL JUNIOR									X									230201	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
71	CC	85168583	RANGEL FLOREZ JORGE ARNULFO									X									230201	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
72	CC	22518488	RESTREPO GARCIA ALEXANDRA MARGARITA																		230201	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
73	CC	72197932	RIVERA MONTES CARLOS MARIO													X					231001	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.000%	30	SI
74	CC	72252708	RODRIGUEZ NUÑEZ EDUARDO ENRIQUE																		230201	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
75	CC	72431927	ROJAS CAMAÑO JORGE DE JESUS																		230301	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
76	CC	1143261130	SANTOYA LANDINO JORGE DABIAN											X							25-14	3	EPS010	3	CCF06	3	14-25	3	0.000%	3	SI
77	CC	1143261130	SANTOYA LANDINO JORGE DABIAN																		25-14	27	EPS010	27	CCF06	27	14-25	27	6.960%	27	SI
78	CC	72215728	SERJE RUIZ MARCO FIDEL																		230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
79	CC	1085171397	SOLIS REYES SORAIDA																		230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
80	CC	72170346	TAPIA NUNEZ FERNELL													X					230301	15	EPS002	15	CCF06	15	14-25	15	0.000%	15	SI
81	CC	72170346	TAPIA NUNEZ FERNELL																		230301	15	EPS002	15	CCF06	15	14-25	15	6.960%	15	SI
82	CC	72004936	TEJERA JIMENEZ WILMER JOSE																		25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
83	CC	1143153645	VALENCIA GARCIA ANDERSON DAVID									X									25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
84	CC	22605987	VARELA CAHUANA YEIMY CAROLINA																		230301	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
85	CC	72184650	VARILLA VELASQUEZ JAIRO ENRIQUE									X									230301	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
86	CC	6893820	VIGGIANY DE LA HOZ NADID RAMON									X									230301	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
87	CC	73079359	VILLALOBOS MORALES JULIO CESAR																		231001	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
88	CC	8648027	VILORIA CORONADO GIOVANNI ENRIQUE																		230201	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI
89	CC	72435867	VISBAL ESCORCIA JONATTAN JOSE																		230201	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF

PLANILLA PAGADA

SUCURSAL: CARTAGENA (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: CG 6,96 (1 Afiliados)

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)

90	CC	3805848	CONTRERAS NARVAEZ ARGEL																		25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: PLANTA ASFALTO (2 Afiliados)

Centro de Trabajo: STA MARTA 6.96 (2 Afiliados)

Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)

EMPLEADO No.		EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Dias	SALUD Codigo	SALUD Dias	CCF Codigo	CCF Dias	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS Tarifa	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF
91	CC	94461289	BARON GOMEZ JHON JAIRO													X					25-14	5	EPS037	5	CCF33	5	14-25	5	0.000%	5	Si
92	CC	94461289	BARON GOMEZ JHON JAIRO									X								X	25-14	25	EPS037	25	CCF33	25	14-25	25	6.960%	25	Si
93	CC	1043127232	MEJIA SILVA OBEIMAR YECID									X									23030 1	30	EPS037	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: STA MARTA CLL 30 (3 Afiliados)

Centro de Trabajo: 6,96 (3 Afiliados)

Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)

EMPLEADO No.		EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Dias	SALUD Codigo	SALUD Dias	CCF Codigo	CCF Dias	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS Tarifa	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF
94	CC	1003561315	DIAZ MESTRA SOLANYI	X																	23030 1	26	EPS005	26	CCF33	26	14-25	26	6.960%	26	Si
95	CC	1080429222	MEJIA SILVA MIGUEL ANGEL	X								X									25-14	15	ESSC07	15	CCF33	15	14-25	15	6.960%	15	Si
96	CC	1082965036	RIVADENEIRA TERNERA KARINA LISNEY	X																	23020 1	26	EPS005	26	CCF33	26	14-25	26	6.960%	26	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: HOTEL CGENA (1 Afiliados)

Centro de Trabajo: HOTEL CGENA (1 Afiliados)

Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)

EMPLEADO No.		EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Dias	SALUD Codigo	SALUD Dias	CCF Codigo	CCF Dias	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS Tarifa	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF
97	CC	39693658	CHAVEZ PEREZ ROSSANA ANGELI																		23090 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-25	30	0.522%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO No.		EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Dias	SALUD Codigo	SALUD Dias	CCF Codigo	CCF Dias	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS Tarifa	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF

SUCURSAL: BOGOTA 004 (10 Afiliados)

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: BG 6.96 (10 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																	
98	CC	1015427077	AGUILERA HERNAN ALIRIO	X	X	230201	22	EPS037	22	CCF22	22	14-25	22	6.960%	22	Si
99	CC	1022939680	BALAGUERA CEPEDA JUAN CARLOS	X	X	230301	22	EPS017	22	CCF22	22	14-25	22	6.960%	22	Si
100	CC	79766462	CHAPARRO MOLINA ERNESTO	X	X	25-14	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
101	CC	1012445250	LOPEZ VANEGAS EDGAR IVAN	X	X	230301	19	EPS008	19	CCF22	19	14-25	19	6.960%	19	Si
102	CC	1044919724	MENDEZ SALAS MARLON YOHAN	X	X	231001	30	EPS017	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
103	CC	79245501	MORENO SANCHEZ JOSE HERNANDO	X	X	25-14	19	EPS005	19	CCF22	19	14-25	19	6.960%	19	Si
104	CC	79789562	POVEDA RODRIGUEZ HENRRY			231001	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
105	CC	80351373	RODRIGUEZ CASTELLANOS ADELMO	X	X	25-14	30	EPS005	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
106	CC	79896019	ROZO CAVANZO YOVANNY ARMANDO	X	X	25-14	22	EPS005	22	CCF22	22	14-25	22	6.960%	22	Si
107	CC	79667359	RUIZ SACRISTAN SANDRO EDGAR	X	X	230201	29	EPS017	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	Si
Total		Afiliados(100)															

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				99	$24,722,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$3,088,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$6,897,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$7,077,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$6,886,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$772,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	$8,605,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	98	$8,605,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				100	$6,691,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$328,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$967,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	83	$5,173,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$221,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				100	$6,211,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$38,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$98,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$66,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$140,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$1,763,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$210,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$69,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$959,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$1,850,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$962,200
TOTAL				100	$46,230,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800209530	3	CONSTRUCTORA FG S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	CR 57 NO 84 211	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3785184	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	32216261	9446563573	E	2023/02/08	2023/02/09	BANCOLOMBIA		$52,740,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1124025939	ACOSTA MEDINA CARLOS CARLOS							X												23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
2	CC	1065658640	ANGULO AVENDAÑO YIRLEYS JOHANNA		X					X		X									X	23030 1	29	EPS010	29	CCF06	29	14-25	29	6.960%	29	Si
3	CC	12630350	ARIZA CASTRO YOANIS							X												25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
4	CC	94461289	BARON GOMEZ JHON JAIRO													X						25-14	3	EPS037	3	CCF33	3	14-25	3	0.000%	3	Si
5	CC	94461289	BARON GOMEZ JHON JAIRO							X		X										25-14	27	EPS037	27	CCF33	27	14-25	27	6.960%	27	Si
6	CC	32757587	BARRIOS GARCIA MATILDE ROSA													X						23020 1	3	EPS048	3	CCF06	3	14-25	3	0.000%	3	Si
7	CC	32757587	BARRIOS GARCIA MATILDE ROSA							X											X	23020 1	27	EPS048	27	CCF06	27	14-25	27	6.960%	27	Si
8	CC	1048936310	BELLO PADILLA GLEY							X												23020 1	30	EPS048	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
9	CC	9043214	BERRIO CASIANI ABEL ANTONIO							X		X										23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
10	CC	1047338287	BOVEA DE LEON HARWINS NICOLAS							X												23020 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
11	CC	1129573765	BUENO NAVARRO CRISTIAN JOSE							X												23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
12	CC	72120285	CALVO GUERRERO WALBERTO ALFONSO	X								X										23030 1	14	EPS002	14	CCF06	14	14-25	14	6.960%	14	Si
13	CC	1143116175	CARCAMO JIMENEZ YULIANA PATRICIA							X												23030 1	30	ESSC07	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
14	CC	72203810	CARDENAS MARTINEZ JUAN CARLOS							X												25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
15	CC	72229441	CARDONA FAJARDO YIMMY							X		X										23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
16	CC	8690550	CARREÑO MILLAN SERAFIN							X												25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
17	CC	1140817602	CASADIEGO ROMERO CARLOS ANDRES																			23030 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
18	CC	39693658	CHAVEZ PEREZ ROSSANA ANGELI																			23090 1	30	EPS005	30	CCF08	30	14-25	30	0.522%	30	Si
19	CC	7596522	CHIMAS TORREGROZA YOVANI ALFONSO							X												23020 1	9	EPS002	9	CCF06	9	14-25	9	6.960%	9	Si
20	CC	7596522	CHIMAS TORREGROZA YOVANI ALFONSO											X								23020 1	21	EPS002	21	CCF06	21	14-25	21	0.000%	21	Si
21	CC	1129530174	CONSUEGRA GUTIERREZ JEFRY DE JESUS							X												23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
22	CC	72022387	CONSUEGRA POLO WILLIAM GUSTAVO							X												23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
23	CC	3805848	CONTRERAS NARVAEZ ARGEL							X												25-14	30	EPS005	30	CCF08	30	14-25	30	6.960%	30	Si
24	CC	1080016969	CORONADO MANGA SERGIO LUIS													X						23020 1	7	EPS037	7	CCF06	7	14-25	7	0.000%	7	Si
25	CC	1080016969	CORONADO MANGA SERGIO LUIS							X											X	23020 1	23	EPS037	23	CCF06	23	14-25	23	6.960%	23	Si
26	CC	1234096041	CURIEL GONZALEZ SEBASTIAN							X												25-14	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
27	CC	72271354	DAZA JIMENEZ NAYID HUMBERTO							X												23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
28	CC	72216341	DE AVILA MEZA JORGE LUIS							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
29	CC	32758690	DE LA HOZ FONSECA BLANCA FLOR							X											25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
30	CC	32740463	DE LA HOZ FONSECA LUZ DE MARIA							X											23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
31	CC	22585074	DE LAS SALAS PEREZ DAMARIS LUZ							X											25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
32	CC	72051266	DIAZ PAREJO RILO RAFAEL							X		X									23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
33	CC	1003561315	DIAZ MESTRA SOLANYI																		23030 1	30	EPS005	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	Si
34	CC	1101816658	ECHAVEZ MARQUEZ EDGAR ANDRES							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
35	CC	1082845112	FERNANDEZ PALMA EDIGAR DAVID	X																	23030 1	3	EPS002	3	CCF33	3	14-25	3	6.960%	3	Si
36	CC	1129512171	FERRER HERNANDEZ JOSE PATROCINIO	X								X									23020 1	7	CCFC5 5	7	CCF06	7	14-25	7	6.960%	7	Si
37	CC	72308348	GOMEZ CORREA RODRIGO ALBERTO	X								X									23030 1	6	EPS002	6	CCF06	6	14-25	6	6.960%	6	Si
38	CC	37915533	GONZALEZ DE GONZALEZ CATALINA SUSANA							X											25-14	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
39	CC	18000347	GUTIERREZ RAMOS VICTOR MANUEL							X											25-14	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
40	CC	44205189	GUZMAN ARIZA MARIA AUXILIADORA							X		X									23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
41	CC	8647595	HURTADO ESTRADA FRANCISCO JAVIER							X											23100 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
42	CC	9790388	HURTADO GIRALDO GUSTAVO ENRIQUE							X											23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
43	CC	45496866	JAIMES CAMACHO CLAUDIA SORAYA							X											23030 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
44	CC	1046873285	JIMENO AVILA JULIAN ENRIQUE	X																	23030 1	5	EPS037	5	CCF06	5	14-25	5	6.960%	5	Si
45	CC	72269379	MAGRIS VASQUEZ JHORMAN ANTONIO													X					23030 1	8	EPS002	8	CCF06	8	14-25	8	0.000%	8	Si
46	CC	72269379	MAGRIS VASQUEZ JHORMAN ANTONIO							X		X								X	23030 1	22	EPS002	22	CCF06	22	14-25	22	6.960%	22	Si
47	CC	32772731	MANZANO ORDOÑEZ CLAUDIA PATRICIA							X											25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
48	CC	72287471	MARCELES ORDOÑEZ WALTER BERNEY							X		X									23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
49	CC	8770226	MARIN ORTEGA CARLOS RAFAEL							X		X									23030 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
50	CC	1042348740	MARQUEZ CAHUANA MAURICIO DE JESUS							X		X									25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
51	CC	72178896	MARTINEZ MOVILLA ALBERTO MANUEL													X					23030 1	4	EPS010	4	CCF06	4	14-25	4	0.000%	4	Si
52	CC	72178896	MARTINEZ MOVILLA ALBERTO MANUEL							X											23030 1	26	EPS010	26	CCF06	26	14-25	26	6.960%	26	Si
53	CC	72013540	MARTINEZ JIMENEZ JORGE JAIME							X											23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
54	CC	1043930251	MARTINEZ CASTRO MANUEL							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
55	CC	72051456	MARTINEZ GARIZABAL YESID ANTONIO													X					23030 1	3	EPS002	3	CCF06	3	14-25	3	0.000%	3	Si
56	CC	72051456	MARTINEZ GARIZABAL YESID ANTONIO							X											23030 1	27	EPS002	27	CCF06	27	14-25	27	6.960%	27	Si
57	CC	1143121459	MAURY FONTALVO MERY HELLEN							X		X									23030 1	30	MIN002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
58	CC	72014821	MEJIA ORTEGA JAIME CESAR							X		X									25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
59	CC	1080429222	MEJIA SILVA MIGUEL ANGEL							X		X									25-14	30	ESSC07	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	Si
60	CC	1043127232	MEJIA SILVA OBEIMAR YECID							X		X									23030 1	30	EPS037	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	Si
61	CC	72216135	MELENDEZ GARCIA GREGORIO EMILIO							X		X									25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
62	CC	1044919724	MENDEZ SALAS MARLON YOHAN	X																	23100 1	7	EPS017	7	CCF22	7	14-25	7	6.960%	7	Si
63	CC	1044393186	MOLINARES DE CASTRO FRANCISCO ALBERTO							X											25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
64	CC	1050035281	MONTES URUETA JOSE WILFRIDO							X		X									23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
65	CC	72328723	MORELO BEDOYA YESIHT MANUEL							X											23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
66	CC	79245501	MORENO SANCHEZ JOSE HERNANDO	X																	25-14	29	EPS005	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	Si
67	CC	8743687	NUÑEZ CERVANTES EDILBERTO ENRIQUE							X		X									23100 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
68	CC	1045696347	OCAMPO MARTINEZ VICTOR MANUEL							X											23030 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
69	CC	12560482	OCHOA MARRIAGA NELSON ENRIQUE							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
70	CC	73435114	OLIVERA BOLAÑO LUIS CARLOS							X											23100 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
71	CC	1043930949	ORELLANO MARTINEZ KELVER JOSE							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
72	CC	1043930430	ORELLANO MARTINEZ YESID JOSE	X								X									25-14	6	EPS002	6	CCF06	6	14-25	6	6.960%	6	Si
73	CC	72189977	ORTEGA MARIN MANUEL DOMINGO							X											23100 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
74	CC	15045855	OSTA CASTRO HABIT ALEJANDRO							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
75	CC	32828116	PABON MARTINEZ SAIDA LUZ							X											25-14	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
76	CC	8671119	PADILLA NATERA EDUARDO ENRIQUE							X												0	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
77	CC	19418798	PATIÑO PINEDA CESAR ALBERTO							X		X									23100 1	30	EPS048	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
78	CC	73270654	PEÑALOZA OBESO MAXIMO MIGUEL	X								X									23030 1	6	EPS002	6	CCF06	6	14-25	6	6.960%	6	Si
79	CC	72206978	PEREZ MERCADO ARNEYS DE JESUS							X		X									23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
80	CC	72282545	PEREZ DE LA HOZ HERNAN							X		X									23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
81	CC	85083843	PEREZ PACHECO ROBERTO MIGUEL							X		X									23030 1	30	EPS042	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
82	CC	1140896693	PERNETT GARCIA CARLOS ALBERTO							X		X									23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
83	CC	79789562	POVEDA RODRIGUEZ HENRRY							X		X									23100 1	30	EPS008	30	CCF22	30	14-25	30	6.960%	30	Si
84	CC	72264924	PULGARIN CASTAÑO FIDEL JUNIOR							X		X									23020 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
85	CC	85168583	RANGEL FLOREZ JORGE ARNULFO													X					23020 1	12	EPS037	12	CCF06	12	14-25	12	0.000%	12	Si
86	CC	85168583	RANGEL FLOREZ JORGE ARNULFO							X		X									23020 1	18	EPS037	18	CCF06	18	14-25	18	6.960%	18	Si
87	CC	22518488	RESTREPO GARCIA ALEXANDRA MARGARITA							X											23020 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
88	CC	1143132740	REYES PADILLA LUIS CARLOS	X								X									23030 1	14	EPS037	14	CCF06	14	14-25	14	6.960%	14	Si
89	CC	1082965036	RIVADENEIRA TERNERA KARINA LISNEY							X											23020 1	30	EPS005	30	CCF33	30	14-25	30	6.960%	30	Si
90	CC	72197932	RIVERA MONTES CARLOS MARIO											X		X					23100 1	14	EPS002	14	CCF06	14	14-25	14	0.000%	14	Si
91	CC	72197932	RIVERA MONTES CARLOS MARIO							X											23100 1	16	EPS002	16	CCF06	16	14-25	16	6.960%	16	Si

Planilla Resumen

92	CC	72252708	RODRIGUEZ NUÑEZ EDUARDO ENRIQUE							X										23020 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
93	CC	72431927	ROJAS CAMAÑO JORGE DE JESUS							X										23030 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
94	CC	79896019	ROZO CAVANZO YOVANNY ARMANDO	X																25-14	29	EPS005	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	Si
95	CC	1033797483	RUIZ CIFUENTES SANDRO STEVEN	X																23030 1	29	EPS017	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	Si
96	CC	79667359	RUIZ SACRISTAN SANDRO EDGAR	X																23020 1	29	EPS017	29	CCF22	29	14-25	29	6.960%	29	Si
97	CC	85463097	SALINA DAZA OSCAR ARTURO	X								X								23030 1	13	EPS037	13	CCF33	13	14-25	13	6.960%	13	Si
98	CC	26987841	SALTAREN GALEZO GINA ROSA							X										23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
99	CC	1143261130	SANTOYA LANDINO JORGE DABIAN							X		X								25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
100	CC	72215728	SERJE RUIZ MARCO FIDEL							X		X								23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
101	CC	1085171397	SOLIS REYES SORAIDA							X										23030 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
102	CC	72170346	TAPIA NUNEZ FERNELL												X					23030 1	2	EPS002	2	CCF06	2	14-25	2	0.000%	2	Si
103	CC	72170346	TAPIA NUNEZ FERNELL							X										23030 1	28	EPS002	28	CCF06	28	14-25	28	6.960%	28	Si
104	CC	72004936	TEJERA JIMENEZ WILMER JOSE							X										25-14	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
105	CC	1143153645	VALENCIA GARCIA ANDERSON DAVID							X										25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
106	CC	22605987	VARELA CAHUANA YEIMY CAROLINA												X					23030 1	7	EPS010	7	CCF06	7	14-25	7	0.000%	7	Si
107	CC	22605987	VARELA CAHUANA YEIMY CAROLINA							X										23030 1	23	EPS010	23	CCF06	23	14-25	23	6.960%	23	Si
108	CC	72184650	VARILLA VELASQUEZ JAIRO ENRIQUE							X										23030 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
109	CC	6893820	VIGGIANY DE LA HOZ NADID RAMON							X		X								23030 1	30	EPS005	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
110	CC	73079359	VILLALOBOS MORALES JULIO CESAR							X										23100 1	30	EPS037	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
111	CC	8648027	VILORIA CORONADO GIOVANNI ENRIQUE							X		X								23020 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
112	CC	39098170	VISBAL MARTINEZ CARMEN SOFIA												X					23020 1	9	EPS010	9	CCF06	9	14-25	9	0.000%	9	Si
113	CC	39098170	VISBAL MARTINEZ CARMEN SOFIA							X										23020 1	21	EPS010	21	CCF06	21	14-25	21	0.522%	21	Si
114	CC	72435867	VISBAL ESCORCIA JONATTAN JOSE							X		X								23020 1	30	EPS010	30	CCF06	30	14-25	30	6.960%	30	Si
115	CC	22468104	YEPES FERNANDEZ MILENA DEL SOCORRO												X					25-14	7	EPS005	7	CCF06	7	14-25	7	0.000%	7	Si
116	CC	22468104	YEPES FERNANDEZ MILENA DEL SOCORRO							X									X	25-14	23	EPS005	23	CCF06	23	14-25	23	0.522%	23	Si
117	CC	1143240261	YEPEZ VILLAREAL LORAINE							X										23020 1	30	EPS002	30	CCF06	30	14-25	30	0.522%	30	Si
Total		**Afiliados(104)**																												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				103	$28,323,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$3,635,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$7,244,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	$9,059,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$7,656,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$726,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				104	$9,981,100
COLMENA	[redacted]25	800,226,175	3	104	[redacted]$9,981,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				104	$7,240,800
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	7	$431,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$399,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	89	$6,181,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$228,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				104	$7,130,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$13,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$130,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$71,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$145,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$2,132,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$141,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$59,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$127,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,072,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	35	$2,189,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,045,800
TOTAL				104	$52,676,100

INGECON

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **MARISOL LEMUS CHAUTA**, identificada con **Cédula de Ciudadanía No. 51.765.184 de Bogotá D.C.**, y con Tarjeta Profesional No. **53.776-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisora Fiscal de INGECON S.A.** identificada con **Nit. 822.000.138-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales (ley 1562 de 2012), pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), de todos los empleados, pagados por la compañía durante los últimos Seis (6) meses, contados a partir de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el Decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Dada en Bogotá D.C., el ocho (08) de febrero de 2023.

Atentamente,

MARISOL LEMUS CHAUTA
Revisor Fiscal
C.C. No. 51.765.184 de Bogotá D.C.
T.P. 53.776 – T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909317013	9446629203	E	2023/02/09	2023/02/09	BANCO DE BOGOTA		$62,731,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (55 Afiliados)																						$179,488,216	$29,441,800			$183,204,137	$7,331,700			$174,550,177	$6,985,000			$183,204,137		$9,603,100		$0	$0		$53,361,600
Centro de Trabajo: 0,52200 (13 Afiliados)																						$40,966,467	$6,717,400			$40,966,467	$1,639,500			$40,926,467	$1,637,900			$40,966,467		$200,200		$0	$0		$10,195,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																						$40,966,467	$6,717,400			$40,966,467	$1,639,500			$40,926,467	$1,637,900			$40,966,467		$200,200		$0	$0		$10,195,000
1	CC	1023033357	CASTILLO CASTILLO LINA MAYERLY							X											25-14	30	$3,828,000	$612,500	EPS005	30	$3,828,000	$153,200	CCF22	30	$3,828,000	$153,200	14-11	30	$3,828,000	0.522%	$20,000	30	$0	$0	Si	$938,900
2	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA													X					23030 1	9	$599,700	$96,000	EPS008	9	$599,700	$24,000	CCF22	9	$599,700	$24,000	14-11	9	$599,700	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$144,000
3	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA							X											23030 1	21	$1,623,300	$259,800	EPS008	21	$1,623,300	$65,000	CCF22	21	$1,623,300	$65,000	14-11	21	$1,623,300	0.522%	$8,500	21	$0	$0	Si	$398,300
4	CC	1020807680	FIERRO RAMIREZ CAMILA							X											23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
5	CC	39756469	GALINDO MENDOZA ADRIANA							X											25-14	30	$2,212,000	$354,000	EPS005	30	$2,212,000	$88,500	CCF22	30	$2,212,000	$88,500	14-11	30	$2,212,000	0.522%	$11,600	30	$0	$0	Si	$542,600
6	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA													X					25-14	1	$220,100	$37,700	EPS017	1	$220,100	$8,900	CCF22	1	$220,100	$8,900	14-11	1	$220,100	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$55,500
7	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA							X											25-14	29	$7,404,667	$1,259,000	EPS017	29	$7,404,667	$296,200	CCF22	29	$7,404,667	$296,200	14-11	29	$7,404,667	0.522%	$38,700	29	$0	$0	Si	$1,890,100
8	CC	1033810121	GUZMAN GORDO LEIDY TATIANA												X						23030 1	1	$40,000	$6,400	EPS002	1	$40,000	$1,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$40,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$8,000
9	CC	1033810121	GUZMAN GORDO LEIDY TATIANA							X											23030 1	29	$2,018,400	$323,000	EPS002	29	$2,018,400	$80,800	CCF22	29	$2,018,400	$80,800	14-11	29	$2,018,400	0.522%	$10,600	29	$0	$0	Si	$495,200
10	CC	24870121	MOLANO OSPINA GLORIA NANCY													X					23030 1	6	$399,800	$64,000	EPS005	6	$399,800	$16,000	CCF22	6	$399,800	$16,000	14-11	6	$399,800	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$96,000
11	CC	24870121	MOLANO OSPINA GLORIA NANCY							X											23030 1	24	$1,855,200	$296,900	EPS005	24	$1,855,200	$74,300	CCF22	24	$1,855,200	$74,300	14-11	24	$1,855,200	0.522%	$9,700	24	$0	$0	Si	$455,200
12	CC	79539982	MORENO MARTINEZ JAIME FRANCISCO													X					25-14	9	$440,100	$70,500	EPS008	9	$440,100	$17,700	CCF22	9	$440,100	$17,700	14-11	9	$440,100	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$105,900
13	CC	79539982	MORENO MARTINEZ JAIME FRANCISCO							X											25-14	21	$1,191,400	$190,700	EPS008	21	$1,191,400	$47,700	CCF22	21	$1,191,400	$47,700	14-11	21	$1,191,400	0.522%	$6,300	21	$0	$0	Si	$292,400
14	CC	40385707	PEREZ REY NUBIA CONSTANZA													X					23020 1	9	$599,700	$96,000	EPS005	9	$599,700	$24,000	CCF22	9	$599,700	$24,000	14-11	9	$599,700	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$144,000
15	CC	40385707	PEREZ REY NUBIA CONSTANZA							X											23020 1	21	$1,623,300	$259,800	EPS005	21	$1,623,300	$65,000	CCF22	21	$1,623,300	$65,000	14-11	21	$1,623,300	0.522%	$8,500	21	$0	$0	Si	$398,300
16	CC	41911467	RAMIREZ HERNANDEZ ANA MARIA							X											23030 1	30	$8,511,000	$1,447,000	EPS005	30	$8,511,000	$340,500	CCF22	30	$8,511,000	$340,500	14-11	30	$8,511,000	0.522%	$44,500	30	$0	$0	Si	$2,172,500
17	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA													X					25-14	3	$199,900	$32,000	EPS005	3	$199,900	$8,000	CCF22	3	$199,900	$8,000	14-11	3	$199,900	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$48,000
18	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA							X											25-14	27	$2,087,100	$334,000	EPS005	27	$2,087,100	$83,500	CCF22	27	$2,087,100	$83,500	14-11	27	$2,087,100	0.522%	$10,900	27	$0	$0	Si	$511,900
19	CC	1069759356	TORRES ORTIZ DANNA GERALDINE													X					23030 1	2	$220,000	$35,200	EPS005	2	$220,000	$8,800	CCF22	2	$220,000	$8,800	14-11	2	$220,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$52,800
20	CC	1069759356	TORRES ORTIZ DANNA GERALDINE							X											23030 1	28	$3,572,800	$571,700	EPS005	28	$3,572,800	$143,000	CCF22	28	$3,572,800	$143,000	14-11	28	$3,572,800	0.522%	$18,700	28	$0	$0	Si	$876,400
21	CC	1018424223	ZAMBRANO RODRIGUEZ ANA MARIA							X											25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Centro de Trabajo: 6,96000 (42 Afiliados)																						$138,521,749	$22,724,400			$142,237,670	$5,692,200			$133,623,710	$5,347,100			$142,237,670		$9,402,900		$0	$0		$43,166,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)																						$138,521,749	$22,724,400			$142,237,670	$5,692,200			$133,623,710	$5,347,100			$142,237,670		$9,402,900		$0	$0		$43,166,600
22	CC	11304586	AGUILAR SERRANO BERNARDINO							X		X										0	$0	$0	EPS005	30	$3,449,254	$138,000	CCF22	30	$3,449,254	$138,000	14-11	30	$3,449,254	6.960%	$240,100	30	$0	$0	Si	$516,100
23	CC	11430451	ALONSO GIL MIGUEL ANTONIO							X		X									23030 1	30	$2,195,375	$351,300	EPS008	30	$2,195,375	$87,900	CCF22	30	$2,195,375	$87,900	14-11	30	$2,195,375	6.960%	$152,800	30	$0	$0	Si	$679,900
24	CC	1039652781	ARIAS DENIS LUIS CARLOS							X		X									23030 1	30	$2,448,171	$391,800	EPS037	30	$2,448,171	$98,000	CCF22	30	$2,448,171	$98,000	14-11	30	$2,448,171	6.960%	$170,400	30	$0	$0	Si	$758,200

2023/02/10 10:16 AM

Planilla Resumen

25	CC	1007326949	AVILA ROJAS JOHAN RONALDO	X																	230201	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF22	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
26	CC	93405057	BELTRAN OLAYA LUIS FERNANDO							X		X									230201	30	$1,922,546	$307,700	EPS002	30	$1,922,546	$77,000	CCF22	30	$1,537,000	$61,500	14-11	30	$1,922,546	6.960%	$133,900	30	$0	$0	SI	$580,100
27	CC	91015818	CASTELLANOS FANDIÑO ALVARO DAVID							X		X									230201	30	$1,979,400	$316,800	EPS008	30	$1,979,400	$79,200	CCF22	30	$1,479,000	$59,200	14-11	30	$1,979,400	6.960%	$137,800	30	$0	$0	SI	$593,000
28	CC	80452743	CASTIBLANCO GOMEZ LUIS FERNANDO							X		X									231001	30	$1,513,300	$242,200	EPS017	30	$1,513,300	$60,600	CCF22	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,513,300	6.960%	$105,400	30	$0	$0	SI	$466,200
29	CC	1039654243	CHAVERRA CUESTA WILMAR							X		X									230301	30	$3,515,850	$562,600	EPS037	30	$3,515,850	$140,700	CCF22	30	$3,515,850	$140,700	14-11	30	$3,515,850	6.960%	$244,800	30	$0	$0	SI	$1,088,800
30	CC	86040488	FAJARDO FREDY LEONARDO							X		X									230301	30	$3,047,623	$487,700	EPS005	30	$3,047,623	$122,000	CCF22	30	$1,537,000	$61,500	14-11	30	$3,047,623	6.960%	$212,200	30	$0	$0	SI	$883,400
31	CC	79314050	FIERRO MORALES JAIME RAFAEL							X											231001	30	$10,307,000	$1,752,400	EPS005	30	$10,307,000	$412,300	CCF22	30	$10,307,000	$412,300	14-11	30	$10,307,000	6.960%	$717,400	30	$0	$0	SI	$3,294,400
32	CC	1018415688	FIERRO MORA JORGE ARMANDO							X											230301	30	$4,211,000	$673,800	EPS005	30	$4,211,000	$168,500	CCF22	30	$4,211,000	$168,500	14-11	30	$4,211,000	6.960%	$293,100	30	$0	$0	SI	$1,303,900
33	CC	17352915	FIERRO MORALES JORGE ARMANDO													X					230301	11	$2,181,667	$371,100	EPS005	11	$2,181,667	$87,300	CCF22	11	$2,181,667	$87,300	14-11	11	$2,181,667	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$545,700
34	CC	17352915	FIERRO MORALES JORGE ARMANDO							X											230301	19	$4,371,267	$743,300	EPS005	19	$4,371,267	$174,900	CCF22	19	$4,371,267	$174,900	14-11	19	$4,371,267	6.960%	$304,300	19	$0	$0	SI	$1,397,400
35	CC	79670631	FORERO LEON CHARLES EDWIN							X		X									25-14	30	$1,911,741	$305,900	EPS001	30	$1,911,741	$76,500	CCF22	30	$1,537,000	$61,500	14-11	30	$1,911,741	6.960%	$133,100	30	$0	$0	SI	$577,000
36	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO													X					230301	9	$660,000	$105,600	EPS010	9	$660,000	$26,400	CCF22	9	$660,000	$26,400	14-11	9	$660,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$158,400
37	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO							X											230301	21	$1,774,667	$284,000	EPS010	21	$1,774,667	$71,000	CCF22	21	$1,774,667	$71,000	14-11	21	$1,774,667	6.960%	$123,600	21	$0	$0	SI	$549,600
38	CC	79182273	GUTIERREZ VELA VICTOR MANUEL											X							25-14	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	13	$502,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$100,700
39	CC	79182273	GUTIERREZ VELA VICTOR MANUEL							X		X									25-14	17	$1,154,667	$184,800	EPS037	17	$1,154,667	$46,200	CCF22	17	$1,154,667	$46,200	14-11	17	$1,154,667	6.960%	$80,400	17	$0	$0	SI	$357,600
40	CC	11409965	HERNANDEZ ROZO JOSE VICENTE							X		X									25-14	30	$4,445,116	$711,300	EPS005	30	$4,445,116	$177,900	CCF22	30	$4,445,116	$177,900	14-11	30	$4,445,116	6.960%	$309,400	30	$0	$0	SI	$1,376,500
41	CC	11516681	HERNANDEZ CLAVIJO WILLIAM ERNESTO		X															X		0	$0	$0	EPS002	4	$266,667	$10,700	CCF22	4	$1,622,223	$64,900	14-11	4	$266,667	6.960%	$18,600	4	$0	$0	SI	$94,200
42	CC	4080940	LOPEZ JUAN ANDRES							X		X									25-14	30	$2,185,337	$349,700	EPS002	30	$2,185,337	$87,500	CCF22	30	$2,185,337	$87,500	14-11	30	$2,185,337	6.960%	$152,100	30	$0	$0	SI	$676,800
43	CC	79803958	MANTILLA GONZALEZ OSCAR							X											230301	30	$2,436,000	$389,800	EPS005	30	$2,436,000	$97,500	CCF22	30	$2,436,000	$97,500	14-11	30	$2,436,000	6.960%	$169,600	30	$0	$0	SI	$754,400
44	CC	5607719	MEDINA PINTO MIGUEL ANGEL							X		X									231001	30	$2,305,513	$368,900	EPS005	30	$2,305,513	$92,300	CCF22	30	$2,305,513	$92,300	14-11	30	$2,305,513	6.960%	$160,500	30	$0	$0	SI	$714,000
45	CC	1019142408	MOLINA ALBORNOZ JUAN MANUEL							X		X									230301	30	$3,485,400	$557,700	EPS005	30	$3,485,400	$139,500	CCF22	30	$3,485,400	$139,500	14-11	30	$3,485,400	6.960%	$242,600	30	$0	$0	SI	$1,079,300
46	CC	1084739193	MONTENEGRO GONZALEZ MASCEL ENRIQUE							X		X									230201	30	$5,182,542	$881,300	EPS037	30	$5,182,542	$207,400	CCF22	30	$5,182,542	$207,400	14-11	30	$5,182,542	6.960%	$360,800	30	$0	$0	SI	$1,656,900
47	CC	1148455718	MORENO PEREZ JOSE ALEJANDRO							X		X									230301	30	$2,231,978	$357,200	EPS005	30	$2,231,978	$89,300	CCF22	30	$2,231,978	$89,300	14-11	30	$2,231,978	6.960%	$155,400	30	$0	$0	SI	$691,200
48	CC	1126125040	MORENO PEREZ YULITZA DEL CARMEN							X		X									230301	30	$1,859,375	$297,500	EPS037	30	$1,859,375	$74,400	CCF22	30	$1,859,375	$74,400	14-11	30	$1,859,375	6.960%	$129,500	30	$0	$0	SI	$575,800
49	CC	6771591	OCHOA MOLINA CARLOS MESIAS							X		X									25-14	30	$4,205,540	$672,900	EPS005	30	$4,205,540	$168,300	CCF22	30	$4,205,540	$168,300	14-11	30	$4,205,540	6.960%	$292,800	30	$0	$0	SI	$1,302,300
50	CC	28539814	PATIÑO PAVA GREISI													X					230301	1	$183,333	$31,400	EPS010	1	$183,333	$7,400	CCF22	1	$183,333	$7,400	14-11	1	$183,333	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$46,200
51	CC	28539814	PATIÑO PAVA GREISI							X											230301	29	$6,167,334	$1,048,600	EPS010	29	$6,167,334	$246,700	CCF22	29	$6,167,334	$246,700	14-11	29	$6,167,334	6.960%	$429,300	29	$0	$0	SI	$1,971,300
52	CC	17342901	PULGARIN ORTIZ EDGAR EMILIO							X											25-14	30	$1,740,000	$278,400	EPS002	30	$1,740,000	$69,600	CCF22	30	$1,740,000	$69,600	14-11	30	$1,740,000	6.960%	$121,200	30	$0	$0	SI	$538,800
53	CC	1018510718	RAMIREZ FIGUEREDO BRIAN RICARDO											X							230301	2	$102,223	$16,400	EPS005	2	$102,223	$4,100	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$102,223	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,500
54	CC	1018510718	RAMIREZ FIGUEREDO BRIAN RICARDO							X											230301	28	$2,490,134	$398,500	EPS005	28	$2,490,134	$99,700	CCF22	28	$2,490,134	$99,700	14-11	28	$2,490,134	6.960%	$173,400	28	$0	$0	SI	$771,300
55	CC	80374298	RAMIREZ VARELA NELSON ORLANDO							X		X									230301	30	$2,406,353	$385,100	EPS017	30	$2,406,353	$96,300	CCF22	30	$1,537,000	$61,500	14-11	30	$2,406,353	6.960%	$167,500	30	$0	$0	SI	$710,400
56	CC	3215934	REYES HERRERA MIGUEL ANDRES													X					230301	9	$2,623,500	$446,200	EPS002	9	$2,623,500	$105,000	CCF22	9	$2,623,500	$105,000	14-11	9	$2,623,500	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$656,200
57	CC	3215934	REYES HERRERA MIGUEL ANDRES							X											230301	21	$7,100,800	$1,207,400	EPS002	21	$7,100,800	$284,100	CCF22	21	$7,100,800	$284,100	14-11	21	$7,100,800	6.960%	$494,300	21	$0	$0	SI	$2,269,900
58	CC	79816057	RIOS RIOS RODRIGO							X		X									230301	30	$2,068,601	$331,000	EPS005	30	$2,068,601	$82,800	CCF22	30	$2,068,601	$82,800	14-11	30	$2,068,601	6.960%	$144,000	30	$0	$0	SI	$640,600
59	CC	1076821977	RIVAS IBARGUEN YOISER ANDRES													X					230301	11	$733,334	$117,400	EPS010	11	$733,334	$29,400	CCF22	11	$733,334	$29,400	14-11	11	$733,334	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$176,200
60	CC	1076821977	RIVAS IBARGUEN YOISER ANDRES							X		X									230301	19	$1,669[illegible]	$267,100	EPS010	19	$1,669,334	$66,800	CCF22	19	$1,469,334	$58,800	14-11	19	[illegible]669,334	6.960%	$116,200	19	$0	$0	SI	$508,900

aportes en línea

Planilla Resumen

61	CC	1001637143	ROMANA ROMANA JARLINSON							X		X									230301	30	$2,32[illegible]	$371,800	CCFC20	30	$2,323,600	$93,000	CCF22	30	$2,323,600	$93,000	14-11	30	$2,323,600	6.960%	$161,800	30	$0	$0	Si	$719,600
62	CC	5854349	ROMERO GARZON ELPIDIO							X		X									25-14	30	$5,394,040	$917,100	EPS017	30	$5,394,040	$215,800	CCF22	30	$5,394,040	$215,800	14-11	30	$5,394,040	6.960%	$375,500	30	$0	$0	Si	$1,724,200
63	CC	5853921	ROMERO GARZON SAIN							X		X									25-14	30	$5,803,666	$986,800	EPS005	30	$5,803,666	$232,200	CCF22	30	$5,803,666	$232,200	14-11	30	$5,803,666	6.960%	$404,000	30	$0	$0	Si	$1,855,200
64	CC	52902515	TORRES RENDON GLADYS ANDREA													X					25-14	1	$183,333	$31,400	EPS005	1	$183,333	$7,400	CCF22	1	$183,333	$7,400	14-11	1	$183,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$46,200
65	CC	52902515	TORRES RENDON GLADYS ANDREA							X											25-14	29	$6,167,334	$1,048,600	EPS005	29	$6,167,334	$246,700	CCF22	29	$6,167,334	$246,700	14-11	29	$6,167,334	6.960%	$429,300	29	$0	$0	Si	$1,971,300
66	CC	79182649	TOVAR INFANTE JULIAN ODILIO							X		X									25-14	30	$4,250,959	$680,200	EPS037	30	$4,250,959	$170,100	CCF22	30	$4,250,959	$170,100	14-11	30	$4,250,959	6.960%	$295,900	30	$0	$0	Si	$1,316,300
67	CC	74371522	VALENCIA RENDON JULIAN ANDRES							X		X									25-14	30	$1,752,600	$280,500	EPS005	30	$1,752,600	$70,200	CCF22	30	$1,421,000	$56,900	14-11	30	$1,752,600	6.960%	$122,000	30	$0	$0	Si	$529,600
68	CC	71980770	VALENCIA MOSQUERA JULIO CESAR							X		X									25-14	30	$3,194,799	$511,200	EPS037	30	$3,194,799	$127,800	CCF22	30	$3,194,799	$127,800	14-11	30	$3,194,799	6.960%	$222,400	30	$0	$0	Si	$989,200
69	CC	17352602	VARON SERRANO JOSE DANIEL							X		X									230201	30	$2,902,920	$464,500	EPS005	30	$2,902,920	$116,200	CCF22	30	$1,537,000	$61,500	14-11	30	$2,902,920	6.960%	$202,100	30	$0	$0	Si	$844,300
70	CC	17334747	ZAMBRANO HERNANDEZ CARLOS OVIEDO							X		X									230301	30	$3,431,286	$549,100	EPS017	30	$3,431,286	$137,300	CCF22	30	$1,537,000	$61,500	14-11	30	$3,431,286	6.960%	$238,900	30	$0	$0	Si	$986,800
71	CC	3090935	ZONA MORENO ELICEO							X		X									230201	30	$3,527,857	$564,500	EPS010	30	$3,527,857	$141,200	CCF22	30	$1,659,000	$66,400	14-11	30	$3,527,857	6.960%	$245,600	30	$0	$0	Si	$1,017,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACESAR (2 Afiliados)																							$8,830,439	$1,423,600			$8,830,439	$314,400			$8,830,439	$314,400			$8,830,439		$547,100		$0	$0		$2,599,500
Centro de Trabajo: 6,96000 (2 Afiliados)																							$8,830,439	$1,423,600			$8,830,439	$314,400			$8,830,439	$314,400			$8,830,439		$547,100		$0	$0		$2,599,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							$8,830,439	$1,423,600			$8,830,439	$314,400			$8,830,439	$314,400			$8,830,439		$547,100		$0	$0		$2,599,500
72	CC	19596915	MONTENEGRO GONZALEZ MANUEL DE JESUS										X								231001	11	$971,667	$116,700	EPS037	11	$971,667	$0	CCF15	11	$971,667	$0	14-11	11	$971,667	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$116,700
73	CC	19596915	MONTENEGRO GONZALEZ MANUEL DE JESUS							X		X									231001	19	$2,929,931	$468,800	EPS037	19	$2,929,931	$117,200	CCF15	19	$2,929,931	$117,200	14-11	19	$2,929,931	6.960%	$204,000	19	$0	$0	Si	$907,200
74	CC	1062394698	PADILLA PADILLA LUIS FRANCISCO							X		X									231001	30	$4,928,841	$838,100	EPS037	30	$4,928,841	$197,200	CCF15	30	$4,928,841	$197,200	14-11	30	$4,928,841	6.960%	$343,100	30	$0	$0	Si	$1,575,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAPUTUMAYO (14 Afiliados)																							$21,388,397	$3,483,200			$21,968,397	$879,100			$21,968,397	$879,100			$21,968,397		$1,529,400		$0	$0		$6,770,800

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 6,9600 (14 Afiliados)																							$21,388,397	$3,483,200			$21,968,397	$879,100			$21,968,397	$879,100			$21,968,397		$1,529,400		$0	$0		$6,770,800
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (14 Afiliados)																							$21,388,397	$3,483,200			$21,968,397	$879,100			$21,968,397	$879,100			$21,968,397		$1,529,400		$0	$0		$6,770,800
75	CC	4165402	BARRERA ROA LUIS RAMIRO	X								X									25-14	27	$2,610,208	$417,700	EPS037	27	$2,610,208	$104,500	CCF63	27	$2,610,208	$104,500	14-11	27	$2,610,208	6.960%	$181,700	27	$0	$0	SI	$808,400
76	CC	98136853	CAICEDO BASTIDAS MARIO FERNANDO	X																	230301	15	$580,000	$92,800	ESSC18	15	$580,000	$23,200	CCF63	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
77	CC	59176678	ERAZO RIASCOS AIDE CORINA							X											230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC18	30	$1,160,000	$46,400	CCF63	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
78	CC	79554421	FERNANDEZ CASTILLO JUAN HARVEY	X																	25-14	26	$6,066,667	$1,031,500	EPS008	26	$6,066,667	$242,700	CCF63	26	$6,066,667	$242,700	14-11	26	$6,066,667	6.960%	$422,300	26	$0	$0	SI	$1,939,200
79	CC	1124859902	GARZON VERDUGO KATHERINE MARIA DEL MAR	X																	25-14	15	$1,250,000	$200,000	EPS037	15	$1,250,000	$50,000	CCF63	15	$1,250,000	$50,000	14-11	15	$1,250,000	6.960%	$87,000	15	$0	$0	SI	$387,000
80	CC	1124854452	JARAMILLO ROSERO ROBINSON FERNEY							X		X									230301	30	$2,306,188	$369,000	EPS037	30	$2,306,188	$92,300	CCF63	30	$2,306,188	$92,300	14-11	30	$2,306,188	6.960%	$160,600	30	$0	$0	SI	$714,200
81	CC	1127074487	MELENDEZ BUITRON HEMER FERNANDO	X																	230301	28	$1,260,000	$201,600	EPSIC3	28	$1,260,000	$50,400	CCF63	28	$1,260,000	$50,400	14-11	28	$1,260,000	6.960%	$87,700	28	$0	$0	SI	$390,100
82	CC	1061542921	MUELAS MUELAS YULLY ALEJANDRA	X																	25-14	20	$2,000,000	$320,000	ESSC62	20	$2,000,000	$80,000	CCF63	20	$2,000,000	$80,000	14-11	20	$2,000,000	6.960%	$139,200	20	$0	$0	SI	$619,200
83	CC	1124313072	NARVAEZ MORA WILMAR ALEXANDER	X																	25-14	15	$850,000	$136,000	EPS037	15	$850,000	$34,000	CCF63	15	$850,000	$34,000	14-11	15	$850,000	6.960%	$59,200	15	$0	$0	SI	$263,200
84	CC	1124867622	NOVOA GUTIERREZ JUAN CAMILO	X																	230301	13	$502,667	$80,500	EPSIC5	13	$502,667	$20,200	CCF63	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	SI	$155,900
85	CC	71256976	PALACIOS ZARATE JUAN CARLOS	X																	25-14	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$20,200	CCF63	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	SI	$155,900
86	CC	1124851467	ROSAS ROSERO CHERYL GIANNINA	X																	230301	15	$1,500,000	$240,000	EPS037	15	$1,500,000	$60,000	CCF63	15	$1,500,000	$60,000	14-11	15	$1,500,000	6.960%	$104,400	15	$0	$0	SI	$464,400
87	CC	1124867654	ZAABEDRA BECERRA SAUDY MILDREY	X																	230301	15	$800,000	$128,000	ESSC18	15	$800,000	$32,000	CCF63	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	6.960%	$55,700	15	$0	$0	SI	$247,700
88	CC	12982935	ZAMBRANO ORDOÑEZ SERVIO TULIO	X																		0	$0	$0	ESSC18	15	$580,000	$23,200	CCF63	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	SI	$86,800
Total	**Afiliados(71)**																						$209,707,052	$34,348,600			$214,002,973	$8,525,200			$205,349,013	$8,178,500			$214,002,973		$11,679,600		$0	$0		$62,731,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$34,348,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,787,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$12,301,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$15,326,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,934,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				71	$11,679,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	71	$11,679,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				71	$8,178,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	55	$6,985,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$314,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	14	$879,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				71	$8,525,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$50,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$76,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$93,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$564,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$124,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$588,900
FAMISANAR	EPS017[redacted]	830,003,564	7	5	$81[redacted]

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$20,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$1,560,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$10,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$716,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$3,824,700
TOTAL				71	$62,731,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1857378960	9445326974	E	2023/01/11	2023/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$48,930,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUBSIDIO (54 Afiliados)																							$154,089,069	$25,246,500			$159,860,662	$6,396,700			$152,030,489	$6,082,800			$159,860,662		$8,326,700		$0	$0		$46,052,700
Centro de Trabajo: 0,52200 (13 Afiliados)																							$35,710,001	$5,854,000			$35,710,001	$1,428,800			$35,710,001	$1,428,800			$35,710,001		$173,000		$0	$0		$8,884,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																							$35,710,001	$5,854,000			$35,710,001	$1,428,800			$35,710,001	$1,428,800			$35,710,001		$173,000		$0	$0		$8,884,600
1	CC	1023033357	CASTILLO CASTILLO LINA MAYERLY																	25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS005	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-11	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$809,300
2	CC	52868906	CORTES QUINTERO LINA MARIA																	23030 1	30	$1,999,000	$319,900	EPS008	30	$1,999,000	$80,000	CCF22	30	$1,999,000	$80,000	14-11	30	$1,999,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,400
3	CC	1020807680	FIERRO RAMIREZ CAMILA												X					23030 1	6	$200,000	$32,000	EPS005	6	$200,000	$8,000	CCF22	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$48,000
4	CC	1020807680	FIERRO RAMIREZ CAMILA																	23030 1	24	$800,000	$128,000	EPS005	24	$800,000	$32,000	CCF22	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	0.522%	$4,200	24	$0	$0	SI	$196,200
5	CC	39756469	GALINDO MENDOZA ADRIANA																	25-14	30	$1,907,000	$305,200	EPS005	30	$1,907,000	$76,300	CCF22	30	$1,907,000	$76,300	14-11	30	$1,907,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$467,800
6	CC	52191510	GUERRERO SANCHEZ LUZ RUBIELA																	25-14	30	$6,603,000	$1,122,700	EPS017	30	$6,603,000	$264,200	CCF22	30	$6,603,000	$264,200	14-11	30	$6,603,000	0.522%	$34,500	30	$0	$0	SI	$1,685,600
7	CC	1033810121	GUZMAN GORDO LEIDY TATIANA																	23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
8	CC	24870121	MOLANO OSPINA GLORIA NANCY																	23030 1	30	$1,999,000	$319,900	EPS005	30	$1,999,000	$80,000	CCF22	30	$1,999,000	$80,000	14-11	30	$1,999,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,400
9	CC	79539982	MORENO MARTINEZ JAIME FRANCISCO																	25-14	30	$1,467,000	$234,800	EPS008	30	$1,467,000	$58,700	CCF22	30	$1,467,000	$58,700	14-11	30	$1,467,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$359,900
10	CC	40385707	PEREZ REY NUBIA CONSTANZA																	23020 1	30	$1,999,000	$319,900	EPS005	30	$1,999,000	$80,000	CCF22	30	$1,999,000	$80,000	14-11	30	$1,999,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,400
11	CC	41911467	RAMIREZ HERNANDEZ ANA MARIA												X					23030 1	6	$1,467,400	$249,600	EPS005	6	$1,467,400	$58,700	CCF22	6	$1,467,400	$58,700	14-11	6	$1,467,400	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$367,000
12	CC	41911467	RAMIREZ HERNANDEZ ANA MARIA																	23030 1	24	$5,869,600	$998,000	EPS005	24	$5,869,600	$234,800	CCF22	24	$5,869,600	$234,800	14-11	24	$5,869,600	0.522%	$30,700	24	$0	$0	SI	$1,498,300
13	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA												X					25-14	7	$466,434	$74,700	EPS005	7	$466,434	$18,700	CCF22	7	$466,434	$18,700	14-11	7	$466,434	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$112,100
14	CC	52207616	ROA MOLINA ALEXANDRA																	25-14	23	$1,532,567	$245,300	EPS005	23	$1,532,567	$61,400	CCF22	23	$1,532,567	$61,400	14-11	23	$1,532,567	0.522%	$8,000	23	$0	$0	SI	$376,100
15	CC	1069759356	TORRES ORTIZ DANNA GERALDINE												X					23030 1	5	$550,000	$88,000	EPS005	5	$550,000	$22,000	CCF22	5	$550,000	$22,000	14-11	5	$550,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$132,000
16	CC	1069759356	TORRES ORTIZ DANNA GERALDINE																	23030 1	25	$2,750,000	$440,000	EPS005	25	$2,750,000	$110,000	CCF22	25	$2,750,000	$110,000	14-11	25	$2,750,000	0.522%	$14,400	25	$0	$0	SI	$674,400
17	CC	1018424223	ZAMBRANO RODRIGUEZ ANA MARIA																	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
Centro de Trabajo: 6,96000 (41 Afiliados)																							$118,379,068	$19,392,500			$124,150,661	$4,967,900			$116,320,488	$4,654,000			$124,150,661		$8,153,700		$0	$0		$37,168,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (41 Afiliados)																							$118,379,068	$19,392,500			$124,150,661	$4,967,900			$116,320,488	$4,654,000			$124,150,661		$8,153,700		$0	$0		$37,168,100
18	CC	11304586	AGUILAR SERRANO BERNARDINO															X			0	$0	$0	EPS005	30	$3,341,593	$133,700	CCF22	30	$3,341,593	$133,700	14-11	30	$3,341,593	6.960%	$232,600	30	$0	$0	SI	$500,000
19	CC	11430451	ALONSO GIL MIGUEL ANTONIO															X		23030 1	30	$2,199,563	$352,000	EPS008	30	$2,199,563	$88,000	CCF22	30	$2,199,563	$88,000	14-11	30	$2,199,563	6.960%	$153,100	30	$0	$0	SI	$681,100
20	CC	1039652781	ARIAS DENIS LUIS CARLOS															X		23030 1	30	$2,262,813	$362,100	EPS037	30	$2,262,813	$90,600	CCF22	30	$2,262,813	$90,600	14-11	30	$2,262,813	6.960%	$157,500	30	$0	$0	SI	$700,800
21	CC	93405057	BELTRAN OLAYA LUIS FERNANDO															X		23020 1	30	$1,866,591	$298,700	EPS002	30	$1,866,591	$74,700	CCF22	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$1,866,591	6.960%	$130,000	30	$0	$0	SI	$556,400
22	CC	91015818	CASTELLANOS FANDIÑO ALVARO DAVID															X		23020 1	30	$1,628,200	$260,600	EPS008	30	$1,628,200	$65,200	CCF22	30	$1,275,000	$51,000	14-11	30	$1,628,200	6.960%	$113,400	30	$0	$0	SI	$490,200
23	CC	80452743	CASTIBLANCO GOMEZ LUIS FERNANDO															X		23100 1	30	$1,315,600	$210,500	EPS017	30	$1,315,600	$52,700	CCF22	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,315,600	6.960%	$91,600	30	$0	$0	SI	$404,800
24	CC	1039654243	CHAVERRA CUESTA WILMAR															X		23030 1	30	$3,360,450	$537,700	EPS037	30	$3,360,450	$134,500	CCF22	30	$3,360,450	$134,500	14-11	30	$3,360,450	6.960%	$233,900	30	$0	$0	SI	$1,040,600

2023/01/12 12:41 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

25	CC	86040488	FAJARDO FREDY LEONARDO									X									230301	30	$3,065,752	$490,600	EPS005	30	$3,065,752	$122,700	CCF22	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$3,065,752	6.960%	$213,400	30	$0	$0	Si	$879,700
26	CC	79314050	FIERRO MORALES JAIME RAFAEL													X					231001	6	$1,777,000	$302,200	EPS005	6	$1,777,000	$71,100	CCF22	6	$1,777,000	$71,100	14-11	6	$1,777,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$444,400
27	CC	79314050	FIERRO MORALES JAIME RAFAEL																		231001	24	$7,108,000	$1,208,500	EPS005	24	$7,108,000	$284,400	CCF22	24	$7,108,000	$284,400	14-11	24	$7,108,000	6.960%	$494,800	24	$0	$0	Si	$2,272,100
28	CC	1018415688	FIERRO MORA JORGE ARMANDO																		230301	30	$3,630,000	$580,800	EPS005	30	$3,630,000	$145,200	CCF22	30	$3,630,000	$145,200	14-11	30	$3,630,000	6.960%	$252,700	30	$0	$0	Si	$1,123,900
29	CC	17352915	FIERRO MORALES JORGE ARMANDO													X					230301	9	$1,785,000	$303,600	EPS005	9	$1,785,000	$71,400	CCF22	9	$1,785,000	$71,400	14-11	9	$1,785,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$446,400
30	CC	17352915	FIERRO MORALES JORGE ARMANDO																		230301	21	$4,165,000	$708,200	EPS005	21	$4,165,000	$166,600	CCF22	21	$4,165,000	$166,600	14-11	21	$4,165,000	6.960%	$289,900	21	$0	$0	Si	$1,331,300
31	CC	79670631	FORERO LEON CHARLES EDWIN									X									25-14	30	$1,522,958	$243,700	EPS001	30	$1,522,958	$61,000	CCF22	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$1,522,958	6.960%	$106,000	30	$0	$0	Si	$463,700
32	CC	1006537687	GARCIA CUELLAR DIEGO ARMANDO																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
33	CC	79182273	GUTIERREZ VELA VICTOR MANUEL									X									25-14	1	$108,867	$17,500	EPS037	1	$108,867	$4,400	CCF22	1	$108,867	$4,400	14-11	1	$108,867	6.960%	$7,600	1	$0	$0	Si	$33,900
34	CC	79182273	GUTIERREZ VELA VICTOR MANUEL											X							25-14	29	$1,095,556	$175,300	EPS037	29	$1,095,556	$43,900	CCF22	0	$0	$0	14-11	29	$1,095,556	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$219,200
35	CC	11409965	HERNANDEZ ROZO JOSE VICENTE									X									25-14	30	$3,746,875	$599,500	EPS005	30	$3,746,875	$149,900	CCF22	30	$3,746,875	$149,900	14-11	30	$3,746,875	6.960%	$260,800	30	$0	$0	Si	$1,160,100
36	CC	11516681	HERNANDEZ CLAVIJO WILLIAM ERNESTO									X										0	$0	$0	EPS002	30	$2,430,000	$97,200	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,430,000	6.960%	$169,200	30	$0	$0	Si	$346,400
37	CC	4080940	LOPEZ JUAN ANDRES									X									25-14	30	$2,203,429	$352,600	EPS002	30	$2,203,429	$88,200	CCF22	30	$2,203,429	$88,200	14-11	30	$2,203,429	6.960%	$153,400	30	$0	$0	Si	$682,400
38	CC	79803958	MANTILLA GONZALEZ OSCAR																		230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	Si	$650,200
39	CC	5607719	MEDINA PINTO MIGUEL ANGEL									X									231001	30	$1,912,463	$306,000	EPS005	30	$1,912,463	$76,500	CCF22	30	$1,912,463	$76,500	14-11	30	$1,912,463	6.960%	$133,200	30	$0	$0	Si	$592,200
40	CC	1019142408	MOLINA ALBORNOZ JUAN MANUEL									X									230301	30	$3,247,500	$519,600	EPS005	30	$3,247,500	$129,900	CCF22	30	$3,247,500	$129,900	14-11	30	$3,247,500	6.960%	$226,100	30	$0	$0	Si	$1,005,500
41	CC	1084739193	MONTENEGRO GONZALEZ MASCEL ENRIQUE									X									230201	30	$4,845,333	$823,900	EPS037	30	$4,845,333	$193,900	CCF22	30	$4,845,333	$193,900	14-11	30	$4,845,333	6.960%	$337,300	30	$0	$0	Si	$1,549,000
42	CC	1148455718	MORENO PEREZ JOSE ALEJANDRO									X									230301	30	$1,834,375	$293,500	EPS005	30	$1,834,375	$73,400	CCF22	30	$1,834,375	$73,400	14-11	30	$1,834,375	6.960%	$127,700	30	$0	$0	Si	$568,000
43	CC	1126125040	MORENO PEREZ YULITZA DEL CARMEN	X								X									230301	14	$498,400	$79,800	EPS037	14	$498,400	$20,000	CCF22	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$498,400	6.960%	$34,700	14	$0	$0	Si	$153,200
44	CC	6771591	OCHOA MOLINA CARLOS MESIAS									X									25-14	30	$3,344,510	$535,200	EPS005	30	$3,344,510	$133,800	CCF22	30	$3,344,510	$133,800	14-11	30	$3,344,510	6.960%	$232,800	30	$0	$0	Si	$1,035,600
45	CC	28539814	PATIÑO PAVA GREISI													X					230301	8	$1,466,667	$249,500	EPS010	8	$1,466,667	$58,700	CCF22	8	$1,466,667	$58,700	14-11	8	$1,466,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$366,900
46	CC	28539814	PATIÑO PAVA GREISI																		230301	22	$4,033,334	$685,800	EPS010	22	$4,033,334	$161,400	CCF22	22	$4,033,334	$161,400	14-11	22	$4,033,334	6.960%	$280,800	22	$0	$0	Si	$1,289,400
47	CC	17342901	PULGARIN ORTIZ EDGAR EMILIO																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
48	CC	1018510718	RAMIREZ FIGUEREDO BRIAN RICARDO																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	6.960%	$160,100	30	$0	$0	Si	$712,100
49	CC	80374298	RAMIREZ VARELA NELSON ORLANDO									X									230301	30	$2,186,358	$349,900	EPS017	30	$2,186,358	$87,500	CCF22	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$2,186,358	6.960%	$152,200	30	$0	$0	Si	$642,600
50	CC	3215934	REYES HERRERA MIGUEL ANDRES																		230301	30	$8,745,000	$1,486,800	EPS002	30	$8,745,000	$349,800	CCF22	30	$8,745,000	$349,800	14-11	30	$8,745,000	6.960%	$608,700	30	$0	$0	Si	$2,795,100
51	CC	79816057	RIOS RIOS RODRIGO									X									230301	30	$1,510,800	$241,800	EPS005	30	$1,510,800	$60,500	CCF22	30	$1,510,800	$60,500	14-11	30	$1,510,800	6.960%	$105,200	30	$0	$0	Si	$468,000
52	CC	1076821977	RIVAS IBARGUEN YOISER ANDRES													X					230301	8	$533,333	$85,400	EPS010	8	$533,333	$21,400	CCF22	8	$533,333	$21,400	14-11	8	$533,333	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$128,200
53	CC	1076821977	RIVAS IBARGUEN YOISER ANDRES																		230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS010	22	$1,466,667	$58,700	CCF22	22	$1,466,667	$58,700	14-11	22	$1,466,667	6.960%	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
54	CC	1001637143	ROMAÑA ROMAÑA JARLINSON									X									230301	30	$2,165,000	$346,400	CCFC20	30	$2,165,000	$86,600	CCF22	30	$2,165,000	$86,600	14-11	30	$2,165,000	6.960%	$150,700	30	$0	$0	Si	$670,300
55	CC	5854349	ROMERO GARZON ELPIDIO									X									25-14	30	$3,755,260	$600,900	EPS017	30	$3,755,260	$150,300	CCF22	30	$3,755,260	$150,300	14-11	30	$3,755,260	6.960%	$261,400	30	$0	$0	Si	$1,162,900
56	CC	5853921	ROMERO GARZON SAIN									X									25-14	30	$5,469,229	$929,900	EPS005	30	$5,469,229	$218,800	CCF22	30	$5,469,229	$218,800	14-11	30	$5,469,229	6.960%	$380,700	30	$0	$0	Si	$1,748,200
57	CC	52902515	TORRES RENDON GLADYS ANDREA													X					25-14	2	$366,667	$62,500	EPS005	2	$366,667	$14,700	CCF22	2	$366,667	$14,700	14-11	2	$366,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$91,900
58	CC	52902515	TORRES RENDON GLADYS ANDREA																		25-14	28	$5,133,334	$872,800	EPS005	28	$5,133,334	$205,400	CCF22	28	$5,133,334	$205,400	14-11	28	$5,133,334	6.960%	$357,300	28	$0	$0	Si	$1,640,900
59	CC	79182649	TOVAR INFANTE JULIAN ODILIO									X									25-14	30	$3,967,426	$634,800	EPS037	30	$3,967,426	$158,700	CCF22	30	$3,967,426	$158,700	14-11	30	$3,967,426	6.960%	$276,200	30	$0	$0	Si	$1,228,400
60	CC	74371522	VALENCIA RENDON JULIAN ANDRES									X									25-14	30	$1,485,200	$237,700	EPS005	30	$1,485,200	$59,500	CCF22	30	$1,275,000	$51,000	14-11	30	$1,485,200	6.960%	$103,400	30	$0	$0	Si	$451,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Pensión Codigo	Pensión Dias	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Codigo	Salud Dias	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Riesgos IBC	Riesgos Tarifa	Riesgos Aporte	Parafiscales Dias	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
61	CC 71980770	VALENCIA MOSQUERA JULIO CESAR									X									25-14	30	$3,08[redacted]	$494,200	EPS037	30	$3,088,333	$123,600	CCF22	30	$3,088,333	$123,600	14-11	30	[redacted]3,088,333	6.960%	$215,000	30	$0	$0	SI	$956,400
62	CC 17352602	VARON SERRANO JOSE DANIEL									X									23020 1	30	$1,902,439	$304,400	EPS005	30	$1,902,439	$76,100	CCF22	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$1,902,439	6.960%	$132,500	30	$0	$0	SI	$566,000
63	CC 17334747	ZAMBRANO HERNANDEZ CARLOS OVIEDO									X									23030 1	30	$2,489,147	$398,300	EPS017	30	$2,489,147	$99,600	CCF22	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$2,489,147	6.960%	$173,300	30	$0	$0	SI	$724,200
64	CC 3090935	ZONA MORENO ELICEO									X									23020 1	30	$1,990,639	$318,600	EPS010	30	$1,990,639	$79,700	CCF22	30	$1,430,000	$57,200	14-11	30	$1,990,639	6.960%	$138,600	30	$0	$0	SI	$594,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Pensión Codigo	Pensión Dias	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Codigo	Salud Dias	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Riesgos IBC	Riesgos Tarifa	Riesgos Aporte	Parafiscales Dias	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACESAR (2 Afiliados)																						$6,288,813	$1,006,300			$6,288,813	$251,600			$6,288,813	$251,600			$6,288,813		$437,800		$0	$0		$1,947,300
Centro de Trabajo: 6,96000 (2 Afiliados)																						$6,288,813	$1,006,300			$6,288,813	$251,600			$6,288,813	$251,600			$6,288,813		$437,800		$0	$0		$1,947,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																						$6,288,813	$1,006,300			$6,288,813	$251,600			$6,288,813	$251,600			$6,288,813		$437,800		$0	$0		$1,947,300
65	CC 19596915	MONTENEGRO GONZALEZ MANUEL DE JESUS									X									23100 1	30	$3,638,813	$582,300	EPS037	30	$3,638,813	$145,600	CCF15	30	$3,638,813	$145,600	14-11	30	$3,638,813	6.960%	$253,300	30	$0	$0	SI	$1,126,800
66	CC 1062394698	PADILLA PADILLA LUIS FRANCISCO																		23100 1	30	$2,650,000	$424,000	EPS037	30	$2,650,000	$106,000	CCF15	30	$2,650,000	$106,000	14-11	30	$2,650,000	6.960%	$184,500	30	$0	$0	SI	$820,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Pensión Codigo	Pensión Dias	Pensión IBC	Pensión Aporte	Salud Codigo	Salud Dias	Salud IBC	Salud Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	Riesgos Codigo	Riesgos Dias	Riesgos IBC	Riesgos Tarifa	Riesgos Aporte	Parafiscales Dias	Parafiscales IBC	Parafiscales Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAPUTUMAYO (2 Afiliados)																						$3,005,417	$480,900			$3,005,417	$120,300			$3,005,417	$120,300			$3,005,417		$209,200		$0	$0		$930,700
Centro de Trabajo: 6,9600 (2 Afiliados)																						$3,005,417	$480,900			$3,005,417	$120,300			$3,005,417	$120,300			$3,005,417		$209,200		$0	$0		$930,700
Ciudad: VALLE DEL GUAMUEZ Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																						$3,005,417	$480,900			$3,005,417	$120,300			$3,005,417	$120,300			$3,005,417		$209,200		$0	$0		$930,700
67	CC 59176678	ERAZO RIASCOS AIDE CORINA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF63	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
68	CC 1124854452	JARAMILLO ROSERO ROBINSON FERNEY									X									23030 1	30	$2,005,417	$320,900	EPS037	30	$2,005,417	$80,300	CCF63	30	$2,005,417	$80,300	14-11	30	$2,005,417	6.960%	$139,600	30	$0	$0	SI	$621,100
Total	**Afiliados(58)**																					$163,383,299	$26,733,700			$169,154,892	$6,768,600			$161,324,719	$6,454,700			$169,154,892		$8,973,700		$0	$0		$48,930,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 822000138	1	INGECON S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 110 No. 9-25 of 911	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7462339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1857378960	9445326974	E	2023/01/11	2023/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$48,930,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				56	$26,733,700	$0	$0	$26,733,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$3,033,500	$0	$0	$3,033,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$8,667,300	$0	$0	$8,667,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	$12,706,800	$0	$0	$12,706,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,326,100	$0	$0	$2,326,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$8,973,700	$0	$0	$8,973,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	$8,973,700	$0	$0	$8,973,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				58	$6,454,700	$0	$0	$6,454,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54	$6,082,800	$0	$0	$6,082,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$251,600	$0	$0	$251,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	$120,300	$0	$0	$120,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				58	$6,768,600	$0	$0	$6,768,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$61,000	$0	$0	$61,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	$86,600	$0	$0	$86,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$291,900	$0	$0	$291,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$467,900	$0	$0	$467,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$654,300	$0	$0	$654,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,101,500	$0	$0	$1,101,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$741,900	$0	$0	$741,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$3,323,500	$0	$0	$3,323,500
TOTAL				58	$48,930,700	$0	$0	$48,930,700

CONTRATO 1784 DE 2021

CONTRATO NO.	**1784**	**Fecha:**	27 DE AGOSTO DE 2021
NÚMERO DEL PROCESO:	LP0-2021-043		
OBJETO:	"CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
VALOR:	CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($46.209.359.460,00)		
PLAZO:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **SEIS (06) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL CHAPARRAL identificado con NIT 901.505.619-5 representado Legalmente por el señor BENJAMIN FIGUEROA MOLINA, identificado con cedula de extranjería No. 444.716.		
NÚMERO DE CUENTA:	69000002008– CUENTA CORRIENTE		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA S.A.		
SUPERVISOR:	FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA- INGENIERO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT.		

Entre **CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRERO,** identificada con cédula No. 38.211.641 en su calidad de Secretaria de Infraestructura y Hábitat, Ordenadora del Gasto a través del Decreto Departamental No.0850 del 31 de agosto de 2020, en representación de Gobernación del Tolima, identificada con Nit. 800.113.672-7, en adelante se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte; y, por la otra el **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL**, identificado con NIT 901.505.619-5, representado Legalmente por el señor **BENJAMIN FIGUEROA MOLINA**, identificado con cedula de extranjería No. 444.716, quienes declaran hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el contrato de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado mediante la Resolución No. 264 del 21 de julio de 2021, previa Licitación pública (Obra pública) número **LPO-2021-043** aperturada mediante Resolución No. 0147 del 21 de mayo de 2021, contrato que se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, el Código Civil, el Código de Comercio y las normas que las modifiquen o

sustituyan, además de las que resulten aplicables a la materia, En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO: El objeto del Contrato es "CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LPO-2021-043, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **SEIS (06) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($46.209.359.460,00), **equivalentes a 50.862 SMLMV para el año 2021.**

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO: Una vez analizado el sector construcción, y teniendo en cuenta en lo trascurrido del año no presentó un crecimiento, además de analizar los argumentos expuesto por el contratista en su solicitud

y teniendo en cuenta el valor del contrato se otorgará en calidad de anticipo el 30% del valor del contrato de obra, previa suscripción del acta de inicio y presentación de la certificación del plan de inversión del anticipo aprobada por el supervisor, interventor y ordenador del gasto.

AMORTIZACIÓN: El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS. – Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la ENTIDAD al CONTRATISTA, serán reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la Tesorería de la Gobernación del Tolima. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

PARÁGRAFO TERCERO: EXCEDENTES DE RECURSOS. – Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la Tesorería de la ENTIDAD, en la cuenta que para tal efecto disponga la Dirección Financiera, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

Nota: Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos. La fiduciaria administra los recursos del patrimonio autónomo y autoriza los pagos con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor y/o el interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo. Cuando la Entidad Estatal declara la caducidad, incumplimiento o terminación del contrato estatal o cuando se presenta la nulidad del contrato estatal la sociedad fiduciaria debe reintegrar los recursos del anticipo a la Entidad Estatal. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y el Departamento será el beneficiario del rendimiento del mismo. La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal. Lo anterior de conformidad con art. 91 ley 1474 de 2011.

Nota: EL INICIO DE LA OBRA NO ESTA SUJETA A LA ENTREGA DEL ANTICIPO

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	No. DISPONIBILIDAD	FECHA	VALOR	VALOR AFECTADO

03-3-2311-0504	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN:2020004730049	2299	20/05/20	$31.120.000.000,00	$31.120.000.000,0
03-3-2311-4500	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE NOS UNE A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA BPIN:2020004730049	2015	27/04/20	$18.000.000.000,00	$15.089.359.460
TOTAL DISPONIBILIDAD				**$49.120.000.000,00**	**$46.209.359.460,00**
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO				$49.119.998.882,00	

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO: (En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan)

El pago del presente proceso será bajo la modalidad de precio unitario el cual deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del constructor.

El Departamento pagará el 90% del Valor total del Contrato mediante actas parciales de obra, así

I. El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al veinte por ciento (20%), Y los demás pagos al avance de la obra hasta el 90% de la ejecución.

II. Y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra se pagará por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta de recibo final y liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos.

Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto. El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor, director de infraestructura y ordenador del Gasto del Departamento.

Los pagos están supeditados al PAC del Departamento.

El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor, supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades y ordenador del gasto, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a "Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.
14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16.El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) Código CCE-EICP-IDI-05 Página 6 de 15 Versión No. 3 Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 3 ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplirá con las obligaciones que se desprendan del Anexo Nº 1 (Anexo Técnico) de este pliego de condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial en cumplimiento con la normatividad INVIAS vigente, las cuales entre otras son:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta para tal efecto los parámetros y condiciones definidos por el DEPARTAMENTO a través del supervisor e interventor del contrato.
2. Realizar las obras cuyo objeto es "el **MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto, en

concordancia con el presupuesto de obra y anexo técnico que hacen parte integral del presente documento.

3. Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hacen parte integral del contrato, cuyas cantidades y precios se relacionan en la misma.
4. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra.
5. Suministrar por su cuenta y riesgo, todos los materiales, equipos, personal y herramientas que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto del contrato. Los materiales y objetos que se utilicen deben ser conforme a la propuesta presentada.
6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
7. Ejecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los equipos, maquinaria, personal y herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras.
8. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.
9. El Contratista hará el cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.
10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto bueno del interventor y supervisor.
11. Consultar oportunamente y por escrito a la Secretaría de Infraestructura y hábitat, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos de la obra. Los cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista.
12. Hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, formaletas, o materiales similares que le pertenezcan o que se haya usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el DEPARTAMENTO realizará los trabajos y cargará su costo al contratista, desmontando su valor de la cuenta final.
13. Revisar e inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la obra y ordenará la remoción de cualquier parte o elemento de construcción que no cumpla con lo estipulado en las cantidades de obra o especificaciones consignadas en las condiciones para contratar.
14. Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripción de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realización de las actividades propuestas. (Las fotos deberán tener fecha en la que se tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregará en medio físico y magnético en CD ROM.
15. Cumplir dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto.
16. Colocar avisos y señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas o a las cosas.

17. Utilizar personal idóneo y experimentado en la ejecución de la obra.
18. Todo el personal que participe en las actividades que refiera la ejecución de las mismas en altura, deberá estar certificado para la realización de trabajo en alturas vigente en el momento de la realización de la actividad.
19. Instalar una valla informativa con base en las especificaciones señaladas en la resolución vigente emanada del Ministerio de Transporte.
20. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el interventor y supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato.
21. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas.
22. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales), El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría.
23. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.
24. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantía.
25. Presentar informe técnico al supervisor e interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago.
26. Las demás que resulten de la ejecución del contrato.
27. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, este último cuando corresponda.
28. El CONTRATISTA debe presentar, además de los informes que le solicite expresamente el interventor y/o supervisor, los siguientes informes: a) Informes de avance mensual: Debe contener debidamente aprobados por la interventoría el avance de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo toda la documentación técnica, a saber. Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes.
29. El CONTRATISTA, entregara al interventor, Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y duración de cada una de las actividades, programación de los trabajos que incluya todas las actividades, flujo mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación lógica con la obra a recibir por interventoría, durante el mismo período, programa de suministros detallados, programa de equipos.
30. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser

demolidos y reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el interventor y Supervisor o la Entidad Contratante.

31. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra, interventor y Supervisor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad Contratante.
32. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos y/o licencias necesarias en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público.
33. Reintegrar al Departamento los excedentes y los saldos que no llegaran a ejecutar parcialmente, este debe reintegrarlo al tesoro del Departamento del Tolima.
34. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO para el cumplimiento del objeto del presente contrato y reintegrar al Departamento los dineros que no se ejecuten en el desarrollo del contrato y los rendimientos financieros que estos generen.
35. Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas.
36. El contratista debe dar estricto cumplimiento a las políticas de inclusión de genero motivadas por el INSTITUTO.
37. Garantizar e implementar los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente.
38. Deberá garantizar durante la ejecución del contrato el desarrollo de actividades, procedimientos y medidas necesarias para el cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno Nacional.
39. El contratista queda obligado a cumplir cabalmente con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o perjuicio al INSTITUTO "INVIAS", Gobernación del Tolima o terceros por esta causa.
40. El contratista se obliga a mantener al INSTITUTO "INVIAS" y a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes realizadas durante la ejecución del contrato.
41. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA: El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega

del objeto contratado.

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
5. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.
6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.
7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual.
8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
9. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
10. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD: El contratista mantendrá a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

CLÁUSULA 15. MULTAS: Incumplir la obligación de incluir mínimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a 1.0 SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del contrato.

Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la legalización del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados y entrega de éstos y los demás documentos necesarios para el inicio del contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de mora.
2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar en valor y/o en plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas garantías en cualquier otro evento que lo amerite, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.
3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.
4. Por suspensión temporal de la obra sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.
5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, el cero punto cero cinco por ciento (0,05%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Departamento del Tolima, establecidas en la Ley.
6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Departamento del Tolima, establecidas en la Ley.
7. Cuando se presente un atraso mayor del veinte por ciento (20%) en cualquiera de los grupos de obra, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Departamento.
8. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente o demás personal requerido en la obra, o por remplazarlos sin previa autorización de la Interventoría, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.

9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.
10. Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución de la obra, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto cero uno por ciento (0.01%) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.
11. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Departamento del Tolima, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato.
12. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la Interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.
13. Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto cero uno por ciento (0,01%) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.
14. Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las demás sanciones a las que haya lugar.
15. Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato.
16. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Departamento entenderá que el Contratista no tiene voluntad para la liquidación de mutuo acuerdo y procederá a la liquidación unilateral.
17. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar la información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.
18. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato.
19. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal es, con base en los salarios presentados en la propuesta, el cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio del Trabajo.
20. Por el incumplimiento en la puesta a disposición de maquinaria de obra y equipos, conforme a lo ofertado como criterio de calidad, para ejercer las actividades de la obra, multa del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor total del contrato por cada semana de retraso sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

21. Por el Incumplimiento en la implementación de medidas de manejo ambiental, multa del cero punto uno por ciento (0,1%) por cada día de no implementación de las medidas, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.
22. Se causará multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

Parágrafo 1. El Departamento del Tolima - Secretaría de Infraestructura y Hábitat, aplicará sucesivamente las multas por cada día de mora o retraso en el cumplimiento de las obligaciones mientras persista el incumplimiento. (Esta disposición aplica para todas las causales de multas, salvo la descrita en el numeral 14.22 de la presente cláusula).

Parágrafo 2. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente f rente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%).La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una SANCIÓN. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral.

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7 y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" con NIT 800.215.807-2</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y</td><td><table><tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr></table></td></tr>
</table>

valores asegurados	**Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	Diez por ciento (10%) del valor del contrato
	Calidad del servicio	Por el termino de duración del contrato y CINCO (5) años más, a partir del recibo final del producto, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto 1082 de 2015.	Treinta por ciento (30%) del valor del componente de estudios y diseños
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	Veinte por ciento (20%) del valor del contrato
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad	Veinte (20%) del valor final de las obras
	Correcta Inversión del Anticipo	Durante el plazo de ejecución del contrato	Por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en calidad de anticipo
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se		

	deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA:

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición

Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7 y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" con NIT 800.215.807-2
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	No debe ser inferior a: El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN: El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las

obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
El lugar de entrega del proyecto adjudicado en el presente proceso será en la VIA CHAPARRAL – RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Ibagué Departamento del Tolima, a los veintisiete (27) días del mes de agostos de 2021.

Funcionario o asesor	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Kateryne Yulieth León Miranda	Directora de Contratación		
Proyectado por:	Milena Cruz Álzate	Delegada Oficina de Contratación		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.				

ADICIONES Y/O MODIFICACIONES AL CONTRATO 1784 DE 2021

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA No: 8

X

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 26 MM 1.00 2023

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901.505.619-5

CONTRATO DE INTERVENTORIA No :

INTERVENTOR : CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACION: 26/10/2021

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 57,272,400,368

PLAZO ACUMULADO: 19 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2023

VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84

VALOR ADICIÓN No.2 : N/A

VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 11,063,040,907.84

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 CANTIDAD	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 +-	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL
VIA													
Capitulo 1. Explanaciones													
1	1P	Localización y replanteo	Ha	7,00	$ 1,150,000,00	$ 8,050,000,00	24,03	$ 27,634,500,00	=	0,00	$ 0,00	24,03	$ 27,634,500,00
2	201,2	Demolición de Estructuras	m3	56,00	$ 230,000,00	$ 12,880,000,00	615,69	$ 141,808,700,00	+	174,31	$ 40,091,300,00	790,00	$ 181,700,000,00
3	210,2,1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	13,566,00	$ 95,000,00	$ 1,288,770,000,00	272,90	$ 25,925,500,00	=	0,00	$ 0,00	272,90	$ 25,925,500,00
4	210,2,2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	27,132,00	$ 16,500,00	$ 447,678,000,00	16,709,12	$ 275,700,480,00	-	-4,333,80	-$ 71,507,700,00	12375,32	$ 204,192,780,00
5	211,1	Remoción de Derrumbes	m3	450,00	$ 13,500,00	$ 6,075,000,00	19,500,00	$ 263,250,000,00	+	2265,00	$ 30,577,500,00	21765,00	$ 293,827,500,00
6	2P	Conformación de sitios de disposicion de sobrantes	m3	50,873,00	$ 6,000,00	$ 305,238,000,00	38,368,24	$ 230,209,440,00	+	2,265,00	$ 13,590,000,00	40633,24	$ 243,799,440,00
7	3P	Mejoramiento de la Subrasante con material tamaño maximo de 4" (Incluye Suministro, Colocacion, Compactacion Transporte)	m3	26,800,00	$ 167,000,00	$ 4,442,200,000,00	26,585,84	$ 4,439,801,880,00	+	3,000,00	$ 501,000,000,00	29585,84	$ 4,940,801,880,00
Subtotal						**$ 6,810,891,000,00**		**$ 6,404,138,500,00**			**$ 613,761,100,00**		**$ 5,917,881,600,00**
Capitulo 2. Bases, Subbases y Afirmados													
8	310,1	Conformacion de la calzada existente	m2	66,500,00	$ 1,300,00	$ 86,450,000,00	81,684,10	$ 106,189,330,00	=	0,00	$ 0,00	81684,10	$ 106,189,330,00
9	320,1	Subbase granular	m3	20,249,00	$ 205,000,00	$ 4,151,045,000,00	8,592,20	$ 1,761,401,000,00	-	-5,123,43	-$ 1,050,303,150,00	3468,77	$ 711,097,850,00
10	330,1	Base granular	m3	12,642,00	$ 225,000,00	$ 2,844,450,000,00	7,518,17	$ 1,691,588,250,00	-	-4,483,00	-$ 1,008,675,000,00	3035,17	$ 682,913,250,00
11		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido (separación de granulares)	m2	0,00	$ 12,000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
Subtotal						**$ 7,081,948,000,00**		**$ 3,889,178,580,00**			-$ 2,058,978,150,00		**$ 1,500,200,430,00**
Capitulo 3. Pavimentos Asfalticos													
12	420,1	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	m2	44,835,00	$ 4,000,00	$ 179,340,000,00	32,555,34	$ 130,221,360,00	-	-17,379,46	-$ 69,517,920,00	15175,86	$ 60,703,440,00
13	421,3	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	m2	44,835,00	$ 3,500,00	$ 156,922,500,00	34,815,80	$ 121,855,300,00	-	-21,807,92	-$ 76,327,720,00	13007,88	$ 45,527,580,00
14	450P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	5,882,00	$ 1,050,000,00	$ 5,945,100,000,00	3,396,58	$ 3,566,409,000,00	-	-1,985,71	-$ 2,063,995,500,00	1430,87	$ 1,502,413,500,00
Subtotal						**$ 6,281,362,500,00**		**$ 3,818,486,660,00**			-$ 2,209,841,148,00		**$ 1,608,644,520,00**
Capitulo 4. Estructuras para Estabilización de Taludes y Recuperación de Banca													
15	600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	19,360,00	$ 53,000,00	$ 1,026,080,000,00	17,850,00	$ 946,050,000,00	+	8,650,00	$ 458,450,000,00	26500,00	$ 1,404,500,000,00
16	600,2,1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	35,00	$ 115,000,00	$ 4,025,000,00	42,99	$ 4,943,850,00	=	0,00	$ 0,00	42,99	$ 4,943,850,00
17	600,2,3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	827,00	$ 83,000,00	$ 68,641,000,00	155,55	$ 12,910,650,00	+	2544,45	$ 211,189,350,00	2700,00	$ 224,100,000,00
18	610,2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	10,500,00	$ 164,000,00	$ 1,722,000,000,00	6,526,70	$ 1,398,378,800,00	+	3,473,30	$ 588,621,200,00	12000,00	$ 1,986,000,000,00
19	630,3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	1,336,00	$ 980,000,00	$ 1,308,280,000,00	2,816,03	$ 2,563,709,400,00	=	0,00	$ 0,00	2816,03	$ 2,563,709,400,00
20	621,1P	Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C, incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	1,850,00	$ 2,800,000,00	$ 5,180,000,000,00	4,820,00	$ 13,496,000,000,00	+	578,48	$ 1,619,744,000,00	5398,48	$ 15,115,744,000,00
21	630,4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	4,300,00	$ 920,000,00	$ 3,956,000,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
22	630,5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	251,00	$ 700,000,00	$ 175,700,000,00	165,58	$ 115,906,000,00	+	24,42	$ 17,094,000,00	190,00	$ 133,000,000,00
23	630,7	Concreto clase G	m3	1,200,00	$ 530,000,00	$ 636,000,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
24	640,1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	358,768,00	$ 8,000,00	$ 2,870,144,000,00	700,824,13	$ 5,604,993,040,00	+	69,506,15	$ 556,049,200,00	770130,28	$ 6,161,042,240,00
25	673,2	Material Granular Drenante	m3	2,800,00	$ 175,000,00	$ 490,000,000,00	97,46	$ 17,055,500,00	=	0,00	$ 0,00	97,46	$ 17,055,500,00
26	673,1,1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	19,950,00	$ 12,000,00	$ 239,400,000,00	159,42	$ 1,913,040,00	=	0,00	$ 0,00	159,42	$ 1,913,040,00
27	663,1,1P	Tuberia perforada diametro 4"	m		$ 81,000,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	+	980,00	$ 79,380,000,00	980,00	$ 79,380,000,00
28	681,1	Gaviónes de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1: recubrimiento de Zinc (galvanizado)	m3	825,00	$ 350,000,00	$ 288,750,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
29	674,1P	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	800,00	$ 245,000,00	$ 196,000,000,00	1197,76	$ 293,451,200,00	=	0,00	$ 0,00	1197,76	$ 293,451,200,00
Subtotal						**$ 18,162,020,800,00**		**$ 24,486,311,480,00**			**$ 3,911,827,780,00**		**$ 27,966,839,230,00**
Capitulo 5. Drenajes													
30	600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	700,00	$ 57,000,00	$ 39,900,000,00	10328,49	$ 588,723,930,00	+	2171,51	$ 123,776,070,00	12500,00	$ 712,500,000,00
31	600,2,1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	10,00	$ 115,000,00	$ 1,150,000,00	222,00	$ 25,530,000,00	=	0,00	$ 0,00	222,00	$ 25,530,000,00
32	600,2,3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	50,00	$ 83,000,00	$ 4,150,000,00	189,80	$ 14,076,800,00	=	0,00	$ 0,00	189,80	$ 14,076,800,00
33	610,2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	310,00	$ 179,000,00	$ 55,490,000,00	5157,27	$ 923,151,330,00	+	2000,00	$ 358,000,000,00	7157,27	$ 1,281,151,330,00
34	630,4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	150,00	$ 959,000,00	$ 143,850,000,00	35,00	$ 33,565,000,00	=	0,00	$ 0,00	35,00	$ 33,565,000,00
35	630,3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	0,00	$ 980,000,00	$ 0,00	704,28	$ 690,194,400,00	+	195,72	$ 191,805,600,00	900,00	$ 882,000,000,00
36	630,5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	75,00	$ 700,000,00	$ 52,500,000,00	121,82	$ 85,274,000,00	+	63,18	$ 44,226,000,00	185,00	$ 129,500,000,00
37	630,7	Concreto clase G	m3	246,00	$ 550,000,00	$ 135,300,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38	640,1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	8,000,00	$ 8,100,00	$ 64,800,000,00	68,368,18	$ 553,782,258,00	=	0,00	$ 0,00	68368,18	$ 553,782,258,00
39	661,1	Tuberia de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	225,00	$ 805,000,00	$ 181,125,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT** ACTA No: **8**

X

FECHA DE ELABORACIÓN: DD **26** MM **1.00** **2023**

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901,595,819-5**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR : **CONSORCIO IC & CB - NIT. 901,521,515-5**

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACION: 26/10/2021

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 57,272,400,368

PLAZO ACUMULADO: 19 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2023

VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84

VALOR ADICIÓN No.2 : N/A

VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 11,063,040,907.84

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 CANTIDAD	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 +-	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL
40	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo,	m3	680.00	$ 880,000.00	$ 598,400,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
41	673.2	Material Granular Drenante	m3	350.00	$ 182,000.00	$ 63,700,000.00	5275.03	$ 960,055,460.00	-	-852.03	-$ 118,689,460.00	4623.00	$ 841,366,000.00
42	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	3,950.00	$ 12,000.00	$ 47,400,000.00	30,771.02	$ 369,252,240.00	-	-8,048.02	-$ 72,576,240.00	24723.00	$ 296,676,000.00
43	663.1.1P	Tuberia de PVC perforada D=6"	m	0.00	$ 81,000.00	$ 0.00	10,810.32	$ 875,635,920.00	-	-3,776.32	-$ 305,881,920.00	7034.00	$ 569,754,000.00
44	610.1	Rellenos para estructuras con suelo	m3		$ 75,000.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
45	320.1	Subbase granular	m3	0.00	$ 205,000.00	$ 0.00	807.93	$ 165,625,650.00	-	-645.93	-$ 132,415,650.00	162.00	$ 33,210,000.00
Subtotal						$ 1,387,765,000.00		$ 5,284,866,999.00			$ 88,264,400.00		$ 5,373,131,399.00
Capitulo 6. Señalización y Seguridad													
46	700.1	Lineas de Demarcación con pintura en frio	m	21,000.00	$ 2,800.00	$ 58,800,000.00	17,384.17	$ 48,675,676.00	=	0.00	$ 0.00	17384.17	$ 48,675,676.00
47	700.3	Marca Vial con pintura en frio	m2	500.00	$ 47,800.00	$ 23,900,000.00	100.00	$ 4,780,000.00	=	0.00	$ 0.00	100.00	$ 4,780,000.00
48	701.1	Tacha Reflectiva	Und	1,750.00	$ 14,000.00	$ 24,500,000.00	2,356.00	$ 32,984,000.00	=	0.00	$ 0.00	2356.00	$ 32,984,000.00
49	710.1	Señal Vertical de Transito tipo I con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	Und	50.00	$ 625,000.00	$ 31,250,000.00	20.00	$ 12,500,000.00	=	0.00	$ 0.00	20.00	$ 12,500,000.00
50	720.1P	Señal Poste de referencia SI - 04	Und	7.00	$ 602,000.00	$ 4,214,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
51	730.1	Defensa metalica	m	310.00	$ 273,000.00	$ 84,630,000.00	335.00	$ 91,455,000.00	=	0.00	$ 0.00	335.00	$ 91,455,000.00
52	730.2	Sección final	Und	25.00	$ 276,000.00	$ 6,900,000.00	58.00	$ 15,456,000.00	=	0.00	$ 0.00	58.00	$ 15,456,000.00
53	740.1	Captaforos	Und	130.00	$ 18,000.00	$ 2,340,000.00	335.00	$ 6,030,000.00	=	0.00	$ 0.00	335.00	$ 6,030,000.00
Subtotal						$ 224,834,000.00		$ 211,886,676.00			$ 0.00		$ 211,886,676.00
Capitulo 7. Transportes													
54	900.1P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	M3-KM	14,536.00	$ 1,050.00	$ 15,262,800.00	2,068.54	$ 2,171,967.00	+	1,181.53	$ 1,240,606.50	3250.07	$ 3,412,573.50
55	900.2P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1.000 m).	M3-KM	439,650.00	$ 1,350.00	$ 593,527,500.00	880,190.39	$ 1,188,257,026.50	+	384,811.32	$ 519,495,282.00	1265001.71	$ 1,707,752,308.50
56	900.3P	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM	313,800.00	$ 1,550.00	$ 486,390,000.00	127,967.02	$ 198,379,881.00	-	-39,967.02	-$ 61,793,881.00	88120.00	$ 136,586,000.00
Subtotal						$ 1,095,180,300.00		$ 1,388,808,874.50			$ 459,942,007.50		$ 1,847,750,882.00
Capitulo 8. Obras Varias													
57	800.2	Cerca de Alambre de Puas con Postes de Concreto.	m	2,000.00	$ 29,000.00	$ 58,000,000.00	4,984.05	$ 144,537,450.00	=	0.00	$ 0.00	4984.05	$ 144,537,450.00
Subtotal						$ 58,000,000.00		$ 144,537,450.00			$ 0.00		$ 144,537,450.00
Capitulo 9. No Previstos													
NP1	465.13	Demolición de la carpeta asfáltica	m3	0.00	$ 135,419.00	$ 0.00	193.87	$ 26,253,881.53	-	-100.00	-$ 13,541,900.00	93.87	$ 12,711,781.53
NP2	671.3P	Cuneta de Concreto clase C Vaciada In Situ; incluye la conformacion de la superficie de apoyo,	m3	0.00	$ 968,374.00	$ 0.00	2,122.75	$ 2,055,820,732.62	-	-1,385.64	-$ 1,341,822,573.48	737.11	$ 713,798,159.14
NP3	661.1	Tuberia de Concreto Reforzado 28 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	0.00	$ 889,932.00	$ 0.00	651.20	$ 579,523,718.40	=	0.00	$ 0.00	651.20	$ 579,523,718.40
NP4	683.5	Geodren vial	m2		$ 109,677.00	$ 0.00	2,357.20	$ 258,530,624.40	=	0.00	$ 0.00	2357.20	$ 258,530,624.40
NP5	802.4	Poda de la parte aérea de árboles tipo IV	Un	0.00	$ 60,270.00	$ 0.00	164.00	$ 9,884,280.00	-	-124.00	-$ 7,473,480.00	40.00	$ 2,410,800.00
NP6	802.8	Poda de la parte radicular de árboles tipo IV	Un	0.00	$ 232,208.00	$ 0.00	88.00	$ 20,434,304.00	+	43.00	$ 9,984,944.00	131.00	$ 30,419,248.00
NP7	683.1	Geotextil de refuerzo tipo tejido 4000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 30,089.00	$ 0.00	5,624.40	$ 169,232,571.60	=	0.00	$ 0.00	5624.40	$ 169,232,571.60
NP8	683.2	Geotextil de refuerzo tipo tejido 6000 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 37,497.00	$ 0.00	1,413.60	$ 53,005,759.20	=	0.00	$ 0.00	1413.60	$ 53,005,759.20

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

el Tolima nos Une

PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA No: 8

X

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 26 MM 1.00 2023

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901,505,619-5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR : CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACION: 26/10/2021

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 57,272,400,368

PLAZO ACUMULADO: 19 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2023

VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84

VALOR ADICIÓN No.2 : N/A

VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 11,063,040,907.84

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 CANTIDAD	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 +-	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL
NP9	683,3	Geoceldá tipo HDPE 6" de fachada para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	0.00	$ 90,866.00	$ 0.00	8,967.76	$ 816,681,800.16	=	0.00	$ 0.00	8967.76	$ 816,681,800.16
NP10	683,4	Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m3	0.00	$ 189,199.00	$ 0.00	1,345.30	$ 254,529,414.70	+	4,454.70	$ 842,824,785.30	5800.00	$ 1,097,354,200.00
NP11	741,13	Delineadores de curva horizontal SP-75 doble	Und	0.00	$ 858,663.00	$ 0.00	180.00	$ 154,559,340.00	=	0.00	$ 0.00	180.00	$ 154,559,340.00
NP12		Rocería y limpieza ancho max. 2m a lado y lado de la vía, y retiro material vegetal	Ha	0.00	$ 778,289.00	$ 0.00	2.09	$ 1,626,624.01	+	0.03	$ 23,348.67	2.12	$ 1,649,972.68
NP13		Limpieza alcantarillas Existentes	Un	0.00	$ 258,279.00	$ 0.00	37.00	$ 9,556,323.00	=	0.00	$ 0.00	37.00	$ 9,556,323.00
NP14		Limpieza de cunetas incluye retiro de sobrantes	ml	0.00	$4,138.00	$ 0.00	15,927.30	$ 65,907,167.40	=	0.00	$ 0.00	15927.30	$ 65,907,167.40
Subtotal						$ 0.00		$ 4,475,346,341.02			$ 510,004,875.51		$ 3,965,341,465.51
SUBTOTAL						$ 40,813,697,800.00		$ 49,743,846,983.84			$ 206,338,913.37		$ 49,534,207,841.99
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AMBEIMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN K11+680 DE LA VIA CHAPARRAL - RIOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA													
Capitulo 1. Preliminares													
1	4P	Localización y replanteo puente	m2	9,034.20	$ 2,000.00	$ 18,068,400.00	9,034.20	$ 18,068,400.00	=	0.00	$ 0.00	9034.20	$ 18,068,400.00
Subtotal						$ 18,068,400.00		$ 18,068,400.00			$ 0.00		$ 18,068,400.00
Capitulo 2. Movimiento de Tierras													
2	200,2P	Demoste y limpieza de zonas no boscosas	m2	4,000.00	$ 20,000.00	$ 80,000,000.00	4,000.00	$ 80,000,000.00	=	0.00	$ 0.00	4000.00	$ 80,000,000.00
3	201,2P	Demolición de estructuras de concreto reforzado	m3	88.00	$ 197,000.00	$ 17,336,000.00	88.00	$ 17,336,000.00	=	0.00	$ 0.00	88.00	$ 17,336,000.00
4	201,11	Desmontaje y traslado de estructuras metálicas	kg	97,650.00	$ 5,000.00	$ 488,250,000.00	97,650.00	$ 488,250,000.00	=	0.00	$ 0.00	97650.00	$ 488,250,000.00
5	220,1	Terraplen	m3	2,465.00	$ 20,000.00	$ 49,300,000.00	2,465.00	$ 49,300,000.00	=	0.00	$ 0.00	2465.00	$ 49,300,000.00
6	210,1,1	Excavaciones sin clasificar de la explanación y canales	m3	680.00	$ 14,000.00	$ 9,520,000.00	680.00	$ 9,520,000.00	=	0.00	$ 0.00	680.00	$ 9,520,000.00
Subtotal						$ 644,406,000.00		$ 644,406,000.00			$ 0.00		$ 644,406,000.00
Capitulo 3. Estructura de Pavimento													
7	630,3	Concreto resistencia 28MPA	m3	85.00	$ 980,000.00	$ 83,300,000.00	85.00	$ 83,300,000.00	=	0.00	$ 0.00	85.00	$ 83,300,000.00
8	640,1	Acero de refuerzo 420MPA	kg	7,705.00	$ 8,000.00	$ 61,640,000.00	7,705.00	$ 61,640,000.00	=	0.00	$ 0.00	7705.00	$ 61,640,000.00
9	330,1	Base granular clase A	m3	573.00	$ 182,000.00	$ 104,286,000.00	573.00	$ 104,286,000.00	=	0.00	$ 0.00	573.00	$ 104,286,000.00
10	450,2	Mezcla densa en caliente tipo MDC19	m3	40.00	$ 1,100,000.00	$ 44,000,000.00	40.00	$ 44,000,000.00	=	0.00	$ 0.00	40.00	$ 44,000,000.00
11	420,1	Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-1	m2	420.00	$ 4,000.00	$ 1,680,000.00	420.00	$ 1,680,000.00	=	0.00	$ 0.00	420.00	$ 1,680,000.00
12	673,1,2	Geotextil tipo T2400	m2	450.00	$ 12,000.00	$ 5,400,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
13	230,1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	500.00	$ 112,000.00	$ 56,000,000.00	500.00	$ 56,000,000.00	=	0.00	$ 0.00	500.00	$ 56,000,000.00
14	810,1	Protección de taludes con bloques de césped	m2	1,382.00	$ 18,000.00	$ 24,876,000.00	1,382.00	$ 24,876,000.00	=	0.00	$ 0.00	1382.00	$ 24,876,000.00
15	311,1	Afirmado	m3	93.00	$ 128,000.00	$ 11,904,000.00	93.00	$ 11,904,000.00	=	0.00	$ 0.00	93.00	$ 11,904,000.00
Subtotal						$ 393,086,000.00		$ 387,686,000.00			$ 0.00		$ 387,686,000.00
Capitulo 4. Estructuras Adicionales y Drenajes													
16	610,5	Rellenos con material filtrante	m3	67.00	$ 257,000.00	$ 17,219,000.00	67.00	$ 17,219,000.00	=	0.00	$ 0.00	67.00	$ 17,219,000.00
17	673,1,1	Geotextil tipo NT-2500	m2	310.00	$ 12,000.00	$ 3,720,000.00	310.00	$ 3,720,000.00	=	0.00	$ 0.00	310.00	$ 3,720,000.00
18	663,1,1P	Tubería de PVC perforada D=4"	m	44.00	$ 81,000.00	$ 3,564,000.00	44.00	$ 3,564,000.00	=	0.00	$ 0.00	44.00	$ 3,564,000.00
19	663,1,2P	Tubería de PVC D=1"	m	28.00	$ 45,000.00	$ 1,260,000.00	28.00	$ 1,260,000.00	=	0.00	$ 0.00	28.00	$ 1,260,000.00
20	600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	230.00	$ 57,000.00	$ 13,110,000.00	230.00	$ 13,110,000.00	=	0.00	$ 0.00	230.00	$ 13,110,000.00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA No: 8

X

FECHA DE ELABORACIÓN	DD	26	MM	1.00	2023

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901,865,619-5

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR : CONSORCIO IC & CB - NIT. 901,521,515-5

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACION: 26/10/2021

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00

VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 57,272,400,368

PLAZO ACUMULADO: 19 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2023

VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84

VALOR ADICIÓN No.2 : N/A

VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 11,063,040,907.84

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 CANTIDAD	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 +-	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL
21	610,1	Rellenos para estructuras con suelo	m3	95,00	$ 75,000,00	$ 7,125,000,00	95,00	$ 7,125,000,00	=	0,00	$ 0,00	95,00	$ 7,125,000,00
22	630,3	Concreto resistencia 28MPA	m3	85,00	$ 984,000,00	$ 83,640,000,00	85,00	$ 83,640,000,00	=	0,00	$ 0,00	85,00	$ 83,640,000,00
23	630,6	Concreto resistencia 14MPA	m3	16,00	$ 643,000,00	$ 10,288,000,00	16,00	$ 10,288,000,00	=	0,00	$ 0,00	16,00	$ 10,288,000,00
24	640,1	Acero de refuerzo 420MPA	kg	7,190,00	$ 8,000,00	$ 57,520,000,00	7,190,00	$ 57,520,000,00	=	0,00	$ 0,00	7190,00	$ 57,520,000,00
Subtotal						$ 197,448,999,00		$ 197,448,999,00			$ 0,00		$ 197,448,999,00
Capitulo 5. Estructura Principal													
25	630,3	Concreto resistencia 28MPA	m3	1,00	$ 984,000,00	$ 984,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
26	630,3,1P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa	m3	79,00	$ 2,050,000,00	$ 161,950,000,00	91,70	$ 187,985,000,00	=	0,00	$ 0,00	91,70	$ 187,985,000,00
27	630,3,2P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de cuña de apoyo	m3	2,45	$ 1,380,000,00	$ 3,381,000,00	5,25	$ 7,245,000,00	=	0,00	$ 0,00	5,25	$ 7,245,000,00
28	630,3,3P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga diafragma intermedia	m3	10,83	$ 1,730,000,00	$ 18,735,900,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
29	630,3,4P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de losa de aproximación	m3	30,66	$ 1,400,000,00	$ 42,924,000,00	14,13	$ 19,782,000,00	=	0,00	$ 0,00	14,13	$ 19,782,000,00
30	630,3,5P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de barrera de protección	m3	13,69	$ 1,320,000,00	$ 18,070,800,00	2,12	$ 2,798,400,00	=	0,00	$ 0,00	2,12	$ 2,798,400,00
31	630,3,6P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Mensula de apoyo	m3	4,95	$ 1,360,000,00	$ 6,732,000,00	0,27	$ 367,200,00	=	0,00	$ 0,00	0,27	$ 367,200,00
32	630,3,7P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de viga cabezal	m3	41,59	$ 1,550,000,00	$ 64,464,500,00	48,00	$ 74,400,000,00	+	32,00	$ 49,600,000,00	80,00	$ 124,000,000,00
33	630,3,8P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro espaldar	m3	16,40	$ 1,380,000,00	$ 22,632,000,00	14,05	$ 19,389,000,00	=	0,00	$ 0,00	14,05	$ 19,389,000,00
34	630,3,9P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro pantalla	m3	34,65	$ 1,520,000,00	$ 52,668,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
35	630,3,10P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Muro aleta	m3	24,17	$ 1,490,000,00	$ 36,013,300,00	41,09	$ 61,224,100,00	=	0,00	$ 0,00	41,09	$ 61,224,100,00
36	630,3,11P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Tope sismico	m3	2,88	$ 1,350,000,00	$ 3,888,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
37	630,3,12P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pila de cimentación, no incluye acero	m3	47,71	$ 1,430,000,00	$ 68,225,300,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
38	621,1P	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Pilote de concreto vaciado in Situ, de diametro 1,2m, (incluye excavación en roca bajo agua no incluye acero de refuerzo)	m3	78,00	$ 2,950,000,00	$ 230,100,000,00	160,00	$ 472,000,000,00	-	-10,00	-$ 29,500,000,00	150,00	$ 442,500,000,00
39	621,5,1	Concreto resistencia 28MPA para construcción de Camisa permanente de diametro exterior 1,5m , En concreto	m3	78,00	$ 1,175,000,00	$ 91,650,000,00	50,00	$ 58,750,000,00	-	-10,00	-$ 11,750,000,00	40,00	$ 47,000,000,00
40	630,6	Concreto resistencia 14MPA	m3	26,00	$ 642,000,00	$ 16,692,000,00	3,86	$ 2,478,120,00	=	0,00	$ 0,00	3,86	$ 2,478,120,00
41	630,1P	Concreto resistencia 35MPApara construcción de VIGA POSTENSADA	m3	92,00	$ 3,200,000,00	$ 294,400,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
42	640,1	Acero de refuerzo 420mMPA	kg	108,156,00	$ 8,000,00	$ 865,248,000,00	53,024,00	$ 424,192,000,00	+	19,585,33	$ 156,682,640,00	72809,33	$ 580,874,640,00
43	663,1,3P	Tuberia de PVC D=4"	m	6,30	$ 80,000,00	$ 504,000,00	6,30	$ 504,000,00	=	0,00	$ 0,00	6,30	$ 504,000,00
44	663,1,2P	Tuberia de PVC D=1"	m	10,00	$ 45,000,00	$ 450,000,00	10,00	$ 450,000,00	=	0,00	$ 0,00	10,00	$ 450,000,00
45	663,1,1P	Tuberia de PVC Perforada D=4"	m	10,00	$ 81,000,00	$ 810,000,00	46,20	$ 3,742,200,00	=	0,00	$ 0,00	46,20	$ 3,742,200,00
46	673,1,1	Geotextil tipo NT-2500	m2	140,00	$ 12,000,00	$ 1,680,000,00	140,00	$ 1,680,000,00	=	0,00	$ 0,00	140,00	$ 1,680,000,00
47	632P	Baranda peatonal metálica (H=1,15m)	m	70,00	$ 672,000,00	$ 47,040,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
48	5P	Placina de acero laminada ASTM A36(370mmX430mmX1/8")	u	32,00	$ 125,000,00	$ 4,000,000,00	32,00	$ 4,000,000,00	=	0,00	$ 0,00	32,00	$ 4,000,000,00
49	642,1P	Elastometro D60 (450mmX400mm)	u	0,80	$ 595,000,00	$ 476,000,00	6,00	$ 3,570,000,00	=	0,00	$ 0,00	6,00	$ 3,570,000,00
50	642,2P	Elastometro D60 (300mmX250mm)	u	0,05	$ 545,000,00	$ 27,250,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
51	6P	Cable postensado (10 torones)	m	280,20	$ 232,000,00	$ 65,006,400,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
52	7P	Cable postensado (9 torones)	m	280,76	$ 193,000,00	$ 54,186,680,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
53	8P	Anclaje activo postensado (170mmX170mm)	u	32,00	$ 328,000,00	$ 10,496,000,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
54	9P	Tuberia metalica D=2"	m	5,20	$ 108,000,00	$ 561,600,00	0,00	$ 0,00	=	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

PÁGINA	1	DE	1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT** ACTA No: **8**

X

FECHA DE ELABORACIÓN: DD 26 MM 1.00 2023

CONTRATO DE OBRA No :

OBJETO: CONTRATAR LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIA CHAPARRAL - RIO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL - NIT. 901.505.819-5**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR : **CONSORCIO IC & CB - NIT. 901.521.515-5**

PLAZO INICIAL: 6 MESES
FECHA DE INICIACION: 26/10/2021
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 46,209,359,460.00
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 57,272,400,368

PLAZO ACUMULADO: 19 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2023
VALOR ADICIÓN No.1 : $ 11,063,040,907.84
VALOR ADICIÓN No.2 : N/A
VALOR TOTAL DE ADICIONES : $ 11,063,040,907.84

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 CANTIDAD	PRESENTES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 07 VALOR TOTAL	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 +-	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	MODIFICACIONES ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 08 VALOR TOTAL
55	10P	Sellador elastico (junta de dilatación)	m	22.00	$ 625,000.00	$ 13,750,000.00	0.00	$ 0.00	=	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
56	11P	Bolsacreto de volumen 1m3	un	210.00	$ 111,000.00	$ 23,310,000.00	210.00	$ 23,310,000.00	=	0.00	$ 0.00	210.00	$ 23,310,000.00
57	610.5	Rellenos con material filtrante	m3	32.50	$ 255,000.00	$ 8,287,500.00	32.50	$ 8,287,500.00	=	0.00	$ 0.00	32.50	$ 8,287,500.00
58	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	1,692.97	$ 57,000.00	$ 96,499,290.00	1,692.97	$ 96,499,290.00	=	0.00	$ 0.00	1692.97	$ 96,499,290.00
59	600.2.2	Excavaciones varias en roca bajo agua	m3	128.58	$ 144,000.00	$ 18,515,520.00	128.58	$ 18,515,520.00	=	0.00	$ 0.00	128.58	$ 18,515,520.00
Subtotal						$ 2,344,359,840.00		$ 1,491,169,350.00			$ 165,032,640.00		$ 1,656,201,970.00
Capitulo 6. Transportes													
60	900.2	Transporte de material provenientes de la excavación	m3-km	16,519.00	$ 1,380.00	$ 22,796,220.00	16,519.00	$ 22,796,220.00	=	0.00	$ 0.00	16519.00	$ 22,796,220.00
61	900.2P	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, derrumbes, materiales granulares, mezclas asfálticas para distancias mayores de mil metros (1,000 m).	M3-KM	0.00	$ 1,350.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	+	30,597.24	$ 41,306,274.00	30597.24	$ 41,306,274.00
62	900.3P	Transporte de Mezclas de concreto hidráulico	M3-KM	0.00	$ 1,550.00	$ 0.00	7,823.67	$ 12,126,688.50	=	0.00	$ 0.00	7823.67	$ 12,126,688.50
Subtotal						$ 22,796,220.00		$ 34,922,908.50			$ 41,306,274.00		$ 76,229,182.50
Capitulo 7. No Previstos													
63		Enrocado con roca >.8 del mismo rio	m3	0.00	$ 44,813.00	$ 0.00	424.00	$ 19,000,712.00	=	0.00	$ 0.00	424.00	$ 19,000,712.00
64		Junta elastomerica empalme placa - estribo	m	0.00	$ 5,460,156.00	$ 0.00	19.30	$ 105,381,010.80	=	0.00	$ 0.00	19.30	$ 105,381,010.80
65		Acero ASTM A709 Gr. 50W para viga metálica (Incluye, Transporte, fabricación y montaje)	kg	0.00	$ 26,303.00	$ 0.00	74,520.90	$ 2,109,165,032.70	=	0.00	$ 0.00	74520.90	$ 2,109,165,032.70
66		Acero ASTM A500-A572 Gr. C para viga metálica (Incluye, Tuberia, transporte, fabricación y montaje)	kg	0.00	$ 23,524.00	$ 0.00	1,705.00	$ 40,108,420.00	=	0.00	$ 0.00	1705.00	$ 40,108,420.00
Subtotal						$ 0.00		$ 2,273,655,175.50			$ 2.24		$ 2,273,655,175.50
					SUBTOTAL	$ 3,820,161,660.00		$ 5,047,383,814.00			$ 206,338,913.37		$ 5,253,692,728.26
					SUBTOTAL VIA + PUENTE	$ 44,433,859,460.00		$ 63,789,900,367.84			$ 0.00		$ 63,789,900,367.84
					PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)	$ 1,240,000,000.00		$ 1,400,000,000.00	+		$ 0.00		$ 1,400,000,000.00
					REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 450,000,000.00		$ 1,750,000,000.00	+		$ 0.00		$ 1,750,000,000.00
					IVA REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 85,500,000.00		$ 332,500,000.00	+		$ 0.00		$ 332,500,000.00
					SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 1,775,500,000.00		$ 3,482,500,000.00			$ 0.00		$ 3,482,500,000.00
					VALOR TOTAL	$ 46,209,359,460.00		$ 67,272,400,367.84			$ 0.00		$ 67,272,400,367.84

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio)

DEBIDO A MAYORES Y MENORES CANTIDADES

NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron

FIRMA
ING. JUAN CAMILO BLAVA RODRIGUEZ
Representante Legal (S) Consorcio Vial Chaparral

Firma
Interventor: ING. JUAN MANUEL ESCALLON ARANGO.
Representante Legal (S) CONSORCIO IC & CB

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoria de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: Ing. SANDRA LILIANA GARCIA COVAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
ORDENADORA DEL GASTO

FIRMA
Nombre: Ing. XIMENA ALEJANDRA GARCIA CASTILLO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

FIRMA
ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
SUPERVISOR

Original: Archivo de Gestión (Direccion de Contratación)
Copias:

COPIA RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14788586964

(415)7707212489984(8020) 000001478858696 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 5 6 1 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 110 9 25 ED TORRE EMPRESARIAL PACIFIC OF 911

42. Correo electrónico contabilidad.jcsr@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 8 5 4 6	7 4 6 2 3 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 7 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 09 - 23 / 11 : 31: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FIGUEROA MOLINA BENJAMIN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14788586964

(415)7707212489984(8020) 000001478858696 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 5 6 1 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 5 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 5 2 5	
81. Hasta	2 0 2 3 0 1 2 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 1 0 7 2 8		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14788586964

(415)7707212489984(8020) **000001478858696 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 5 6 1 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 5 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	4 4 4 7 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FIGUEROA	MOLINA	BENJAMIN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 5 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 2 4 5 5 3 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROA	MOLINA	CRISTIAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 5 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 5 1 4 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANTOS	MARTINEZ	EDUARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 9 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 4 6 5 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SILVA	RODRIGUEZ	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14788586964

(415)7707212489984(8020) 000001478858696 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 5 6 1 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 2 0 0 0 1 3 8	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: INGECON S.A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
11,522,339,865	2 5	2 0 2 1 0 5 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 0 9 5 3 0	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA FG S A

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
11,522,339,865	2 5	2 0 2 1 0 5 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 2 2 3 3 5	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social: AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
11,522,339,865	2 5	2 0 2 1 0 5 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 4 6 5 6 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SILVA	RODRIGUEZ	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
11,522,339,865	2 5	2 0 2 1 0 5 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14725054811

(415)7707212489984(8020) 000001472505481 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 2 3 3 5	3	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	A&C COLOMBIA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 16 93 A 16

42. Correo electrónico bfigueroa@gmcic.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 4 8 5 4 6	3 2 1 2 8 7 8 9 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 8 0 8 2 2	4 1 1 2	2 0 1 8 0 8 2 2	4 2 1 0	7 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 25 / 12 : 56: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14725054811

(415)7707212489984(8020) 000001472505481 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 2 3 3 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 1 0 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 3 0 2 3 4 0 6	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 8 0 8 2 2	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14725054811

(415)7707212489984(8020) 000001472505481 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 2 2 3 3 5	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	4 4 4 7 1 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FIGUEROA	MOLINA	BENJAMIN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 0 0 5 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
NAVARRO	LEAL	NARCISO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjer 2 2	6 3 5 4 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTIN	HERRANZ	IGNACIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14762870831

(415)7707212489984(8020) 000001476287083 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 0 1 3 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGECON S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 110 9 25 OF 911

42. Correo electrónico gerencia@ingeconsa.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 6 2 3 3 9	3 1 1 4 7 7 5 4 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	1 9 9 5 0 6 0 6	4 2 9 0	1 9 9 5 0 6 0 6	4 9 2 3	6 8 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 03 / 12 : 39: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FIERRO MORALES JAIME RAFAEL
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14762870831

(415)7707212489984(8020) 000001476287083 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 0 1 3 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	3 6 7 1	1 4 7 8
73. Fecha	1 9 9 5 0 6 0 6	2 0 0 9 0 4 0 7
74. Número de notaría	1	2 9
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 1 0 8	2 0 0 9 0 4 1 5
77. No. Matrícula mercantil	9 0 9 6 8 8	9 0 9 6 8 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 5 0 6 0 6	2 0 0 9 0 4 0 7
81. Hasta	2 0 1 5 0 6 0 6	2 0 4 4 0 4 0 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14762870831

(415)7707212489984(8020) 000001476287083 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 0 1 3 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 8 1 2 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 1 4 0 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FIERRO	MORALES	JAIME	RAFAEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 3 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 1 5 6 8 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FIERRO	MORA	JORGE	ARMANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14762870831

(415)7707212489984(8020) **000001476287083 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 0 1 3 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 3 1 4 0 5 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FIERRO	MORALES	JAIME	RAFAEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		0 2 0 0 9 0 4 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 9 1 1 4 6 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RAMIREZ	HERNANDEZ	ANA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	0	2 0 0 9 0 4 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 4 4 4 9 2 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	CASTAÑO	MARIA	ALICE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 4 1 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	2 4 4 6 4 2 3 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	CASTAÑO	DIANA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 4 1 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14762870831

(415)7707212489984(8020) 000001476287083 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 0 1 3 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 7 6 5 1 8 4		5 3 7 7 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LEMUS	CHAUTA	MARISOL	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 9 1 2 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 5 3 5 8		1 0 9 3 8 8

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
FORERO	RUGE	HENRY	ADOLFO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 5 3 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730668419

(415)7707212489984(8020) 000001473066841 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 0 9 5 3 0	3	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA FG S A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 57 84 211

42. Correo electrónico constructorafgbq@une.net.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 7 3 0 9 6 6	3 7 8 6 1 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 3 0 9 2 8	4 2 2 0	1 9 9 3 0 9 2 8	4 2 9 0 / 4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 10 14 16 42 48 52

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código: 23 22	55. Forma: 2 / 56. Tipo: 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 4 61. Fecha 2021 - 01 - 14 / 11 : 15: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TAFFUR FLOREZ JACQUELINE MAEL
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 15-01-2021 11:29:58AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14720358301

(415)7707212489984(8020) 000001472035830 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 9 4 6 5 6 9	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 4 6 5 6 9	1 9 9 6 0 3 1 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SILVA	RODRIGUEZ	JUAN	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 100 8 A 55 TO C OF 401

42. Correo electrónico: juancamilo.silva@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 6 6 0 9 0 6	4 6 6 1 4 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 3 0 9 2 5	4 9 2 3	2 0 0 3 0 9 2 5	4 2 9 0	4 2 2 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9 9		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 01 / 05 : 58: 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Bancolombia

Bogotá D. C., 23/05/2022

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL** Identificada con el **Nit. 901505619** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 69000002008** desde el **8/03/21 (M/D/A)** la cual se denomina **CONSORCIO VIAL CHAPARRAL,** en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **ADRIANA CORREA GARCES**.

Atentamente,

Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

FACTURA

CONSORCIO VIAL CHAPARRAL

NIT 901505619 - 5
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764043802704 del 02/02/2023 al 02/02/2024
Habilita numeración de:
FEV-10 al FEV-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 110 9 25 ED TORRE EMPRESARIAL
PACIFIC OF 911
BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

Factura Electronica de Venta No. 123
Fecha de emisión: 23/02/2023 09:48:57 PM
Fecha de validación DIAN:
Fecha de vencimiento: 25/03/2023
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT 800113672 - 7
Dirección: Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 5
Codigo Cliente 001
Teléfono: 2611111
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Ibagué
Departamento: Tolima
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	001	Acta parcial de obra No 8 Contrato de Obra No. 1784 de 2021 Contratar La Obra De Mejoramiento De La Vía Chaparral -Rio Blanco, Departamento Del Tolima- periodo de: 1 diciembre-22 al 31 de enero de 2023	1,00	Suma global	COP 4,384,228,155.20	COP 0.00			COP 4,384,228,155.20

Total de items: 1
Observaciones
INTEGRANTES DEL CONSORCIO
JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ NIT 79.946.569-6 25%
INGECON S.A NIT 822.000.138-1 25%
CONSTRUCTORA FG S.A. NIT 800.209.530-3 25%
AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901.222.335-3 25%

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 69000002008

Subtotal:	COP 4,384,228,155.20
Impuestos:	COP 0.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,384,228,155.20
Neto a pagar	COP 4,384,228,155.20

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR FISCAL
