Gmail **Interventoría postes <interventoria2454.postes@gmail.com>**

Fwd: HURTO DE CABLE EXT-1477 AK 20 X AC 80


Yeimmy Viviana Urrego Niño <interventoria2454.postes@gmail.com> 5 de abril de 2023, 10:19
Para: Adriana Lucia Rodriguez Fonseca <adrodriguez@movilidadbogota.gov.co>
Cc: Nancy Mateus Raquira <nmateus@movilidadbogota.gov.co>, Wilmer Alexander Rozo Garzón <wilmer.rozo@ardanuy.com>

Cordial saludo Ingeniera,

De acuerdo con la revisión en sitio de la caja de la intersección del asunto, se precisa lo siguiente:

1. La caja requiere su reconstrucción, lo que refiere a subir por lo menos dos hiladas de ladrillo de cada uno de los muros. La actividad mencionada se encuentra por fuera del alcance del Contrato 2023.1356, puesto que el Contratista no cuenta con licencia de excavación ni con el material necesario para la reconstrucción. Cabe resaltar que, en el punto es necesario, luego de la reconstrucción de la caja, la instalación de un marco antivandálico.

2. El espacio con el que se cuenta es de 0,50m de ancho como se evidencia en el registro fotográfico, lo que indica que no es viable la instalación de una base en concreto, ya que el área del elemento es de 1 metro cuadrado. Además la zona no presenta un espacio plano que me brinde estabilidad a cualquier tipo de elemento que se pretenda instalar, creando una situación peligrosa ya que estaría en riesgo de caída a la vía que se encuentra por debajo del puente.

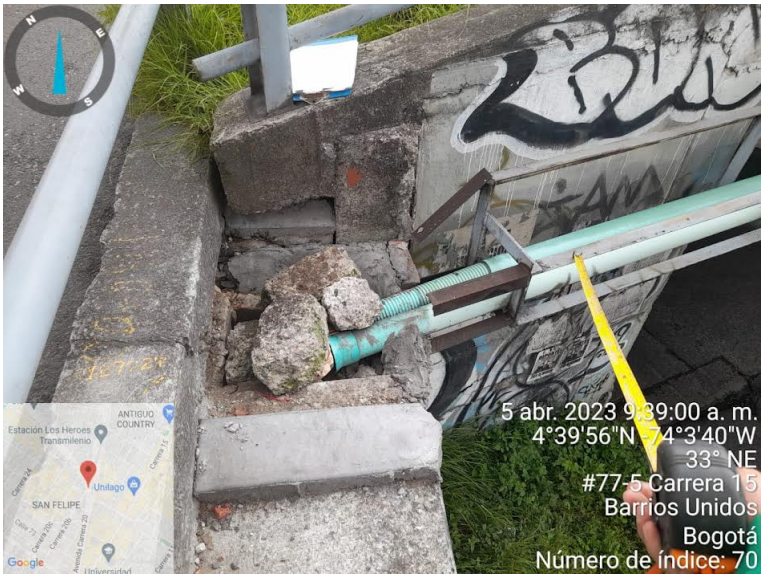

[El texto citado está oculto]
--

Viviana Urrego Niño

Ingeniera residente de mantenimiento de postes

Consorcio Semaforización ACO

Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202

Bogotá, Colombia

Tel: +57 (601) 3222735
