	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

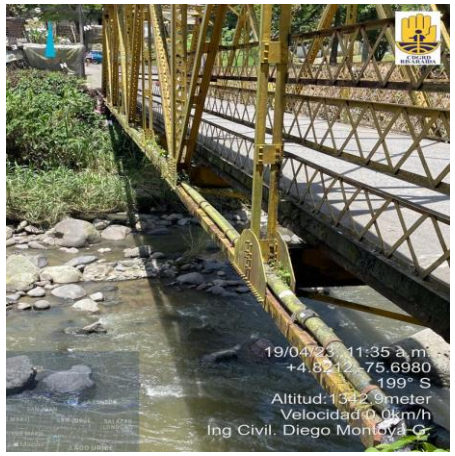
1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**1**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de marzo de 2023 – 29 de abril de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Ximena Carmona Giraldo**

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 30 de marzo de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de La Celia:** -**Visita técnica No. 1**, Predio La Playa, vereda San Eugenio. Municipio de la Celia. Deslizamiento traslacional por concentración de flujos subsuperficiales de agua.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango
	El día 07 de abril de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Santa Rosa: -**Visita técnica No. 1**, caracterización de población y elementos expuestos ante una posible erupción del volcán nevado del Ruiz Acompañamiento a alcaldía municipal de Santa Rosa para la evaluación del sector la Linda,	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales

	acompañados de, CARDER, Defensa Civil, Policía, Cruz Roja, Ponalsar. **El día 14 de abril de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de La Celia:** **- Visita técnica No. 1.** finca villa del Carmen vereda primavera, el 28 de marzo se presenta un creciente de la quebrada nn tributaria del Rio Cañaveral. La cual trajo consigo material de arrastre y socavo piscinas de criadero de peces. Una transversal colmatada con material, ocasiona el paso del caudal sobre la vía terciaria. **- Visita técnica No. 2.** Visita técnica finca la camelia vereda el cóndor, el 16 de marzo del 2023 se presenta un movimiento en masa de tipo rotacional, afecto la estructura del baño de la vivienda, se llevan a cabo cultivos de café y plátano. No hay manejo de aguas lluvias del techo ni de	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Daniel Vargas, Mateo Álzate Profesionales: Diego Montoya, Daniel Vargas, Mateo Álzate

	escorrentía. **El día 19 de abril de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Dosquebradas.** **- Visita técnica No. 1.** Visita técnica Bario la Esneda, Municipio de Dosquebradas, verificación de estado de puente peatonal estructura metálica, puente peatonal colgante y puente vehicular en estructura metálica, también problemática por socavación lateral costado norte del Río **El día 21 de abril de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Balboa.** **Visita No 1.** Visita técnica I.E Santo Domingo Savia, solicitud realizada para evaluación de Riesgo, presenta deterioro por falta de mantenimiento e inadecuado manejo de aguas lluvia.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades. Carpeta Alcance 1.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades. Carpeta Alcance 1.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel. Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Mateo Álzate

	Visita No 2. Visita técnica institución educativa Tambores, presentaban una problemática asociada a falta de mantenimiento del pozo séptico, pero ya al momento de la visita ya lo habían reanimado, sin embargo, se sigue presentando mal manejo de aguas lluvias.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades. Carpeta Alcance 1.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Mateo Álzate
	Visita No 3. Sede María Inmaculada, ubicada en el casco urbano del municipio de balboa, presenta problemas de humedad por falta de mantenimiento en las cubiertas y Terrazas, también presenta un posible asentamiento.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades. Carpeta Alcance 1.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, Mateo Álzate

2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	Solicitud información de acciones tomadas para mitigar los procesos de inestabilidad de la ladera ubicada en la vía departamental código 156 denominada Minas del Socorro - El Chaquiro, municipio de Dosquebradas	 Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.	
3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que le sea requerido por el supervisor.	Presupuesto para obras de manejo de aguas lluvia, I.E Tabores del Municipio de Balboa.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4 .	

	Presupuesto Construcción box culvert 3 m x4 m x 6 m y obras de contención finca Villa del Carmen Vereda La primavera municipio la Celia Risaralda	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4 .	
	Presupuesto para obras de estabilización de talud mediante trinchos en guadua y obras para el manejo de aguas lluvia del obras para el adecuado manejo de aguas lluvia finca la camelia vereda el cóndor municipio de la Celia	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4 .	

	Presupuesto para manejo de aguas lluvia y de escorrentía, vereda San Eugenio municipio de la Celia	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4 .	
4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Se estuvo atento por disponibilidad los días 1- 9 de abril de 2023. Se estuvo atento por disponibilidad los días 24- 30 de abril de 2023 Apoyo de entregas de AHE en el Municipio de Mistrató el día 31 de marzo de 2023		No se tienen observaciones.

5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Reunión Equipo técnico el día 11 de abril de 2023. Reunión Equipo técnico el día 19 de abril de 2023.	 	

	Reunión con funcionarios y contratistas de La Coordinación Departamental de Riesgos	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 7.	
	Capacitación Riesgo Biomecánico, realizada el día 27 de abril de 2023	 . Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 7.	

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS
