El futuro es de todos | Presidencia de la República

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE
CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	217-18	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	711	**4. Fecha de Inicio:**	21/12/2018	**5. Fecha de Finalización:**	30/11/2020
6. Nombre Contratista:	GPS ELECTRONICS LTDA			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	900092491 - 1
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	En virtud del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los equipos UPS ubicados en las diferentes sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	4	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	2,220,569.00
12. Período de prestación del servicio	26/05/2019 - 26/05/2019	**13. Factura de Venta y fecha de Expedición:**	5172 - 11/06/2019
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por GERSON JAIR SAENZ ROJAS , como Representante Legal (X) y/o Revisor Fiscal () de fecha 11/06/2019		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_(x)	Inversion_()

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	**Recurso**	**Actual**	**Reserva Pptal**	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 007 01 3	0	SI	NO	2,220,569.00

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	66,882,373.00		
Valor Adiciones	00.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	66,882,373.00		
Valor Ejecutado ($):	12,642,416.00	**% de Ejecución**	22,22%
Pago en Trámite ($):	2,220,569.00	**% por Ejecutar**	77,78%
Saldo por Ejecutar ($):	52,019,388.00	**% Total**	100%

IV. AVANCE DEL CONTRATO

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

CONTRERAS

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: en el segundo trimestre se realizó visita de mantenimiento preventivo de 19 UPS el día 26 de mayo, que están incluidas en el contrato de prestación de servicios 217/18: Edificio Administrativo sotano UPS Liebert 40 KVa Edificio Administrativo (SOTANO DAPRE) UPS PEI 30 Kva Edificio administrativo subestación sótano UPS Liebert 50 Kva Edificio Administrativo primer piso UPS Liebert 50 Kva Casa Republicana Tripp-Lite SU20K3/3 20 KVA Subestación Casa de Nariño UPS Liebert 80 KVA Subestación Casa de Nariño UPS Liebert 80 KVA UPS planta baja UPS PEI U330 30 Kva Casa de Nariño (SEN) "Eaton Powerware 9355" 30 KVA Casa Galán UPS Liebert 40 Kva Vicepresidencia MGE UPS system Galaxy 3000 20 KVa Equidad para la Mujer Salicru 30 KVA Centro de computo casa de huéspedes Cartagena UPS SPECTRONIC 15 KVA Habitación 10 casa de huéspedes de Cartagena UPS SPECTRONIC 1,5 KVA Sala de Prensa casa de huéspedes de Cartagena UPS TITAN 1,5 KVA Fuerte de manzanillo casa de huéspedes de Cartagena UPS SPECTRONIC 1,5 KVA Edecán casa de huéspedes de Cartagena UPS PEI 1,5 KVA Guardia casa de huéspedes de Cartagena TITAN 1,5 KVA Habitación 4 casa de huéspedes de Cartagena UPS SPECTRONIC 1,5 KVA	21,97%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSION

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		**Meta Producto**		**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)**		
Total						

25. Observaciones:	Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de julio de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:09)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

08 JUL 2019

FECHA RECIBIDO

HORA: 9:10 am

RECIBIDO POR: Sandra

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

GPS ELECTRONICS Ltda.

INGENIO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Diseño, Instalación y mantenimiento

NIT.900.092.491 - 1

IVA RÉGIMEN COMÚN - RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762001232552
FECHA 2016/11/21 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 4261 AL 5000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4659 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

SEÑORES:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	FACTURA DE VENTA No.	5172
NIT.:	DE LA REPUBLICA	FECHA:	
DIRECCIÓN	899.999.083-0	TELÉFONO:	11 DE JUNIO DE 2019
E.MAIL:	CALLE 7 N. 6 - 54	No. ORDEN DE SERVICIO:	5629300

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	FACTURA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 217-2018		
1	mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los equipos UPS ubicados en las diferentes sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, actividades realizadas en el mes de mayo de 2019	$ 1.866.024	$ 1.866.024
	Resolución de Facturación No. 18762012355039 Autoriza de la 5101 a la 7000 del 17 de Enero de 2019.		

SON:	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE	SUB - TOTAL:	$ 1.866.024
		IVA	$ 354.545
OBSERVACIONES		TOTAL	$ 2.220.569

ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR QUE ASIMILA PARA SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231 DEL JULIO DE 2008

NIT GPS ELECTRONICS LTDA.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Calle 37 No. 17A - 03 Bogotá, D.C.
Teléfonos: 323 1022 - 311 502 81 73 • gps.electronicsltda@hotmail.com • gpselectronicsltda1@gmail.com
Davivienda Cta corriente 008969994766 - Bancolombia Cta ahorros 205 55956453

Impreso por MEDIOS LORD'S S.A.S. - NIT.900 503 103 - 4 • Cel. 310 559 4079

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762012355039

(415)7707212489984(8020) 001876201235503 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900092491	1				

11. Razón social

GPS ELECTRONICS LTDA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CL 37 17 A 03 BRR TEUSAQUILLO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitacion de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado 2019-01-17 / 09:45:57 PM Fecha Acuse de Recibo Digitalmente

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres SAENZ ROJAS GERSON JAIR

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 80065772 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización GPS ELECTRONICS LTDA

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-01-17 21:45:57

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN®

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762012355039

(415)7707212489984(8020) 001876201235503 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900092491	1				

11. Razón social

GPS ELECTRONICS LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GPS ELECTRONICS LTDA CL 37 NO. 17 A 03	PAPEL	1		5101	7000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14505242934

(415)7707212489984(8020) 000001450524293 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 2 4 9 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
GPS ELECTRONICS LTDA

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 37 17 A 03 BRR TEUSAQUILLO

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gps.electronicsltda@hotmail.com		3 2 3 1 0 2 2	3 1 1 5 0 2 8 1 7 3

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	2 0 1 3 0 4 0 2	7 1 1 0	2 0 1 3 0 4 0 2	4 7 3 2	3 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	0	1	1	1	4	1	6	4	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 3 3 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Paragrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SAENZ ROJAS GERSON JAIR
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GPS ELECTRONICS Ltda.

Bogotá DC, 11 de junio de 2019

Señores:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Asunto: Certificación Pago De Aportes Parafiscales Y Obligaciones Laborales

Yo Gerson Jair Sáenz Rojas, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.065.772 de Bogotá, en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad de juramento que GPS ELECTRONICS LTDA con Nit. 900.092.491-1 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de Salud, ARL, Pensiones, y Obligaciones Parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los (6) seis meses anteriores a la fecha del cierre de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Así mismo manifiesto bajo la gravedad de juramento que GPS ELECTRONICS LTDA con Nit. 900.092.491-1 se encuentra exenta de realizar los aportes al SENA

Atentamente:

GPS ELECTRONICS Ltda
NIT. 900.092.491-1

GERSON JAIR SAENZ ROJAS
Representante Legal
Gps Electronics ltda
NIT 900092491-1

Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900092491	1	GPS ELECTRONICS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CL 37 #17 A-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3230977	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	445800717	8492337278	E	2019/05/22	2019/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,857,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CAFAM (7 Afiliados)																					$9,225,716	$1,476,200			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$642,400		$0	$0		$2,857,200
Centro de Trabajo: RIESGOS (7 Afiliados)																					$9,225,716	$1,476,200			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$642,400		$0	$0		$2,857,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																					$9,225,716	$1,476,200			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$642,400		$0	$0		$2,857,200
1	CC	1004065500 ALONSO DIANA																		230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	SI	$371,600
2	CC	1032467308 CHICINO DIEGO		X																230201	30	$1,081,200	$173,000	EPS017	30	$1,081,200	$43,300	CCF21	30	$1,081,200	$43,300	14-23	30	$1,081,200	$75,300	30	$0	$0	SI	$334,900
3	CC	1012456511 LOAIZA GERARDO																		230301	30	$1,081,200	$173,000	EPS008	30	$1,081,200	$43,300	CCF21	30	$1,081,200	$43,300	14-23	30	$1,081,200	$75,300	30	$0	$0	SI	$334,900
4	CC	1020739277 QUINTERO DIANA																		230301	30	$954,000	$152,700	EPS008	30	$954,000	$38,200	CCF21	30	$954,000	$38,200	14-23	30	$954,000	$66,400	30	$0	$0	SI	$295,500
5	CC	88219115 RIVEROS PEDRO																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF21	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0	SI	$256,600
6	CC	79745353 SAENZ EDINSON																		230301	30	$1,081,200	$173,000	EPS008	30	$1,081,200	$43,300	CCF21	30	$1,081,200	$43,300	14-23	30	$1,081,200	$75,300	30	$0	$0	SI	$334,900
7	CC	80065772 SAENZ GERSON																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
Total	**Afiliados(7)**																					$9,225,716	$1,476,200			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$369,300			$9,225,716	$642,400		$0	$0		$2,857,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900092491	1	GPS ELECTRONICS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CL 37 #17 A-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3230977	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	445800717	8492337278	E	2019/05/22	2019/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,857,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,476,200	$0	$0	$1,476,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$978,700	$0	$0	$978,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$365,000	$0	$0	$365,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$642,400	$0	$0	$642,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$642,400	$0	$0	$642,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$369,300	$0	$0	$369,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	$369,300	$0	$0	$369,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$369,300	$0	$0	$369,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$124,800	$0	$0	$124,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$153,200	$0	$0	$153,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$91,300	$0	$0	$91,300
TOTAL				7	$2,857,200	$0	$0	$2,857,200

2019/05/13 02:13 PM

GPS ELECTRONICS Ltda.

Bogotá 10 de Junio 2019.

INFORME MANTENIMIENTO DE UPS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.

Mediante el siguiente informe presentamos el mantenimiento realizado el día **26 de Mayo de 2019** a las UPS de los diferentes edificios del DAPRE según el contrato No 217-18 *"En virtud del contrato, El CONTRATISTA se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los equipos de UPS ubicados en las diferentes sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad".*

Para la realización del mantenimiento la empresa GPS ELECTRONICS LTDA realizó el siguiente procedimiento:

Se realizó reconocimiento visual del estado de cada uno de los equipos que se encuentran dentro del contrato y de sus componentes:

1. MEDICIONES realizadas a las UPS:
- Mediciones de Voltajes de entrada, Fase-Fase, Fase-Neutro y Neutro-Tierra.
- Mediciones de corriente de entrada, Fases, Neutro y Tierra, teniendo en cuenta el balanceo de fases.
- Mediciones de Voltajes de salida, Fase-Fase, Fase-Neutro y Neutro-Tierra.
- Mediciones de corriente de salida, Fases, Neutro y Tierra.
- Medición de voltaje a todas y cada una de las Baterías.
- Medición y verificación Frecuencia de entrada y salida.

2. REVISION DEL BANCO DE BATERIAS.
- Ajuste a las conexiones entre baterías torque, bornes de baterías.
- Voltaje y corriente de carga
- Prueba de encendido.

3. LIMPIEZA
Se realiza con el fin de retirar toda la polución y polvo que cae sobre el equipo ya que estos equipos al transcurrir el tiempo acumulan mucho polvo y más en el ambiente en que se encuentren.
- Limpieza interna y externa del equipo.
- Aspirado de todas las áreas.
- Limpieza y aplicación de antiestáticos en las tarjetas.
- limpieza de filtros de polvo.

4. BYPASS.
En cuanto a las Pruebas y revisión de bypass se realizan con y sin carga y tomando sus respectivas mediciones de voltaje, realizar parte del mantenimiento en Bypass para una mayor seguridad de los componentes, las mediciones arrojaron valores pequeños de corriente debido a que no se tenía cargas altas a los equipos.

Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com ingpedroriveros@gmail.com

REVISIÓN DE SUS PARTES Y COMPONENTES

- Ajuste mecánico de componentes y partes del equipo.
- Ajuste de bornes de conexión eléctrica.
- Inspección del Display LCD.
- Revisión de los Indicadores Luminosos.
- Ventiladores.

5. Implementación de elementos de protección personal.

El personal Técnico Utilizara los elementos de protección como lo son:


a. Gafas.
b. Guantes.
c. Botas dieléctricas.
d. Equipos de medición.


De acuerdo a la verificación realizada se encontró lo siguiente:

ITEM	Marca UPS	Capacidad	Ubicación- Edificio	Serial	Placa de inventario	Cantidad baterías
1	UPS Liebert	40 KVa	Subestación sótano EDIFICIO DAPRE-FPC	2101200155207C4E	10405399	40
2	UPS PEI	30 Kva	Subestación sótano EDIFICIO DAPRE-FPC	U30120261832045S	67003	32
3	UPS Liebert	50 Kva	Subestación sótano EDIFICIO DAPRE-FPC	210120053621230200 03	84070	32
4	UPS Liebert	50 Kva	Centro de Cableado Piso 1 Sede Administrativa	210120053521126020 001	10406022	32
5	Tripp-Lite SU20K3/3	20 KVA	Centro de cableado Piso 1 Centro de Cableado Casa Republicana	9933CLCPS64700001 7	NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	40
6	UPS Liebert	80 KVA	Subestación sótano de Casa de Nariño	37-3441	73353	40
7	UPS Liebert	80 KVA	Sótano pasillo Subestación Casa de Nariño.	M10L300015	10405478	40
8	Eaton Powerware 9355	30 KVa	Centro de cableado piso 1 SEN Casa de Nariño	EY445KXX10	73423	2/18
9	UPS PEI U330	30 Kva	Centro de cableado Prensa semi-sótano Casa de Nariño	U30121163632949PS	83359	34
10	UPS Liebert	40 Kva	Parqueadero No 1 Edificio Galán	37-6198	NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	40
11	MGE UPS systems Galaxy 3000	20 KVa	Centro de cableado- Planta Eléctrica Vicepresidencia	A010176	75643	20
12	Salicru NEX POWER NX/3	30 KVA	Centro de cableado casa Equidad para la Mujer	144164	73248	28
13	UPS SPECTRONIC	15 KVA	Centro de Computo casa de huéspedes Cartagena	91210209	78178	16
14	UPS SPECTRONIC	1,5 KVA	Habitación 4 casa de huéspedes de Cartagena	NO APLICA	78181	3
15	UPS SPECTRONIC	1,5 KVA	Habitación 10 casa de huéspedes de Cartagena	NO APLICA	78180	3
16	UPS POWEST TITAN	2 KVA	Sala de Prensa casa de huéspedes de Cartagena	161101- 20510039	78179	6
17	UPS SPECTRONIC	1,5 KVA	Fuerte de manzanillo Casa de huéspedes de Cartagena	NO APLICA	NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	3

18	UPS PEI	1,0 KVA	Edecán casa de huéspedes de Cartagena UPS	U1151261837113T	NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	3
19	UPS PEI	1,0 KVA	Guardia casa de Huéspedes de Cartagena.	U1151261837114T	NO TIENE PLACA DE INVENTARIO	3

1. UPS LIEBERT 40 KVA (SUBESTACION SOTANO EDIFICIODAPRE-FPC).

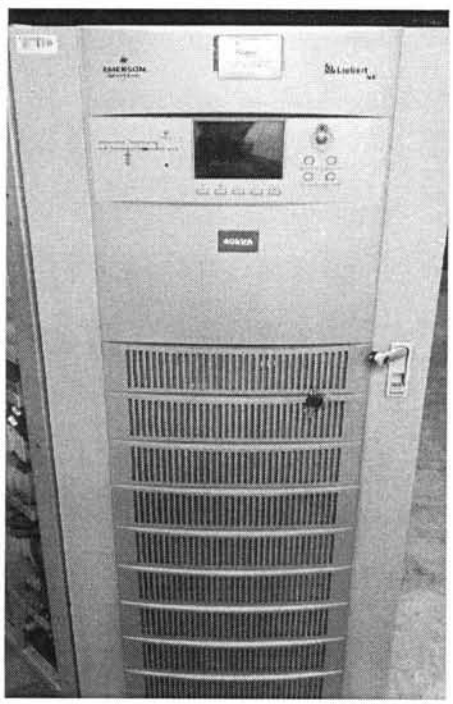


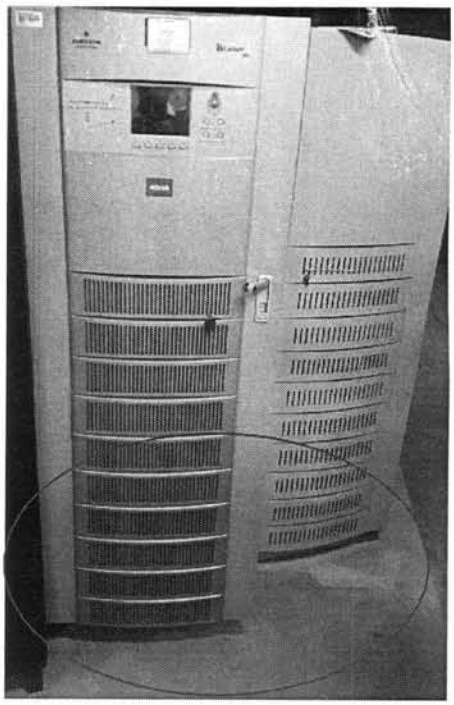






Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com

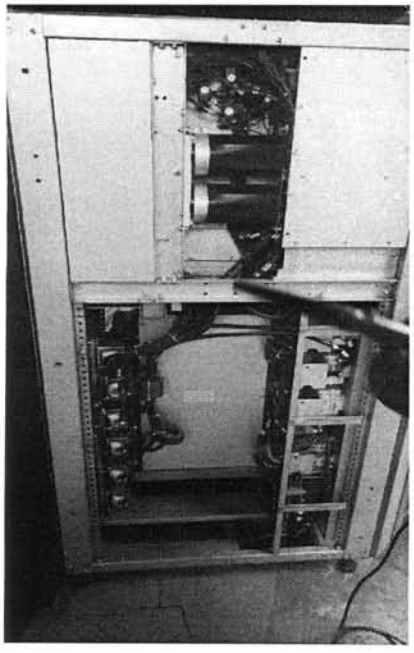



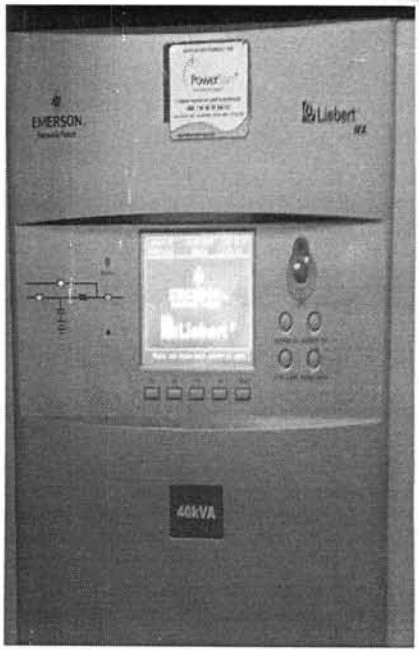

Marca UPS	Capacidad	Ubicación	Serial	Placa de inventario	Cantidad Bancode Baterías
UPS Liebert	40 KVA	Subestación Sótano Edificio DAPRE-FPC	2101200155207C4E	10405399	40 unidades de 12V/ 26 AH

Se hace el procedimiento de encendido del UPS Liebert y se verifica que sus parámetros de funcionamiento estén normales.

Se encontró que las baterías fueron instaladas en el año 2013, para lo cual es una fecha superior a la recomendada por los fabricantes ya que el tiempo que se recomienda para el cambio de las baterías sugerido es de 3 a 5 años teniendo en cuenta que la altas temperaturas deterioran de forma rápida la vida útil de ellas y por estar ubicadas en un sótano muy húmedo y con alta polución el desgaste será mayor.

Por tal motivo se recomienda el cambio del equipo por uno de iguales características teniendo en cuenta la instalación de este equipó sobre un piso falso que permita que este equipo funcione de forma adecuada.

2. UPS PEI 30 KVA EDIFICIO ADMINISTRATIVO (SUBESTACION SOTANO EDIFICIO DAPRE-FPC).

Para iniciar el apagado de las UPS, comenzamos con la visualización de los eventos que haya presentado la UPS o si se encuentra alarmada para lo cual se evidencia el panel que NO presenta alarma por baterías (Regulando y en caso de caídas de voltaje de la red eléctrica


externa entre en funcionamiento su banco de Baterías), se inspeccionan los demás parámetros voltajes, corrientes, frecuencia y están en los rangos normales de operación.


Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, se desmonta tarjetas de control, revisión del banco de baterías, se ajustaron los bornes de las baterías, se realizó toma de lectura de carga en las baterías y lectura de voltaje, corriente en todo el equipo.

Se evidencia que las baterías fueron instaladas antes del año 2015, para lo cual es una fecha que se encuentra en el limite al tiempo estipulado recomendada por los fabricantes ya que el tiempo que se recomienda para el cambio de las baterías sugerido es de 3 a 5 años teniendo en cuenta que la altas temperaturas deterioran de forma rápida la vida útil de ellas y por estar ubicadas en un sótano muy húmedo y con alta polución el desgaste será mayor.





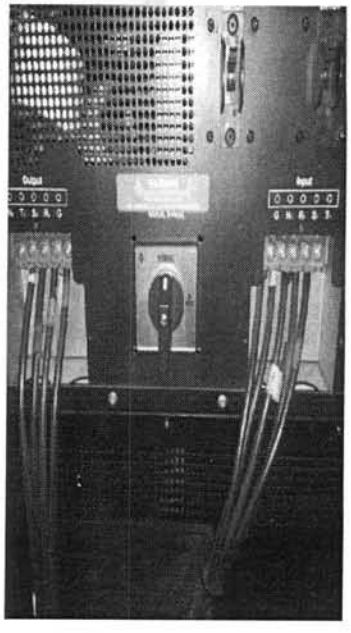

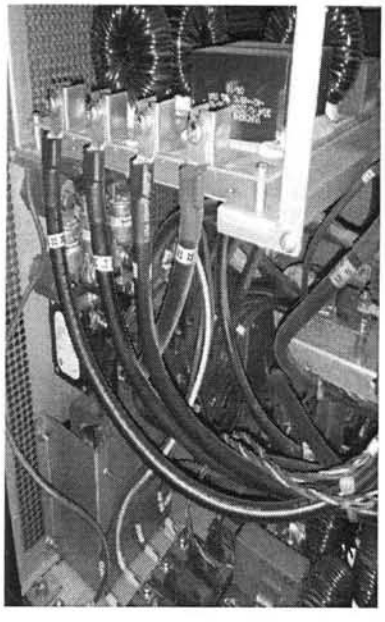





Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com


GPS ELECTRONICS Ltda.


3. UPS LIEBERT DE 50 KVA (SUBESTACION SOTANO EDIFICIODAPRE-FPC).


Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, se desmonta tarjetas de control, revisión del banco de baterías, se ajustaron los bornes de las baterías en el cual se encontró que tenía 2 bornes de las baterías sueltas las cuales se dejó ponchadas, se realizó toma de lectura de carga en la baterías y lectura de voltaje, corriente en todo el equipo.

Para iniciar el apagado de las UPS, comenzamos con la visualización de los eventos que haya presentado la UPS o si se encuentra alarmada para lo cual se evidencia el panel que está en estado normal (Regulando y en caso de caídas de voltaje de la red eléctrica externa entre en funcionamiento su banco de baterías), se inspeccionan los demás parámetros voltajes, corrientes, frecuencia y están en los rangos normales de operación.




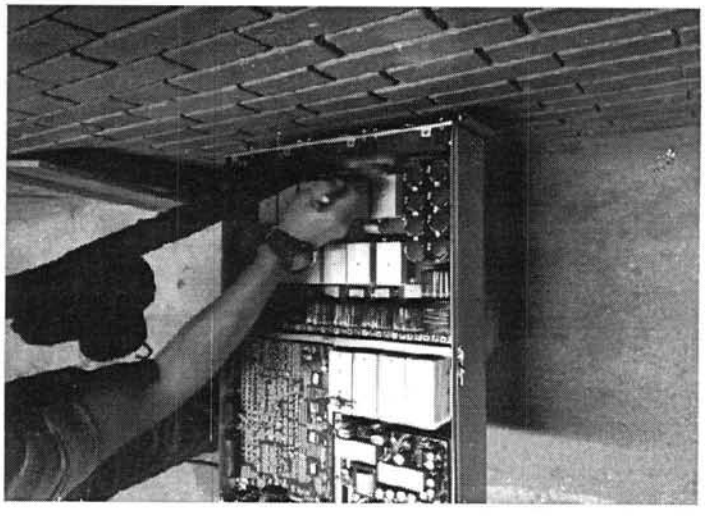

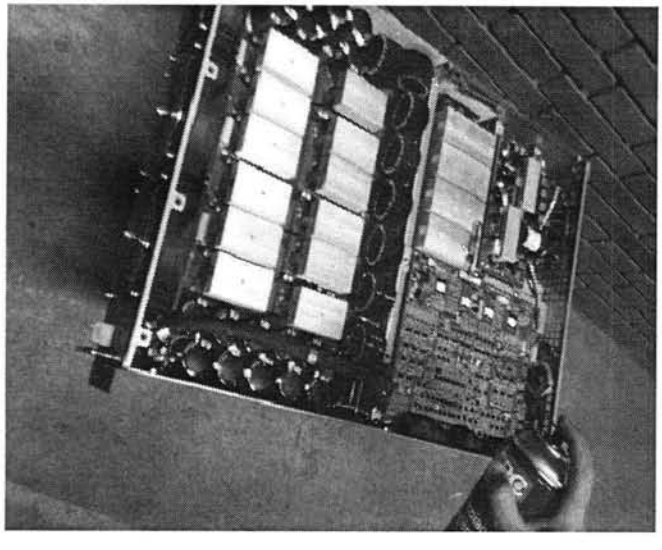

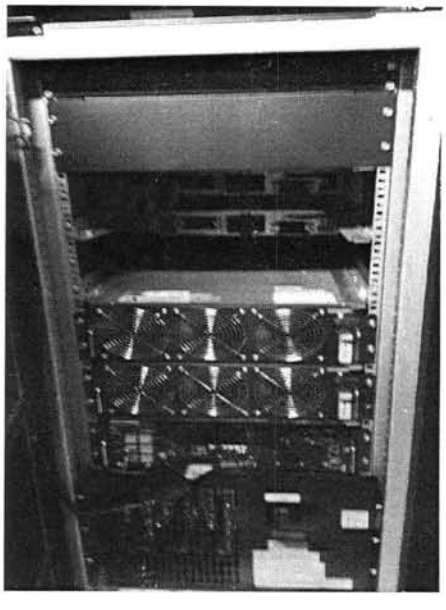

Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com

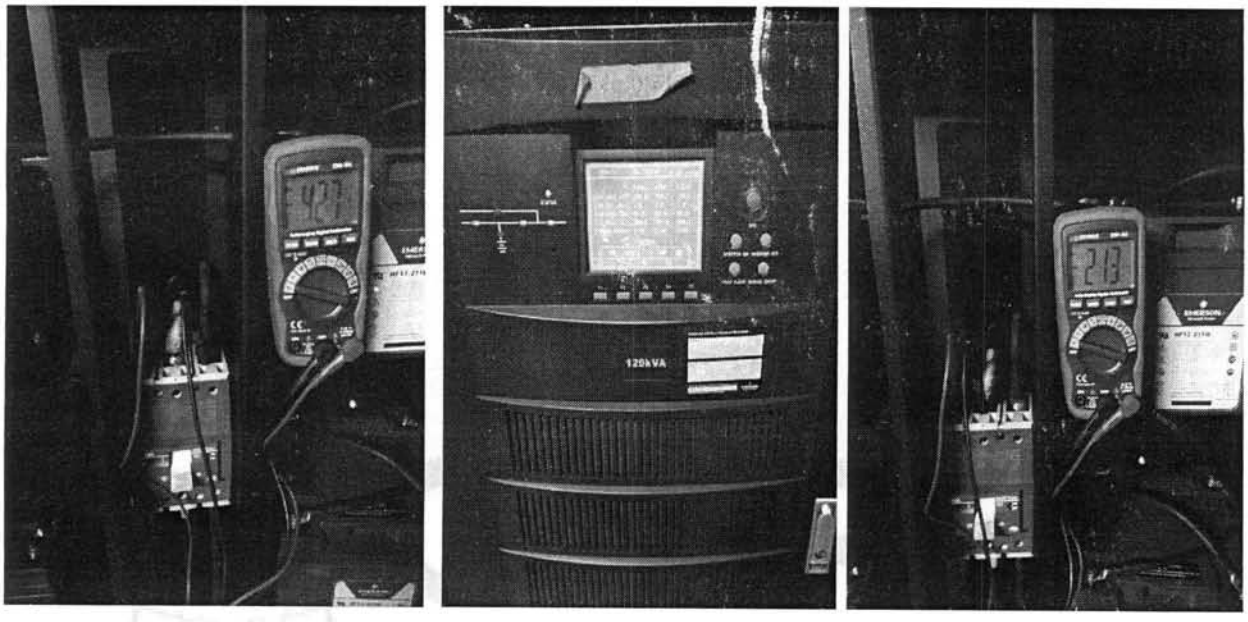


4. UPS LIEBERT 50 KVA (EDIFICIO ADMINISTRATIVO PRIMERPISO).




Para iniciar el apagado de las UPS, comenzamos con la visualización de los eventos que haya presentado la UPS o si se encuentra alarmada para lo cual se evidencia el panel que NO presenta alarma por baterías (Regulando y en caso de caídas de voltaje de la red eléctrica externa entre en funcionamiento su banco de Baterías, se deja en evidencia que las baterías tienen fecha de instalación del año del año 2013), se inspeccionan los demás parámetros voltajes, corrientes, frecuencia y están en los rangos normales de operación.

Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, se desmonta tarjetas de control, revisión del banco de baterías, se ajustaron los bornes de las baterías, se realizó toma de lectura de carga en las baterías y lectura de voltaje, corriente en todo el equipo.

Se encontró las baterías fueron instaladas antes del año 2012, para lo cual es una fecha superior al tiempo recomendado por los fabricantes (tiempo sugerido es de 3 a 5 años) por tal motivo se encuentra en riesgo su autonomía y se recomienda el cambio de las baterías.

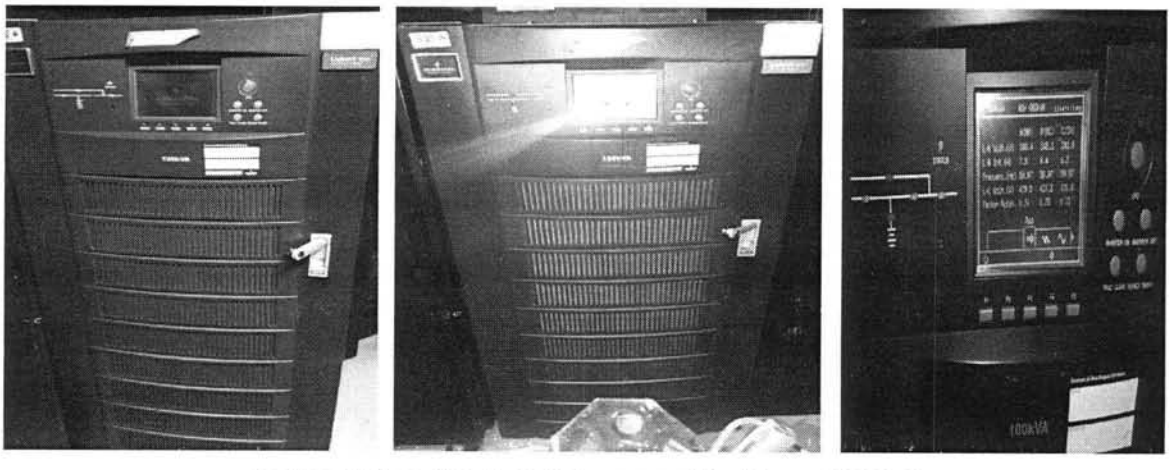



Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com

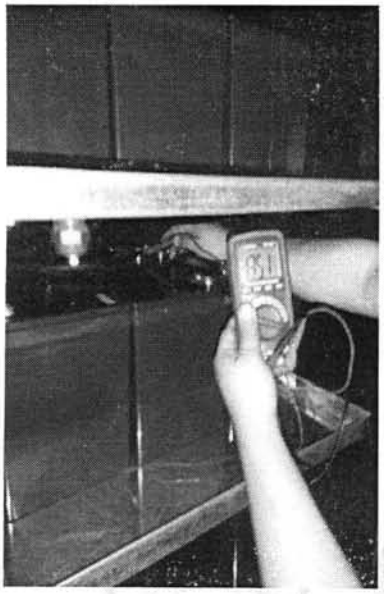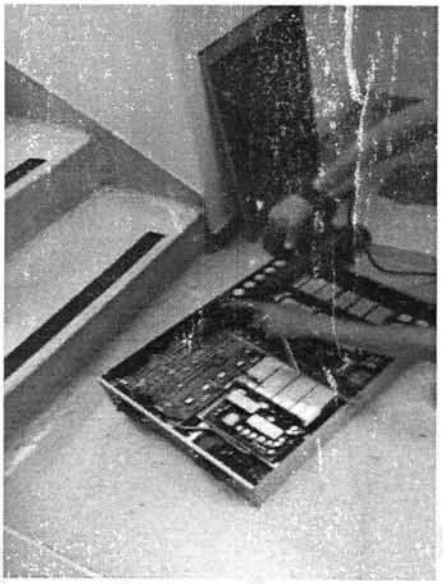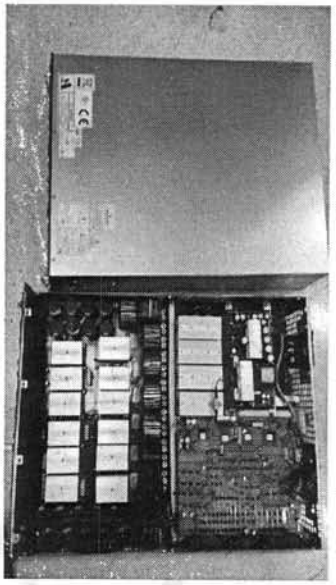5. TRIPP-LITE 20 KVA (CENTRO DE CABLEADO PISO 1 CENTRO DE CABLEADO CASAREPUBLICANA).

Para iniciar el apagado de las UPS, comenzamos con la visualización de los eventos que haya presentado la UPS o si se encuentra alarmada para lo cual se evidencia el panel que NO presenta alarma por baterías (Regulando y en caso de caídas de voltaje de la red eléctrica externa entre en funcionamiento su banco de Baterías), se inspeccionan los demás parámetros voltajes, corrientes, frecuencia y están en los rangos normales de operación, se evidencia que se encuentra en muy buen estado.

Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, se desmonta tarjetas de control, revisión del banco de baterías, se ajustaron los bornes de las baterías, se realizó toma de lectura de carga en las baterías y lectura de voltaje, corriente en todo el equipo.

Se encuentra desbalanceadas las fases ya que en una fase se tiene R 10% S 28% T 6% por tal motivo se recomienda el balanceo de cargas para evitar problemas por el desequilibrio de las cargas.

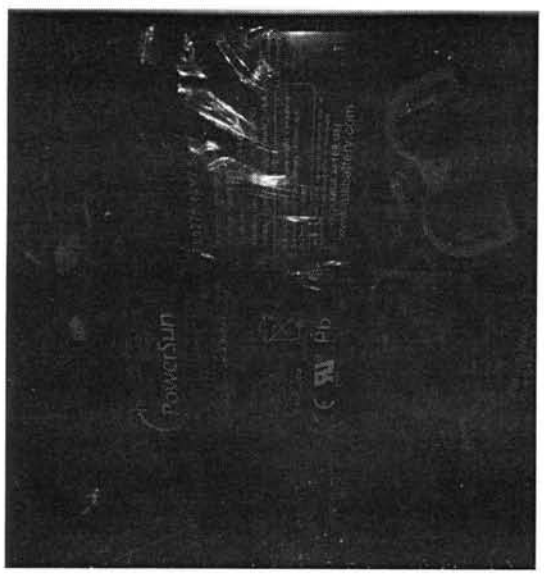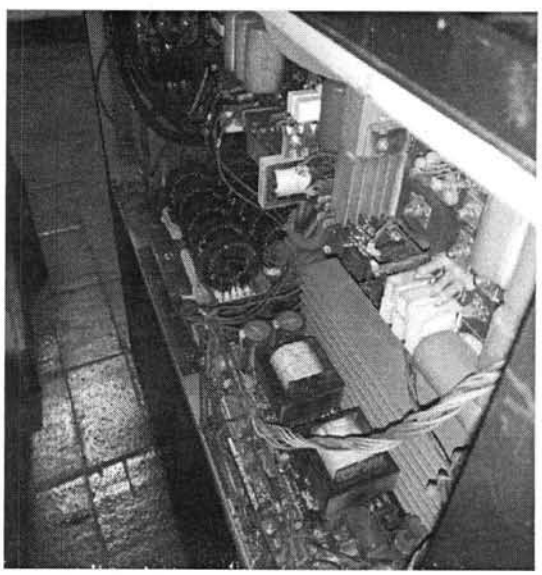


6. UPS LIEBERT 80 KVA (PASILLO SUBESTACIÓN CASA DENARIÑO).

Para iniciar el apagado de las UPS, comenzamos con la visualización de los eventos que haya presentado la UPS o si se encuentra alarmada para lo cual se evidencia el panel que NO presenta alarma por baterías (Regulando y en caso de caídas de voltaje de la red eléctrica externa entre en funcionamiento su banco de Baterías, se deja en evidencia que las baterías tienen fecha de instalación del año del año 2013), se inspeccionan los demás parámetros voltajes, corrientes, frecuencia y están en los rangos normales de operación.

Se realizó mantenimiento preventivo al equipo, se desmonta tarjetas de control, revisión del banco de baterías, se ajustaron los bornes de las baterías, se realizó toma de lectura de carga en las baterías y lectura de voltaje, corriente en todo el equipo.

GPS ELECTRONICS Ltda.

Por tal motivo se recomienda el cambio inmediato del banco de baterías para poder obtener el respaldo y poder actualizar el sincronismo para que funcionen en cascada y tener el respaldo necesario con el que fue diseñado el sistema.

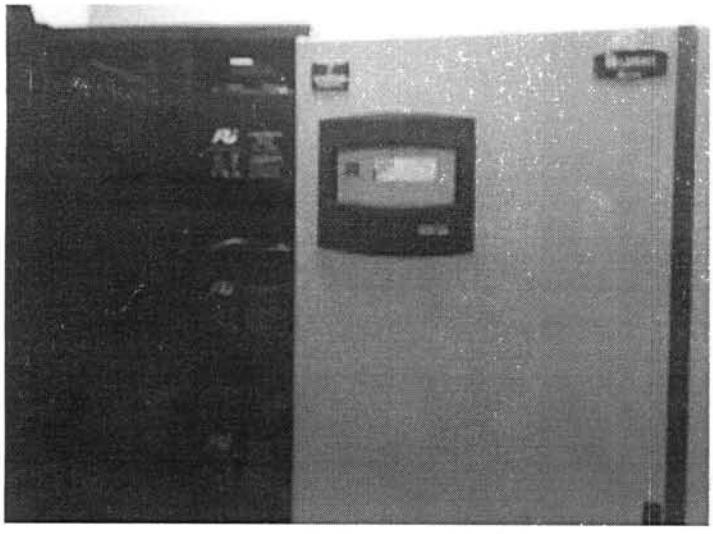











Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com


GPS ELECTRONICS Ltda.


7. UPS LIEBERT 80 KVA SUBESTACIÓN CASA DE NARIÑO (SUBESTACIÓN SÓTANO DE CASA DENARIÑO).

Este equipo se encuentra en buenas condiciones y tiene un tiempo aproximado de fabricación de +/- 14 años, actualmente se encuentra soportando toda la carga del edificio ya que la otra se encuentra sin comunicación y respaldo debido al daño de sus baterías.


Se encuentra que esta UPS tiene toda la carga debido a que perdió el sincronismo por lo cual se encontró BY Pass no detectado, las baterías se encuentran en perfecto estado ya que se le realizó el cambio de las baterías en el año 2017.

Por tal motivo se recomienda el cambio inmediato del banco de baterías para poder obtener el respaldo necesario que deben generar.

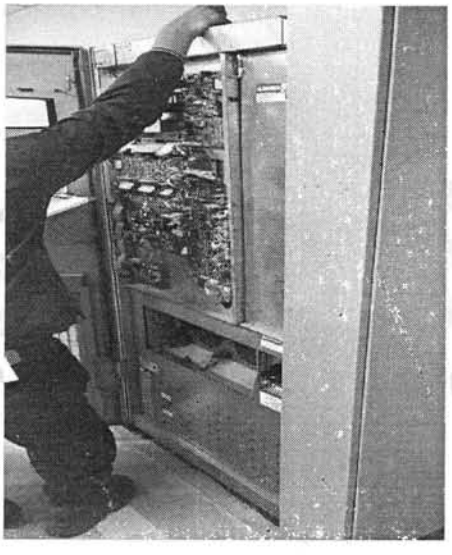

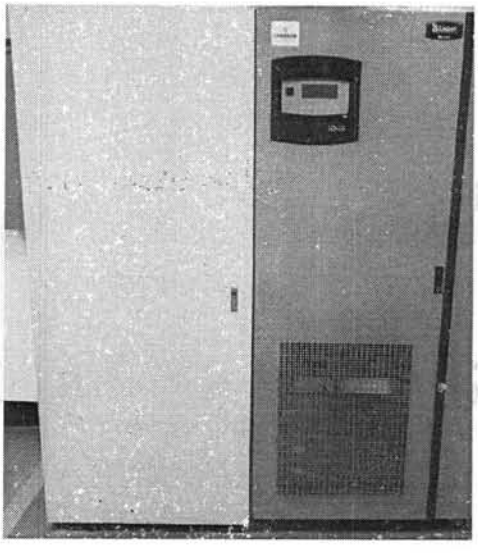



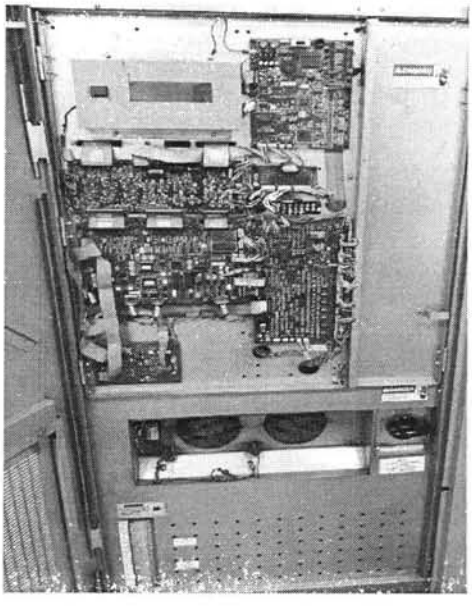



Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com



GPS ELECTRONICS Ltda.

8. **UPS PEI 30 KVA UPS PLANTA BAJA (CENTRO DE CABLEADO PRENSA SEMI-SÓTANO CASA DENARIÑO).**

Este equipo se encuentra en buenas condiciones y tiene un tiempo aproximado de fabricación de +/- 4 años, actualmente se encuentra soportando toda la carga del sala de prensa y está en optimas condiciones.

Se encontró alarma de desbalance de líneas, para lo cual se debe realizar una revisión profunda de como se están distribuyendo las alimentación de los equipos ya que la sobrecarga por esta falla deteriora de forma rápida el equipo.

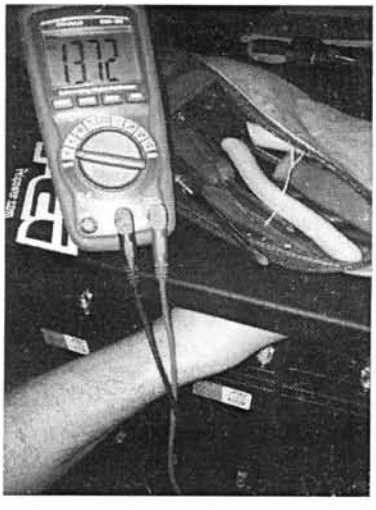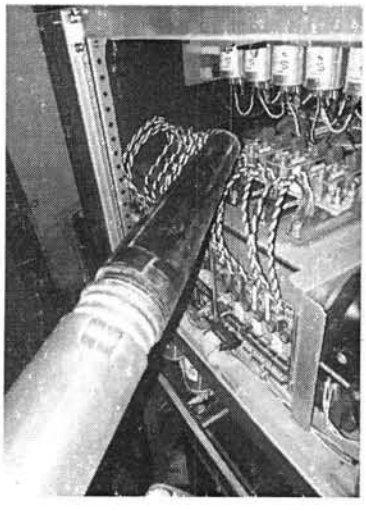Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com

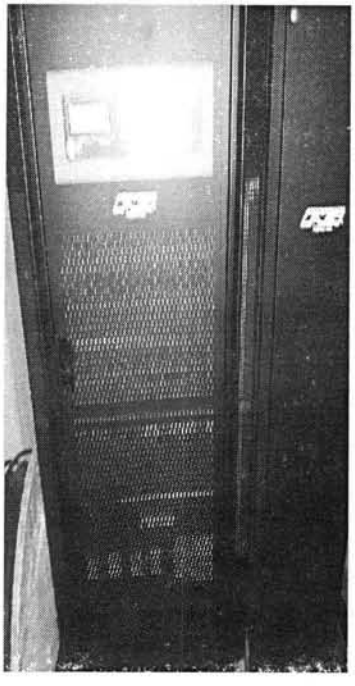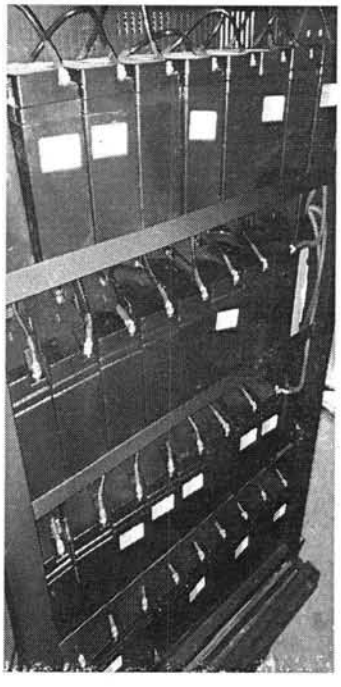
Se evidencia que se alarma el equipo por sobrecarga ya que se tiene alta la carga en las líneas de R y T ya que superan los 20 Amperios y en la línea S se tiene una carga inferior a los 15 Amperios.

9. UPS EATON POWER WARE DE 30 KVA CASA DE NARIÑO (UBICADO EN SALON SEN).

Este equipo se encuentra en buenas condiciones y tiene un tiempo aproximado de fabricación de +/- 8 años, actualmente se encuentra en un porcentaje inferior al 30% lo cual hace que funcione correctamente, el lugar que está ubicado se encuentra libre de polución y con buena refrigeración lo cual garantiza su perfecta operación.


Se encuentra que esta UPS tiene el banco de baterías en perfecto estado ya que se el cambio de las baterías fueron cambiadas en el año 2018.



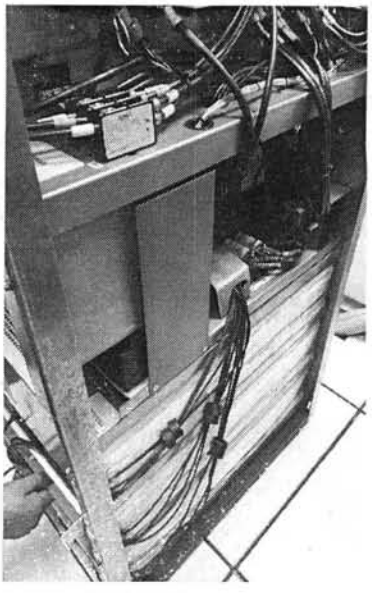




Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com

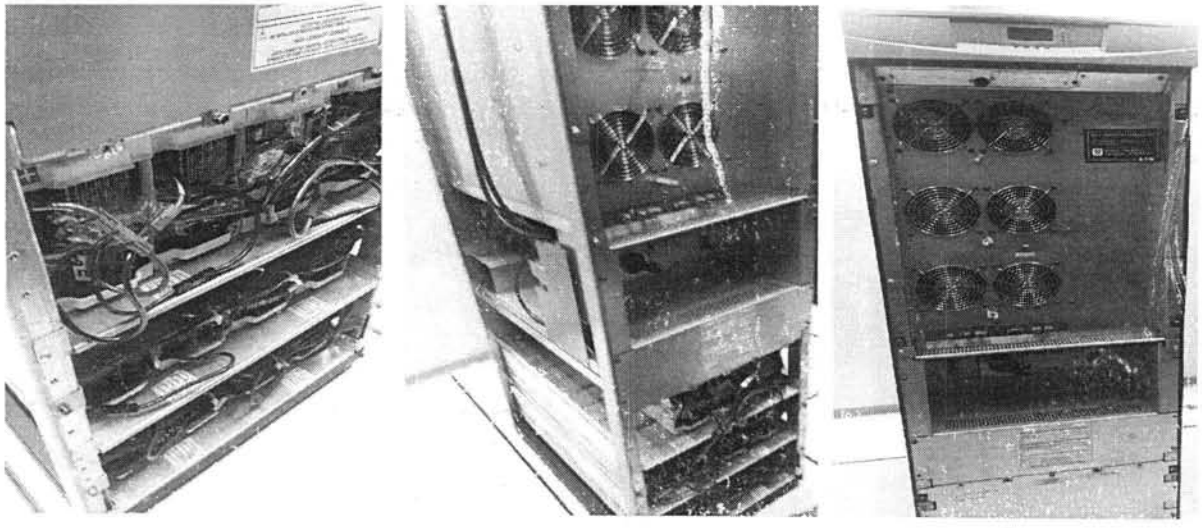



10. UPS LIEBERT 40 KVA EDIFICIO GALÁN (PARQUEADERO NO1).

Este equipo se encuentra en buenas condiciones y tiene un tiempo aproximado de fabricación de +/- 14 años, actualmente se encuentra soportando toda la carga del edificio Galán con una carga aproximada del 30% y se encuentra en una zona con buena refrigeración pero al estar en un sótano con mucha humedad se ve un poco deteriorado sus componentes.


Se encuentra que esta UPS tiene las baterías en regular estado ya que el tiempo de instalación de las baterías es superior al recomendado por el fabricante para lo cual se recomienda el cambio de ellas para que pueda garantizar el respaldo necesario al evidenciar que fueron instaladas en el año 2013.


Se recomienda el cambio del equipo y la sustitución por uno de similares características ya que puede presentar problemas en sus componentes y es difícil la consecución d ellos por obsolescencia de sus componentes.

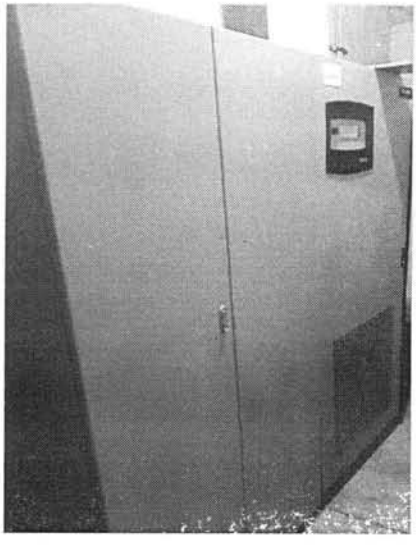

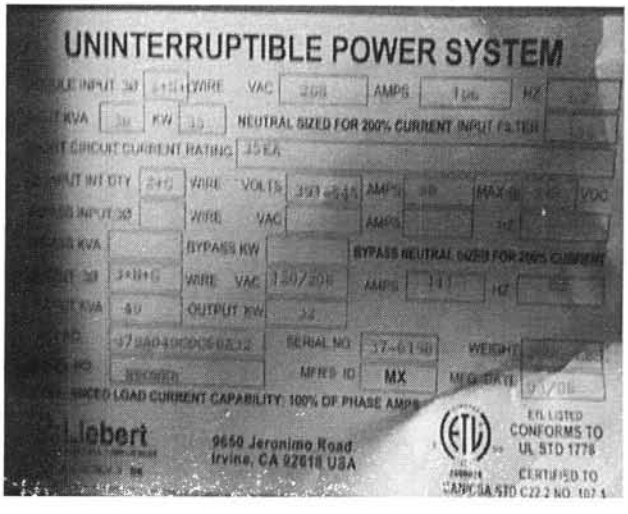

Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com


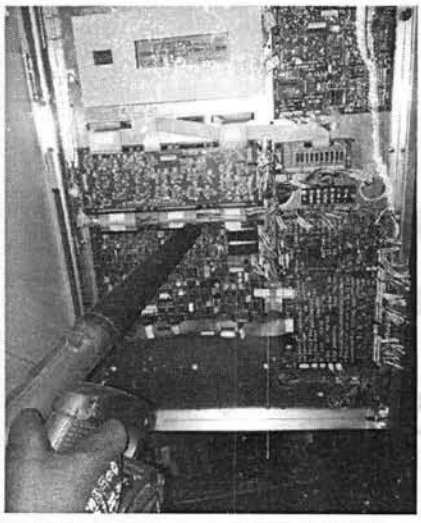


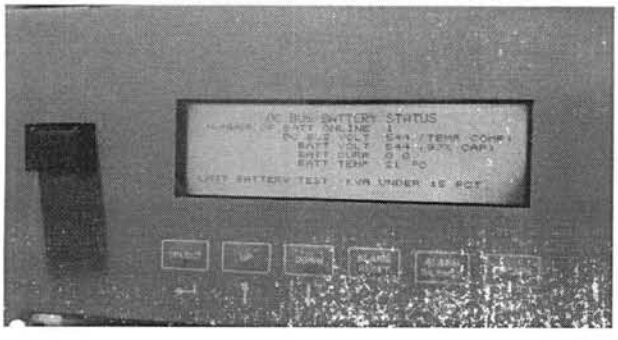
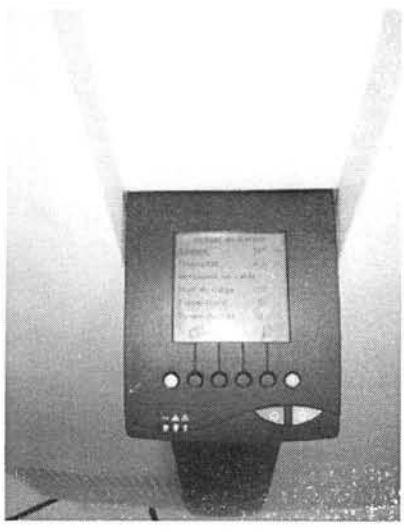


11. MGE UPS SYSTEMS GALAXY 3000 (CENTRO DE CABLEADO- PLANTA ELÉCTRICA VICEPRESIDENCIA).



Este equipo se encuentra en buenas condiciones y tiene un tiempo aproximado de fabricación de +/- 12 años, actualmente se encuentra soportando toda la carga del edificio Vicepresidencia con una carga aproximada del 25% y se encuentra en una zona con buena refrigeración, en un piso falso con buen acondicionamiento del equipo.

Este esquipo se encentra en buenas condiciones Se encuentra que esta UPS tiene las baterías en buen estado ya que el tiempo de instalación de las baterías se encuentra dentro del rango recomendado por el fabricante, pero se debe ir pensando en el cambio de las baterías para que una vez superado el tiempo de vida de ellas no se quede el equipo sin respaldo.

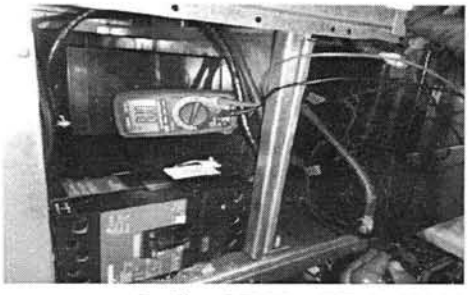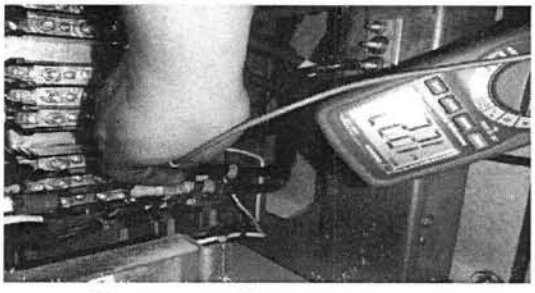





12. SALICRU NEX POWER NX/3 (CENTRO DE CABLEADO CASA EQUIDAD PARA LA MUJER).

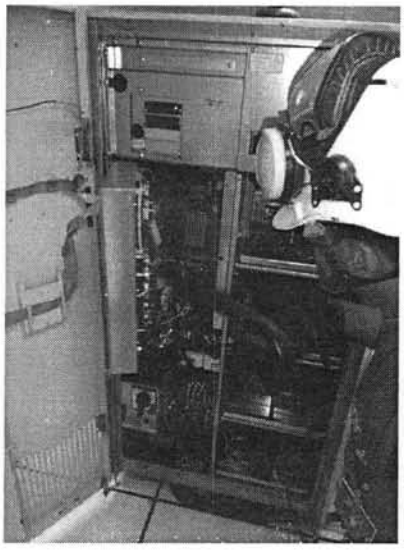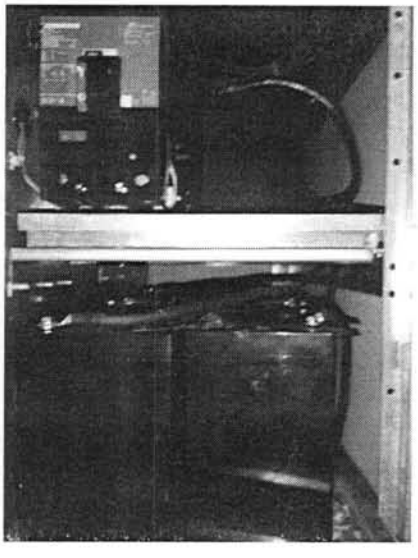Este equipo se encuentra en buenas condiciones ya que fue reparada hace poco, es un equipo que tiene más de +/- 10 años de fabricación, actualmente se encuentra soportando toda la carga de la sede Equidad para la Mujer, con una con una carga aproximada del 20% y se encuentra en una zona con buena refrigeración.


Se encuentra que esta UPS tiene las baterías nuevas ya que en el mes de enero fueron cambiadas las baterías, con realización de pruebas y dando como resultado una autonomía eficiente, se encuentra instalada sobre piso falso lo cual contribuye al buen funcionamiento del equipo.



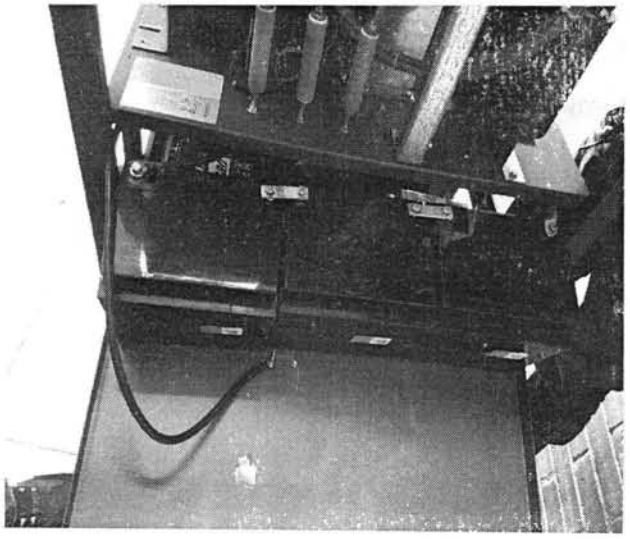

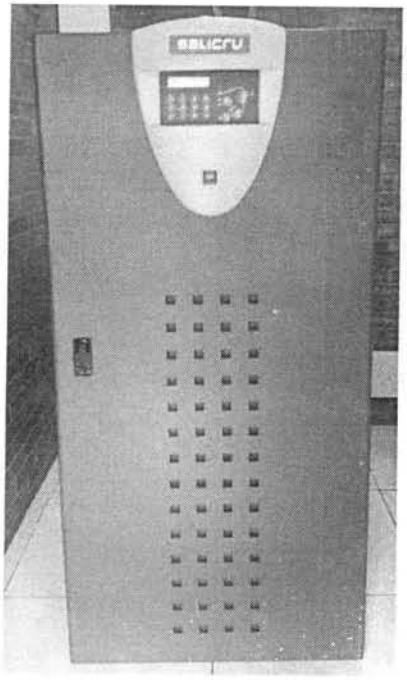




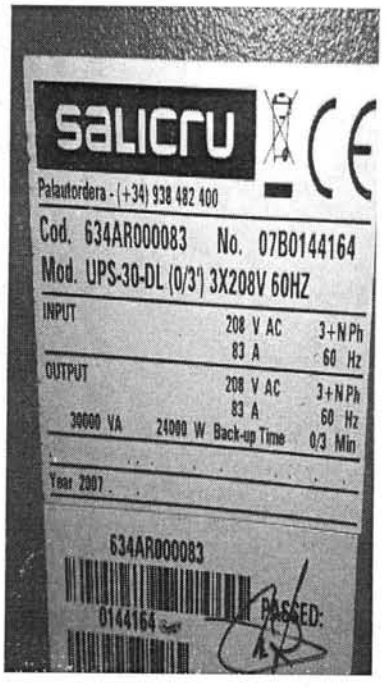

13. UPS SPECTRONIC (CENTRO DE COMPUTO CASA DE HUESPEDESCARTAGENA).

Este equipo se encuentra en buenas condiciones, es un equipo que tiene más de +/- 8 años de servicio, actualmente se encuentra soportando toda la carga de la sede CASA DE HUESPEDES CARTAGENA, con una con una carga aproximada del 10%, se encuentra en una zona con buena refrigeración.

Se encuentra que esta UPS tiene las baterías con 4 años de instalada, en la inspección realizada se determinó que funcionan correctamente pero al estar sobre el límite de vida sugerido por el fabricante se recomienda en las próximas visitas realizar el cambio pertinente al equipo, con la finalidad de garantizar el respaldo pertinente.

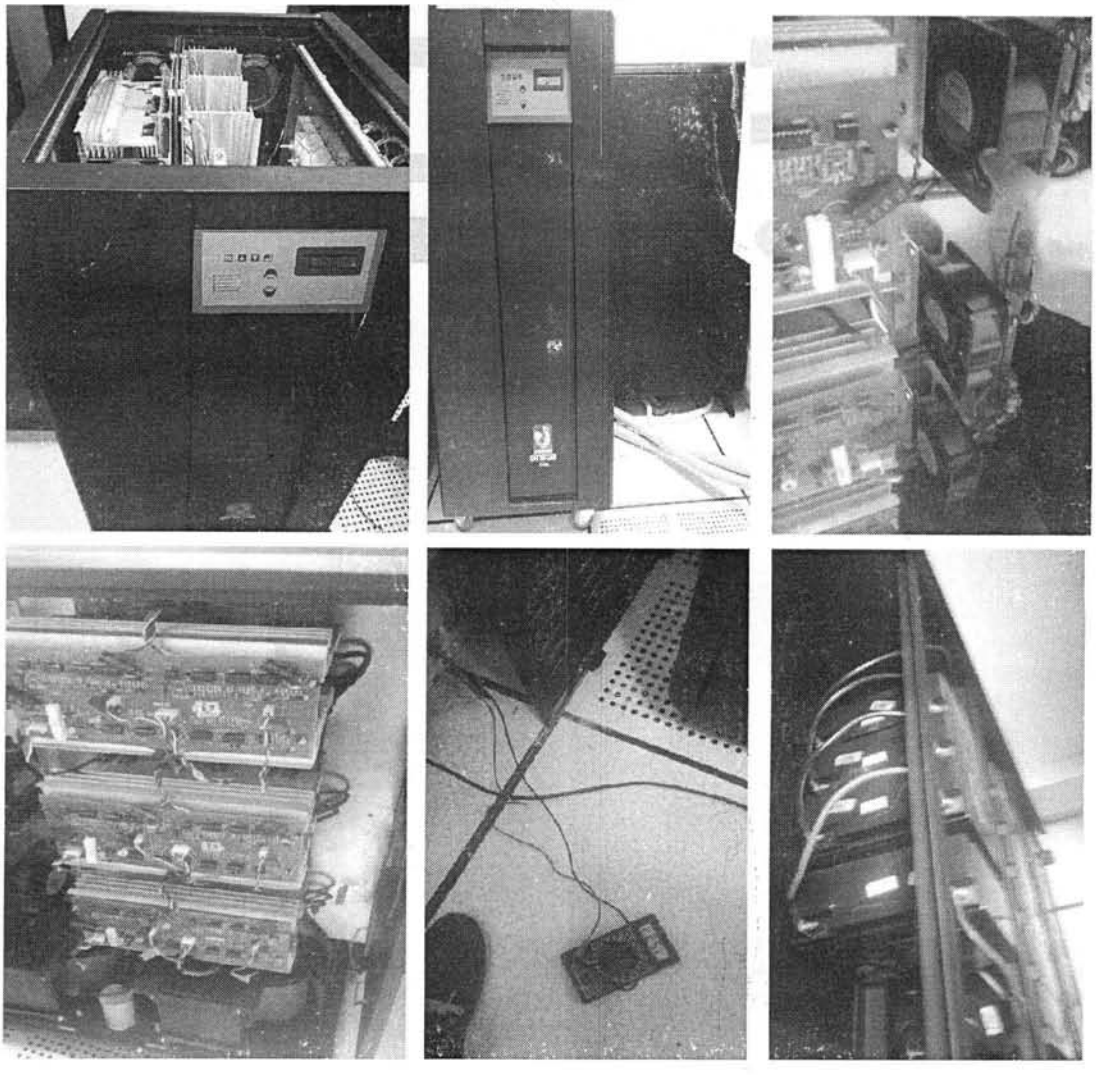


14. HABITACION 10 CASA DE HUESPEDES DECARTAGENA

Este equipo se encuentra en buenas condiciones, es un equipo que tiene más de +/- 8 años de servicio, actualmente se encuentra en la habitación 10 para dar soporte al equipo de computo del invitado que se aloje en esta, se encuentra funcionando de forma adecuada.

Se encuentra que esta UPS tiene las baterías con más de 5 años de instalada y se encuentra en regular estado, en la inspección realizada se determinó que funcionan pero al estar sobre el límite de vida sugerido por el fabricante se recomienda en las próximas visitas realizar el cambio pertinente al equipo, con la finalidad de garantizar el respaldo necesario.




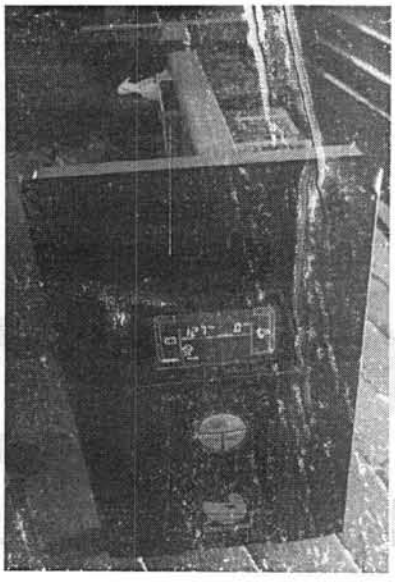


15. UPS POWEST TITAN DE 2 KVA (SALA DE PRENSA CASA DE HUÉSPEDES DE CARTAGENA).

Este equipo se encuentra en buenas condiciones, es un equipo que tiene más de +/- 5 años de servicio, actualmente se encuentra en la sala de prensa para dar soporte a Los equipos que aquí se ubiquen, se encuentra funcionando de forma adecuada.

Se encuentra que esta UPS tiene las baterías con más de 5 años de instalada y se encuentra en buen estado, en la inspección realizada se determinó que funcionan pero al estar sobre el límite de vida sugerido por el fabricante se recomienda en las próximas visitas realizar el cambio pertinente de las baterías del equipo, con la finalidad de garantizar el respaldo necesario.

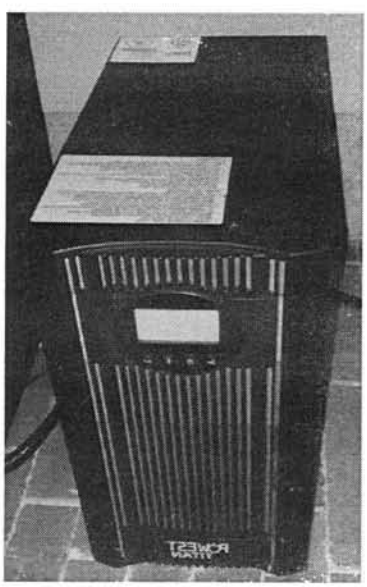


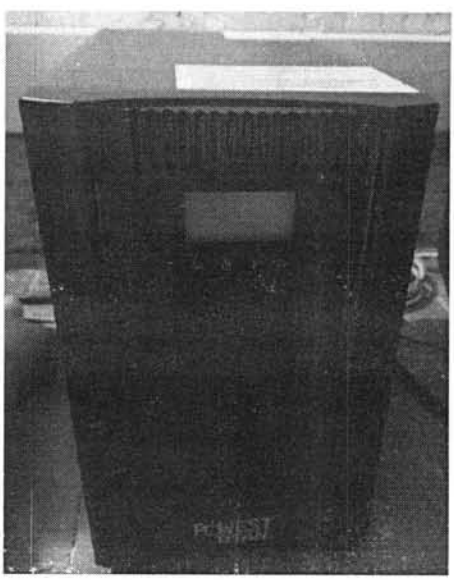

16. UPS SPECTRONIC (FUERTE DE MANZANILLO CASA DE HUÉSPEDES DE CARTAGENA).


Este equipo se encontró completamente deteriorado, es un equipo que tiene más de 10 años de uso y se encuentra en una zona con alta salinidad por tal motivo el deterioro que en ella se evidencia, se recomienda dar de baja este equipo y adquirir uno de características similares.



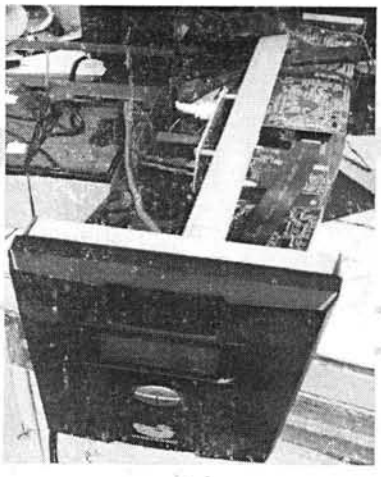

17. UPS PEI (EDECÁN CASA DE HUÉSPEDES DE CARTAGENAUPS).

Se encontró que este equipo presenta problemas en su autonomía así como también tiene un daño en el inversor de la tarjeta ya que no tiene voltaje en la salida, el equipo se encuentra en su parte física en buen estado, por tal motivo se sugiere el cambio de la tarjeta y adicionalmente el remplazo de las baterías, ya que por encontrarse expuestas a las altas temperaturas que en la casa se tiene la vida útil de dichos equipos es menor.

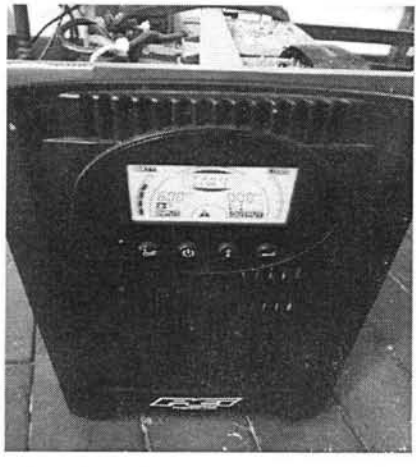



18. UPS PEI (GUARDIA CASA DE HUÉSPEDES DECARTAGENA).

Se encontró que este equipo presenta problemas en su autonomía así como también tiene un daño en el inversor de la tarjeta generalmente se presentan por fluctuaciones en el voltaje de entrada de los equipos, lo cual se encontró que no tiene voltaje en la salida, el equipo se encuentra en su parte física en buen estado, por tal motivo se sugiere el cambio de la tarjeta y


adicionalmente el remplazo de las baterías, ya que por encontrarse expuestas a las altas temperaturas que en la casa se tiene la vida útil de dichos equipos es menor.






19. HABITACION 4 CASA DE HUESPEDES DECARTAGENA.

Se encontró que este equipo presenta problemas en su autonomía así como también tiene un daño en el inversor de la tarjeta generalmente se presentan por fluctuaciones en el voltaje de entrada de los equipos, lo cual se encontró que no tiene voltaje en la salida, el equipo se encuentra en su parte física en buen estado, por tal motivo se sugiere el cambio de la tarjeta y adicionalmente el remplazo de las baterías, ya que por encontrarse expuestas a las altas temperaturas que en la casa se tiene la vida útil de dichos equipos es menor.

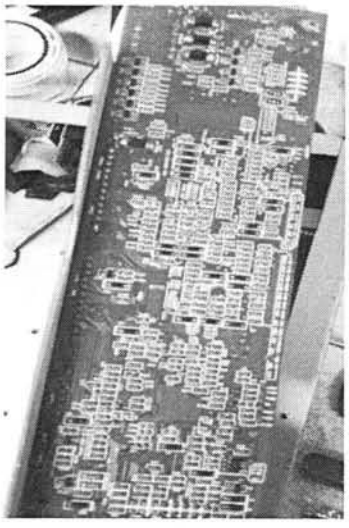




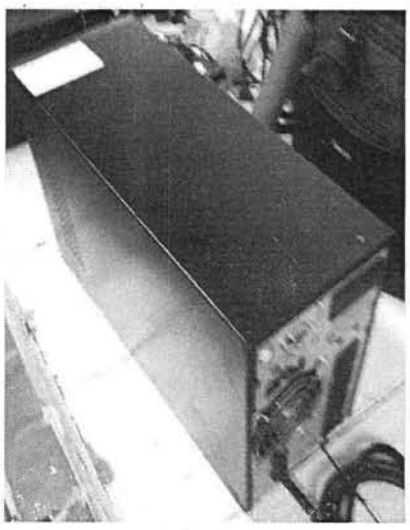

GPS ELECTRONICS Ltda.

Nota: Los cuatro (4) equipos que se diagnosticaron averiados y que fueron revisados en el laboratorio en Bogotá, se entregaron el día 10 de junio de 2019 en la bodega de sistema del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, los cuales están fuera de servicio y se siguiere se deben dar de baja.

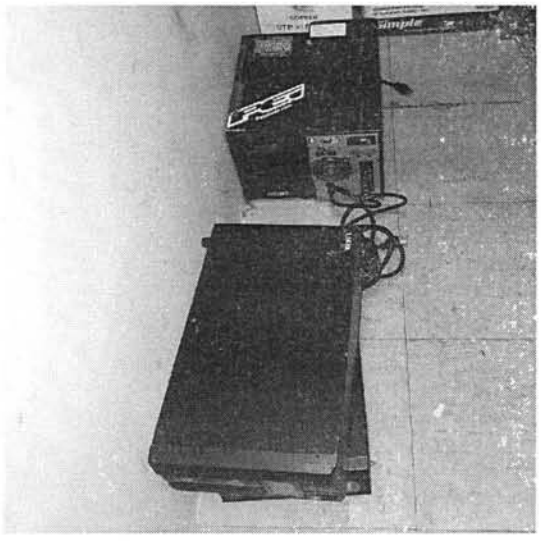

GERSON JAIR SAENZ ROJAS
C.c. 80.065.772 de Bogotá
D.C. Representante Legal
GPS ELECTRONICS
LTDA NIT. 900092491-1

Calle 37 No 17 A 03-Teusaquillo Bogotá D.C.
Teléfono 3231022-3115028173
gps.electronicsltda@hotmail.com - ingpedroriveros@gmail.com

El futuro es de todos | Presidencia de la República

CONTRATO No. 217-18 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y GPS ELECTRONICS LTDA

INFORME DE ACTIVIDADES

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos para los equipos UPS ubicados en las diferentes sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas definidas por la Entidad.
Plazo de ejecución del 21/12/2018 hasta el 30/11/2020
Período de prestación del servicio: 26 de mayo de 2019.
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: en el segundo trimestre se realizó visita de mantenimiento preventivo de 19 UPS el día 26 de mayo, que están incluidas en el contrato de prestación de servicios 217/18. Edificio Administrativo sotano UPS Liebert 40 KVa Edificio Administrativo (SOTANO DAPRE) UPS PEI 30 Kva Edificio administrativo subestación sótano UPS Liebert 50 Kva Edificio Administrativo primer piso UPS Liebert 50 Kva Casa Republicana Tripp-Lite SU20K3/3 20 KVA Subestación Casa de Nariño UPS Liebert 80 KVA Subestación Casa de Nariño UPS Liebert 80 KVA UPS planta baja UPS PEI U330 30 Kva Casa de Nariño (SEN) "Eaton Powerware 9355" 30 KVA Casa Galán UPS Liebert 40 Kva Vicepresidencia MGE UPS system Galaxy 3000 20 KVa Equidad para la Mujer Salicru 30 KVA Centro de computo casa de huéspedes Cartagena UPS SPECTRONIC 15 KVA Habitación 10 casa de huéspedes de Cartagena UPS SPECTRONIC 1,5 KVA Sala de Prensa casa de huéspedes de Cartagena UPS TITAN 1,5 KVA Fuerte de manzanillo casa de huéspedes de Cartagena UPS SPECTRONIC 1,5 KVA Edecán casa de huéspedes de Cartagena UPS PEI 1,5 KVA Guardia casa de huéspedes de Cartagena TITAN 1,5 KVA Habitación 4 casa de huéspedes de Cartagena UPS SPECTRONIC 1,5 KVA

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS.
Jefe Area de Tecnologías y Sistemas de Información.
Supervisor
