PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2585 DEL 3 DE MARZO DE 2023.
CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO

2. CONTRATO DE OBRA

2.1 OBJETO
2.2 GENERALIDADES
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
2.4 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
2.5 ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DE LA OBRA
2.6 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONTRATO
2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS
2.8 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
2.9 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
2.10 ACTA DE VECINDAD
2.11 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA OBRA
2.12 SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA
2.13 INDICADORES DE GESTION
2.14 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION-MARCO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN OBRA-CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS)
2.15 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA
2.16 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
2.17 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
2.18 CONTROL DEL EQUIPO (EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR)
2.19 REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO
2.20 MANEJO AMBIENTAL
2.21 SALUD OCUPACIONAL
2.22 BITÁCORA
2.23 ACTA DE OBRA Y MEMORIA DE MEDIDAS
2.24 RELACION PLANOS DE OBRA

3. CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1 INFORMACION Y ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.2 ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DEL CONTRATO

3.3 ACTA DE RECIBO Y APROBACION DE DISEÑOS

3.4 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.5 CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

3.6 ACTAS DE INTERVENTORIA

3.7 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

3.8 COMITÉS DE OBRA Y VISITAS TÉCNICAS

3.9 CONTROL DE PARAFISCALES INTERVENTORIA

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Pereira, hasta el día 31 de diciembre de 2022 prestó el servicio de la Administración, Operación y Mantenimiento del sistema de alumbrado público a través de un contrato por licitación pública con laempresa de Energía de Pereira SA ESP. Como lo establece la regulación del servicio de alumbrado público, es una obligación de las administraciones municipales prestar el servicio de alumbrado público de una manera continua y según lo estable el Decreto 943 de 2018.

“ARTÍCULO 2.2.3.6.1.2. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público, el cual podrán prestar de manera directa, o a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público que demuestren idoneidad en la prestación del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable. De conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberán garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio de alumbrado público, así Como los niveles adecuados de cobertura.” Actualmente, el sistema de alumbrado público del Municipio de Pereira cuenta con aproximadamente 34.104 luminarias en tecnologías Led, sodio y metal halide de varias potencias, que requieren constantemente de su mantenimiento y reparación; actividad que estará a cargo de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Infraestructura; hasta que se realice la licitación pública de AOM para el año 2023.

Adicionalmente la comunidad diariamente presenta solicitudes de reparación de luminarias que se encuentran fuera de servicio y se presentan salidas de circuitos de alumbrado público que pueden estar ubicados ubicadas sobre avenidas y vías de gran importancia para la ciudad, estas actividades deben atendidas oportunamente, dado que pueden originar temas de inseguridad y de inconformismo en la comunidad.

Ha surgido también la necesidad para algunos entes de control como la policía metropolitana y el instituto municipal de tránsito han solicitado a la administración apoyo en la instalación de las líneas de iluminación o luminarias como un refuerzo para cumplir y brindar seguridad a la comunidad.

La resolución CREG 123 de 2011 y el Decreto 2424 de 2006 define el servicio de alumbrado como “un servicio público no domiciliario con el que se proporciona

iluminación a espacios públicos, bienes de uso público y de circulación, de tránsito vehicular o peatonal; dentro de un perímetro urbano y rural de un municipio o un distrito. Para prestar el servicio de alumbrado público, además del suministro de energía se requiere ejecutar las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema".

1,1 OBJETO

ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Participantes:

MUNICIPIO DE PEREIRA:	**Entidad contratante.**
MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO:	Directora de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
LUIS IVAN SALGUERO JIMENEZ:	Ingeniero Coordinador Infraestructura
PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS EN INGENIERIA SAS RL Jaime Eduardo Bedoya Echeverry	Contratista

2.1 OBJETO


ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

2.2 GENERALIDADES - CONTRATO DE ALQUILERNo. 2585 DEL 3 DE MARZO DE 2023

Consistió en el traslado de personal adscrito a la Secretaría de Infraestructurapara lareparación de luminarias en la zona urbana y rural del municipio de Pereira, por solicitud de las comunidades de estos sectores, para ello se trabajó con un carro canasta para la atención de daños y la realización de las actividades programadas por el supervisor del contrato.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO (localización geográfica):

Zona Urbana De Pereira

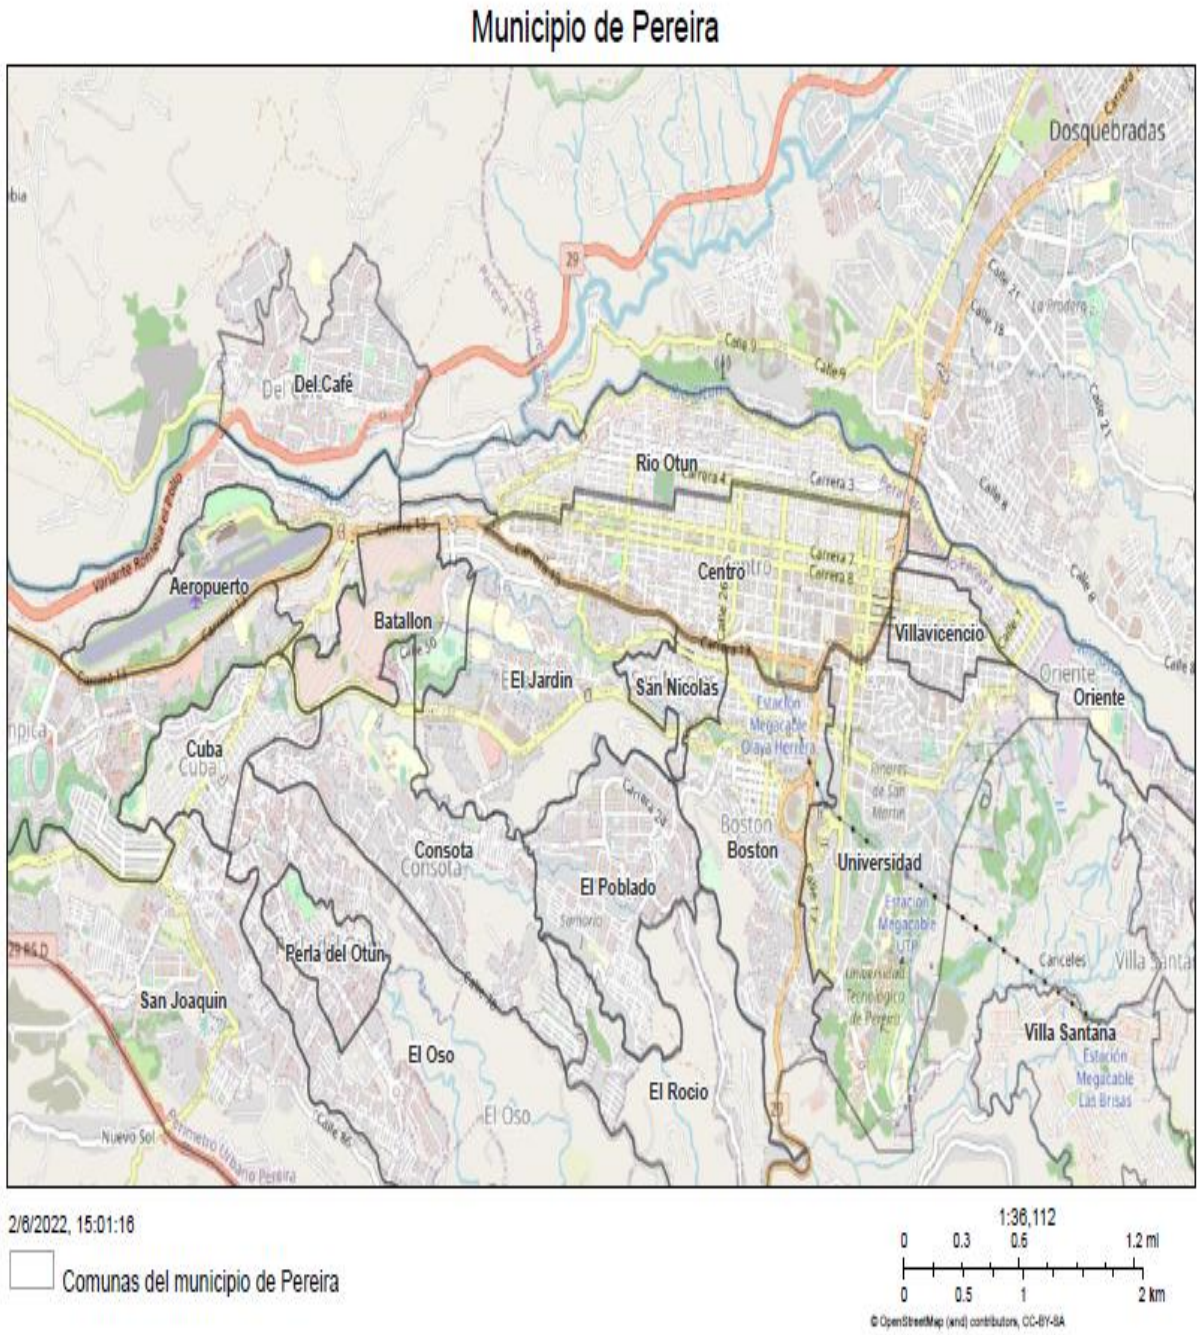

Zona Rural Del Municipio De Pereira



2.4 ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CLASE DE CONTRATO:	**CONTRATO DE ALQUILER**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE PEREIRA**
DEPENDENCIA: RESPONSABLE:	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
CONTRATISTA:	**PROEXING - PROFESIONALES EXPERTOS EN INGENIERIASAS RL Jaime Eduardo Bedoya Echeverry**
SUPERVISOR :	**MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO**
OBJETO DEL CONTRATO:	**ALQUILER DE UN CARRO CANASTA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	**$71.901.388**
VALOR ADICIÓN:	**$ 26.363.832**
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN:	**$ 98.265.220**
VALOR PAGADO ACTA 1:	**35.950.694**
VALOR EJECUTADO SIN COBRAR:	**35.950.694**

DURACIÓN INICIAL:	**2 MESES**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**2 MESES**
PRORROGA:	**22 DÍAS**
DURACIÓN FINAL:	**2 MESES Y 22 DÍAS**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**2 MESES Y 22 DÍAS**
FECHA DE INICIO INICIAL:	**4 DE MARZO DE 2023**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	**3 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**3 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE REINICIO:	**30 DE MAYO DE 2023**
PLAZO DE TERMINACIÓN CON PRORROGA:	**23 DE JUNIO DE 2023**

2.5 ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DE LA OBRA

Adjunto copia del contrato y sus respectivos documentos.

2.6 OBRAS PROGRAMADAS DURANTE EL CONTRATO

Se realizaron reparación de luminarias en la zona urbana y rural del municipio de Pereira, los sitios intervenidos son:

Centro de Pereira, Barrio Millán Rubio, Villa Olímpica, san Marcos, Perla Del Sur, Atenas, Remanso, Guayabal, Padre Valencia, 2500 Lotes, Independientes, Rocío, San Fernando, Belmonte, El Bosque, Villa Verde, Villa Del Prado, Pirámides, Las Américas.

2.7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

A continuación, se describe las cantidades de luminarias, circuitos intervenidos y reflectores reparados:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO ATENDIDOS	15
LUMINARIAS REPARADAS APROXIMADAMENTE (DE VARIAS POTENCIAS)	550

2.8 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

N/A

2.9 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

2.10 ACTA DE VECINDAD

N/A

2.11 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA DE LA OBRA

N/A

2.12 SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO DE LA OBRA.



REVISIÓN Y REPARACIÓN LUMINARIA SODIO CALLE 19 ENTRE CARRERAS 4 Y 5.



REVISIÓN Y REPARACIÓN LUMINARIA SODIO 150 VATIOS CALLE 17 CON CARRERA 8.



REPARACIÓN DE REFLECTORES 250 VATIOS.



REPARACIÓN DE LUMINARIAS SODIO BARRIO GUAYABAL.



REPARACIÓN LUMINARIA SODIO 150 VATIOS BARRIO SAN FERNANDO.



REPARACIÓN LUMINARIA UBICADA EN POSTE PRIMARIO.



REVISIÓN Y REPARACIÓN LUMINARIAS ALREDEDORES ESTADIO HERNÁN RAMÍREZ VILLEGAS.

2.13 INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN		
DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
Valor Ejecutado		$ 71.901.388

2.14 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Se llevaron a cabo las inspecciones y controles sobre la reparación y mantenimientos realizados a las luminarias que se encontraban fuera de servicio y se verificó el correcto funcionamiento de los equipos lumínicos reparados.

PLAN DE CALIDAD

N/A

2.15 INFORME FINANCIERO DE LA OBRA

N.A

2.16 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

N.A

2.17 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

SE VERIFICÓ

2.18 CONTROL DEL EQUIPO (EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA)

SE VERIFICÓ.

2.19 REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO

N/A

2.20 MANEJO AMBIENTAL

N.A

2.21 SALUD OCUPACIONAL

N.A

2.22 BITÁCORA

COPIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS JUNTO CON MATERIAL FOTOGRAFICO.

2.23 ACTAS DE OBRA Y MEMORIA DE MEDIDAS

Informe De Actividades.

2.24 RELACION PLANOS DE OBRA

N/A

3 CONTRATO DE INTERVENTORIA No

N/A

3.1. INFORMACION Y ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

N/A

3.2. ENTREGA DE DOCUMENTOS PREVIOS A LA INICIACION DE LA OBRA

ACTA DE INICIO

3.3 ACTA DE RECIBO Y APROBACION DE DISEÑOS

N/A

3.4 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

N/A

3.5 CONTROL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA.

N/A

3.6 ACTAS DE INTERVENTORIA

N/A

3.7 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

N/A

3.8 COMITÉS DE OBRA Y VISITAS TÉCNICAS

Se realizaron visitas técnicas

3.9 CONTROL DE PARAFISCALES INTERVENTORIA

N/A

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se ejecutó las actividades requeridas durante el periodo informado.

5 ANEXOS

Se anexan registro de actividades diarias al presente informe.

Ing. MARÍA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO.
Supervisor

Proyectó y Elaboró
Luis Iván Salguero Jiménez

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

FECHA Mayo-03-2023 CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Talleres San Joaquin.	—	—	Retiro y cargue materiales
8:20	8:40	Cancha multiple los laureles, mz M casa 7	—	—	Fotocelda, se normaliza 6 reflectores
8:50	—	2500 Lts Abertadores mz 11 casa 6	23307	150	Cambio empalmes fotocontrol 10 luminarias
		Bajada Dorado. Taller final 2	11145	150	Se ajusta fotocontrol, 12 luminarias
—	10:20	Piramides mz 2 casa 2	07934	150	Kit completo, 6mts alambre #12, bombilla
		Piramides, Sede Comunal	07933	150	Kit completo, magal, fotocelda, 6mts #12
10:40	11:20	Villa del Prado mz 27-28-29-30	—	—	Fotocontrol en buen Estado
		u u mz 27 casa 18	01258	150	Empalmes flojos fotocontrol 4mts #12, 1 lamp.
11:50	—	Barrio las Americas Ayuda Rio Calle 16 Pachas	04970	400	Kit completo, bombilla y fotocelda
			—	400	En alambre de abejas
—	—	Ayuda Rio # 16-17	91200	400	Kit completo, bombilla y Fotocelda
		Ayuda Rio # 16-07	09119	400	Kit completo, bombilla y Fotocelda
—	—	Ayuda Rio # 17-38	—	400	Kit completo, bombilla y Fotocelda
		u u # 17-38	—	400	Kit completo, bombilla y Fotocelda
—	2:10	Ayda Rio Calle 17 Barrio Zea	19918	150	Fotocelda, normaliza 3 lamparas
2:20	—	Ayda Rio A 9-55 Bavaria	Cambio conectores y fotocelda. Fotocontrol, se normalizan 12 pachas 250W		
—	3:30	hacia el CAI			

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#2

FECHA Mayo-02-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
11:30	11:50	Palmar de Villa Verde Cra 38A # 28-03	32898	70	Se retira para cambio mogul, Bombilla y fotocelda
12:00	12:30	calle 29 # 38B-07	32908	70	se retira para cambio bombilla.
12:50	—	Avda Rio calle 18 Pachas	22573 14074	400 400	Sin tension, Luna, reventada, conectores base y FOTOCELDA.
—	—	" " " "	22573 14074	400 400	Kit completo, bombilla Kit completo, bombilla
—	—	Avd. Rio # 18-51 Pachas	02357 04868	400 400	Acometida quemada, 6m/s cable 3x12 conectores, base y fotocelda
—	—	" " " "	02357 04868	400 400	cambio bombilla cambio bombilla, 4mts cable # 3x12
—	3:30	calle 17 # 1-30	02947	150	Bombilla y fotocelda

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#1

FECHA Mayo-02-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arrayave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	talleres San Joaquin	—	-	Retiro y cargue de materiales
8:00	8:20	Entrada talleres San Joaquin	22894	150	cambio fotocelda
9:00	—	Palmar de Villa Verde cra 37 A # 29-03	—	—	Sin tension en red subterranea, se reyzan curcamos, conectores soltertados
—	—	" " " "	32696	150	Cambio bombilla y fotocelda, 2 conectores
			32697	150	Bombilla y Fotocelda
—	—	cra 37 A # 29-23	32695	150	Bombilla y Fotocelda
		Cra 37 A # 28-11	—	150	Bombilla y Fotocelda
—	—	cra 37 A # 28-43	—	150	Bombilla y Fotocelda
		cra 37B # 28-03	33178	70	Bombilla y Fotocelda
—	—	cra 38 # 29-51	32647	70	Bombilla y Fotocelda
		cra 38 # 29-71	32648	70	Bombilla y Fotocelda
—	—	cra 38 # 28-74	32891	70	Bombilla y Fotocelda
		cra 38A # 29-03	32650	70	Bombilla y Fotocelda
—	11:20	cra 38A # 28-23	32899	70	Bombilla y Fotocelda

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

FECHA Abril-27-2023 CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Talleres del municipio	—	—	Retiro y Cargue materiales
8:30	—	El Reversadero Cra 29 # 9-01	21562	150	Linea Reventada, se cambia el punto de energizacion
—	—	" "	—	70W	Punto alimentacion lampara NA # 21562
—	—	El Bosque Cra 32 #5-53 Via Mundo nuevo	11617	70	Cambio Bombilla
—	—	" " Cra 32 # 5-63	11616	70	Cambio Bombilla
—	—	" " Cra 32 calle 5	11489	150	Cambio Bombilla y descombra
—	—	" " Cra 5 # 31-71 callejon	18899	150	Bombilla, Balasto, arranciador y condensador
—	—	" " mz E casa 44	18895	150	Cambio Bombilla
—	—	mz E casa 44	32626	70	Cambio Bombilla
—	—	mz L casa 6	32621	70	Bombilla, conectores,
—	—	El Bosque Via la mina	—	—	Linea reventada, reponer 8mts cable
—	1:00	" " "	—	—	8 luminarias apagadas
1:20	2:00	Villa Olimpica frente al Diamante	Fotocontrol en Buen Estado 12 luminarias		

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#2

FECHA Abril-26-2023 CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
12:40	—	Guayabal mz 115 casa 8	—	LED 90W	Se retira quemada
—	—	" " mz 113 casa 1	33755	150	Bombilla, arrancador, conectores
		mz 113 casa 1	34182	70	Bombilla, arrancador, conectores
—	—	" " frente mz 113 casa 1	33756	NA	Cambio balasto, bombilla, fotocelda
		mz 114 casa 1		150	conectores
—	—	" " mz 114 casa 1	34355	150	Bombilla, fotocelda, balasto, arrancador, condensador, conectores
—	1:30	" " mz 92 casa 8	33300	70	Bombilla, arrancador, conectores
		mz 42 casa 1	29780	150	Bombilla, arrancador, conectores
1:50	—	El Romanzo mz 38 casa 13	30041	150	fotocelda, bombilla, arrancador,
		mz 48 casa 1			balasto y condensador
—	—	mz 48 casa 1	29778	150	Fotocelda, bombilla, arrancador, balasto, condensador, conectores
—	3:00	mz 47 casa 20	29721	70	Bombilla, fotocelda, conectores
		mz 48 casa 1	33419	150	Bombilla, fotocelda y arrancador

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#1

FECHA Abril-26-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Tallaves del Municipio	—	—	Retiro y Cargue Materiales
8:30	—	Canchas multiples de las Brisas	05872	NA 150	Sin tension, cambio conectores, soldados y bombilla
—	—	" "	Reflector NA-150		Se retira para cambio tabsto, arrancador, bombilla, 2mts de 3x12, condensador
—	9:30	" " "	13074	150	Cambio Bombilla y 2 conectores
9:50	—	Barrio Guayabal mz 98 casa 3	—	—	Cambio fotocelda, 4 luminarias
		mz 98 casa 1	33272	70W	cambio bombilla
—	—	" " mz 96 casa 1	33291	70W	Cambio bombilla
		mz 96 casa 8	33283	70W	cambio conectores y bombilla
—	—	mz 101 casa 27	33281	70W	cambio mogol y bombilla
		mz 100 casa 27	33757	70W	cambio mogol, bombilla y arrancador
—	12:30	mz 115 casa 1	33758	70W	cambio bombilla, mogol, arrancador
		mz 116 casa 1	33759	150	Retiro, cambio bombilla, conector, arrancador
			34196	150	Bombilla, arrancador, conectores

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

FECHA Abril - 24 - 2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO - 457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	talleres San Joaquin	—	—	Retiro y cargue materiales
8:20	—	Villa olimpia frente al supper inter	21497	NA 250	Se retira para cambio balasto, condensador y arrancador bombilla
—	—	Frente al Estadio canchas	—	—	se cambia foto control quemado, Breaker 50A, 4 mts alambre #12
—	—	" " " "	Reflector NA	250	se retira cambio Balasto, arrancador, Balasto, Bombilla, condensador
—	—	" " " "	—	—	Cambio de red, 60mts cable AL# 6 4 Conectores
—	12:00	la villa, canchas frente al Velodromo	19483	NA 70	Canchas, Retira control quemado, cambio contactor, ~~18~~ 10 comunanas 18
12:20	—	Belmonte calle 99bis #15A-48	—	—	Linea quemada, cambio bornes sulfatados 2 conectores, 5mts AL#6, 20 comunaneas
—	1:00	Belmonte calle 98bis #15A-47	10227	NA 150	Cambio bombilla
1:20	—	Parque olaya Herrera, Mastil #2	Reflectores		Red Subterranea sin tensión.
—	—	Mastil #2	18870	NA 70	Punto energización, cuskader, percha cinta Bandit, hebillas, conectores
—	3:00	mastil #2	Reflectores		se remalayan 6 refletores, se reponen 70 mts cable AL#6, conectores

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#22

FECHA Abril-23-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
11:00	—	Entrada Urec Frances Condominio Jamaica	19206	NA 70	Cambio Base y fotocelda, Bombilla y 3mts alambre #12
—	—	" " "	19207	NA 70	Base y Fotocelda, Bombilla y 3mts alambre #12
—	—	" " " "	19208	NA 70	Base y Fotocelda, bombilla, 3mts alambre #12. Se realiza descombra
—	—	" " "	20049	NA 150	Se retira en mal estado
—	—	" " " "	15814	NA 150	Reposición, Kit completo, bombilla, conectores, 3mts alambre #12
—	—	" " "	19209	NA 70	Base y Fotocelda, bombilla y 3mts alambre #12
—	—	" " "	14010	NA 70	Se reorienta, Guadua sobre la linea y lineas rotas, se descumbra y
—	3:30	" " "	—	—	Se reponen 70 mts cable AL #6 cambio empalmes, 4 conectores y aislador
—	3:30	" " "	—	—	cambio fotocelda, se normalizan 7 luminarias

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#1

FECHA Abril-21-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arrayave

PLACA VEHICULO WJO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Talleres San Joaquin	—	—	Retiro y Cargue Materiales
8:20	—	Plazoleta Urila Olimpia mastil #1 y #2	Reflectores		Se reparan fomis cable AL #6 red subterranea y se
—	—	" " "			normalizan mastil #1 y #12 12 Reflectores.
—	9:20	mastil #1 y #2 Frente de, frente almacafe Energizacion	Trafo	Manifasico	Cambio Ramal Red Subterranea A Conectores
9:30	—	Via ppal otros de Almacafe hasta la ayuda 30 agosto	11340	NA 150	Fotocontrol disparado. se normali- zan 15 luminarias
—	—	Via ppal otros de Almacafe- hasta el Super Inter	Trafo 0447	#	cierto en red aerea, se normaliza fotocontrol disparado
—	10:20	" " " " "	14199	NA 150	Se cusla cierto en red aerea, cambio de empalmes sollatados
10:30	10:40	La Urila Cra 17 calle 84 frente al parque	20955	NA 150	Cambio Arrancador

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#02

FECHA Abril-12-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
11:50	-	San Fernando mz 19 casa 16 La Playita mz 19 casa 15	Reflector 250W —	NA 150	Cambio Bombilla Cambio fotocelda
—	—	Parque Central mz 19 casa 16 mz 19 casa 12	03891 —	150 —	Cambio Bombilla Sin tension, Cambio fotocelda, conectores
—	—	Parque Central,	09321 —	150 150	Sin tension, cambio conectores Sin tension, cambio conectores
—	—	San Fernando frente mz 19 casa 5 Parque Central	09318 09270	150 150	Cambio fotocelda, conectores Corto Red aerea se templan Lineas
—	—	Parque Central Canchas Multiples	09271 03839	150 Reflector	Cambio fotocelda, se templan Lineas Sin tension cambio Conectores
—	—	Parque Central	23337 12146	150 150	Sin tension, cambio conectores Sin tension, cambio conectores
—	—	Parque Central mz 29 casa 15A	20124 06438	250 150	Cambio Bombilla, conectores Sin tension, cambio conectores
—	—	Parque Central	09324	NA 250	Se retira, cambio balasto, arrancador, condensador, mogul, bombilla
—	—	1a u1 mz 20 casa 13	09128	150W	cambio conectores
—	3:30	u— u mz 20 casa L	0785A	150W	Sn tension cambio fotocelda

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#1

FECHA Abril-12-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	talleres del Municipio	—	—	Retiro y Cargue Materiales
8:20	—	San Fernando La Playita Plazoleta Mz 23	31384	NA 150	cambio Bombilla y fotocelda
—	—	Mz 24 Casa 7	06036 09908	NA 150	Cable Robado, se reponen 12 mts alambre #12, base y fotocelda
—	—	canchas Multiples mz 22 Casa 8	Reflectores		sin tension, cable Robado, se reponen 28 mts cable AL #6 y dos conectores
—	—	" " mz 22 Casa 8	37295 - 37296 37297		Punto energizacion reflectores Dos conectores
—	—	" " mz 21 casa 9	09917	150	Prendida, cambio fotocelda
		mz 21 casa 13	09918	150	cambio bombilla
—	—	mz 21 casa 1	09920	150	corto red aerea, se tempan cables
		frente mz 21 casa 1	17348	150	corto red aerea, se normaliza
—	—	" " mz 21 casa 1	12147	150	corto red aerea, cambio fotocelda
		frente mz 21 casa 1	12259	150	corto red aerea, se normaliza
—	—	" " " "	—	70W	corto red aerea, se normaliza
—	11:30	" " " "	16256	NA-70W	corto red aerea, se normaliza

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#2

FECHA Abril - 11 - 2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WOO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
11:30	—	2500 lotes Independientes M7 7 casa 11	31619	150	Cambio Bombillay fotocelda
—	—	" Rocio M7 25 Casa 17	24128	70	Cambio Balasto, Bombilla, arrancador, Condensador
—	—	" Rocio M7 23 Casa 14	08503	150	Cambio Fotocelda
—	—	" Villa Mana M7 27-28-276	—	—	Cambio dos fotoceldas, se repusieron 50mts cable AL #6
—	—	" " M7 29 Casa 16	00451	150	Cambio Bombilla, Basto, arrancador y condensador
—	2:00	" " M7 30 Casa 10	08529	150	Balasto, bombilla, arrancador condensador

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

FECHA Abril-11-2023

CUADRILLA 01 #2

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Talleres del municipio	—	—	Retiro y Cargue de materiales
8:10	8:50	Via ppal frente a Gama 3 y 2 Alambra	22056 22051	150 150	Cambio Bombilla Cambio Bombilla
8:45	9:00	Via ppal entre Simau 2 y Panorama 2	11450	NA 150	Foto centro disparado se normalizan 12 luminarias
9:10	9:20	Cancha futbol. Padre Valencia Mz 4 Casa 19	Reflectores		Cambio de fotocelda, se normalizan 4 Reflectores
9:30	9:40	2500 Lotes Neira Marquez	08440	NA 150	Cable reventado, 10 mts alambre #12
9:50	10:00	2500 lotes La Granja Mz 10 casa 15	08428	NA 150	Cambio Bombilla
10:10	10:20	2500 Lotes Mz 8 casa 18 independientes	08411	150	Cambio Balasto, Bombilla, arrancador, Condensador y Bombilla
10:30	11:00	" " Independientes Mz 7 casa 11	08419	150	Cambio Bombilla

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

FECHA Abril-10-2023

CUADRILLA 01 #2

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WVO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
1:20	-	El Remanzo mz 41 casa 1	30195	70 NA	cambio Bombilla
		mz 41 Casa 6	05101	70 NA	cambio Bombilla
-	-	frente a mz 36 casa 13	33620	NA 150	cambio Bombilla
-	-	" " " "	30213	NA 70	cambio Bombilla
-	-	frente mz 36 casa 12	30042	NA 150	cambio Bombilla
-	-	mz 47 casa 9A	29179	NA 70	cambio Bombilla y fotocelda
-	-	mz 47 casa 9D	sin marquilla NA - 70		cambio Bombilla y fotocelda
-	3:30	El Remanzo Salida a Guayabal	00816	NA 70	cambio Bombilla frente mz 44 casa 12

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#2

FECHA Marz Abril-10-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Talleres del municipio	—	—	Retiro y Cargue materiales
8:30	—	El Remanzo mz 10 casa 16	29112	150-HA	Cambio Bombilla, condensador y fotocelda
		mz 10 casa 9	29111	150 NA	Cambio Bombilla
—	—	mz 10 casa 3	29109	150 NA	Cambio Bombilla, se reorienta
		mz 40 casa 32	29096	150 NA	Cambio Bombilla
—	—	mz 40 casa 38	29045	150 NA	cambio Bombilla, arrancador y fotocelda
		mz 40 casa 19	29106	150 NA	Cambio Bombilla
—	—	mz 3 casa 18	29156	70 NA	cambio Bombilla
		mz 12 casa 14	29129	70 NA	cambio Bombilla
—	-	El Remanzo mz 12 casa 10	29130	70 NA	Cambio Bombilla, Balasto arrancador y fotocelda
—	—	mz 13 casa 1C	29140	70 NA	cambo fotocelda
		mz 40 casa 3	30123	150 NA	Cambio fotocelda y Bombilla
—	1:00	mz 40 casa 10	30193	150 NA	cambio fotocelda, Bombilla y Balasto.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

FECHA Abril-05-2023 CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	Talleres del Municipio	—	—	Retiro y cargue Materiales
8:30	11:00	Requisa Alumbrado zona Villa Olimpica	—	—	Requisa Redes aereas y Subterraneas
11:10	11:30	III Campi kross Villa Olimpia	—	—	Fotocontrol Disparado, se normalizan 13 repetidoras
12:00	2:00	Talleres del Municipio	—	—	Reparacion y mantenimiento

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01 — Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019 — #2

FECHA Abril-04-2023 — CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry — NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO SWG0-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
1:00	1:30	Perla del Sur Parque frente a la iglesia Católica	Reflectores MH 250		Cambio de 3 bombillas en Tres reflectores
1:40	—	Perla del Sur MZ 10 casa 11	06322	150 NA	cambio balasto, bombilla, arrancador
		MZ 10 casa 25	06320	150 NA	cambio Bombilla
—	—	MZ 12 casa 12	06318	NA	cambio Bombilla
		MZ 12 casa 17	06317	150	Cambio Bombilla
—	—	MZ 9 casa 1	06517	NA	cambio Bombilla
		MZ 9 casa 11	06519	150	Cambio Bombilla
—	—	MZ 3 casa 45	—	70W	cambio fotocelda
		MZ 6 casa 37	06529	150W	cambio Bombilla y fotocelda
—	—	MZ 6 casa 33	03431	NA	cambio Bombilla y fotocelda
		MZ 2 casa 2	06330	150	Cambio Bombilla
—	—	MZ 2 casa 8	06331	150	Cambio Balasto, Bombilla, Arrancador
		Entrada vereda Perla del Sur	06332	150	cambio Bombilla
—	5:30	" MZ 6 " de atenas "	06345	150	Cambe fotocelda, se normalizan 5 lamparas

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#1

FECHA Abril-04-2023 CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arrayave

PLACA VEHICULO SWG0-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	8:00	talleres municipio	—	—	Retird y Cargue Materiales
8:10	8:40	Plazoleta Villa Olimpica mastil #1	—		Breaker disparado. 2mts alambre #12, se normalizan 6 Reflectores
8:50	9:00	San Marcos mz 14 casa 316	06073	NA 150	cambio fotocelda se normalizan 5 luminarias
9:20	—	Perla del sur mz 4 casa 13 frente a la Iglesia	06327 Apoyo	150 NA	cambio bombilla cambio fotocelda, alumenta 3 lamparas
—	—	Perla del Sur frente Iglesia Catolica frente Cancha Multiple	06507	150 NA	cambio fotocelda
			04854	150 NA	cambio Bombilla y fotocelda
—	—	Perla Sur frente Cancha Multiple Cancha Enmallada	02662	150 NA	cambio Bombilla y Fotocelda
			33798	Reflector MH	cambio Balasto, bombilla, arranc
—	—	" " " "	33797	Reflector	cambio bombilla
		" " " "	33799	250W	Cambio Bombilla
—	—	" " " "	33794	250W	se retiran para cambio balasto,
		" " " "	33795	250W	arrancador, bombilla
—	12:45	" " " "	33796	250W MH	Cambio Bombilla

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#2

FECHA Abril-03-2023 CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario echeverry NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
11:30	—	cra 8 # 20-64 cra 8 # 20-39	— 17844	150 150	cambio balasto, arrancador - bombilla Balasto, arrancador y bombilla
—	12:30	cra 9 # 20-37 calle 19 # 4-70	03771 14086	150 150	cambio bombilla Fotocelda, bombilla, arrancador, balasto
12:40	12:50	Barrio Millán Rebio Avda Rio # 27-17	—	150	Cambio bombilla
1:10	—	Cra 7 # 31-03	24888	250 mH	Cambio bombilla, balasto, fotocelda y arrancador
—	2:00	Cra 7 # 30-67	24827	250	Sin tension, Reusar carcamo

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTIVIDADES DIARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO

Version: 01

Fecha de Vigencia: Junio 14 de 2019

#1

FECHA Abril-03-2023

CUADRILLA 01

NOMBRE LINIERO Mario Echeverry

NOMBRE AYUDANTE Ricardo Arroyave

PLACA VEHICULO WGO-457

Hora Inicial	Hora Final	Dirección De La Visita	No Marq	Pot (W)	Actividad Realizada
7:00	7:30	Cra 8 # 16-41	17638	150	Balasto-Bombilla, arrancador cambio LG+ completo FOTOcelda
7:40	8:20	Cra 8 # 16-54	17537	150	Cambio Bombilla
		Cra 8 # 14-33	—	150	Sin tension, revisar carcamo
8:30	—	Cra 8 # 14-71	—	150	Sin tension, revisar carcamo
		Cra 8 # 14-22	18096	150	Cambio Bombilla
—	—	Parque Simon Bolivar Cra 8a calle 20	—	250	Fotocontrol subterraneo
		Cra 7 calle 20 Esquina	—	150	Cambio arrancador
—	—	Cra 7 # 20-38 catedral	—	150	Encendida, cambio fotocelda
		Cra 7 # 23-03	—	150	Cambio fotocelda
—	—	calle 23 # 7-68	21013	150	Sin tension, cambio fotocelda
		" " # 7-40	21014	150	Sin tension, cambio fotocelda
—	—	calle 23 # 7-16	10134	150	Punto energizacion lamparas 21013-21014, 30mts cable AL #6 dos ailadores y watro conectores
—	—	" " " "			
—	—	Cra 8 #23-21	—	150	Sin tension, Revisar carcamo
—	11:20	Cra 8 #21-75	—	150	Sin tension, revisar carcamo
