	Fecha			Informe N° 01 GN2206-2023		
	Día	**Mes**		**Año**		
	31	MAYO		2023		
Tipo de informe:		**Parcial**	X	**Final**		(Marcar con una X la casilla seleccionada)
CONTRATISTA:	GLORIA OLIVA HERRERA					
CONTRATO No.	GN2206 - 2023					
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales en Ingeniería Civil para apoyar los Procesos de estructuración, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de bienes públicos rurales e infraestructura productiva a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Nariño.					
PERIODO DEL INFORME:	Del 1 al 31 de mayo de 2023					

ACTIVIDADES GENERALES EJECUTADAS

1. APOYAR DESDE SU PERFIL PROFESIONAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, FORMULACIÓN, AJUSTES Y OBSERVACIONES A QUE HAYA LUGAR CON RESPECTO A LOS PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

En este mes no se ha requerido apoyo al respecto.

2. BRINDAR CONCEPTOS Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROYECTOS PROPIOS DE SU ÁREA QUE SEAN RADICADOS EN LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

En este mes no se ha requerido apoyo al respecto.

3. BRINDAR APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS Y CONTRATOS DERIVADOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL:

A. **MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, EN PREDIOS DE LOS USUARIOS DE DISTRITO DE RIEGOS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO BPIN 2013000030142.**

Seguimiento situación actual: El proyecto se encuentra en proceso de cierre y en revisión en Secretaria de Planeación

Debido a inconvenientes en tema financiero, de cruce de cuentas y reintegros de valores no se ha podido continuar con el cierre del proyecto.

Se recibe respuesta por parte de planeación Municipal, en el cual manifiestan que el trámite se debe realizar en Secretaria de hacienda, es tema financiero y Jurídico, por lo tanto, en este mes no se apoyado técnicamente.



Libertad y Orden — Gobernación de Nariño — de Planeación

SPD – SGR – 122 – 23

Pasto, 10 de mayo de 2023

Doctor
EDGAR MAURICIO ORTIZ BOTINA
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Departamental
Gobernación de Nariño
Pasto

Ref. Seguimiento / Decreto 804 del 21 de Julio de 2021

Proyectos. BPIN 2013000030142-2013000030147 / "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN PREDIOS DE LOS USUARIOS DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO/ MEJORAMIENTO RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PREDIOS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE RIEGO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

Cordial Saludo

En atención de lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 2056 de 2020, por medio de la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías, los proyectos de inversión que se financien con cargo a este sistema presupuestal serán ejecutados por quien designe las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36 de la presente Ley.

De igual manera se establece que las entidades ejecutoras de recursos del SGR son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la gestión de los proyectos que se requiera e implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos de inversión y decidir, de manera motivada, sobre la continuidad de los mismos, sin perjuicio de las acciones de control a las que haya lugar.

En mérito de lo anterior, el Departamento de Nariño fue designado como entidad ejecutora de los proyectos del asunto y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le asignó la supervisión de los mismos. Para el proyecto identificado con código BPIN 2013000030142, la Subdirección de Control del Departamento Nacional de Planeación adelanta un procedimiento administrativo sancionatorio y correctivo (PACS 312-17) contra el Departamento, el cual se encuentra en el siguiente estado: "*periodo probatorio agotado*".

No obstante, en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal o sus formas, reconocido por el artículo 228 de la Constitución, si se han originado elementos probatorios o evidencias de manera sobreviniente a la etapa probatoria culminada, que coadyuven a demostrar las alegaciones realizadas por esta entidad en el documento de descargos, por favor allegarlas a la Secretaría de Planeación con el fin de que sean incorporadas en el procedimiento sancionatorio mencionado.



Libertad y Orden — Gobernación de Nariño — Secretaría de Planeación

Ahora bien, frente a las posibles inconsistencias que se han presentado en los pagos realizados en los contratos estatales GN1441-13 y GN244 – 15, celebrados para la ejecución de los proyectos del asunto, solicitamos se retome su estudio y análisis con la Secretaría de Hacienda, a fin de continuar con el trámite de reintegro de saldos de los proyectos y sus respectivos cierres. Se advierte que esta dependencia no puede dar aprobación de los proyectos de actos administrativos de reintegro de recursos presentados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras no se dé una solución jurídica y/o financiera a los inconvenientes presentados.

Finalmente, es necesario resaltar que los proyectos ya estarían presentado baja calificación en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, lo que podría representar fuertes sanciones contra el Departamento de Nariño por parte del Departamento Nacional de Planeación, de manera que es necesario y urgente que se tomen las medidas correspondientes para lograr el cierre de ambos proyectos.

Atentamente,

DARÍO ALEXANDER CHÁVES LÓPEZ
Secretario de Planeación Departamental

Proyectó: Darío Cuaspa Ibarra
Contratista SPD – SGR

Revisó: Juan Sarmiento
Contratista SPD-SGR

B. **IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA MUJER RURAL AFECTADA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL COVID19 EN LOS ANDES, NARIÑO.**

Seguimiento situación actual: El convenio se encuentra ejecutado en su totalidad, en proceso de liquidación y cierre.

En este mes no se ha requerido apoyo al respecto.

C. **FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ Y PLÁTANO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑOL Y LOS ANDES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN NO. 2019000030020.**

En este mes no se ha requerido apoyo al respecto.

D. **FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. BPIN NO. 2020000030074.**

ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SUPERVISOR

GLORIA OLIVA HERRERA	APOYAR LOS TRÁMITES DE INGRESO DE LOS EQUIPOS AL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO, TRÁMITE DE PÓLIZAS TODO RIESGO Y ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE COMODATO CON LOS MUNICIPIOS.

Actividades designadas con tres compañeros, se trabajó en grupo y se presentó resultados al Ingeniero Julián Ospina; Solicitud de estatutos de rentas, revisión y Análisis de tarifas para el alquiler de maquinaria verde en los 26 Municipios beneficiarios de proyecto

Formato sugerido creación y/o modificación Estatuto o código de rentas tarida alquiler maquinaria agrícola Recibidos ×

LUZ ESTHER UNIGARRO CÁRDENAS <luzestherunigarro@gmail.com> vie, 26 may, 16:03 (hace 10 días)
para JULIAN, jimenalib, castroleydi2010, daniela2021.juridica, pantojaalexander10, mi, delgadojohnedwin, alcaldia, agricultura, planeación, umata, agropecuarioyt

Estimados
Secretarios de Agricultura
Mpos beneficiarios
Proyecto *"FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN 26 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO*

De acuerdo a la directriz del Supervisor Julian Ospina, me permito en nombre del equipo de compañeros asignados al trámite de estatuto de rentas, remitir a Uds un documento guia Word, para que se adelanten las respectivas mesas de trabajo, de cada Municipio, donde de manera conjunta participen los asesores jurídicos y financieros, para orientar lo referente al trámite solicitado en base a los lineamientos técnicos del Proyecto.

Una vez sean suscritos los comodatos, el documento de tarifas ya se encuentre adelantado para radicación en el consejo, con el fin de optimizar el tiempo requerido.

Para el caso de los siguientes Mpos, que ya cuentan con tarifas establecidas, se sugiere analizar ajustes pertinentes a que haya lugar, especialmente si la tarifa

			Estatuto de rentas tarifas de alquiler maquinaria agricola
1	Sapuyes	Incrementa la tarifa anualmente según el Índice de precios al consumidor IPC, la tarifa incluye accesorios	15/02/2022
2	Ipiales	Calcula según UVT, por veredas y si se alquila con accesorios	22/12/2022
3	Cuaspud Carlosama	La tarifa se calcula en salarios mínimos legales vigentes Según el Índice de inflamación anual, no precisa accesorios	30/11/2021
4	Imues	Fija tarifa por hora y expone que el incremento será de acuerdo al IPC anual, no incluye accesorios	6/12/2022
5	Puerres	Según el incremento de Salario mínimo legal vigente SMLV anual, no especifica accesorios	28/02/2022
6	Contadero	Establece tarifa, pero no especifica el incremento anual, no incluye accesorios	28/12/2022

Agradecemos su atención, cualquier duda, con el mayor gusto.

Atentamente Equipo


Gloria Oliva, Jhon Delgado, Alex Pantoja, Luz Esther Unigarro

E. **FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO Y COMERCIAL, COMO ESTRATEGIA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO RURAL DE LOS PEQUEÑOS CUYICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, en el municipio de Belén. BPID - 317682.**

En este mes no se ha requerido de apoyo profesional, debido a que el proyecto se encuentra suspendido.

F. **MEJORAMIENTO DE LA COMPETIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO BPIN 2013000030122.**

- Revisión de acta de modificación enviada por Interventoría, a través de correo electrónico el día 4 de mayo, se efectuó observaciones y recomendaciones a través de correo electrónico el día 10 de mayo 2023.

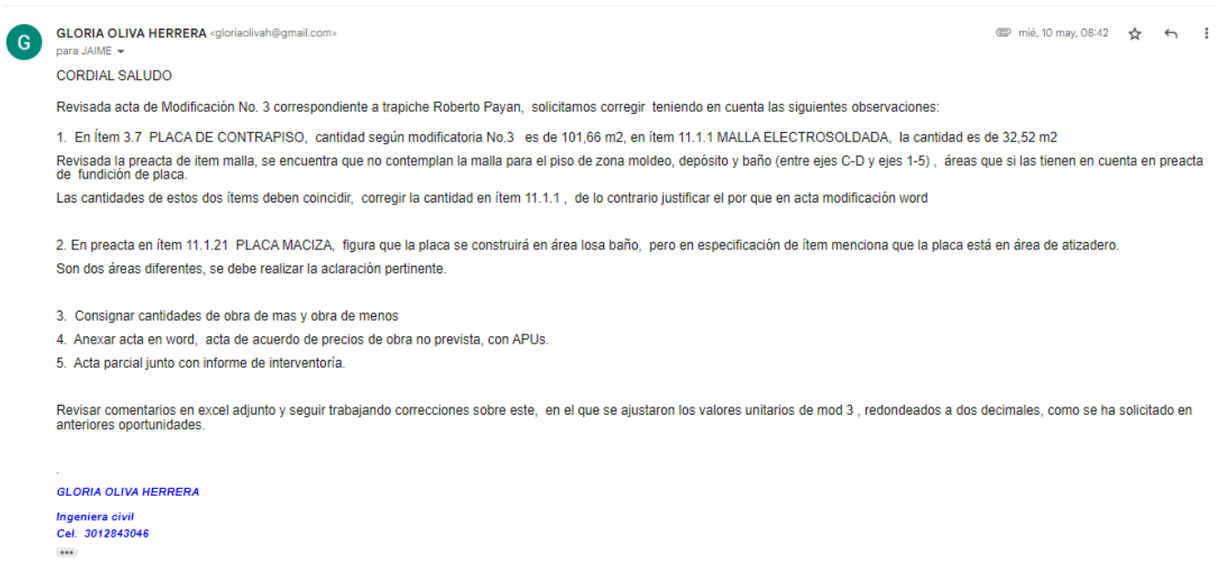

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> mié, 10 may, 08:42
para JAIME

CORDIAL SALUDO

Revisada acta de Modificación No. 3 correspondiente a trapiche Roberto Payan, solicitamos corregir teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

1. En Ítem 3.7 PLACA DE CONTRAPISO, cantidad según modificatoria No.3 es de 101,66 m2, en ítem 11.1.1 MALLA ELECTROSOLDADA, la cantidad es de 32,52 m2

Revisada la preacta de item malla, se encuentra que no contemplan la malla para el piso de zona moldeo, depósito y baño (entre ejes C-D y ejes 1-5) , áreas que si las tienen en cuenta en preacta de fundición de placa.

Las cantidades de estos dos ítems deben coincidir, corregir la cantidad en ítem 11.1.1 , de lo contrario justificar el por que en acta modificación word

2. En preacta en ítem 11.1.21 PLACA MACIZA, figura que la placa se construirá en área losa baño, pero en especificación de ítem menciona que la placa está en área de atizadero.


Son dos áreas diferentes, se debe realizar la aclaración pertinente.

3. Consignar cantidades de obra de mas y obra de menos
4. Anexar acta en word, acta de acuerdo de precios de obra no prevista, con APUs.
5. Acta parcial junto con informe de interventoría.

Revisar comentarios en excel adjunto y seguir trabajando correcciones sobre este, en el que se ajustaron los valores unitarios de mod 3 , redondeados a dos decimales, como se ha solicitado en anteriores oportunidades.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

- Revisión de acta de modificación enviada por Interventoría e Ing Jaime, a través de correo electrónico el día 15 de mayo, se efectuó observaciones y recomendaciones a través de correo electrónico el día 16 de mayo 2023.

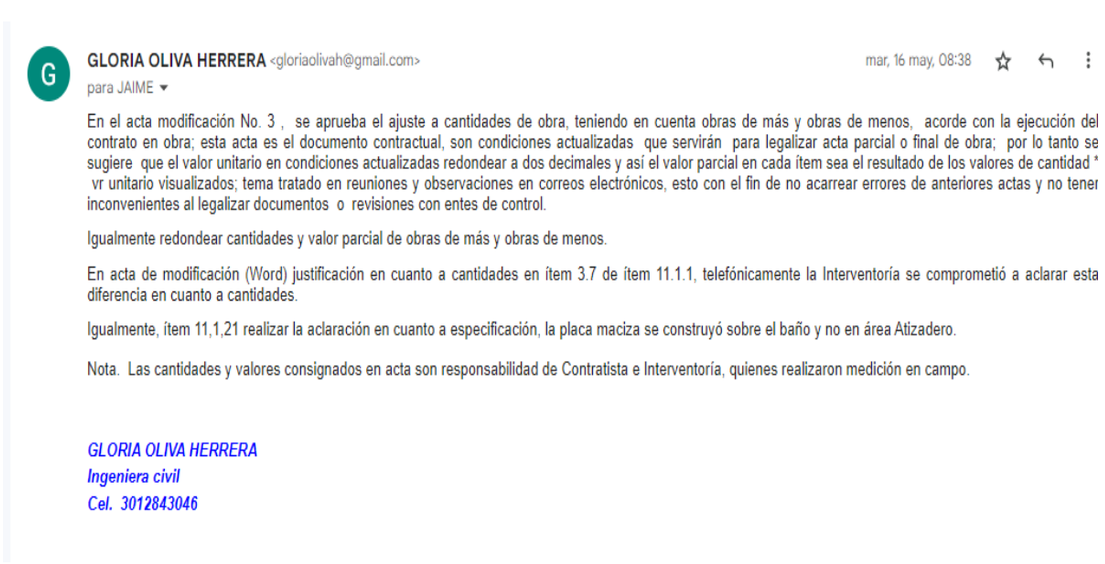

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> mar, 16 may, 08:38
para JAIME

En el acta modificación No. 3 , se aprueba el ajuste a cantidades de obra, teniendo en cuenta obras de más y obras de menos, acorde con la ejecución del contrato en obra; esta acta es el documento contractual, son condiciones actualizadas que servirán para legalizar acta parcial o final de obra; por lo tanto se sugiere que el valor unitario en condiciones actualizadas redondear a dos decimales y así el valor parcial en cada ítem sea el resultado de los valores de cantidad * vr unitario visualizados; tema tratado en reuniones y observaciones en correos electrónicos, esto con el fin de no acarrear errores de anteriores actas y no tener inconvenientes al legalizar documentos o revisiones con entes de control.

Igualmente redondear cantidades y valor parcial de obras de más y obras de menos.

En acta de modificación (Word) justificación en cuanto a cantidades en ítem 3.7 de ítem 11.1.1, telefónicamente la Interventoría se comprometió a aclarar esta diferencia en cuanto a cantidades.

Igualmente, ítem 11,1,21 realizar la aclaración en cuanto a especificación, la placa maciza se construyó sobre el baño y no en área Atizadero.

Nota. Las cantidades y valores consignados en acta son responsabilidad de Contratista e Interventoría, quienes realizaron medición en campo.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

Fwd: ACTA MODIFICATORIA 3 ROBERTO PAYAN Recibidos ×

JAIME ANDRES ALVEAR BOLANOS vie, 19 may, 12:12
INGE BUEN DIA POR FA ME PUEDE DAR LA APROBACION DE LA MODIFICATORIA 3, QUE ASI LO PIDE LA INTERVENTORIA GRACIAS ---------- Forwarded ...

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> vie, 19 may, 14:44
para JAIME

CORDIAL SALUDO

REVISADA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3, CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN TRAPICHE ROBERTO- PAYAN, SE ENCUENTRAN SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, PROCEDER CON LA LEGALIZACIÓN DE LA MISMA.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

- Revisión presupuesto para adición contratos Costa

Fwd: Recursos adicionales instalación equipos trapiches costa Recibidos ×

JAIME ANDRES ALVEAR BOLANOS vie, 26 may, 10:01 (hace 10 días)
para mí

INGE GLORIA BUEN DIA, POR FA ME PUEDE REVISAR ESTE PRESUPUESTO, SI REALMENTE SE AJUSTARIA A LAS CONDICIONES DE ROBERTO Y MAGUI PAYAN MAS QUE TODO EN PRECIOS DE MANO DE OBRA Y PRECIOS

MUCHAS GRACIAS

---------- Forwarded message ---------
De: <gsilva@fedepanela.org.co>
Date: jue, 25 may 2023 a las 15:26
Subject: Recursos adicionales instalación equipos trapiches costa
To: Jaimealvear <jaimealvear@narino.gov.co>, Fedepanelainterventoria <fedepanelainterventoria@gmail.com>

Buena tarde.

Remito el presupuesto de lo referente en el asunto para su consideración.

--
Cordialmente.

GERMAN SILVA SANTANDER

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> vie, 26 may, 18:06 (hace 10 días)
para JAIME

CORDIAL SALUDO

LA CANTIDAD DE MATERIALES ES MÍNIMA PARA CONSTRUIR LAS ACTIVIDADES QUE FALTAN EN OBRA, POR LO TANTO SE PUEDE ADQUIRIR EN FERRETERÍAS DEL MUNICIPIO DE BARBACOAS, SE ANEXA VALORES DE FERRETERÍA DE LA REGIÓN, COTIZACIÓN REALIZADA TELEFÓNICAMENTE.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES SE DEBE RECONSIDERAR DEBIDO A QUE LA DISTANCIA HASTA EL SITIO DE LA OBRA DISMINUYE.

PARA EVALUAR EL VALOR DE MANO DE OBRA, PRESENTAR LAS COTIZACIONES A QUE HACE REFERENCIA EN EL ARCHIVO EXCEL

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

- Revisión actas Planta Mallama

Fwd: MODIFICACIÓN PLANTA MALLAMA Recibidos ×

JAIME ANDRES ALVEAR BOLANOS vie, 26 may, 10:12 (hace 10 días)
INGE POR FA UNA REVISION AL TEMA DE MALLAMA PARA QUE PUEDAN TRAMITAR LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS GRACIAS --------- Forwarded message --------- De: interv…

GLORIA OLIVA HERRERA vie, 26 may, 17:24 (hace 10 días)
CORDIAL SALUDO REVISADA ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2 CORRESPONDIENTE A PLANTA DE MALLAMA, SE ENCUENTRA UN DIFERENCIA EN VALOR ACTA MODIFICACIÓN …

JAIME ANDRES ALVEAR BOLANOS lun, 29 may, 09:32 (hace 7 días)
inge Por fa dar visto bueno. Date: lun, 29 may 2023 a las 9:24 Subject: Re: MODIFICACIÓN PLANTA MALLAMA To: JAIME ANDRES ALVEAR BOLANOS <jaimealvear@narino.gov.

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> lun, 29 may, 10:58 (hace 7 días)
para interventoría, JAIME

CORDIAL SALUDO

REVISADA ACTA DE MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A PLANTA DE MALLAMA, SE ENCUENTRAN SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES REALIZADAS, **PROCEDER CON LA LEGALIZACIÓN DE LA MISMA**.

NOTA. LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN ACTA SON RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA, QUIENES REALIZARON MEDICIÓN EN CAMPO

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

- Reunión proyecto 122, con Fedepanela, supervisor ingeniero Jaime Alvear el 20 de mayo en Secretaria de planeación y Fedepanela, supervisor e Interventoría el 29 de mayo de 2023

Fwd: Citación reunión contrato 019 Recibidos ×

JAIME ANDRES ALVEAR BOLANOS lun, 29 may, 14:25 (hace 7 días)
para mí

INGE POR FA ME ACOMPAÑA MAÑANA A UNA REUNION

GRACIAS

---------- Forwarded message ---------
De: <gsilva@fedepanela.org.co>
Date: lun, 29 may 2023 a las 12:50
Subject: Citación reunión contrato 019
To: Trapiche Roberto-Magüi <trapicherobertomagui@gmail.com>, Ingenieramariarodriguezb <ingenieramariarodriguezb@gmail.com>
Cc: Jaimealvear <jaimealvear@narino.gov.co>, Fedepanelainterventoria <fedepanelainterventoria@gmail.com>, Cmarin <cmarin@fedepanela.org.co>, Juridica <juridica@fedepanela.org.co>


Atento saludo.

Por medio del presente me permito citar a reunión de carácter urgente para tratar el tema mencionado en el asunto, atendiendo los compromisos adquiridos en la reunión del pasado viernes 26 de mayo del presente en el Departamento de Planeación de la Gobernación de Nariño.

Es indispensable la presencia del Supervisor por parte de Gobernación de Nariño y la Interventoría del Convenio 586-15, además de la contratista María Rodríguez, con el fin de avanzar en lo pactado.

Agradezco la presencia a las 10 de la mañana, oficina Fedepanela Pasto, cra 23 No 13 -112 apto 202 Barrio Santiago

G. **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS BPM Y TICS EN LA CADENA DE MANIPULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS PLAZAS DE MERCADO PARA LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO GENERADO POR LA PANDEMIA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, en los municipios de Pasto Ipiales y Tumaco.**

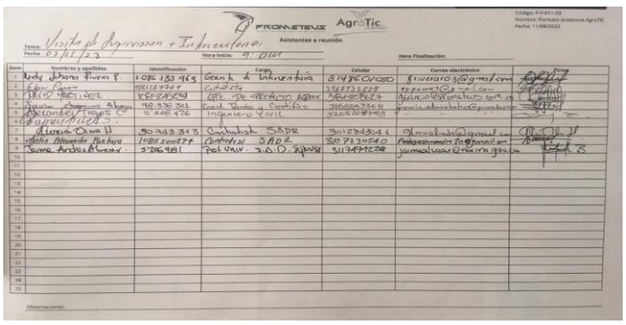

VISITA CENTRO DE ACOPIO AGROTICS EN IPIALES - 2 DE MAYO

Verificación de subsanación de observaciones realizadas en componente adecuaciones en infraestructura.





VISITA CENTRO DE ACOPIO AGROTICS EN PASTO - 4 DE MAYO

Verificación y revisión componente adecuaciones en infraestructura.



Revisión de documentos, componente infraestructura, informes y actas de las Adecuaciones de los centros de acopio de los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco. (evidencia correos electrónicos)

REVISION DOCUMENTOS CENTROS DE ACOPIO - AGROTICS

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> mar, 23 may, 11:38 (hace 13 días)
para ljriverar03, JAIME

CORDIAL SALUDO

REVISADA DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR WHATSAPP, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE DE ADECUACIONES EN EDIFICACIONES DONDE FUNCIONAN LOS CENTROS DE ACOPIO, ME PERMITO ENVIAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN PREACTA **NO** COINCIDEN CON CANTIDADES ACTUALIZADAS EN ACTA MODIFICACIÓN, FALTA UBICACIÓN O DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA, ADEMÁS FALTAN ITEMS POR PLASMAR EN PREACTA.

- FALTAN APUs DE ITEMS NO PREVISTOS Y EL CAPÍTULO UNO, IGUALMENTE LOS VALORES **NO** CORRESPONDEN A PRECIOS UNITARIOS DEL ACTA DE MODIFICACIÓN.

- EN ENCABEZADO DE ACTAS - EN ALGUNA CELDA INCLUIR A QUÉ CENTRO DE ACOPIO CORRESPONDE DICHA ACTA.

ADJUNTO EL EXCEL DE CENTRO DE ACOPIO DE IPIALES EN DONDE SE INSERTÓ ALGUNOS COMENTARIOS, TENER EN CUENTA EN LAS ACTAS DE LOS OTROS CENTROS PARA CORRECCIONES.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

REMISIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ADECUACIONES Recibidos ×

PROMETEUS SOLUCIONES sáb, 27 may, 11:19 (hace 9 días)
Ingeniera Gloria Oliva Cordial saludo Comparto con usted la información relacionada con las modificaciones desarrolladas a las actas de cada centro de acopio de

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> lun, 29 may, 11:28 (hace 7 días)
para JAIME, PROMETEUS


Cordial saludo

Revisada la documentación enviada, correspondiente a las adecuaciones de los centros de acopio en Ipiales, Pasto, Tumaco; me permito presentar las siguiente observaciones:

- Valor de Apu ítem 2.10 Estuco plástico para muros, no coincide con el valor consignado en acta de modificación $ 9500. en APU $ 9562,50
- Valor Apu ítem 2.2 Pintura epoxica.. en APU $ 39936,19 en acta $ 38500
- Falta APU Ítem 2.5 Divisiones en Aluminio, es item contractual debe estar este análisis.
- Faltan APUs, de capítulo 1, Diseño de adecuaciones locativas
- Valor Ítem 3.1 en APU $ 138500 en acta $ 132800
- Corregir en Acta parcial, item 2,2 la especificación es PINTURA EPOXICA PARA MUROS Y NO ANTIBACTERIAL (NO PREVISTO)
- Preactas incompletas.
- En Acta parcial Centro acopio de Pasto, corregir en condiciones originales, el valor no corresponde al contratado $ 35.838.744,58 vr. contratado $ 30.046.188,58.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

REUNIÓN AGROTIS. REVISIÓN DE ACTAS - 30 MAYO

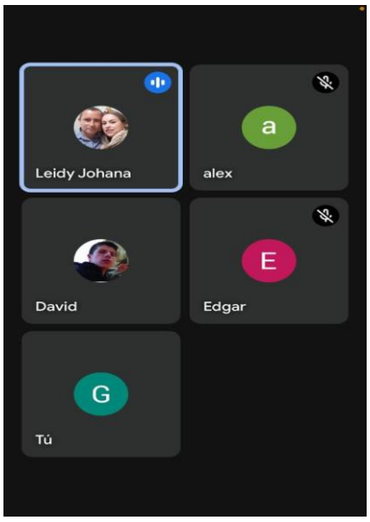

5. APOYAR A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, ASESORANDO DESDE SU PERFIL PROFESIONAL, EN EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS, PROYECTOS, COMITÉS, ETC.:

a) AFECTACIONES CLIMÁTICAS
b) COMITÉ GESTION DE RIESGOS
c) UMATAS
d) RIEGOS
e) BIENES PÚBLICOS DEL PLAN DE DESARROLLO

a) AFECTACIONES CLIMÁTICAS

VISITA DE EVALUACION DE DAÑOS POR EMERGENIA TEMPORADA DE LLUVIAS EN MUNICIPIO DE LA CRUZ Y SAN BERNARDO NARIÑO - 3 DE MAYO



RESPUESTA A DERECHO DE PETICION - AFECTACIONES CLIMATICAS EN LA CRUZ NARIÑO

Fwd: DERECHO DE PETICIÓN- PARA RESPUESTA :) Recibidos ×

JAIRO ANDRES ACOSTA NARVAEZ lun, 8 may, 10:30
Buen día compañeros, Recibimos una petición en virtud de las diferentes emergencias ocasionadas por ola invernal, cierre vial y desastres naturales; en tal sent

JAIRO ANDRES ACOSTA NARVAEZ lun, 8 may, 10:31
---------- Forwarded message --------- De: JAIRO ANDRES ACOSTA NARVAEZ <jaironarvaez@narino.gov.co> Date: lun, 8 may 2023 a las 10:29 Subject: Fwd: DERECHO DE P

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> mar, 9 may, 08:59
para JAIRO

CORDIAL SALUDO

SE ADJUNTA EN OFICIO (RESALTADO GRIS) LAS ACCIONES EJECUTADAS DESDE SECRETARIA DE AGRICULTURA, FRENTE A LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Pasto, 08 de mayo de 2023

Señores
COMITÉ CIVICO POR LA CRUZ
ferchofigueroa@gmail.com
3116563117

Ref. Contestación derecho de petición con radicado No. 2256 de fecha 03 de mayo de 2023.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el derecho de petición incoado por ustedes el día 03 de mayo de 2023, bajo el número de radicado interno 2256, frente a sus peticiones, me permito informar lo siguiente:

Desde la secretaría de Agricultura y Desarrollo rural del departamento, se realizó visita técnica el día 3 de mayo de 2023, al Corregimiento de San Gerardo del Municipio de la Cruz, con profesionales de esta dependencia junto con profesionales de Unidad de asistencia técnica agropecuaria -UMATA, con el fin de hacer un reconocimiento y evaluación de las afectaciones, debido a las fuertes lluvias en el mes de abril del presente año, las cuales generaron graves emergencias en el sector agropecuario.

En dicha visita, se solicitó la entrega del censo de identificación y caracterización de productores agropecuarios afectados por ola invernal, el acta de gestión riesgo Municipal, reporte agropecuario junto con informe y registro fotográfico. El día 8 de mayo se recepciona información a través de correo electrónico de Coordinador de Umata de su municipio; se procederá a revisar y consolidar dicha información con el fin de gestionar ante el Ministerio de Agricultura se incluyan a productores afectados en programas o proyectos, acceder a alivios financieros, líneas especiales de crédito y así poder mitigar en parte el impacto ocasionado la temporada invernal.

DELEGACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS GESTION DE RIESGOS - REUNION 19 DE MAYO





PROYECTOS PARA GESTIÓN DEL RIESGO Recibidos ×

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> vie, 12 may, 11:03
para PEDRO, EDGAR, arqjuliootero

Ingeniero:
PEDRO GAVIRIA MUÑOZ
Subsecretario asuntos agropecuarios
Secretaría de agricultura.

Cordial saludo

De acuerdo a compromisos adquiridos en Consejo Departamental de Gestión de riesgos y atendiendo directrices del señor Secretario de Agricultura Ing. Mauricio Ortiz, solicito a usted comedidamente nos colabore en la conformación de un equipo técnico para estructurar los siguientes proyectos, los cuales están aprobados en plan de acción específico de Gestión del Riesgo:

1. Fortalecimiento de cultivos como respuesta a la afectación por la segunda temporada de lluvias -fenómeno de la niña 2022, apoyo DE **KITS DE INSUMOS AGROPECUARIOS** para los Municipios de Albán, Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Colon, Consaca, Córdoba, Cuaspud, Cumbal, El Tambo, Funes, Guachucal, Guaitarilla, Ipiales, La Cruz, La Florida, La Unión, Linares, Los Andes, Mallama, Olaya Herrera, Ospina, Policarpa, Potosí, Providencia, Pupiales, Roberto Payan, Samaniego, San Bernardo, San Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Sandoná, Santa Cruz de Guachavez, Sapuyes, Tablón de Gómez, Taminango, Tangua del departamento de Nariño.

2. Fortalecimiento de los **MERCADOS CAMPESINOS**, para la disminución del impacto generado por temporada de lluvias -fenómeno de las Niña en los Municipios de de BUESACO, CONSACA, EL TAMBO, FUNES, LA FLORIDA, LA UNIÓN, LOS ANDES, OSPINA, SAN LORENZO, SAN PABLO, TAMINANGO, TANGUA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

3. Fortalecimiento de la Agroindustria y la **COMERCIALIZACIÓN DE FORMA ANCESTRAL DEL SECTOR PANELERO** del Municipio de Consaca, Ancuya, Sandoná, Linares, Ricaurte y Mallama del Departamento de Nariño

4. **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS BPM Y TICS EN LA CADENA DE MANIPULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN LAS PLAZAS DE MERCADO** para la disminución del impacto generado por temporada de lluvias o fenómeno de la Niña en los Municipios Ancuya, Arboleda, Belén, Buesaco, Colon, Consaca, El Tambo, Funes, La Unión, Linares, Los Andes, Ospina, Policarpa, Potosí, Pupiales, Samaniego, Sn Lorenzo, San Pablo, San Pedro de Cartago, Tablón de Gómez, Taminango, Tangua del departamento de Nariño

Agradeciendo la atención a la presente solitud.

GLORIA OLIVA HERRERA
Profesional Apoyo
SADR

PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com> vie, 26 may, 10:55 (hace 10 días)
para PEDRO


Cordial saludo

ingeniero por favor desde su correo enviar los proyectos , a los profesionales para la estructuración de los mismos


GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

2 archivos adjuntos · Analizado por Gmail





REUNIÓN VIRTUAL TEMA MERCADOS CAMPESINOS DE GESTIÓN DEL RIESGO - 30 MAYO

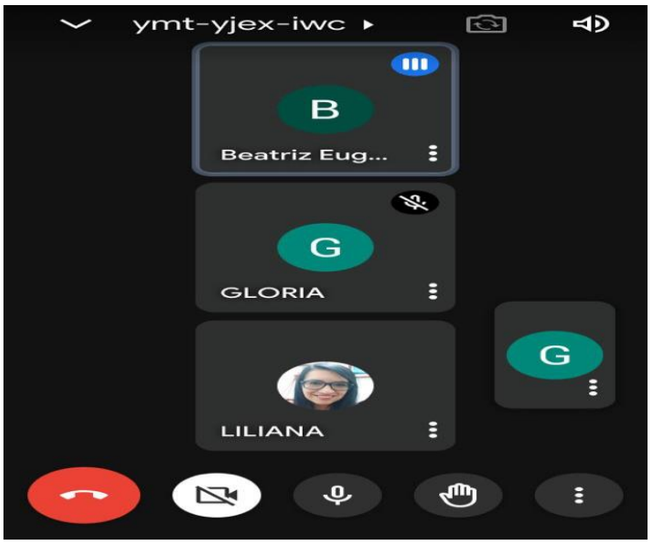


DAR RESPUESTA A SOLICITUDES DE AFECTACIONES CLIMATICAS VIA WHATSAPP Y CORREOS.

Revisión de documentación de reporte de afectaciones por temporada de lluvias en municipios de Nariño - se realizan observaciones para su correspondiente corrección de información.
Se consolida información en archivo Excel.





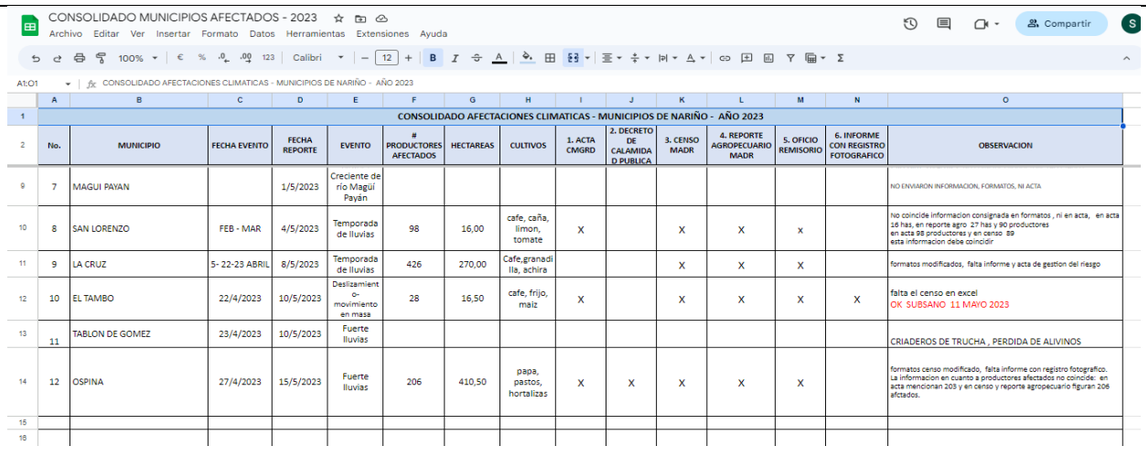

CONSOLIDADO MUNICIPIOS AFECTADOS - 2023

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

Compartir

A1:O1 | CONSOLIDADO AFECTACIONES CLIMATICAS - MUNICIPIOS DE NARIÑO - AÑO 2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	CONSOLIDADO AFECTACIONES CLIMATICAS - MUNICIPIOS DE NARIÑO - AÑO 2023														
2	No.	MUNICIPIO	FECHA EVENTO	FECHA REPORTE	EVENTO	# PRODUCTORES AFECTADOS	HECTAREAS	CULTIVOS	1. ACTA CMGRD	2. DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA	3. CENSO MADR	4. REPORTE AGROPECUARIO MADR	5. OFICIO REMISORIO	6. INFORME CON REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION
9	7	MAGUI PAYAN		1/5/2023	Creciente de rio Magüí Payán										NO ENVIARON INFORMACION, FORMATOS, NI ACTA
10	8	SAN LORENZO	FEB - MAR	4/5/2023	Temporada de lluvias	98	16,00	cafe, caña, limon, tomate	X		X	X	x		No coincide informacion consignada en formatos , ni en acta, en acta 16 has, en reporte agro 27 has y 90 productores en acta 98 productores y en censo 89 esta informacion debe coincidir
11	9	LA CRUZ	5- 22-23 ABRIL	8/5/2023	Temporada de lluvias	426	270,00	Cafe,granadilla, achira			X	X	X		formatos modificados, falta informe y acta de gestion del riesgo
12	10	EL TAMBO	22/4/2023	10/5/2023	Deslizamiento- movimiento en masa	28	16,50	cafe, frijo, maiz	X		X	X	X	X	falta el censo en excel OK SUBSANO 11 MAYO 2023
13	11	TABLON DE GOMEZ	23/4/2023	10/5/2023	Fuerte lluvias										CRIADEROS DE TRUCHA , PERDIDA DE ALIVINOS
14	12	OSPINA	27/4/2023	15/5/2023	Fuerte lluvias	206	410,50	papa, pastos, hortalizas	X	X	X	X	X		formatos censo modificado, falta informe con registro fotografico. La informacion en cuanto a productores afectados no coincide: en acta mencionan 203 y en censo y reporte agropecuario figuran 206 afctados.
15															
16															

b) COMITÉ GESTION DE RIESGOS

REUNIÓN CONCEJO DE GESTIÓN DEL RIESGO, POR TEMPORADA DE LLUVIAS.

ELABORACION DE PRESENTACION DEL INFORME A CONSEJO DE GESTION DEL RIESGO - 8 DE MAYO



PRESENTACIÓN PARA GESTIÓN DEL RIESGO - SEGUIMIENTO PAE

GLORIA OLIVA HERRERA <gloriaolivah@gmail.com>
para AGRICULTURA

lun, 8 may, 10:50

CORDIAL SALUDO

En atención a la CIRCULAR 018 – 2023 de DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DEL RIESGO, se adjunta la presentación del avance al Plan de Acción Específico de La Secretaria de Agricultura y la matriz de seguimiento.

Ingeniero por favor revisar la diapositiva 14 - 15 -16 , donde están los proyectos de los cuales no tenemos avance.

GLORIA OLIVA HERRERA
Ingeniera civil
Cel. 3012843046

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

SEGUIMIENTO PA...

PLAN DE ACCION...

4. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO MENSUALIZADO, DISCRIMINADO LAS ACTIVIDADES POR SEMANA, DEFINIENDO ACTIVIDADES, INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN, DENTRO DE LOS DOS (2) PRIMEROS DÍAS HÁBILES DE MES, CON EL RESPECTIVO VISTO BUENO DE LOS PROFESIONALES CON LOS CUALES REALIZA LABORES

PLAN DE TRABAJO MENSUALIZADO, MES DE MAYO; PRESENTADO AL SUPERVISOR JAIME ALVEAR

5. PRESENTACIÓN DE UN INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES EN MEDIO MAGNÉTICO.

SE PRESENTA EL PRESENTE INFORME MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON EVIDENCIA O SOPORTES DE LO EFECTUADO.

6. LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y QUE ESTÉN ACORDES CON EL OBJETO CONTRACTUAL.

OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS:

REUNION EN ASAMBLEA Y CAMARA DE COMERCIO - TEMA DISTRITO DE RIEGO PAZ VERDE - 9 Y 10 MAYO





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

SOPORTES DOCUMENTALES

CONTRATISTA	**FIRMA**
GLORIA OLIVA HERRERA	
VO.BO. SUPERVISOR	**FIRMA**
JAIME ANDRES ALVEAR BOLAÑOS	

REVISÓ	**FIRMA**
ING. JULIAN OSPINA GIRÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
DR. JAIRO ANDRÉS ACOSTA PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
