CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 435 DE 2022 N° Folios 90

"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE PAIPA

INFORME DE INTERVENTORIA N°3

18-01-2023 hasta 17-02-2023

INTERVENTORIA: CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ

C.C N° 4.051.028

CONTRATISTA DE OBRA: CONVENIO N°11- 2022

RED VITA PAIPA PAIPA S.A ESP

NIT: 900259348-5

R/L TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA

INTERVENTORIA
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONSORCIO INTERVENTORIA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES	3
2. AVANCE DEL PROYECTO – ACTIVIDADES EJECUTADAS-AVANCE N°3	5
3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA	9
4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA	11
5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA	15
6. CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	16
7. ANEXOS: ACTAS DE COMITÉ ACTAS DE VECINDAD	17

1. GENERALIDADES

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	435 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."
CONTRATISTA	R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ.
C.C	4051028
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.298.800,62
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 62/100 M/CTE.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	10 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	29 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1	18 ENERO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N° 1	27 DE ENERO DE 2023 UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO MAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	17 MARZO DE 2023

2. AVANCE DEL PROYECTO

A. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

En este periodo de tiempo la empresa RD VITAL PAIPA S.A.E.S.P adelanta las siguientes actividades de acuerdo a la programación, suministro de materiales y mano de obra con la que cuentan actualmente:

CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO CARRERA 17- PAIPAN ENTRE CALLES 25 Y 26

Cerramiento en vara rolliza y lona H= 1.50 con una distancia entre postes de 2 m





Demolición pavimento asfaltico E<= 10 cm incluye cargue y transporte hasta 5 KM



Excavación de cortes y canales sin clasificar incluye acarreo libre de 5KM para hacer reposición de la red de alcantarillado principal por tubería PVC D= 18" y para acometidas por tubería PVC D= 6"





Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

Relleno para redes en arena de peña (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) piso- atraque y recubrimiento.



Relleno con material de afirmado compactado con plancha vibradora.




Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC D= 18"



Retiro de tubería existente en concreto diámetro pulgadas


Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

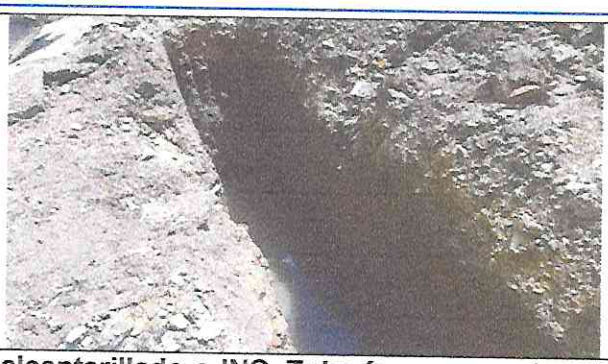

Conexión domiciliaria alcantarillado o INC. Tubería y accesorios de conexión tubería a la red principal de alcantarillado.



REPORTE DE % DE AVANCE

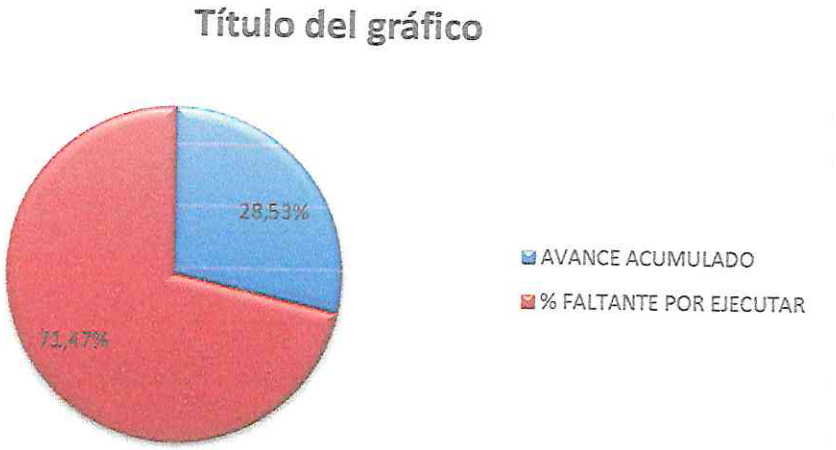

A la fecha del presente informe se cuenta con un avance acumulado del 28,06%.

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA :

- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE CONTRATISTA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

INGENIERO
JOSE UBALDO CASTRO
Secretario de infraestructura pública y movilidad
Supervisor
Alcaldía municipal de Paipa

REFERENCIA: CONVENIO N° 011 DE 2022 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE TRABAJO DE OBRA

Yo, Carlos Eduardo Robles Sáenz, en mi calidad de interventor del contrato en referencia certifico que la empresa Red Vital Paipa ha realizado las afiliaciones y pagos correspondientes al sistema de seguridad social del recurso humano que participó en las actividades preliminares que se ejecutaron en este periodo de tiempo, los cuales se encuentran subrayados en la planilla de enero adjunta por el contratista de obra.

Cordialmente

R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

CARGO	NOMBRE	% DEDICACION
DIRECTOR	CLAUDIA ROCIO SUAREZ	50%
RESIDENTE	SANDRA PAOLA LÓPEZ VEGA	100%

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52351443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 11 75-22	TELÉFONO:	3208029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4483906091	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	661125

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0		$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0		$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																															PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52351443	SUAREZ CASTILLO CLAUDIA ROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	52351443	$ 6.100	$ 0	$ 1.160.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118553015
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA PAOLA LOPEZ VEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	260520 - SANDRALOPEZ
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	5247964164		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/02/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		47964164

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 185.600	$ 900	$ 186.500
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 900	$ 186.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 145.000	$ 700	$ 0	$ 145.700
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 700	$ 0	$ 145.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 23.200	$ 200	$ 23.400
SUBTOTALES:			$ 23.200	$ 200	$ 23.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118553015	LOPEZ VEGA SANDRA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 111855301	$ 6.100	30	$ 1.160.000	$CCF10-COMFABOY	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 361.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO
CONTRATO DE OBRA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: crobiessaenz@gmail.com

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 631,126,448,69	
VALOR APORTE CONTRAPARTE	$ 70,125,160,97	
PAGO DE ANTICIPO (50%) (Recursos municipio) (29-11-2022)		$ 315,563,224.35
SALDO SIN EJECUTAR MUNICIPIO		$ 315,563,224.35
SALDO SIN EJECUTAR CONTRAPARTE		$ 70,125,160,97
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 701,251,609.66	$ 701,251,609.66

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: crobiessaenz@gmail.com

6. CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTIAS

Mediante la presente certifico que las pólizas y garantías hasta la fecha del presente informe se encuentran vigentes y pendientes por aprobar. Tal como se evidencia en la plataforma secop 2.

R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

7. ANEXOS:

✓ACTAS COMITÉS
✓ACTAS DE VECINDAD

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

COMITÉ N° 1

CONVENIO 030 2021:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA –BOYACA.
LUGAR:	Alcaldía de Paipa.
FECHA:	23-enero-2023.
HORA DE INICIO/ CULMINACIÓN	4:30pm - 5:50pm.

TEMAS A TRATAR
- Compromisos.

DESARROLLLO DE LA REUNIÓN
- Vía Se ha avanzado en la Cra 17, se solicita las caracterizaciones, densidades.
- Es importante la comisión topográfica para identificar las aguas para donde se direcciona
+ El lunes se remiten con la carpeta, este fin de semana se abre la vía.
- Primera semana de febrero. ya esta terminada la Cra 17.

- Solicitud permiso y cronograma. actualizado (martes 24 enero - 2023).

- En la ubicación de la UAT, se hace recomendaciones por parte de la interventoría para que no se haga una capa y al mismo frente un pozo, por lo tanto se propone una capa con dos niveles.

- Se recomienda cumplimiento de seg social para los trabajadores. y elementos de protección personal.

- Oficializar a gestión de riesgos, por las inundaciones presentes en los frentes de trabajo.

PARTICIPANTES			
NOMBRES	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Nassim Sidman Montañez	Red Vital	Residente de Obra	
Judy Corchuelo	Red Vital Paipa	Subgerente Operativa	
Dayana Camargo	Red Vital Paipa	Profesional Gestión Ge.	
Carolina Núñez Castillo	Alcaldía Paipa	Asesor Planeación	
Ubaldo Castro	ALC/ Paipa	Sec Infra/	
Karol Bernal	Alc Paipa	Sec Infra	
Carlos Robles	Contratista	Rep. Legal Interv	

COMITÉ N° 2

CONVENIO 030 2021:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICION DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA.
LUGAR:	Alcaldía Municipal.
FECHA:	30-ENE-2023
HORA DE INICIO/ CULMINACIÓN	6:10pm - 6:05pm

TEMAS A TRATAR
- Verificación Compromisos anteriores - Compromisos.

DESARROLLLO DE LA REUNIÓN
- Se verifica el cumplimiento de compromisos, y se evidencia que se solicito prórroga al contrato
- Se realiza recomendación por parte de interventoría. refuerzo el cerramiento de la Cra 17.
- Se realiza la solicitud del informe de obra.

Red Vital

CONSORCIO INTERACUEDUCTO
CHORRO BLANCO

COMPROMISOS
Ajustar cronograma con respecto a prórroga.
Actualizar gestión de riesgo?..
Seg. social - afiliaciones.
Presentación de informes.
Arreglar tubería potable OAT.


PARTICIPANTES			
NOMBRES	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Hernan Mesa Sabogal	Red Vital	Residente de Obra	
Lindy Cochuelo Vera	Red Vital Paipa	Subgerente Operativa	
Karol Benavides	Alcaldía de Paipa	Prof. Apoyo	
Carlos Quintero	Consultoría Interventoría	Rep. Legal	
Sandra Díaz.	Interventoría.	Interventora	

COMITÉ N° 3

CONVENIO 010 2021:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA –BOYACA.
LUGAR:	Alcaldía de Paipa.
FECHA:	06 Febrero 2023.
HORA DE INICIO/ CULMINACIÓN	4:30 pm. - 6:05pm.

TEMAS A TRATAR
- Varios.

DESARROLLLO DE LA REUNIÓN
- Por parte de Interventoria se sugiere que el cerramiento de la vía intervenida en la Cra 17. quede fijo a borde de anden. debido a que interventoria evidencia Cerramiento Caído y es más perjudicial para el peatón que lo que protege.
- Se recomienda por parte de Interventoria. compactar. con el material totalmente Saturado.

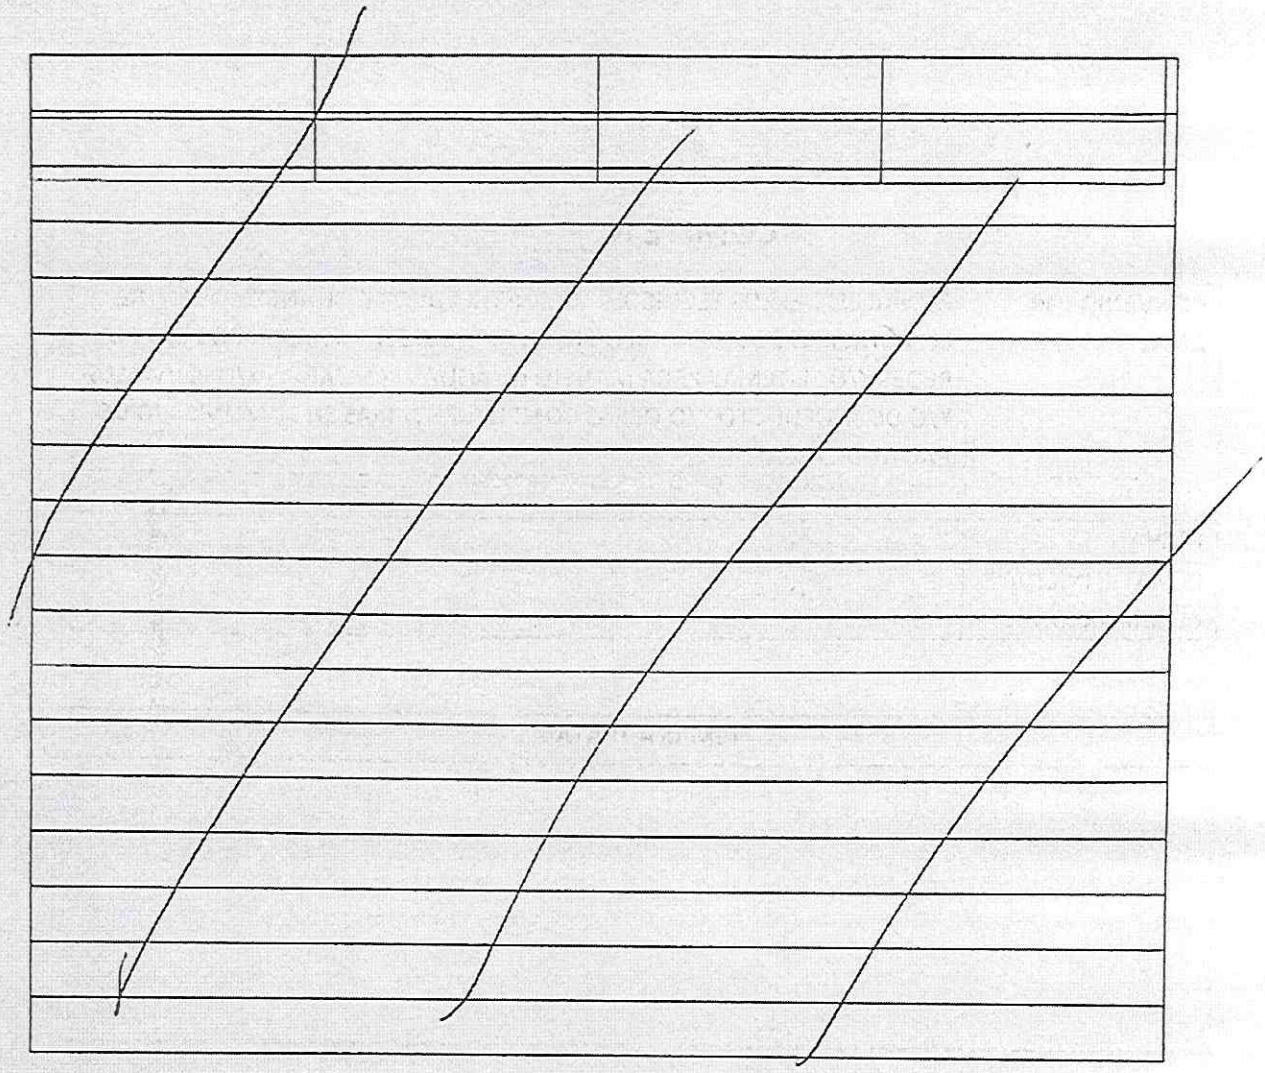

PARTICIPANTES			
NOMBRES	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Cesar Rosa	Sintenerta	Rep' Legal	
Hebert Nessim Solano	Red Vital	Ingeniero	
TITO D. CUBILLOS	RED VITAL PAIPA	REP. LEGAL	
Ludy Carchuelo	Red Vital Paipa	Subgerente Operativo	
Ubaldo Castro	Sec Inprae /	Sec Inprae /	
Carolina Núñez C.	Alcaldía Paipa	Asesor Despacho	

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1


FECHA		
13	01	2023
DD	MM	AA

ACTA No.: 1

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. DATOS Y OBSERVACIONES

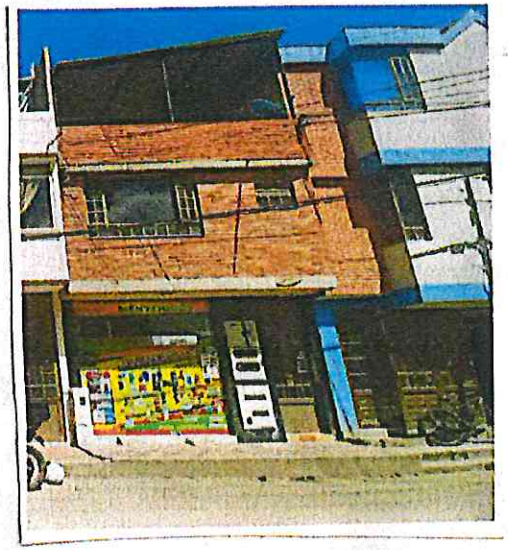

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Gilma Pedraza

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ____

Estrato ____ casa ____ Barrio Primero de mayo

Dirección Carrera 17 # 25-35

Teléfono 3144016371 No. de pisos Tres (3)

Long. del frente (mts) ____

Matrícula Inmobiliaria No. ____

Cédula catastral ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Aseo	☒	☐	8. otro: cuál?
8. Internet		☐	

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Vivienda familiar	☒	Cuál? Con local comercial		

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO

1. Concreto	☒	5. madera	☐
2. Ladrillo	☒	6. Bahareque	☐
3. Bloque	☐	7. Otro	☐
4. Prefabricado	☐	Cuál?	

ACCESOS PERSONAS

Discapacidad SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

Silla de ruedas SI ☐ NO ☐

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: Gilma Pedraza

N° C.C.: 23.252.840 Telefono: 3144016371

Dirección: Cra 17 # 25-35

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: ____

N° C.C.: ____ Telefono: ____

Dirección ____

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: ____

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Maria Amalia

Propietario

Nombre: ____

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P

Nombre: ____

1087

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒	GRIETAS Y FISURAS: NO
MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒ MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒ MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO Teja	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒ MATERIAL: BALDOSA ☒ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO	DESPLAZAMIENTOS: NO
PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☒ MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO Vidrio
PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒ MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL ☐ OTRO	OTRO: Cuál?
FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☒ NO ☐ CANTIDAD _____ DIMENSIONES APROX _____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Propietario suministro datos vía telefonica, manifestando no se encuentra en la zona y a corto plazo no puede acercarse a firmar.

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria	Profesional Planeacion y Proyectos	Propietario	VoBo Subgerente RED VITAL
Nombre:	Nombre: Mario Arnolf.	Nombre:	Nombre:

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

1. DATOS Y OBSERVACIONES





2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario X Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? _____

Estrato 4 casa X Barrio primero de mayo

Dirección _____

Teléfono _____ No. de pisos _____

Long. del frente (mts) _____

Matrícula inmobiliaria No. _____

Cédula catastral _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. Televisión cable	X		
7. Aseo	X		8. otro: cuál?
8. Internet			

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional		5. En construcción		
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor Intermendio		7. Otro		
4. Vivienda familiar	X	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como	
4. Institucional		Cuál?		comercio SI	NO

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO				ACCESOS PERSONAS	
1. Concreto	X	5. madera		Discapacidad SI	NO
2. Ladrillo		6. Bahareque		Cuantos	
3. Bloque		7. Otro		Silla de ruedas	
4. Prefabricado		Cuál?		SI	NO

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: Elsi Patricia Molano

N° C.C.: 46673209 Telefono: 312 3503254

Dirección: Calle 26 N° 14-74

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: _____

N° C.C.: _____ Telefono: ____

Dirección _____

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria
Nombre: _____

Profesional Planeacion y Proyectos
Nombre: Paola Andrea V.

Propietario
Nombre: Elsi Patricia Molano

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P
Nombre: _____

Alcaldía de Paipa

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital AL SERVICIO DE PAIPA

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
DD	MM	2023 AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒	GRIETAS Y FISURAS: NO
MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒	HUMEDADES: NO
MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA	
CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	HUNDIMIENTO PISO: NO
MATERIAL: CONCRETO ☒ MADERA ☐ OTRO	
PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	DESPLAZAMIENTOS: NO
MATERIAL: BALDOSA ☐ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO	
PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☐
	MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO
PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	OTRO: Cuál?
MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL ☐ OTRO	
FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐	OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☐ NO ☐ CANTIDAD _____ DIMENSIONES APROX _____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria	Profesional Planeacion y Proyectos	Propietario	VoBo Supervisor RED VITAL
Nombre:	Nombre: Mario Arroyo	Nombre:	Nombre:

PLANEACIÓN Y PROYECTOS


CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. DATOS Y OBSERVACIONES

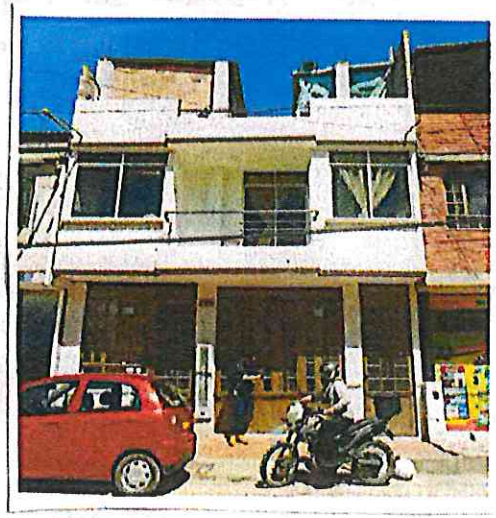

2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Thoana Rodriguez

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Estrato 2 casa X Barrio primero de mayo

Dirección CR 7 # N 45-24

Teléfono 320-3048898 No. de pisos 3

Long. del frente (mts) ___

Matrícula Inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6, Televisión cable	X		
7, Aseo			8. otro: cuál?
8. Internet			

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción		
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor intermendio		7. Otro		
4. Vivienda familiar	X	Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial	X	5. Recreacional	
2. Comercial		6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO X

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI X NO ☐

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO

1. Concreto	X	5. madera	
2. Ladrillo	X	6. Bahareque	
3. Bloque	X	7. Otro	
4. Prefabricado		Cuál?	

ACCESOS PERSONAS

Discapacidad SI ☐ NO X

Cuantos ___

Silla de ruedas SI ☐ NO ☐

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: ___

N° C.C.: 46681898 Telefono: ___

Dirección: ___

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: Thoana Rodriguez

N° C.C.: 46681898 Telefono: 320 3048898

Dirección ___

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: ___

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Maria Arnolf

Propietario

Nombre: Johanna Pp

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P

Nombre: ___

Alcaldía de Paipa

PAIPA S.A. E.S.P. Red Vital

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒	GRIETAS Y FISURAS: NO
MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒ MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒ MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO_____	HUNDIMIENTO PISO:____NO
PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒ MATERIAL: BALDOSA ☐ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO_____	DESPLAZAMIENTOS: NO
PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒	PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☐ MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO_____
PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☒ NO MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL ☒ OTRO	OTRO: Cuál?
FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐	OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☒ NO ☐ CANTIDAD _____ DIMENSIONES APROX _____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoría	Profesional Planeacion y Proyectos	Propietario	VoBo Supervisor RED VITAL
Nombre:	Nombre: Mario Arnolfo	Nombre:	Nombre:

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. DATOS Y OBSERVACIONES



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Restaurante El Paipan

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Estrato 3 casa X Barrio Primero de Mayo

Dirección Cra 17 N° 11-23

Teléfono 3012994754 No. de pisos 2

Long. del frente (mts) 10 mt

Matrícula Inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Aseo	☒	☐	8. otro: cuál?
8. Internet	☐	☐	

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor intermedio	☐	7. Otro	☒	
4. Vivienda familiar	☐	Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO

1. Concreto	☒	5. madera	☒
2. Ladrillo	☐	6. Bahareque	☐
3. Bloque	☐	7. Otro	☐
4. Prefabricado	☐	Cuál?	

ACCESOS PERSONAS

Discapacidad SI ☐ NO ☒

Cuantos ___

Silla de ruedas SI ☐ NO ☐

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: Esthid Ochoa

N° C.C.: ___ Telefono: ___

Dirección: ___

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: Robert Perez

N° C.C.: 1053605966 Telefono: 3012944754

Dirección Vereda la esperanza

FIRMAS

Firma Representante de la interventoria

Nombre: ___

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Mario Arnolf.

Propietario

Nombre: ___

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P

Nombre: ___

1067

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
DD	MM	2023 AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

GRIETAS Y FISURAS: NO

MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA

HUMEDADES: NO

CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☒ MADERA ☐ OTRO_____

HUNDIMIENTO PISO: NO

PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: BALDOSA ☐ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO_____

DESPLAZAMIENTOS: NO

PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☐

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO_____

PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL ☐ OTRO ☒

OTRO: Cuál?

FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☒ NO ☐ CANTIDAD _____ DIMENSIONES APROX _____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoría

Nombre: _____

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Mario Amaya

Propietario

Nombre:

VoBo Supervisor RED VITAL

Nombre: _____

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. DATOS Y OBSERVACIONES







2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Billetería la Bufalos Sagrario Alba

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario X Poseedor ___ Otro Cual? ___

Estrato 2 y 3 casa X Barrio primero de Mayo

Dirección Cr 17 25 41

Teléfono 313 642 5595 No. de pisos 3

Long. del frente (mts) 7 metros

Matrícula inmobiliaria No.

Cédula catastral

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas			
6. Televisión cable			
7. Aseo	X		8. otro: cuál?
8. Internet			

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional		5. En construcción		
2. Valor Arquitectónico		6. Sin edificar		
3. Valor Intermendio		7. Otro	X	
4. Vivienda familiar		Cuál?		

USO ACTUAL

1. Residencial		5. Recreacional	
2. Comercial	X	6. Baldío	
3. Industrial		7. Otro	
4. Institucional		Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ___ NO X

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI X NO ___

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO

1. Concreto	X	5. madera	
2. Ladrillo	X	6. Bahareque	
3. Bloque	X	7. Otro	
4. Prefabricado		Cuál?	

ACCESOS PERSONAS

Discapacidad SI ___ NO X

Cuantos ___

Silla de ruedas SI ___ NO ___

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: Sagrario Alba

N° C.C.: 47324299 Telefono: ___

Dirección: Cr 17 25-41

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: ___

N° C.C.: ___ Telefono: ___

Dirección ___

FIRMAS

Sagrario Alba
Firma Representante de la Interventoria
Nombre: ___

Profesional Planeacion y Proyectos
Nombre: Mario Amaya

Propietario
Nombre: ___

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P
Nombre: ___

Paipa

Red Vital

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA

CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☒ MADERA ☐ OTRO_____

PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: BALDOSA ☐ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO_____

PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL ☐ OTRO

FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐

GRIETAS Y FISURAS: NO

HUMEDADES: NO

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO_____

OTRO: Cuál?

OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☒ NO ☐ CANTIDAD _____ DIMENSIONES APROX _____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante de la interventoría

Nombre: _____

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Marcela Amaffi

Propietario

Nombre:

VoBo Subgerente RED VITAL

Nombre: _____

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Hoja 1		
FECHA		
13	01	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

1. DATOS Y OBSERVACIONES



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María Dolores Ocha

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual? ____

Estrato ____ casa ____ Barrio Primero de Mayo

Dirección Convera 17 # 25-21

Teléfono 3114838615 No. de pisos dos (2)

Long. del frente (mts)

Matrícula Inmobiliaria No.

Cédula catastral

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Aseo	☒	☐	8. otro: cuál?
8. Internet		☐	

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Vivienda familiar	☐	Cuál? Comercial		

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	
4. Institucional	☐	Cuál?		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO

1. Concreto	☒	5. madera	☐	
2. Ladrillo	☒	6. Bahareque	☐	
3. Bloque	☐	7. Otro	☐	
4. Prefabricado	☐	Cuál?		

ACCESOS PERSONAS

Discapacidad SI ☐ NO ☒

Cuantos

Silla de ruedas SI ☐ NO ☐

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario:

N° C.C.: Telefono:

Dirección:

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: María Dolores Ocha

N° C.C.: 46'680.743 Telefono: 3114838615

Dirección Convera 17 # 25-21

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria
Nombre:

Profesional Planeacion y Proyectos
Nombre: Mario Amaf.

Propietario ➡ Arrendatario
Nombre: María Dolores Ocha

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P
Nombre:

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Paipa

PARA LA E.S.P. Red Vital

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

Hoja 1		
FECHA		
13	01	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☒ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA

CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☒ MADERA ☐ OTRO

PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: BALDOSA ☒ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO

PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO X

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☒ METAL ☐ OTRO

FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

GRIETAS Y FISURAS: NO

HUMEDADES: NO

HUNDIMIENTO PISO: NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☒

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO Vidrio

OTRO: Cuál?

OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☒ NO ☐ CANTIDAD 1000 Litros DIMENSIONES APROX FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Maria Amal F.

Propietario → Arrendatario

Nombre: Maria Dolores Ochoa.

VoBo Subgerente RED VITAL

Nombre:

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
13	01	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. DATOS Y OBSERVACIONES



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: María de los Angeles Ochoa

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario X Poseedor ____ Otro Cual? ____

Estrato ____ casa ____ Barrio Primero de Mayo

Dirección Cra 17 # 25-19

Teléfono 3108618002 No. de pisos dos (2)

Long. del frente (mts) ____

Matrícula Inmobiliaria No. ____

Cédula catastral ____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. Televisión cable	☐	☐	
7. Aseo	☒	☐	8. otro: cuál?
8. Internet		☐	

TIPO DE PREDIO

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermendio	☐	7. Otro	☒	
4. Vivienda familiar	☐	Cuál? Comercial		

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál?	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO

1. Concreto	☒	5. madera	☐
2. Ladrillo	☒	6. Bahareque	☐
3. Bloque	☐	7. Otro	☐
4. Prefabricado	☐	Cuál?	

ACCESOS PERSONAS

Discapacidad SI ☐ NO ☒

Cuantos ____

Silla de ruedas SI ☐ NO ☒

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: ____

N° C.C.: ____ Teléfono: ____

Dirección: ____

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: María de los Angeles Ochoa

N° C.C.: 46681790 Teléfono: 3108618002

Dirección Cra 17 # 25 - 19

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: ____

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Maria Ana P.

Propietario ⇒ Arrendatario

Nombre: Maria Ochoa

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P

Nombre: ____

1067

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
13	01	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA

CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: CONCRETO ☒ MADERA ☐ OTRO ____

PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: BALDOSA ☒ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO ____

PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☒ NO ☐

Humedad

PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☒

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☒ METAL ☐ OTRO

FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☒ NO ☐

Humedad

GRIETAS Y FISURAS: NO

Si, paredes internas

HUMEDADES: NO

Si, fachada y paredes internas

HUNDIMIENTO PISO: ____ NO

DESPLAZAMIENTOS: NO

PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☒

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO Vidrio

OTRO: Cuál?

OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☒ NO ☐ CANTIDAD 1000 Litros DIMENSIONES APROX ____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO ____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Revisar pendiente al ingreso del local para evitar empozamiento.

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoría	Profesional Planeacion y Proyectos	Propietario ⇒ Arrendatario	VoBo Subgerente RED VITAL
Nombre:	Nombre: Maria Arenas	Nombre: Maria Ochoa	Nombre:

PLANEACIÓN Y PROYECTOS

Alcaldía de Paipa

Paipa S.A. E.S.P. Red Vital

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
13	01	2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

1. DATOS Y OBSERVACIONES

Predio deshabitado



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: _____

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? _____

Estrato _____ casa _____ Barrio _____

Dirección _____

Teléfono _____ No. de pisos _____

Long. del frente (mts) _____

Matrícula Inmobiliaria No. _____

Cédula catastral _____

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6, Televisión cable	☐	☐	
7, Aseo	☐	☐	8. otro: cuál?
8. Internet		☐	

TIPO DE PREDIO				
1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐	
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐	
3. Valor Intermendio	☐	7. Otro	☐	
4. Vivienda familiar	☐	Cuál?		

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos ☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como
4. Institucional	☐	Cuál?		comercio SI ☐ NO ☐

MATERIALES PREDOMINANTES DEL PREDIO				ACCESOS PERSONAS
1. Concreto	☐	5. madera	☐	Discapacidad SI ☐ NO ☐
2. Ladrillo	☐	6. Bahareque	☐	Cuantos ☐
3. Bloque	☐	7. Otro	☐	Silla de ruedas
4. Prefabricado	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

2.1 INFORMACIÓN PROPIETARIO

Nombre del propietario: _____

N° C.C.: _____ Telefono: ___

Dirección: _____

2.2 INFORMACIÓN ARRENDATARIO

Nombre del arrendatario: _____

N° C.C.: _____ Telefono: ___

Dirección _____

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria
Nombre: _____

Profesional Planeacion y Proyectos
Nombre: Mario Arnulf

Propietario
Nombre: _____

VoBo Gerente Red Vital Paipa S.A E.S.P
Nombre: _____

1067

Paipa podemos

Paipa E.S.P. Red Vital

CONVENIO MP 011 2022 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO

Hoja 1		
FECHA		
		2023
DD	MM	AA
ACTA No.:	1	

ACTA DE VECINDAD

FICHA TÉCNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☐

GRIETAS Y FISURAS: NO

MUROS: PRESENTA AFECTACION SI ☐ NO ☐

MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO MAMPOSTERIA

HUMEDADES: NO

CUBIERTA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐

MATERIAL: CONCRETO ☐ MADERA ☐ OTRO_____

HUNDIMIENTO PISO: NO

PISOS : PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐

MATERIAL: BALDOSA ☐ MADERA ☐ CONCRETO ☐ OTRO_____

DESPLAZAMIENTOS: NO

PAREDES INTERIORES PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐

PUERTAS EXT. PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO : ☐

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL OTRO_____

PUERTAS INT.: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO

MATERIAL: ALUMINIO ☐ MADERA ☐ METAL ☐ OTRO

OTRO: Cuál?

FACHADA: PRESENTA AFECTACIÓN SI ☐ NO ☐

OTRO: Cuál?

TANQUE DE AGUA SI ☐ NO ☐ CANTIDAD _____ DIMENSIONES APROX _____ FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO _____

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El predio se encuentra en abandono y no es posible ubicar un responsable o un encargado.

FIRMAS

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: _____

Profesional Planeacion y Proyectos

Nombre: Mario Amolf.

Propietario

Nombre:

VoBo Subgerente RED VITAL

Nombre: _____
