ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

ACTA DE FINALIZACIÓN
PARA LAS OBRAS EJECUTADAS EN LA NSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ

INFORMACIÓN CONTRATO

CONTRATO No.	4143.010.26.1.1943-2022
CONTRATISTA:	SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
VALOR DEL CONTRATO:	$ 473.432.620,00
FECHA INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 2023
DURACIÓN:	CINCO (5) MESES
INTERVENTOR:	DVINGA S.A.S

INFORMACIÓN OBRA

FECHA INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA CONSTRUCCIÓN:	30 DE MARZO DEL 2023
VALOR FINAL OBRA:	$ 97.128.071,00

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDES PRINCIPAL Y MARCO FIDEL SUAREZ DE LA COMUNA 9 DE SANTIAGO DE CALI. FICHAS EBI NOS. 26003379 Y 26003814".

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

En la Ciudad de Santiago de Cali, **a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2023,** se reunieron: en su condición de contratista: **RODOLFO SEGURA ALCARAZ**, representante legal de SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S,, en condición de interventor: **LUIS ÁNGEL SABOGAL DÍAZ**, representante Legal de DVINGA S.A.S., por parte de la IE Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho Sede Marco Fidel Suarez **LUZ AIDA SALAZAR** en calidad de rectora (E), y en representación de la Secretaria de Educación: el ingeniero **CÉSAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO**, para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos de la etapa de construcción de la obra ejecutada en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ.

A) LABOR EJECUTADA:

Al contratista le corresponde la ejecución de la realización completa y suficiente de los requerimientos de LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ, para la cual se acometieron las siguientes actividades, en los espacios:

Área de Servicios:
Muro de cerramiento

- En la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio José Camacho Sede Marco Fidel Suarez se realizaron las siguientes actividades:
- Se lleva a cabo el desmonte de la malla eslabonada, desmonte de reja metálica, la demolición del muro de cerramiento existente tanto mampostería como elementos en concreto, retiro de escombros.
- Se realizó la perforación y excavación para pilotes, flejado de acero y fundición de pilotes de 40 cm de diámetro.
- Conformación y compactación de subrasante, fundición de solado para vigas de cimentación.
- Conformación y compactación de subrasante para zona de juegos infantiles, andén y canal de piso en concreto.
- Instalación de formaleta y flejado de acero para fundición de vigas de cimentación aéreas y columnetas.
- Instalación de mampostería en ladrillo limpio, postes y diagonales en tubo galvanizado, instalación de malla eslabonada, instalación de alambre de púas.
- Se realizó la instalación de nave de puerta en tuvo galvanizado y malla eslabonada para el acceso principal de la institución.
- Se realizó la instalación de nave de puerta en tuvo galvanizado y malla eslabonada para el acceso a la zona de juegos infantiles.

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	**RECIBO FINAL DE OBRA O CULMINACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**		

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha 25 de abril de 2023, se recibe a satisfacción las obras correspondientes a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ del Municipio de Santiago de Cali.

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la Interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos, contrato y otros, que el contratista SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S, ha cumplido con lo dispuesto en la ley de las obligaciones al sistema de seguridad social integral y recursos parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2023.

RODOLFO SEGURA ALCARAZ
Representante Legal
SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
Contratista

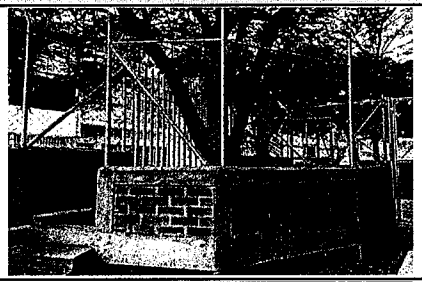
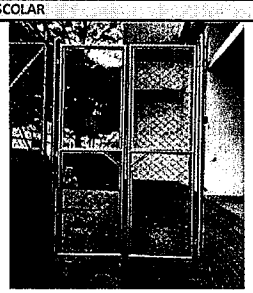
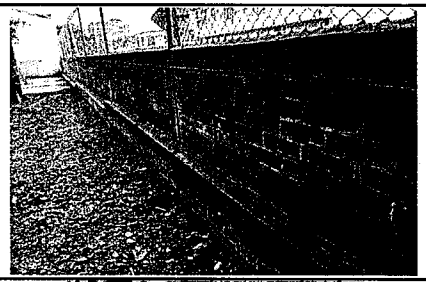
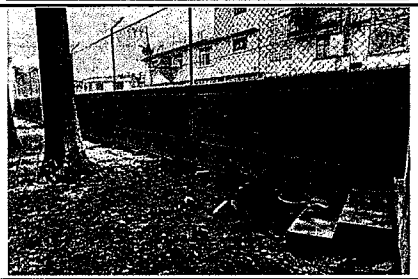
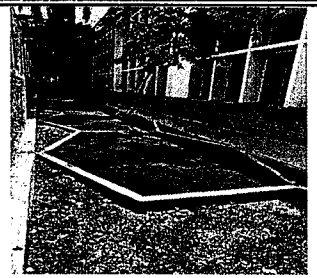
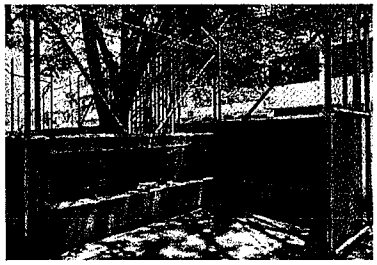
LUIS ANGEL SABOGAL DÍAZ
Representante Legal
DVINGA S.A.S.
Interventor

Nota: La firma de los funcionarios públicos corresponde a un trámite administrativo, la cuantificación y cantidades, hacen parte de la responsabilidad de la interventoría y contratistas.

C.C. 31.275.122 Cali

República de Colombia *Santiago de Cali* SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	**ACTA DE ENTREGA** **CONTRATO No.:** CONTRATO: No.4143.010.26.1943-2012 **CONTRATISTA:** SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S **OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ **VALOR INICIAL:** $ 94.423.447,00 **VALOR ADICIONAL:** $ 2.704.624,00 **VALOR CONTRATO FINAL:** $ 97.128.071,00 **PLAZO:** 5 MESES **INTERVENTOR :** DVINGA S.A.S **PRORROGA:** SI	**Fecha de elaboración:** **Fecha de inicio:**	24 DE MARZO DE 2023 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

PREESCOLAR

FOTO No.1		FOTO No.2		**DESCRIPCION FOTO No.1** Muro de cerramiento con viga área para proteger las raíces del árbol. **DESCRIPCION FOTO No.2** Instalación de nave en tuvo galvanizado y malla eslabonada.
FOTO No.3		FOTO No.4		**DESCRIPCION FOTO No.3** Instalación de malla eslabonada para muro de cerramiento. **DESCRIPCION FOTO No.4** Mampsotería para muro de cerramiento, transición de viga de cimentación.
FOTO No.5		FOTO No.6		**DESCRIPCION FOTO No.5** Muro de cerramiento en mampostería con viga área para proteger las raíces del árbol. **DESCRIPCION FOTO No.6** Instalación de grava sobre zona de juegos infantiles.
FOTO No.7		FOTO No.8		**DESCRIPCION FOTO No.7** Mampsotería para muro de cerramiento, instalación de diagonales y tubos galvanizados. **DESCRIPCION FOTO No.8** Mampsotería para muro de cerramiento, instalación de diagonales y tubos galvanizados.

República de Colombia

Santiago de Cali

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA

CONTRATO No.: CONTRATO: No.4143.010.26.1943-2012

CONTRATISTA: SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ

VALOR INICIAL:	$	94.423.447,00	**VALOR ADICIONAL:**	$ 2.704.624,00
VALOR CONTRATO FINAL:	$	97.128.071,00	**PLAZO:** 5 MESES	
INTERVENTOR : DVINGA S.A.S			**PRORROGA:**	SI

Fecha de elaboración:	24 DE MARZO DE 2023
Fecha de inicio:	01 DE NOVIEMBRE DE 2022

PREESCOLAR

FOTO No.9

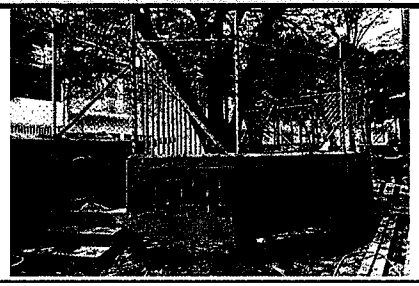
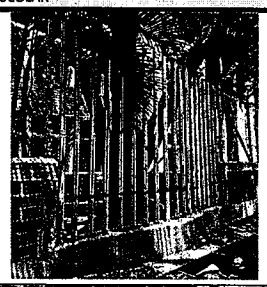


FOTO No.10



DESCRIPCION FOTO No.9

Muro de cerramiento en mampostería con viga área para proteger las raíces del árbol.

DESCRIPCION FOTO No.10

Instalación de tubos para cerramiento en zona de árbol que obstaculiza el lindero del cerramiento.

FOTO No.11



FOTO No.12



DESCRIPCION FOTO No.11

Mampsotería para muro de cerramiento, transición de viga de cimentación.

DESCRIPCION FOTO No.12

Mampsotería para muro de cerramiento, transición de viga de cimentación.

FOTO No.13

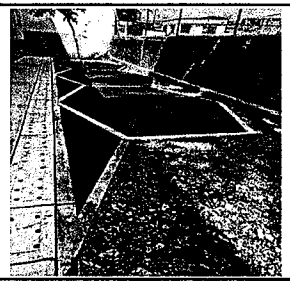



FOTO No.14



DESCRIPCION FOTO No.13

Instalación de grama para zona de juegos infantiles, instalación de plaqueta para canal de concreto.

DESCRIPCION FOTO No.14

Instalación de nave en tuvo galvanizado y malla eslabonada.

cc. 31.295.127

RODOLFO SEGURA ALCARAZ
CONTRATISTA
SEGURA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

LUIS ÁNGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
DVINGA S.A.S
