SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

SERVIINTEG S.A.S.

INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. 022 DE 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA

ENERO DE 2023

7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO/ELÉCTRICO/CIVIL

Sogamoso, Enero 23 de 2023

SEÑORES:
MUNICIPIO DE AQUITANIA
CIUDAD.

REFERENCIA OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 112.5KVA PARA ELADECUADO TRATAMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ"

LOCALIZACION:

SERVIINTEG S.A.S. es una Empresa Privada dedicada a la construcción de redes en media y Baja tensión, Sistemas de Puestas a Tierra, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas. Se Encuentra inscrita en la Administradora de Riesgos Laborales, POSITIVA bajo Clase de Riesgo V, Grado V tarifa 6.960%, Según el decreto Ley 1295 de 1994, art. 26 y 27.

Actualmente cuenta con instalaciones en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Ubicada en la Carrera 11 No. 2-131.

La actividad como tal se realizo el día 23 de Enero de 2023, en presencia del personal de la Administración municipal y los ejecutores del contrato.

7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

TRABAJADORES:

Durante el desarrollo de las labores la Empresa contó con un total de 4 directos, distribuidos por área y por sexo de la siguiente manera.

CARGOS	CANTIDAD	SEXO
Electricistas	2	MASCULINO
Ayudantes	2	MASCULINO
TOTAL	**4**	

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se suministran todos los elementos de protección personal a cada colaborador parael desarrollo de las diferentes actividades ejecutadas dentro del proyecto según lo establecido en nuestro procedimiento y reglamento interno. Los elementos deprotección entregados están distribuidos de la siguiente manera.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SUMINISTRADOS.

TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCIONPERSONAL	ENTREGADOS
Guante de nitrilo	4 PARES
Guantes de vaqueta	4 PARES
Gafas oscuras	4 PARES
Cascos de seguridad	4 PARES

RE- INDUCCIONES Y CHARLAS DE SEGURIDAD.

Durante la ejecución Del proyecto se realizó la respectiva Re inducción y charlas deseguridad a todos los colaboradores que iniciaban actividades en el proyecto.

CHARLAS DE SEGURIDAD	
Mes	**Número de Reuniones De seguridad**
Enero	3
TOTAL	3

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

PERMISOS DE TRABAJO.

Por cada actividad desarrollada Durante adecuaciones, Obras Eléctricas para Cumplimiento del **CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. 022 DE 2022.**

OBJETO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 112.5KVA PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ"

Se realizó un paquete de permiso de trabajo y el ATS complementario de las actividades desarrolladas,Este ATS, contemplaba el Paso a Paso de las actividades, identificando los riesgos existentes de la actividad y los controles requeridos.

PERMISOS DE TRABAJO	
Trabajos en altura	2
Trabajos en caliente	NA
Trabajo con productos químicos	NA
Izajes de carga	0
Izajes crítico	NA


7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL


REGISTRO FOTOGRAFICO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO No. 022 de 2022.

DIALOGOS DIARIOS DE SEGURIDAD, PLAN DE TRABAJO E INICIO DE ACTIVIDADES CON LA APERTURA DEL CIRCUITO.



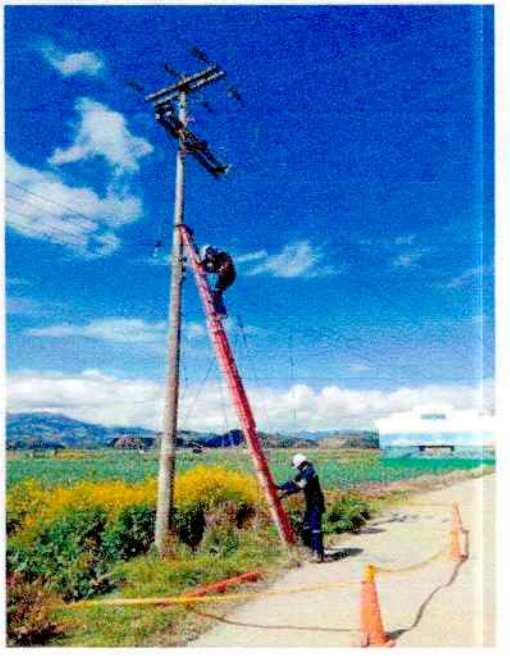




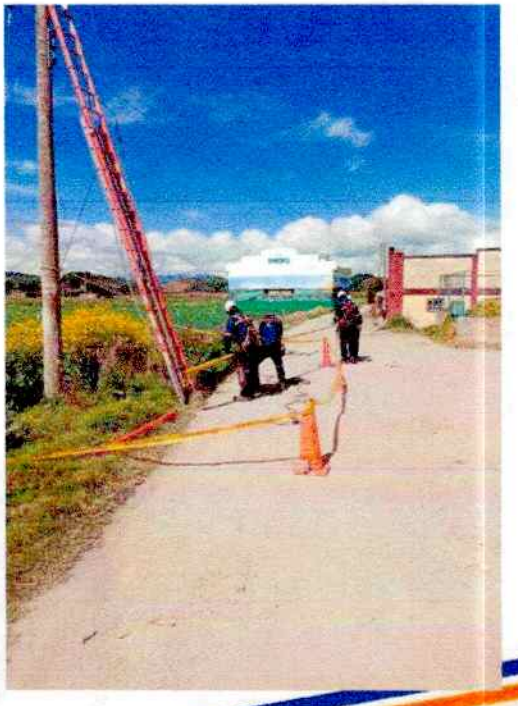


7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL


APERTURA DEL CIRCUITO.

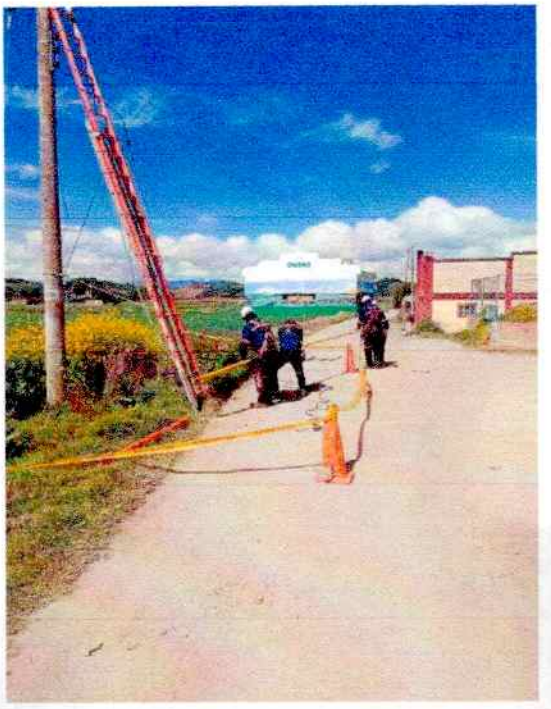

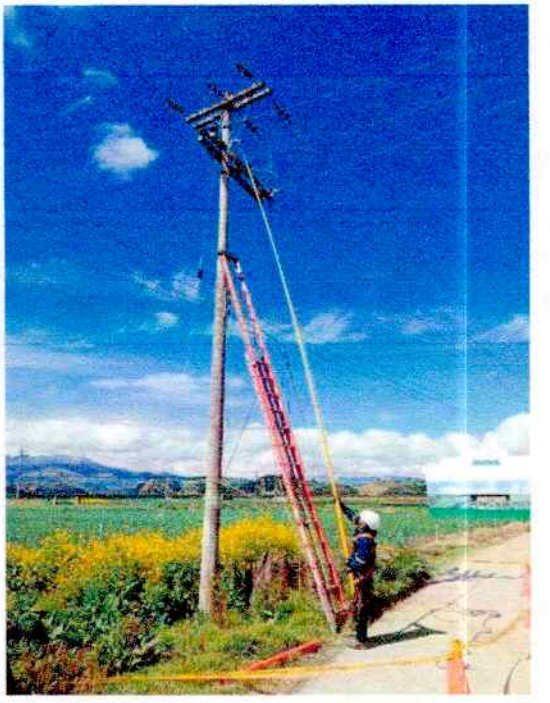

INSTALACION PUESTA A TIERRA PARA RED DESENERGIZADA



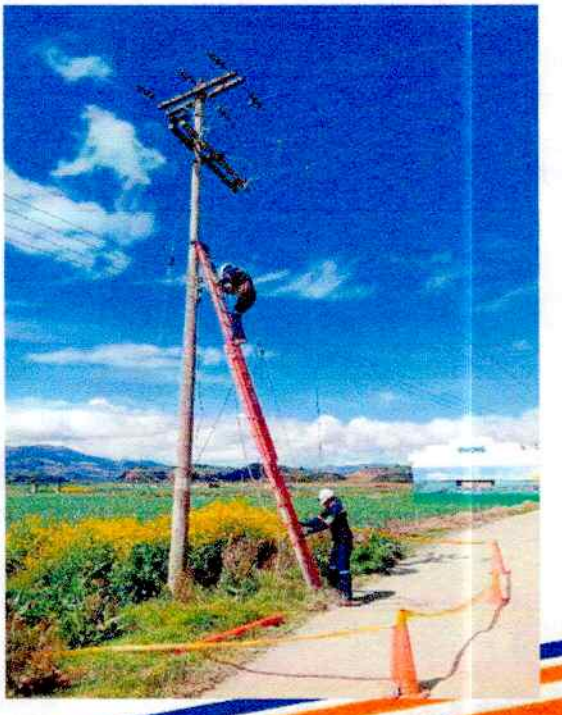


7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

DESMONTE DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA Y PROTECCIONES



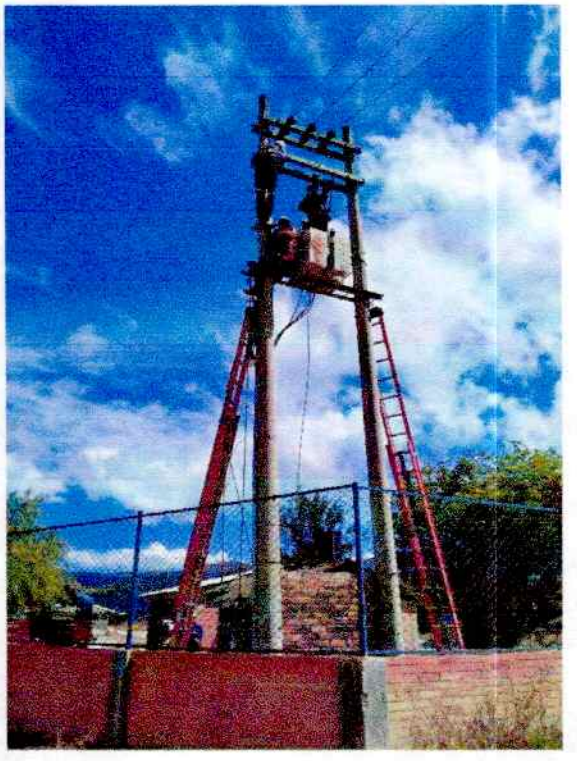








7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com


SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

CAMBIO DE CRUCETERIA PROTECCIONES

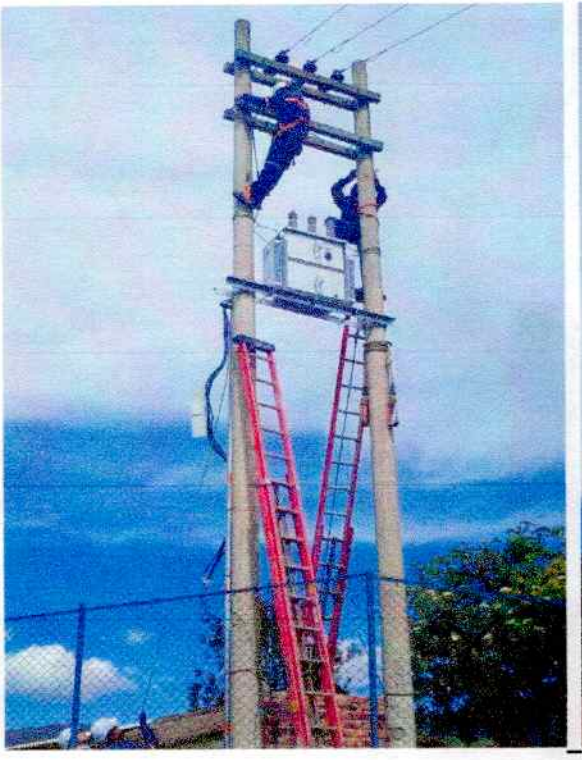

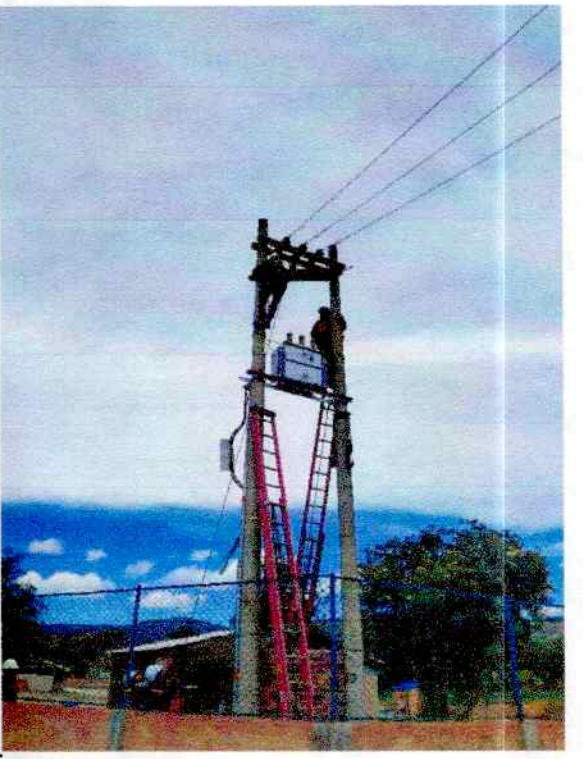

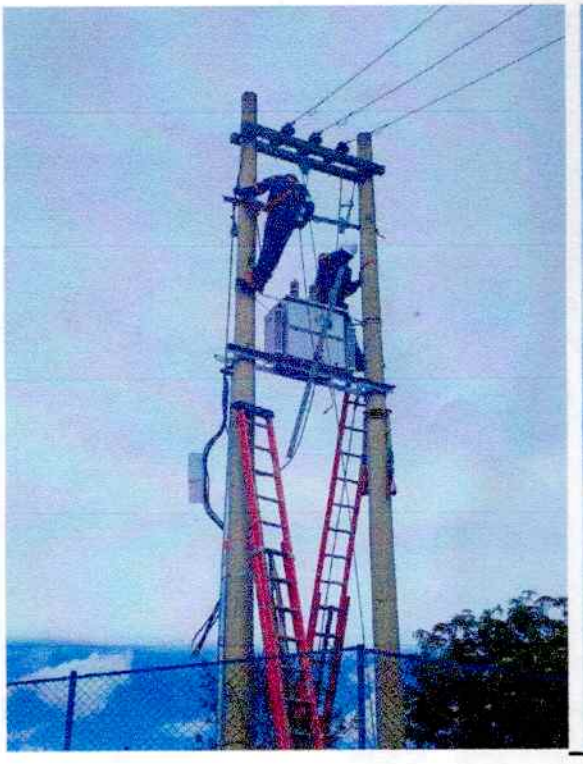


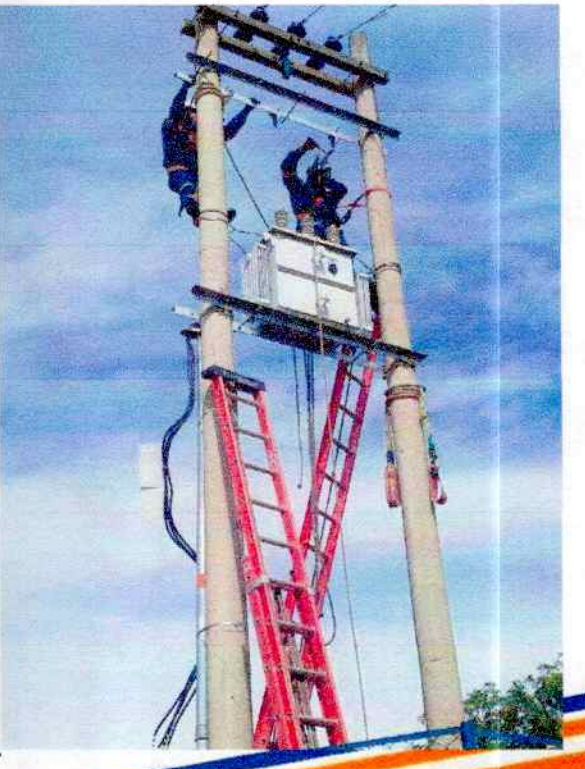

7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

MONTAJE CRUCETERÍA NUEVA PARA TRANSFORMADOR Y TRANSFORMADOR NUEVO

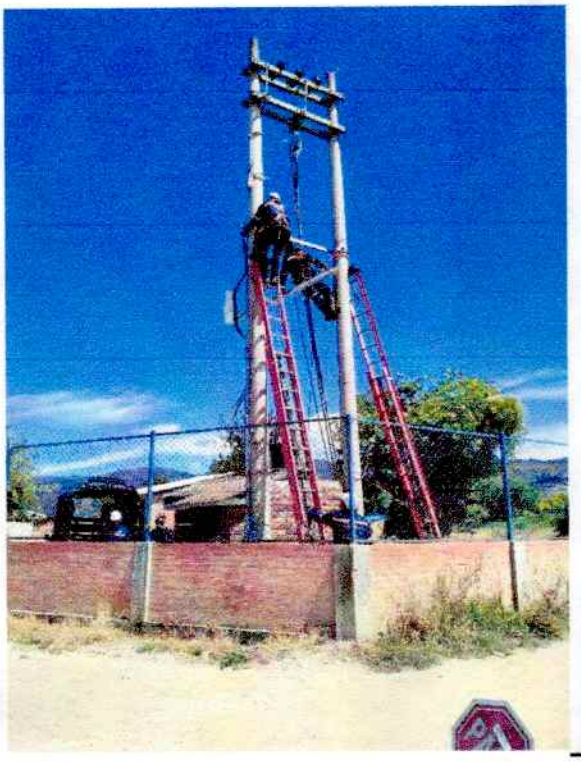








7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

RETIRO DE TIERRA PROVISIONAL Y ENERGIZACIÓN ARRANQUE



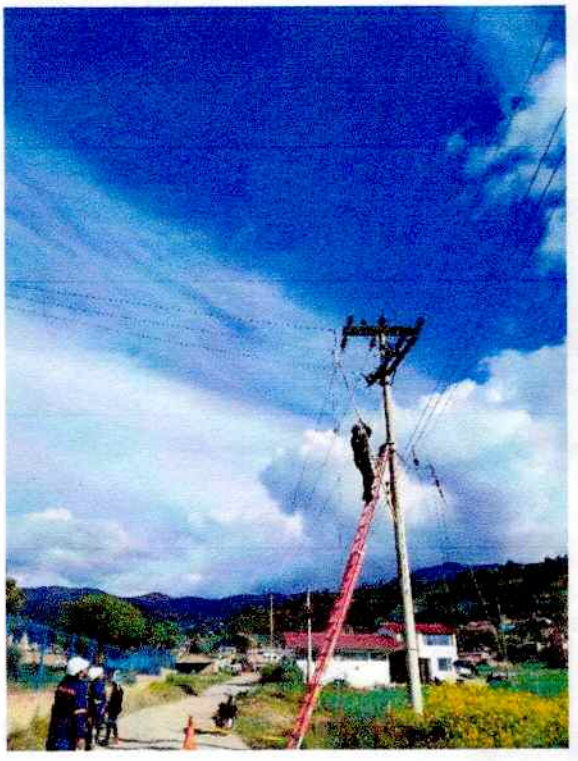




7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

INSTLACIÓN DE PROTECCIONES NUEVAS Y CONEXIONADO DE TRANSFORMADOR

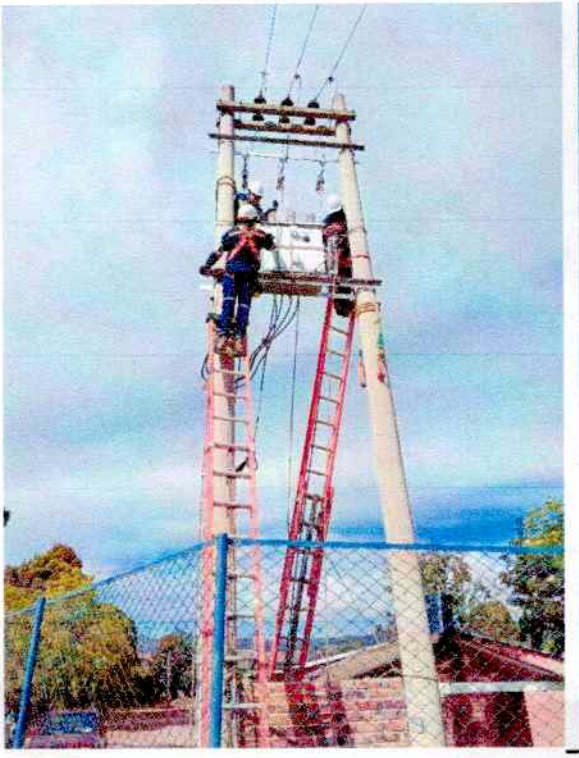










7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com


SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

ENERGIZACIÓN TRANSOFORMADOR

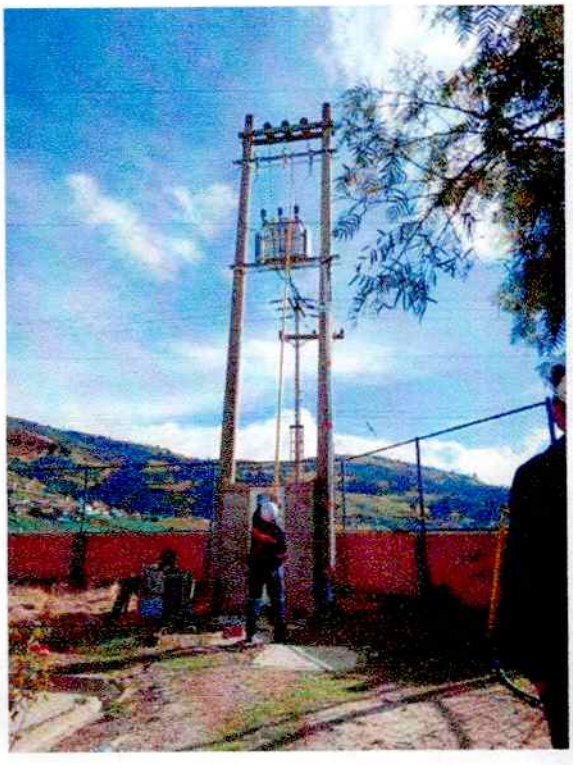

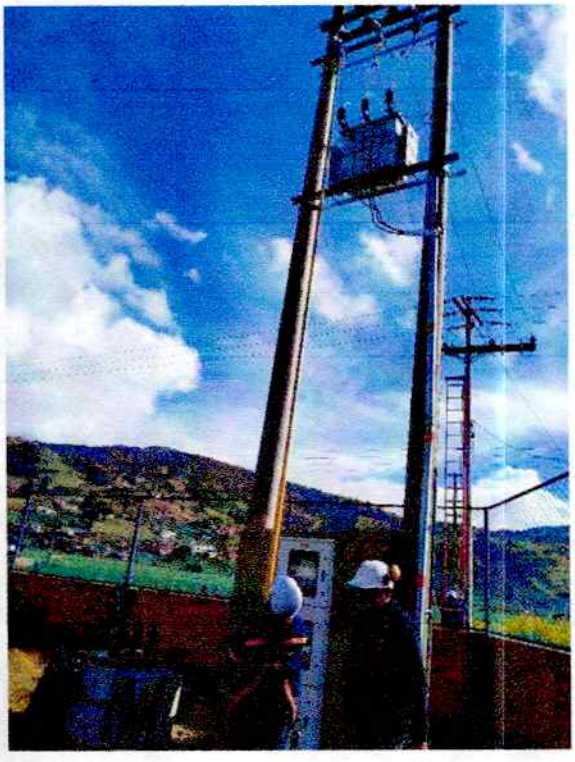

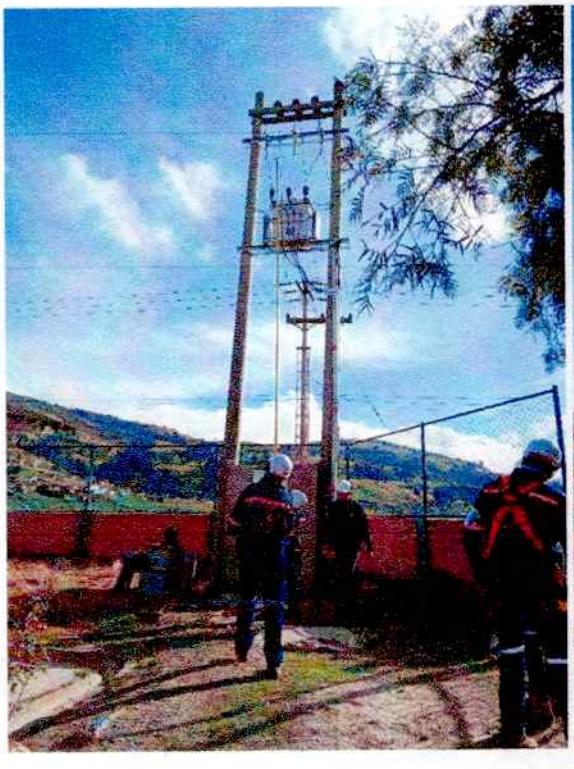

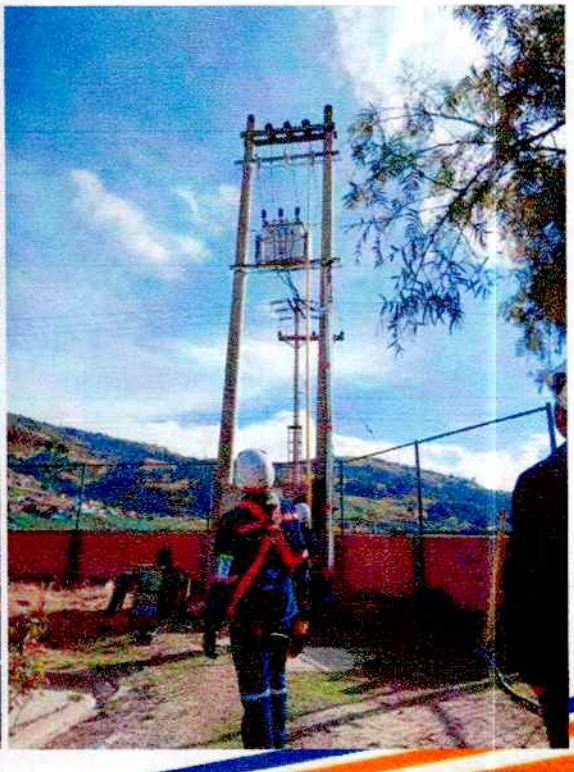

7709581
320 962 7517
CARRERA 11 N° 2-131 (SOGAMOSO, BOYACA)
serviinteg.sas@gmail.com

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO / ELÉCTRICO / CIVIL

De esta forma damos por culminado el Contrato Estatal de Suministro No. 022 de 2022, habiendo sido instalado el Transformador de 112.5 kva el día lunes 23 De Enero de 2023.

Atentamente,

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS
SERVI INTEG S.A.S.
Cra 11 No. 2-131 Sogamoso
Cel. 320 962 7517 - 773 2415

Nombre: JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA
Documento de Identidad: 11.432.257 de Facatativá
Dirección: Carrera 11 No. 2 - 131
Ciudad: SOGAMOSO
Telefax: 7709581
Correo Electrónico: serviinteg.sas@gmail.com
Número de Celular: 3209627517 -7700958

ACTA DE ENTRADA - ALMACEN

ACTA No ___ DE ENTRADA Y RECIBIDO - ALMACEN

CONTRATO DE COMPRAVENTA /Y/O SUMINISTROS	**CONTRATO ESTATAL DE SUMINISTRO 022/2022**
CONTRATISTA	**SERVIINTEG S.A.S** **NIT 826.003.71-8** **JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA** **C.C. 11.432.257 DE FACATATIVÁ**
FECHA CONTRATO	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO	**18 DE ENERO 2023**
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 112.5KVA PARA EL ADECUADO TRATAMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA-BOYACÁ**

En Aquitania a los veintitrés (23) días del mes de Enero de dos mil veintitrés (2023), Se reúnen en la dependencia de Tesorería- Almacén, el Tesorero LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ y el Contratista SERVIINTEG S.A.S identificado con NIT. 826.003.71-8 cuyo representante legal es el señor JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA identificado con cedula N° 11.432.257 DE FACATATIVÁ, y Supervisora la ingeniera. SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES para dar ingreso de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN MATERIAL	CANTIDAD
1	Tuerca de ojo alargado de 5/8"	6
2	Aislador de suspensión tipo sintético para 15 kV (1)	6
3	Eslabón de enganche, pasador y ojal	6
4	Grapa terminal de retención	6
5	Porta Aislador pasante para cruceta 13,2 kV	6
6	Aislador de pin para 13,2 kV	6
7	Transformador trifásico hasta 112,5 kVA	1
8	Cruceta METALICA de 2,0 m (3)	7
9	DPS polimérico 12kV, 10kA tipo línea	3
10	Seccionadora porta fusible tipo cañuela 100 A, 15kV	3
11	Tubo galvanizado EMT de ½" x 3m	2
12	Metros de cinta bandit de 5/8"	3
13	Hebilla bandit de 5/8"	3
14	Perno de máquina de 5/8" x 10"	2
15	Perno de máquina de 5/8" x 12" (16)	1
16	Arandela redonda de ½"	8
17	Perno de máquina de 1/2" x 6" (12)	8

18	Sistema de puesta a tierra para media tensión	1
19	Diagonal metálica en V de 1,10 m para cruceta de madera (6)	3
20	Espárrago galvanizado de 5/8" x 18" (13)	3
21	Espárrago galvanizado de 5/8" x 22"	4
22	Grapa para operar en caliente	3
23	Arandela cuadrada de 5/8"	3
24	Espárrago galvanizado de 5/8" x 18" (13)	9
25	Grapa RL ,11	8
26	aislador tipo tensor	4
27	Sistema de puesta a tierra	1

Para constancia, se firma en Aquitania a los veintitrés (23) días del mes de Enero de Dos mil veintitrés (2023). Por los que en ella intervinieron:

Quien entrega:	**Quien recibe:**	**Quien recibe:**
Firma: DISTRIBUIDORES ELECTRICOS SERVI INTEG S.A.S — Nit. 826003791-8 Cra. 11 No. 02-131 Sogamoso SERVIINTEG S.A.S 826.003.791-8 7517 - 7732415 R/L. JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA **Contratista** NIT 826.003.71-8	**Firma:** LUIS FERNANDO ARANGUREN CHOCONTÁ. **Tesorero- Almacén** C.C.4.283.883	**Firma:** SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES Jefe USP Supervisor C.C. 1.057.598.401
