EQUIVER®
Construcción y mantenimiento de campos deportivos

EQV-C4017-25072023

Santiago de Cali, Julio 25 de 2023

Señores:
INTERVENTORIA
Att: Ing. Eduardo Cárdenas
Representante Legal – Interventoría
Ciudad

REFERENCIA: **EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI EN LAS COMUNAS Y SEGÚN LOS BP's SIGUIENTES: COMUNA 10 B.P. 26003947, COMUNA 11 B.P. 26003930 Y COMUNA 12 B.P. 26003933 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE PROCESO.**

ASUNTO: **SOLICITUD PRORROGA 4162.010.26.1.4017-2022**

Respetados señores,

De manera respetuosa solicitamos a la interventoría considerar una prórroga al contrato de la referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

FRENTE DE OBRA PRIMAVERA

Teniendo en cuenta el correo electrónico del enviado por ustedes el día 21 de julio de 2023, en el cual se nos informa que procedamos a ejecutar las actividades contractuales correspondientes a este frente; respetuosamente dicha solicitud la damos por acatada. Pero como es bien sabido y expresado en nuestros anteriores comunicados, la adquisición de la teja especificada contractualmente tiene un plazo de 45 días para su fabricación y entrega en la ciudad de Cali, es por esto que para poder dar cumplimiento al total de las actividades y teniendo en cuenta que, el retiro de la teja existente, el mantenimiento de la estructura y la colocación de la nueva teja son los ítems más representativos de este frente de obra por tal motivo; solicitamos de la manera más cordial una prórroga al plazo contractual de 60 días.

Es de anotar que este frente de obra estuvo suspendido mientras se definía si era necesario un reforzamiento adicional a estructura metálica.

Agradecemos de antemano la atención a la presente y a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,


JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
Gerente

NOTA: Adjunto copia del correo electrónico.

Autop. Medellín K.m 3.5 Costado Sur Modulo 6 Bod. 34 Terminal Terrestre de Carga – Cota/Cundinamarca/Colombia
Telefax: (571) 8985073 Cel: 3108141623 email: mmaldonado@equiver.com.co / Info@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co

EQUIVER®

Construcción y mantenimiento de campos deportivos

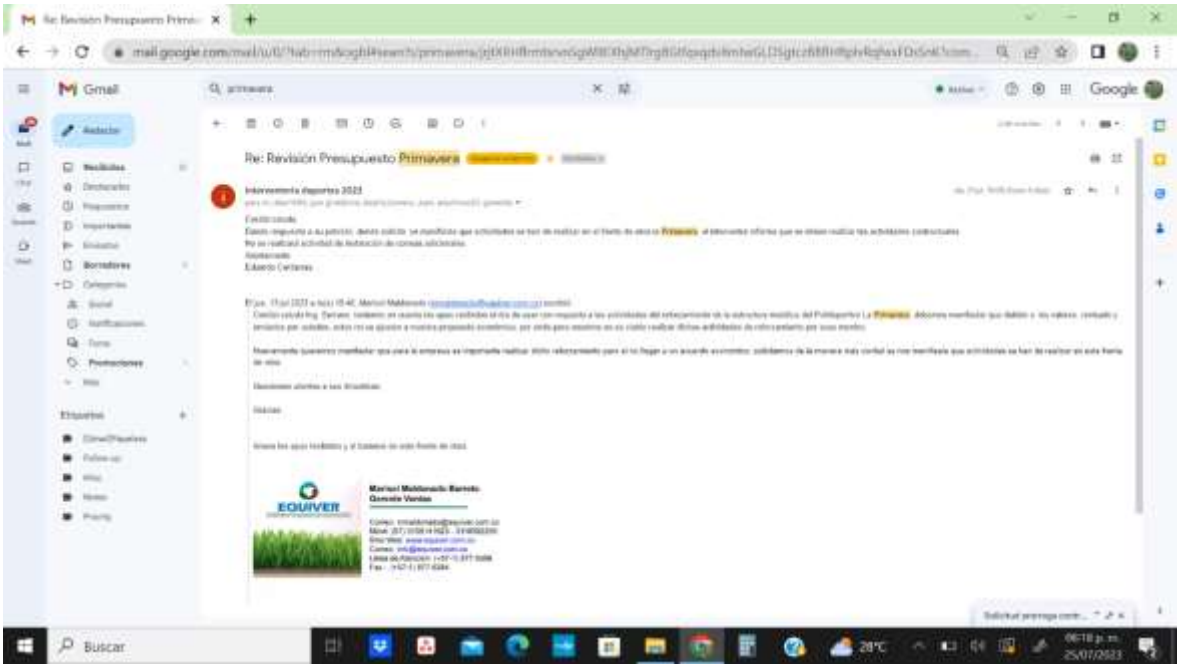

Autop. Medellín K.m 3.5 Costado Sur Modulo 6 Bod. 34 Terminal Terrestre de Carga – Cota/Cundinamarca/Colombia
Telefax: (571) 8985073 Cel: 3108141623 email: mmaldonado@equiver.com.co / Info@equiver.com.co
Web: www.equiver.com.co
