INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	Agosto / 2023	Numero de contrato:	CD-12-2023-4391
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	Maria Olga Macea Buelvas. 1.143.115.512		
Periodo del informe:	Informe comprendido entre el periodo del 28 de junio al 27 de julio de 2023.	Informe número:	01
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: QUINCE MILLONES DE PESOS M/L ($ 15.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES CC. 8662605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. Seguimiento y Supervisión del Contrato Interadministrativo cuyo objeto es: “Estudios y Diseños para los proyectos denominados “Recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín- Distrito Aventura” (UF-4)”, contrato No. CD-12-2020-2435.

2. Asistencia en la realización de respuestas en la plataforma SIGOB, de acuerdo con las solicitudes de ciudadanos, con referencia a la revisión y mantenimiento de vías (reparcheo), para ser incluidas dentro del plan de ejecución.

3. Elaboración y entrega del informe mensual 03 del contrato de Estudios y diseños para la recuperación integral de los caños: Caño de la Ahuyama corredor portuario entre carrera 30 y carrera 38.





Excavacion en los tramos de la cra 30 y 35 con vía al corredor portuario donde se encuentran realizando excavaciones para preparación del talud en donde se colocarán los costales de polietileno que harán de muro de contención, a su vez las retro excavadoras se encuentran llenando los costales con arena y armando la contención para ser posteriormente cubiertas con geotextil.

4. Proceso de supervisión y revisión de las obras que se ejecutan por intermedio de la Secretaría Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, particularmente en el contrato de Ampliación y/o Construcción de la Calle 30 entre la carrera 46 y la circunvalar.



Demolición de andenes, instalación de tuberías Hidrosanitarias, de igual forma colocación de material seleccionado para ser posteriormente compactado.




Realización de cajas de inspección eléctrica correspondiente a los postes de luz, instalación de tubería eléctrica e hidrosanitaria, preparación de material seleccionado para su compactación y posteriormente instalación de losetas táctiles para construcción de andén.





Excavación manual con una profundidad de 2m, retiro de material proveniente de la excavación, demolición de andén existente y construcción de manholes fundidos en sitio y nivelados con una hilera en bloque de cemento, tapa en concreto fundida en sitio para el vertimiento de aguas servidas sobre andén.

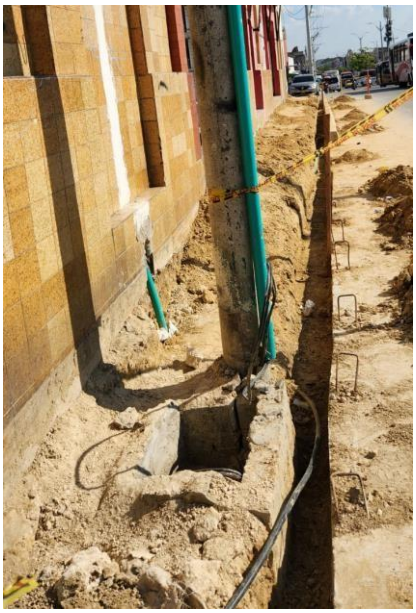



Demolición de andenes existentes, excavación para instalación de tubería eléctrica, fundida de caja para acometida eléctrica, colocación de material seleccionado para su próxima compactación y terminación de la construcción del andén.

5. Proceso de supervisión y revisión de las obras que se ejecutan por intermedio de la Secretaría Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, particularmente en el contrato de Ampliación cordialidad entre Sao La Macarena y carrera 22.







En el sector de la cordialidad en la macarena, se realizaron trabajos de Demolición de andenes, excavaciones para la instalación de tubería sanitaria y construcción de cajas de inspección para aguas servidas y acometidas eléctricas correspondientes al alumbrado público.







Demolición de calzada existente con su respectiva botada.

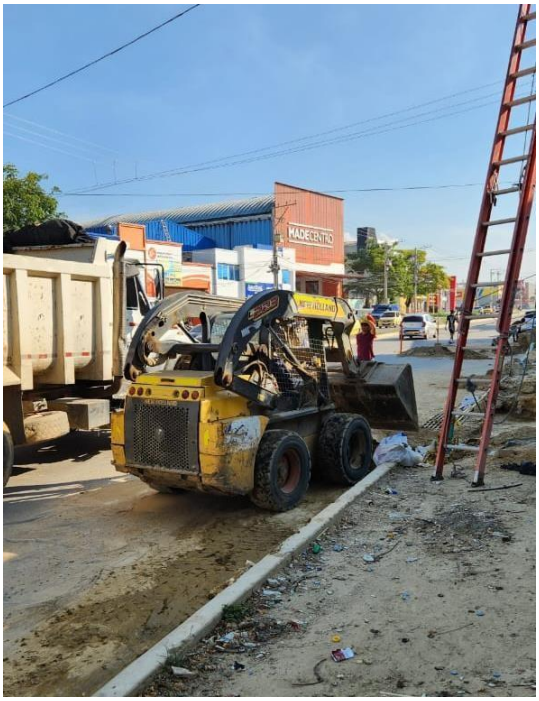

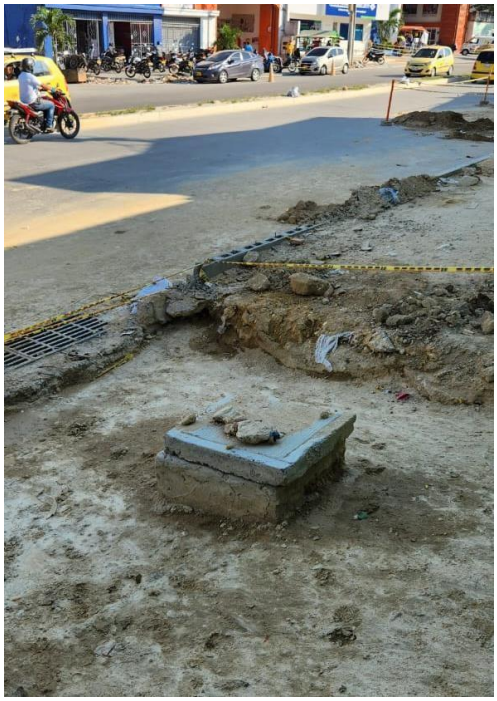

Demolición de andenes y recogida de escombros para su respectiva botada.

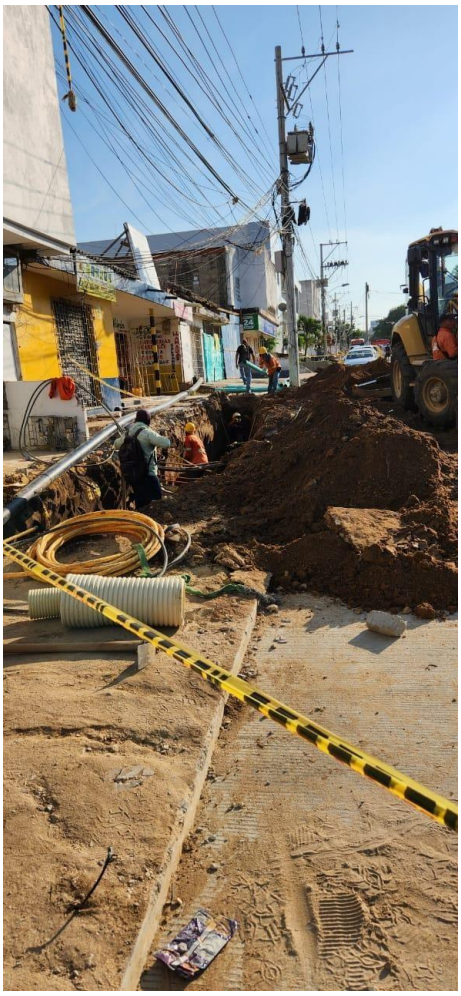

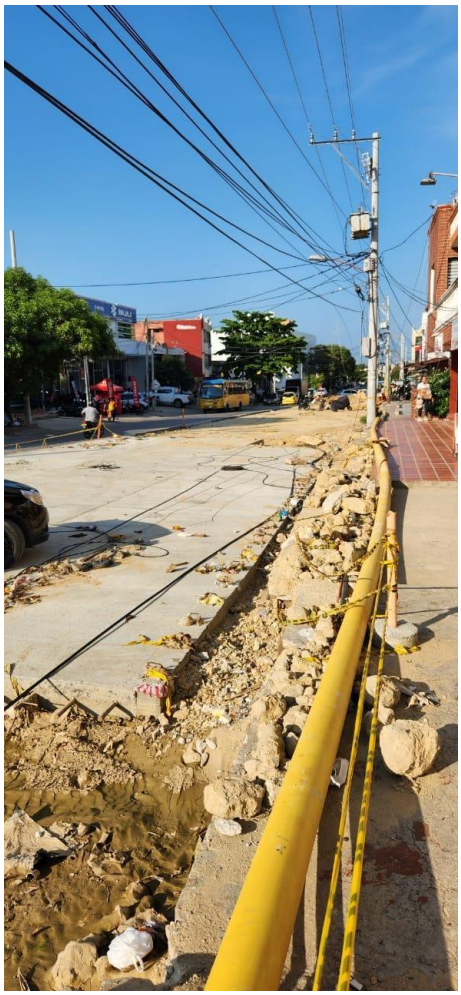

Excavación de maquinaria para el suministro e instalación de acometidas eléctricas y sanitarias.

Atentamente,

MARIA OLGA MACEA BUELVAS

C.C No. 1.143.115.512
Contratista
