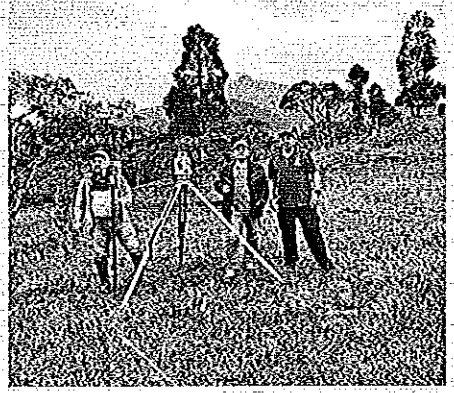
CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	AREA DE VIAS
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA	

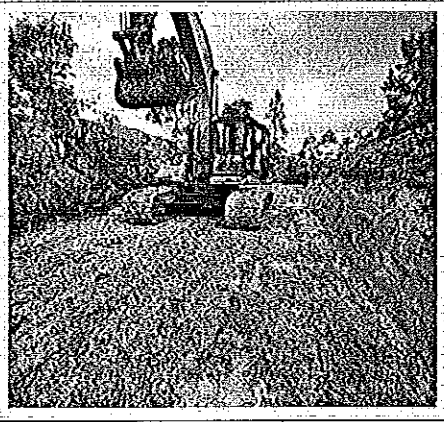
CONTRATO DE OBRA No. 067-2023	OBJETO:	CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIGENCIA 2023

CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CHAVIU	ACTA # :	1	DESDE:	15/mar/2023	HASTA:	26/jul/2023

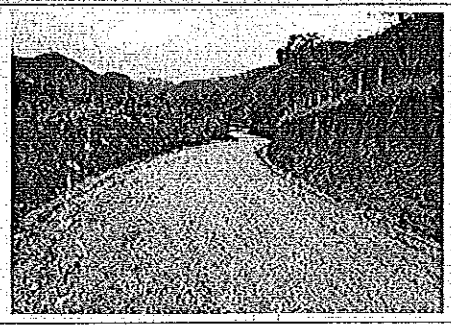
ITEM Nº:	1.10	Descripción: Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciación	UND	KM

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	AREA TOTAL INTERVENIDA						
	Area Via Principal	1.77	1.00		1.00	1.77	1.77
						TOTAL	1.77

ITEM Nº:	1.20	Descripción: Cortes en Material Comun	UND	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	VER CARTERA	1	1.00	1.00	20714.00	20714.00	20714.00
						TOTAL	20714.00

ITEM Nº:	3.10	Descripción: Conformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo	UND	M2

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (--)
		Longitud	Ancho	Altura			
	Via existente	6000	5.00	1.00	1.00	30000.00	30000.00
	Via nueva	1770	7.00	1.00	1.00	12390.00	12390.00
						TOTAL	42390.00

Elaboró:

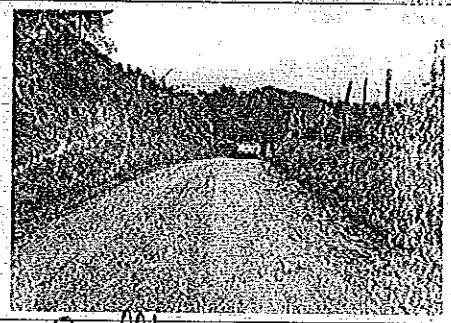
Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión

CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO: F31-OI-400 VERSIÓN 1 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 ENERO DE 2023	CORPORACION NASA KIWE	
		PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	AREA DE VIAS
		MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - PREACTA	

CONTRATO DE OBRA No. 067-2023	OBJETO:	CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIGENCIA 2023					
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CHAVIU	ACTA # :	1	DESDE:	15/mar/2023	HASTA:	26/jul/2023
ITEM Nº:	3.20	Descripción: Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre 5km).				UND	M3

REGISTRO FOTOGRAFICO	UBICACION/DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	Longitud/Area/ Volúmen	TOTAL (=)
		Longitud	Ancho	Altura			
	Via	1770	5.50	0.20	1.00	1947.00	1947.00
						TOTAL	1947.00

Elaboró:

Supervisor de Obra (Residente)

Revisó/ Aprobó

Profesional de Apoyo a la Supervisión
