**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL**

**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes 10. Año 2019.

**CONTRATO N°** 035-00-I-CACOM-6-GRUAL-2019

**CONTRATISTA:** CONSTRUNAL DE AGUAS S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO:** $28.286.300

**FORMA DE PAGO:** PAC Noviembre, según facturación y acta de satisfacción presentada por parte del supervisor del contrato y contratista, la cual será cancelada cuarenta y cinco (45) días posteriores a la radicación de la factura y demás documentos requeridos por la Fuerza Aérea Colombiana.

**FECHA FIRMA**: Día 29. Mes 05. Año 2019.

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS Y EQUIPOS DE LABORATORIO A TODO COSTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día 28. Mes 06. Año 2019.

**CONTRATO MODIFICATORIO 01:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS Y EQUIPOS DE LABORATORIO A TODO COSTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.6.

**FECHA DE FIRMA:** 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA INICIO DE EJECUCION Y HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2019.

**VALOR DEL CONTRATO:** $27.453.300

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| Rutbell Orlando Angarita | **Técnico de Campo** | **N/A** |
| Herrera Dosa Carlos Hugo | **Técnico de Campo** | **N/A** |

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No _X__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No _X__. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**
**(Listar actividades específicas realizadas)**


SE REALIZO MODIFICATORIO AL CONTRATO DONDE SE AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE IGUAL FORMA SE REDUJO EL ITEM RELACIONADO A CONTINUACION, ESTO DEBIDO A QUE DICHOS EQUIPO Y REPUESTOS FUERON DESCONTINUADOS DEL MERCADO.

| Ítem | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 5 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FOTOMETRO. | 1 |

EN EL MES EN CURSO SE ENTREGARON EN LA UNIDAD LOS ITEM RELACIONADOS A CONTINUACION CON SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO Y ENTREGA POR PARTE DEL FUNCIONARIO DE LA EMPRESA QUE REALIZO LA CAPACITACION.

| | |
|---|---|
| **6. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL OXIMETRO**<br>Marca:WTW<br>Modelo: OXI 330 i | Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:<br>• Cambio de membrana<br>• Incluye kit de mantenimiento zbk 325<br>• Calibración del instrumento<br>• Limpieza interna y externa<br>• Cambio de baterías<br>• Limpieza de contactores eléctricos<br><br>**Nota**: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de |

| | |
|---|---|
| | calibración. |
| **7. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VERIFICACION DEL PH METRO**<br>Marca: WTW<br>Modelo: PH 315 i | Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:<br>• Limpieza interna y externa<br>• Calibración con standares trazables a nist ph 4 y ph7<br>• Cambio de baterías<br>• Verificación de sensibilidad y precisión del instrumento<br>• Cambio de electrodo de ph<br>• Revisión de tarjeta electrónica y conexiones<br><br>**Nota**: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de calibración. |
| **8. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TURBIDIMETRO**<br>Marca: HF SCIENTIFIC<br>Modelo: 2000 | Incluye como mínimo las siguiente actividades y las demás que sean necesarias para garantizar su correcto funcionamiento:<br>• Limpieza interna y externa<br>• Incluye estándares certificados<br>• Calibración con estándares certificados y verificación interna y externa del instrumento<br>• Verificación de sensibilidad y precisión del instrumento<br>• Verificación de la alineación de la lámpara<br>• Revisión de tarjeta electrónica y conexiones<br><br>**Nota**: debe anexar certificado de calibración e informe del mantenimiento realizado y el equipo debe venir con Stiker de calibración. |

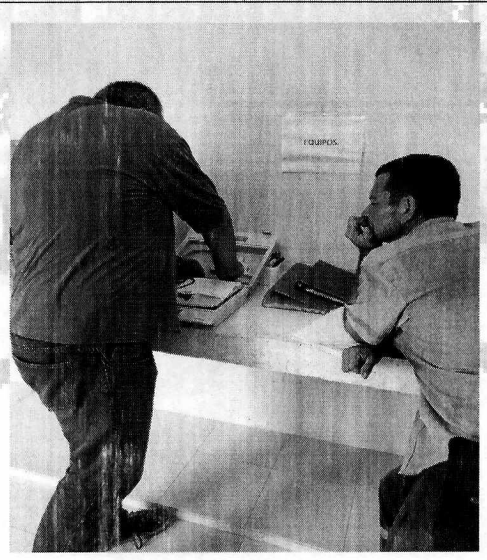

SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**
**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**
**(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**
**"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?**

**SI:___x___ NO_____**

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**
No se han materializado los riesgos.

| | |
|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR: | AT. MAHECHA ESPITIA JUAN CARLOS |
| FIRMA: | |
| C.C. No. | 1073326527 |
| DEPENDENCIA: | CACOM 6 - GRUAL |
