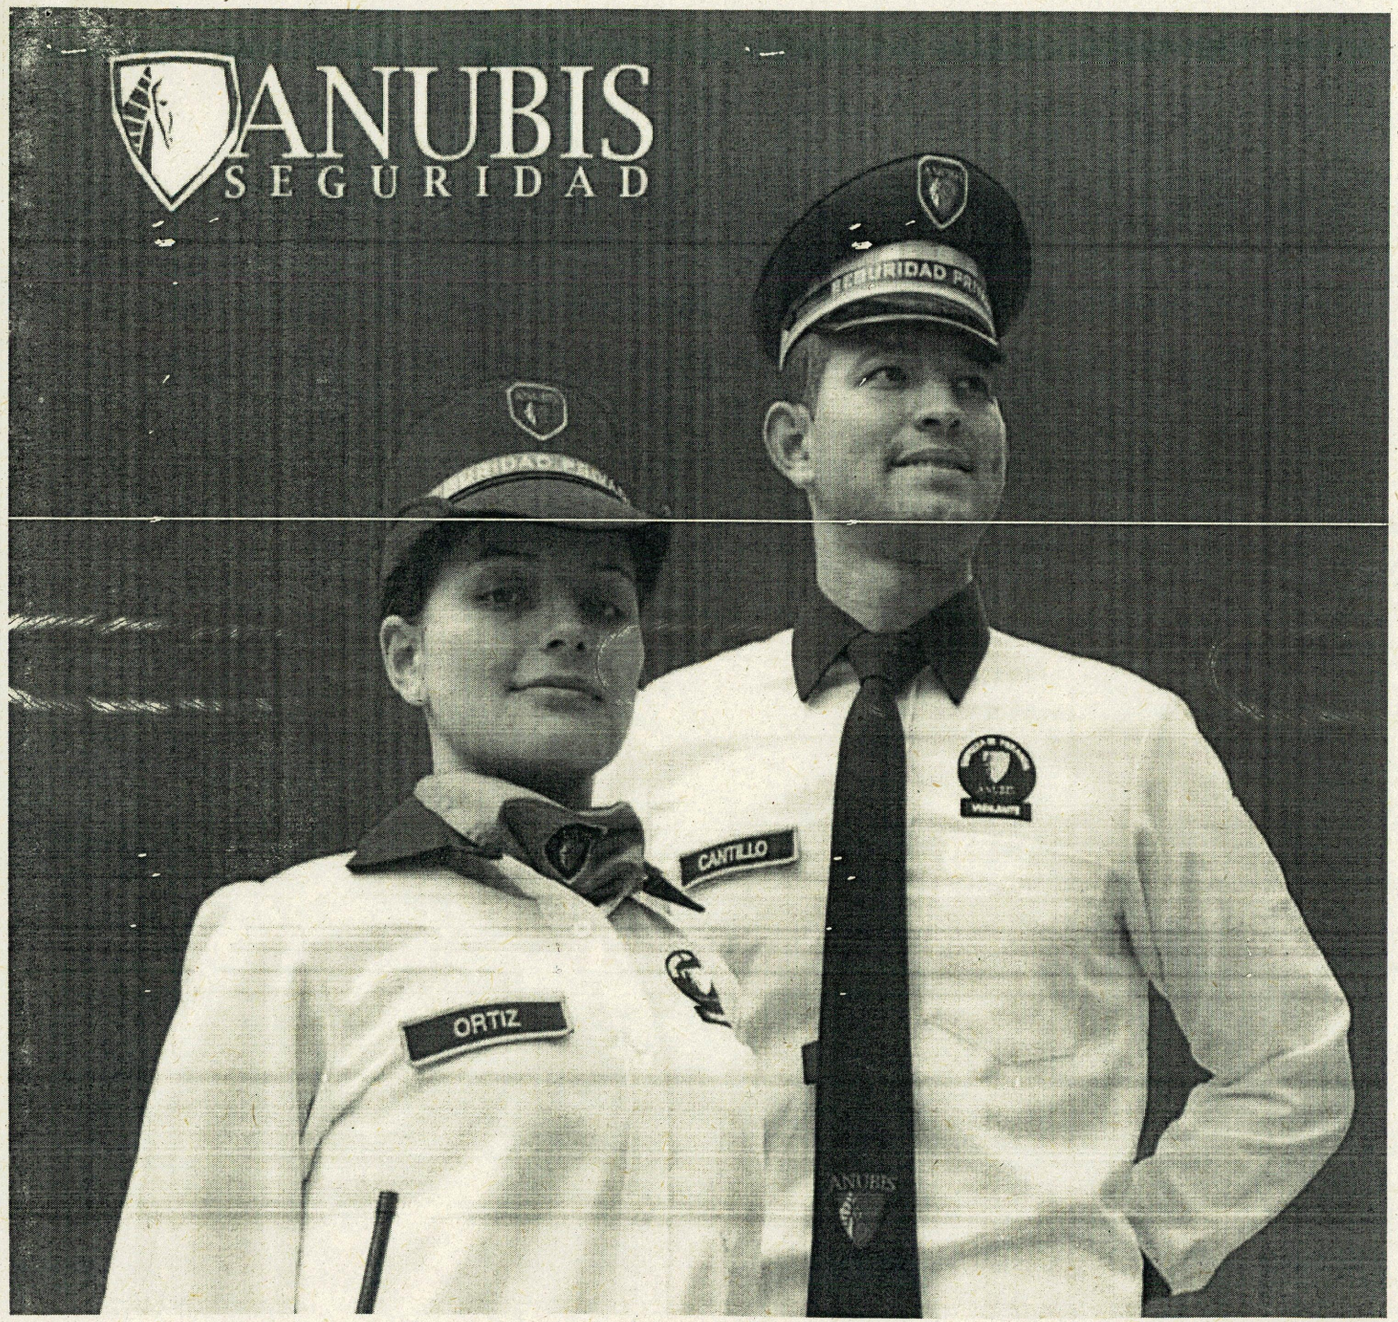


SEGURIDAD ELECTRONICA GOBERNACION DE NARIÑO CONTRATO GN3454-2023

INFORME DE NOVEDADES JULIO 2023

San Juan de Pasto, 11 de octubre de 2023

SEÑORES:
GOBERNACION DE NARIÑO
Dr. FABIO ESTRELLA
Subsecretaria Administrativa

Refeencia: ENTREGA INFORME DE EJECUCION CONTRATO GN3454-2023

OBJETO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA QUE COMPRENDE ALARMAS, CÁMARAS DE SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA GOBERNACIÓN, INCLUYENDO EL ALQUILER, INSTALACIÓN, REPUESTOS, MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS E INSTALACIÓN DE UN ARCO DETECTOR DE METALES EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO"

JULIO 2023.

MONITOREO DE ALARMAS

PUESTO	DIRECCION	CIUDAD	FECHA	INSTALACION DE EQUIPOS	REPORTE EN SISTEMA	OBSERVACION	VALOR ALQUILER MENSUAL	DIAS JULIO	VALOR ALQUILER EQUIPOS	VALOR SERVICIO
1. GOBERNACION EDIFICIO PRINCIPAL.	CALLE 19 No 25-02	PASTO	18/07/2023	(1) central de alarma inalámbrica DSC NEO (34) Sensores de movimiento inalámbrico NEO PG9904 DSC (4) Magnético de trabajo liviano inalámbrico 915 MHz (1) Receptor inalámbrico para NEO DSC (1) Modulo transceptor inalámbrico 915MHz modo host (1) Teclado LCD 5001 (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (1) Sirena 30 Watts (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD				121.219
2. DESPACHO GOBERNADOR.	CALLE 19 No 25-02	PASTO	18/07/2023		INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	459.358,33	14	214.367	121.219
3. OFICINA DE TURISMO PRINCIPAL Y 2DO. PISO DEL EDIFICO CÁMARA DE COMERCIO CENTRO DE CONCILIACIÓN.	CALLE 18 NO 25-25 CENTRO	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (4) Sensor de movimiento LC100 (2) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica. (2) Detector de humo fotoeléctrico 4 hilos con base	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	273.625,00	15	136.813	129.878
4. SECRETARIA DE EDUCACIÓN CALLE 17 NO. 26 - 09.	CALLE 17 NO. 26 - 09 CENTRO	PASTO			PENDIENTE - EN CONSTRUCCION	NO SE HA INSTAALDO EQUIPOS	0,00		-	-

5. SEDE BANDA DEPARTAMENTAL.	CRA 16A NO 13-26 AIRE LIBRE	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica (2) Sensor de rotura de vidrio DG50 Detecto r de humo fotoeléctrico 4 hilos con base.	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	198.668,33	15	99.334	129.878
6. SEDE ANTIGUO FER.	CALLE 17 NO 28-35 CENTRO	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica (2) Sensor de rotura de vidrio DG50 Detector de humo fotoeléctrico 4 hilos con base.	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	198.668,33	15	99.334	129.878
7. PINACOTECA DEPARTAMENTAL.	CRA 26 NO 18-93 CENTRO	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica (2) Sensor de rotura de vidrio DG50 Detector de humo fotoeléctrico 4 hilos con base.	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	198.668,33	15	99.334	129.878
8. AGUARDIENTE NARIÑO BARRIO SAN MIGUEL.	CRA 13A NO 10-53 SAN MIGUEL	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (2) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (11) Sensor de movimiento LC100 (2) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	461.016,67	15	230.508	129.878
9. BODEGA DE RENTAS SAN IGNACIO.	CRA 30A NO 11A-20 SAN IGNACIO	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (5) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	197.010,00	15	98.505	129.878

10. EDIFICIO SEDE CALLE 19 # 27-51 CENTRO.	CALLE 19 # 27-51	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (4) Sensor de movimiento LC100 (2) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica (2) Detector de humo fotoeléctrico 4 hilos con base	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	273.625,00	15	136.813	129.878
11. AGUARDIENTE NARIÑO BARRIO SAN MIGUEL NUEVA BODEGA.	CRA 13A NO 10-53 SAN MIGUEL	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (2) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (8) Sensor de movimiento LC10 0 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica (1) Magnético de trabajo pesado (2) Sensor de humo	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	459.358,33	15	229.679	129.878
12. DIRECCIÓN DE CULTURA.	CALLE 17 CENTRO.	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica (2) Sensor de rotura de vidrio DG50 Detector de humo fotoeléctrico 4 hilos con base	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	197.010,00	15	98.505	129.878
13. BODEGA ALMACÉN	CRA 29 SAN IGNACIO	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado LCD 5001 (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo pesado (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	197.010,00	15	98.505	129.878
14. OFICINA DELEGADA EN BOGOTÁ.	CALLE 104 No 21-85	BOGOTA	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (9) Sensor de movimiento LC100 (2) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878

15. ESTADIO LIBERTAD OFICINA 221	CALLE 12 NO 1 CHAPAL	PASTO	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (4) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo pesado (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	197.010,00	15	98.505	129.878
16. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE IMUÉS.	MUNICIPIO DE IMUES	UNICIPIO DE IMU	17/07/2023	(1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878
17. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE GUACHUCAL.	MUNICIPIO DE GUACHUCAL	ICIPIO DE GUACH	17/07/2023	(1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878
18. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANDONÁ.	MUNICIPIO DE SANDONA	NICIPIO DE SANDO	17/07/2023	(1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878
19. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TANGUA.	MUNICIPIO DE TANGUA	UNICIPIO DE TANG	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878
20. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUPIALES.	MUNICIPIO DE PUPIALES	NICIPIO DE PUPIA	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878

21. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.	MUNICIPIO DE LA UNION	NICIPIO DE LA UN	17/07/2023	(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica I	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	15	156.713	129.878
22. SEDE OPERATIVA DE LA SUBSECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YACUANQUER.	MUNICIPIO DE BUESACO	MUNICIPIO DE BUESACO		(1) Central de alarma 1832 de 8 zonas (1) Teclado RK1555 de 8 zonas (1) Fuente de poder de 16.5 VAC (1) Batería 12 VOL, 7AMP (2) Sensor de movimiento LC100 (1) Magnético de trabajo liviano (1) Sirena (1) Caja metálica	INSTALADO - REPORTANDO A CENTRAL DE MONITOREO ANUBIS	SIN NOVEDAD	313.425,00	6	60.663	51.951
								SUBTOTALES	2.797.853	2.632.187

CCTV							
PUESTO	CIUDAD	FECHA	VISITA TECNICA	REPORTE	VALOR POR SERVICIO MENSUAL	DIAS JULIO	VALOR POR SERVICIO
EDIFICIO SEDE CALLE 19 # 27-51 CENTRO.	PASTO	17/07/2023	(1), DVR de 8 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA. (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (6) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD –metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080 P lente de 2.8 MM 24 Led (6) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios. (6) Video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	409.608,33	15	204.804

ESTADIO DEPARTAMENTAL LIBERTAD	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 8 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA. (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (6) cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD –metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (6) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (6) Video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	409.608,33	15	204.804
COLISEO SUR ORIENTALES	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 8 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (6) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD – metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (6) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (6) Video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	409.608,33	15	204.804
EDIFICIO PASTO PLAZA 4TO PISO	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 4 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (2) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD –metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (2) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (2) video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	409.608,33	15	204.804

OFICINA DE CONTRATACIONJ EDIFICIO LOTERIA DE NARIÑO	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 4 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA (1) Rack metálico o gabinete de 2 RMS. (1) Monitor de 19" (4) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD –metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (4) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (4) Video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	386.391,67	15	193.196
AGUARDIENTE NARIÑO	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 16 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP. TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de II TERAS (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (4) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD – metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (8) Cámara tipo bala 4HD TVI/CVI/AHD – metálica 2MP CMOS IMAG SENSOR 1080P LENTE DE 2.8 MM a 12 MM VARIFOCAL IP 66 24 LED (12) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (12) Video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	421.216,67	15	210.608

AGUARDIENTE NARIÑO DODEGA NUEVA	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 16 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de II TERAS. (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (4) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD – metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (8) Cámara tipo bala 4HD TVI/CVI/AHD – metálica 2MP CMOS IMAG SENSOR 1080P LENTE DE 2.8 MM a 12 . MM VARIFOCAL IP 66 24 LED (12) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (12) video baluma pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	398.000,00	15	199.000
DODEGA DE RENTAS SAN IGNACIO	PASTO	17/04/2023	(1) DVR de 4 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA. (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (4) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD –metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (4) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (4) video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	409.608,33	15	204.804

PINACOTECA	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 4 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de 1 TERA (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19" (4) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD –metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (4) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (4) Envpahd video balum pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	409.608,33	15	204.804
SEDE EDIFICIO VERSALLES 3ER. 4TO. Y 5TO. PISO	PASTO	17/07/2023	(1) DVR de 16 canales H.265 TVI 2CH 3M@15FPS IP2CH4MP. TVI/CVI/AHD HASTA 1080P@15FPS REFERENCIA DS7208HQHIK1 con disco duro de II TERAS. (1) Rack metálico o gabinete de 3 RMS. (1) Monitor de 19". (14) Cámara tipo domo turno HD TVI/CVI/AHD – metálico – 2MP CMOS IMAG SENSOR DE 1080P lente de 2.8 MM 24 Led (14) Fuentes 12 voltios, - 1.5 Amperios (14) video balµma pasivo para HD	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	398.000,00	15	199.000
GOBERNACION EDIFICIO PRINCIPAL.	PASTO	17/07/2023	(1) NVR 32CH. 1.5U, H.265, 320Mbps, Msoporta cámaras IP hasta de 12MP,(2) HDMI, VGA, audio: 1 entrada/ 1 salida Alarma: 16 entradas/6 salidas, 3 puertos USB, RS232, RS485, 2 RJ45, Soporta cámaras con IVS, tecnología P2P, 1 puerto e- SATA (16TB), soporta 4DD SATA X 8TB, con disco duro de 8 TERAS. Alquiler mensual de domo antivandálico IP 4PM, día/noche, IR Smart led 30m, chip CMOS progressive1/3", lente fijo 2.8mm, H.264+, H.265, DWDR, 3D DNR, BLC, HLC, RJ45, IP6, IK10, POE, 12VDC-1ª. con disco duro de 8 TERAS	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	492.525,00	15	246.263

GOBERNACION EDIFICIO PRINCIPAL.	PASTO	28/07/2023	Arco detector de metales	FUNCIONANDO CON NORMALIDAD	509.108,33	3	50.911
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PASTO			DESDE SEGUNDO MES	0,00		-
INSTALACION Y MATERIALES	PASTO			UNICO PAGO			4.145.833

VALOR BRUTO	10.003.089
IVA	1.900.587
VALOR TOTAL A FACTURAR	11.903.675

Realizo: Omar William Toro Jurado
- Coordinador Regional ANUBIS LTDA

Supervisor: FABIO HERNADO ESTRELLA ORDOÑEZ
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
GOBERNACION DE NARIÑO

COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ANUBIS LTDA.
N.I.T. 900.460.759-9
Régimen común, Actividad Económica ICA 8010 tarifa 13.8 x 1.000
No Somos grandes Contribuyentes ni Autorretenedores, ni Agente Retenedores de IVA.
Info@seguridadanubis.com
DIRECCION: CL 90 60 B 08 P 3
TELEFONOS: 6017466918

Datos del Cliente

Nombre : DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Nit 800103923
Dirección : CL 19 23 78
Ciudad : PASTO
Responsabilidad fiscal: O-13 - Gran contribuyente
Regimen fiscal: Responsable de Impuesto a las Ventas (48)
Fecha y hora de validacion: 2023-10-18 11:18:57.875-05:00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FVEA **1942**
FECHA: Octubre 18 DE 2023
Teléfonos : 7233744
Vencimiento 17 11 2023
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de pago: Crédito

ITEMS	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO VIGILANCIA MEDIOS TEC. JULIO 2023	1.00	10,003,088.55	10,003,088.55

TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO AV VILLAS CTA CTE 059016857

TOTAL ITEMS EN LA FACTURA	**1**

VALOR EN LETRAS
ONCE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10,003,088.55
BASE AIU 10%	1,000,308.86
I.V.A.	1,900,586.82
TOTAL VENTA	11,903,675.37

La presenta factura de venta se asimila en todos sus efectos una letra de cambio (Art 774 del código de Comercio). En caso de mora el deudor pagara un interés, a la tasa máxima vigente en la fecha de su causación. La firma de terceros en representación, mandatos u otra calidad similar al nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art 640 del código de Comercio e igualmente constancia de entrega real y a entera satisfacción.

Resolución de Facturación electrónica DIAN No. 18764054734238 de fecha 23/08/2023, Numeración Habilita del FVEA 1800 al FVEA 10000. Por 12 meses.

CUFE: c5caaf455d6b6840bb30fadac3dab57ac20d991042700ba8f38ea690646fa526e2cb414bc1de8473bea42534c7ab5412
