"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.	2				
1.2. Período del informe	Del	13/10/2023			
	Al	27/10/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RO-0021	Fecha	18/08/2023	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINIA/VAUPES Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS					
1.5. Nombre del contratista					
BERMORI GRANADA VALENCIA					
1.6. Cédula o NIT		1.7. Correo electrónico			
76.325.377		granvalingenieria@gmail.com			
1.8. Dirección		1.9. Teléfono			
CALLE 3 No. 6-80 Buenaventura (Valle del cauca)		315 - 497 - 0774			
1.10. Fecha de Inicio		31/08/2023			
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio		☑ Registro Presupuestal			
☑ Aprobación de la Garantía		☑ Suscripción del Contrato			
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)		SI APLICA		N/A	

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO – ORINOQUIA – SECCION BIENES, SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO	**608 6611990 ext. 85019**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2.4. Correo electrónico	**orlando.fernandez@fiscalia.gov.co**

2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)

N/A

2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A

2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 400.000.000	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A		
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
4723	2023-02-06

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
218833	2023-08-18

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	N/A

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/10/2023	$ 400.000.000,00	$ 0	$ 0	$ 400.000.000,00
27/10/2023	$ 400.000.000,00	$ 0	$149.999.803,63	$ 250.000.196,37

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales N/A

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).N/A

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	37.5%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	40%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 24/10/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	x			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	x			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	x			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

1 Certificado de Pago de parafiscales
2 Recibo Satisfacion1 Octubre
3 Facturas Acta 01
BGV 84 $ 91.263.232,76
BGV 85 $ 22.835.283,88

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

BGV 86 $ 10.573.890,84
BGV 87 $ 2.479.207,26
BGV 88 $ 3.895.504,71
BGV 89 $ 18.952.684,22
4 COMUNICADO 30940-0654 PERMISOS GRANVAL -MMTO SEDES -
5 Acta01 - BALANCE CTO FGN-RO-RO-21

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A

Tipo y detalle del informe:	Acta parcial de entrega de obra PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se verifica el cumplimiento del cronograma de actividades.

1. **VERIFICACION DE ACTA 01 DE OBRA**

El Supervior el ingeniero Eddie Orlando Fernandez Gil, en calidad de supervisor del contrato FGN-RO-21-2023, y Residente de Obra Ing. Civil Daniel Londoño Gómez en representación del contratista se realizan seguimiento a los sitios a intervenir

No		
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Cambio piso de garaje, pintura punto fijo.
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED
3	CAIVAS KR 37 34 108	Divisiones en vidrio en piso 2 y 3
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	Terminación de división Drywall y techo en PVC
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Implementación de recepción de recibo de documentos ventanilla única

Se realiza una medición para determinar las cantidades implementadas.

Se hace levantamiento fotográfico de los sitios posterior a la intervención

Se realiza registro de grafico que permite hacer seguimiento a intervenciones.

2. **VERIFICACIÓN SEDES DE SEDES EN VILLAVICENCIO**

Participantes:
DANIEL LONDOÑO GÓMEZ: Ingeniero Residente
EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL - Supervisión

Objetivo: Reconocimiento sitios de intervención:
Se realiza visita en las sedes en Villavicencio para precisar las necesidades de cada sitio de intervención.

El contratista realiza inspección en las sedes para detallar cantidades y costos de los ítems a consumir de los mantenimientos a realizar.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3. VISITA SEDE SAN JOSÉ DE GUAVAIRE

Participantes:
Sury Andrea Serrato – Subdiretora Regional Orinoquia
Daniel Londoño Gómez: Ingeniero Residente
Objetivo: reconocimiento sitios de intervención:
Se realiza visita en la sede de interevión en Guaviare para verificar las la entrega de sitios intervenidos.

4. REUNIÓN CON CONTRATISTA - INTERVENTORIA - SUBDIRECCIÓN

El contratista realiza inspección en las sedes y presenta el presupuesto detallando cantidades y costos de los ítems a consumir de los mantenimientos a realizar.

Se hace seguimiento al cronograma donde expone los tiempos de entraga en cada sede.

Se autoriza el ingreso de personal a las sedes para efectos de diagnostico inspección y levantamiento de información.

Se tramita para pago para el mes de octubre de acuerdo a las facturas y Actad e obra.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

MALO	REGULAR	BUENO	N/A
○	○	○	◉

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A



FIRMA RESPONSABLES



Interventor(es) / Supervisor (es)

Nombre	Cédula
Eddie Orlando Fernandez Gil	17.335.913

Ciudad	Villavicencio	Fecha	27/10/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Eddie Orlando Fernandez Gil.**		**27/10/2023**
Revisó	**Eddie Orlando Fernandez Gil.**		**27/10/2023**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02 Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN


[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RO-21 **VIGENCIA** 2023

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BERMORI GRANADA VALENCIA
CÉDULA O NIT	C.C. 76.325.377
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	granvalingenieria@gmail.com
PERIODO DEL SERVICIO:	Del 04 septiembre al 24 octubre de 2023
OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINIA/VAUPES Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	Del 04 septiembre al 31 diciembre de 2023
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	Se realizarán PAGOS MENSUALES de acuerdo con los mantenimientos realizados y recibos a satisfacción por parte del SUPERVISOR, en concordancia con los proyectos y solicitudes realizados por la Fiscalía General de la Nación, previa presentación de la factura correspondiente y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto asignado.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	BGV 84 $ 91.263.232,76 BGV 85 $ 22.835.283,88 BGV 86 $ 10.573.890,84 BGV 87 $ 2.479.207,26 BGV 88 $ 3.895.504,71 BGV 89 $ 18.952.684,22
VALOR A PAGAR:	$ 149.999.803,67

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	37-44-101041452	Fecha:	18/08/2023		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	218833	Fecha:	18/08/2023	Vr. $	149.999.803,67
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	218833	Fecha:	18/08/2023	Vr. $	400.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	Eddie Orlando Fernandez Gil		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	17335913		
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL DE GESTIÓN III		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO O	**TEL. Ext.:**	608 6611990 ext. 85019
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	orlando.fernandez@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	24/10/2023

OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 84

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	24/10/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	90.835.330,79

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**75.070.521,31**
SUBTOTAL	**90.835.330,79**
IVA UTILIDAD	**427.901,97**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**91.263.232,76**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	11.260.578,20	15,00
Imprevistos	2.252.115,64	3,00
Utilidad	2.252.115,64	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 23:07:10

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 81b8a049239fb2cd64cacb0d9cfb21200f2ad7e150416e2945d98de091f35ca1144588fc284ea67f406f23ac432f6fae--Expedición:23/10/2023 11:22 PM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 85

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE CAIVAS - VILLAVICENCIO - META

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	24/10/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE CAIVAS - VILLAVICENCIO - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	22.728.217,07

Total líneas o ítems: 1

COSTO DIRECTO	**18.783.650,47**
SUBTOTAL	**22.728.217,07**
IVA UTILIDAD	**107.066,81**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.835.283,88**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.817.547,57	15,00
Imprevistos	563.509,51	3,00
Utilidad	563.509,51	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 23:25:40

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 34522f11b72bdb52b224d567bf459585949069e24ba6b4b8e995748a29058ddeba7912ce5e61fc60ccf36690d26104bf--Expedición:23/10/2023 11:44 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 86

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	24/10/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	10.524.313,50

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**8.697.779,75**
SUBTOTAL	**10.524.313,50**
IVA UTILIDAD	**49.577,34**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.573.890,84**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.304.666,96	15,00
Imprevistos	260.933,39	3,00
Utilidad	260.933,39	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 23:48:24

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: fe92c4c4977cb4447e7be9fd2aa4cdcb4cb57dd09cbdb80eb4594843a51de6ff62fe5c176bac7475a0d1f1aa00ae00b3--Expedición:23/10/2023 11:53 PM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 87

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE URI - VILLAVICENCIO - META

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/10/2023	24/10/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE URI - VILLAVICENCIO - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	2.467.583,11

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE CON VEINTISEIS CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**2.039.324,88**
SUBTOTAL	**2.467.583,11**
IVA UTILIDAD	**11.624,15**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.479.207,26**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	305.898,73	15,00
Imprevistos	61.179,75	3,00
Utilidad	61.179,75	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2023 23:58:26

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 019ad3b49a42d210139959f2030a5545b6f7b2d902c92b5c3f234f32dbe7a7021d252a004bb8dc8b375c1d3763d9d4ba--Expedición:24/10/2023 12:04 AM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 88

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE PALACIO DE JUSTICIA - VILLAVICENCIO - META

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	25/10/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE PALACIO DE JUSTICIA - VILLAVICENCIO - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	3.877.240,03

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON SETENTA Y UNO CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**3.204.330,60**
SUBTOTAL	**3.877.240,03**
IVA UTILIDAD	**18.264,68**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.895.504,71**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	480.649,59	15,00
Imprevistos	96.129,92	3,00
Utilidad	96.129,92	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2023 00:11:26

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 464588968152f65c3b02ef0e2691a60785e88b4392d2751e7d70f8405089385a4122e1fa1b79a34853c70327ccd85b69--Expedición:24/10/2023 12:28 AM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 89

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/10/2023	25/10/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE URI - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	18.863.821,59

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON VEINTIDOS CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**15.589.935,19**
SUBTOTAL	**18.863.821,59**
IVA UTILIDAD	**88.862,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**18.952.684,22**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.338.490,28	15,00
Imprevistos	467.698,06	3,00
Utilidad	467.698,06	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/10/2023 06:40:05

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com



C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 3359b7bfc0c152bd7145b96c5946c518cd8894e3e130939e8d71f72b2a8921cdbccb003d8c42b9dd116a599e54e3507a--Expedición:24/10/2023 06:55 AM

EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA
CONTADOR PÚBLICO
NIT 66.743.601 - 5
CR 80 No. 5 - 40 TEL. 2431840 - 3154932250
BUENAVENTURA

Yo, **EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA**, con la cedula de ciudadanía no. 66.743.601 Exp. Btura, en uso de las facultades conferidas por la Junta Central de Contadores de Colombia.

CERTIFICO

Que el señor **BERMORI GRANADA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.325.377 expedida en Popayán, se encuentra a PAZ y SALVO con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias y modificatorias) en los periodos correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Que en constancia de lo anterior se firma el presente documento en la ciudad de Buenaventura a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2023.

EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA
Contadora Pública TP 183435-T

BERMORI GRANADA VALENCIA
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



183435-T

EDIS YAMARIS
CANDELO MICOLTA
C.C. 66743601
RES. INSCRIPCION 624 DEL 06/11/2013
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266474 **194796**

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

87D345C8D10CDDD8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66743601 de BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 183435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ***

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Oficio 30940-0654

Villavicencio, 06 de octubre de 2023

Señor
ALFONSO MELO ERAZO
Responsable Grupo de Seguridad Infraestructuras y Personas
Dirección de Protección y Asistencia – Departamento de Seguridad
Regional Orinoquia.

ASUNTO: **PERMISOS ACCESO A LA SEDES**

Comedidamente solicito su valiosa colaboración en el sentido de autorizar a quien corresponda el acceso a las personas relacionadas a la sede de la Fiscalía General de la Nación de la Regional Orinoquia como aparece a continuación.

EMPRESA	GRAN VAL INGENIERIA
FECHAS	06/10/2023 Hasta 30/10/2023
ACTIVIDADES	OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO DE SEDES
SEDES	Entrerios, URI, Guatiquia, CAIVAS, Archivo en Villavicencio, San José de Guaviare y Retorno.

NOMBRE Y APELLIDO	**NO. DE IDENTIFICACIÓN**
BERMORI GRANDA VALENCIA	C.C 76.325.377
EULHYN MAYRELL CORREA ORTIZ	CC 31.655.741
CARLOS ANDRÉS CUBIDES SANTOS	CC 86.050.461
JAVIER ESNEIDER TOVAR AMUD	CC 1.018.455.674
AUBIN LAMPREA GOMEZ	CC 4.082.932
JULIO ENRIQUE MORENO CRUZ	CC 17.130.720
GERMAN DOMINGO GARCES JORI	C.C 10.55.91.49
ALEXANDER CARDOZO MADRID	C.C 1.121.89.04.77
DANIEL LONDOÑO GOMEZ	C.C 75.094.586
BESTY ANDREA FIERRO GUZMAN	C.C 40.325.117
ERIKA LONDOÑO GOMEZ	C.C 43.455.805
HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO	C.C 16.114.293
ALEXANDER CASTRO MUÑOZ	C.C 1.113.631.738
DONALDO VALENCIA RODRIGUEZ	C.C 18.201.670
YOLVIS RODRIGUEZ PARADA	C.C 1.052.572.427
LIBARDO RODRIGUEZ LADINO	C.C 1.121.831.459
CRISTIAN FABIAN BENITEZ TORO	C.C 1.121.911.371

Gracias por su atención
Atentamente,

EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL
Coordinador Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo (e)
Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía
Email: orlando.fernandez@fiscalia.gov.co.
Tel 3219559152

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA | **X** (marque X) | **No. Acta** | **$ 1,00** | **ACTA FINAL** | (marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 | **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE: SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META SEDE CAIVAS - VILLAVICENCIO - METASEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	**PLAZO INICIAL**	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		**FECHA INICIACION**	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	**FECHA TERMINACION**	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 149.999.803,67	**PLAZO TOTAL**	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 67/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS | **OBRA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA								ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						GUATIQUIA	CAIVAS	ARCHIVO	URI	SAN JOSE	PAL JUSTICIA	TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1.1	Demolición de piso existente.	M2	178,63	19.963,00	$ 3.565.990,69	178,63	-	-	-			178,63	$ 3.565.990,69		$ -	178,63	$ 3.565.990,69
1.2	Demolición de mampostería	M2	1,70	15.321,00	$ 26.045,70	1,70	-	-	-			1,70	$ 26.045,70		$ -	1,70	$ 26.045,70
1.4	Desmonte de marcos y puertas	UN	7,00	$ 20.741,00	$ 145.187,00	7,00	-	-	-			7,00	$ 145.187,00		$ -	7,00	$ 145.187,00
1.5	Regata instalación sanitaria	ML	22,50	$ 16.682,00	$ 375.345,00	22,50	-	-	-			22,50	$ 375.345,00		$ -	22,50	$ 375.345,00
1.6	Demolición de guardaescobas existente	ML	30,64	$ 5.379,00	$ 164.812,56	30,64	-	-	-			30,64	$ 164.812,56		$ -	30,64	$ 164.812,56
1.8	Retiro de cableado UTP y eléctrico	ML	1,00	$ 17.760,00	$ 17.760,00	1,00	-	-	-			1,00	$ 17.760,00		$ -	1,00	$ 17.760,00
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	10,09	$ 20.494,00	$ 206.784,46	6,39	-	-	-		3,70	10,09	$ 206.784,46		$ -	10,09	$ 206.784,46
1.12	Desmonte de canaleta metalica	ML	6,00	$ 6.776,00	$ 40.656,00	6,00	-	-	-			6,00	$ 40.656,00		$ -	6,00	$ 40.656,00
1.14	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	M3	44,38	$ 92.401,00	$ 4.100.756,38	44,38	-	-	-			44,38	$ 4.100.756,38		$ -	44,38	$ 4.100.756,38
2.1	Elaboración de viga en concreto armado	M3	0,36	$ 963.727,00	$ 346.941,72	0,36	-	-	-			0,36	$ 346.941,72		$ -	0,36	$ 346.941,72
2.5	Suministro e instalación malla electrosoldada 5mm. Incluye corte y fijación.	kg	730,89	$ 45.218,00	$ 33.049.384,02	730,89	-	-	-			730,89	$ 33.049.384,02		$ -	730,89	$ 33.049.384,02
3.2	Elaboración de muro en bloque No. 4	M2	1,71	$ 58.512,00	$ 100.055,52	1,71	-	-	-			1,71	$ 100.055,52		$ -	1,71	$ 100.055,52
5.1	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	30,80	$ 34.208,00	$ 1.053.606,40	30,80	-	-	-			30,80	$ 1.053.606,40		$ -	30,80	$ 1.053.606,40
5.3	Ceramica piso de 50 X 50 cm	M2	36,74	$ 83.844,00	$ 3.080.428,56	36,74	-	-	-			36,74	$ 3.080.428,56		$ -	36,74	$ 3.080.428,56
5.8	Guardaescoba en ceramica de .08 m	ML	27,90	$ 36.556,00	$ 1.019.912,40	27,90	-	-	-			27,90	$ 1.019.912,40		$ -	27,90	$ 1.019.912,40
6.6	Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e instalación.	M2	3,30	$ 590.502,00	$ 1.948.656,60	-	-	3,30	-			3,30	$ 1.948.656,60		$ -	3,30	$ 1.948.656,60
7.3	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	118,21	$ 22.155,00	$ 2.618.942,55	118,21	-	-	-			118,21	$ 2.618.942,55		$ -	118,21	$ 2.618.942,55
7.9	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	M2	37,94	$ 99.473,00	$ 3.773.607,73	-	8,03	14,57	-	15,33		37,94	$ 3.773.607,73		$ -	37,94	$ 3.773.607,73
7.10	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	32,00	$ 32.248,00	$ 1.031.936,00	12,00	-	-	-		20,00	32,00	$ 1.031.936,00		$ -	32,00	$ 1.031.936,00
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	584,20	$ 32.446,00	$ 18.954.953,20	564,20	-	-	-		20,00	584,20	$ 18.954.953,20		$ -	584,20	$ 18.954.953,20
7.15	Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate	M2	42,12	$ 78.205,00	$ 3.293.994,60	-	-	42,12	-			42,12	$ 3.293.994,60		$ -	42,12	$ 3.293.994,60
7.16	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	ML	40,80	$ 32.380,00	$ 1.321.104,00	16,00	-	24,80	-			40,80	$ 1.321.104,00		$ -	40,80	$ 1.321.104,00
9.3	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	ML	42,00	$ 72.987,00	$ 3.065.454,00	42,00	-	-	-			42,00	$ 3.065.454,00		$ -	42,00	$ 3.065.454,00
9.14	Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1,00	$ 100.277,00	$ 100.277,00	1,00	-	-	-			1,00	$ 100.277,00		$ -	1,00	$ 100.277,00
9.17	Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	5,00	$ 146.263,00	$ 731.315,00	5,00	-	-	-			5,00	$ 731.315,00		$ -	5,00	$ 731.315,00
9.22	Cajas de inspeccion de 1*1 mts	UN	2,00	$ 489.923,00	$ 979.846,00	2,00	-	-	-			2,00	$ 979.846,00		$ -	2,00	$ 979.846,00
10,5	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanIZAda, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$ 150.296,00	$ 150.296,00	-	-	1,00	-			1,00	$ 150.296,00		$ -	1,00	$ 150.296,00
10,6	Suministro e instalación de Lampara LED. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable rencauchutado #12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanIZAda hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	4,00	$ 263.072,00	$ 1.052.288,00	-	-	4,00	-			4,00	$ 1.052.288,00		$ -	4,00	$ 1.052.288,00
11,1	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	2,16	$ 692.303,00	$ 1.495.374,48	-	-	-	2,16			2,16	$ 1.495.374,48		$ -	2,16	$ 1.495.374,48

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA	X (marque X)	No. Acta	$ 1,00	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE: SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META SEDE CAIVAS - VILLAVICENCIO - METASEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	**PLAZO INICIAL**	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		**FECHA INICIACION**	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	**FECHA TERMINACION**	: 29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 149.999.803,67	**PLAZO TOTAL**	: 120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES 67/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS | **OBRA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA GUATIQUIA	CAIVAS	ARCHIVO	URI	SAN JOSE	PAL JUSTICIA	TOTAL	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	VR. EJECUTADO
11,2	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,20	$ 453.292,00	$ 543.950,40	-	-	-	1,20			1,20	$ 543.950,40		$ -	1,20	$ 543.950,40
11,3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	31,40	$ 495.844,00	$ 15.569.501,60	-	27,70	-	-		3,70	31,40	$ 15.569.501,60		$ -	31,40	$ 15.569.501,60
11,4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	31,03	$ 590.223,00	$ 18.314.619,69	-	7,20	-	-	23,83		31,03	$ 18.314.619,69		$ -	31,03	$ 18.314.619,69
11,5	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	M2	6,39	$ 179.305,00	$ 1.145.758,95	6,39	-	-	-			6,39	$ 1.145.758,95		$ -	6,39	$ 1.145.758,95
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 123.385.542,21**								**$ 123.385.542,21**		**$ -**	-	**$ 123.385.542,21**
	VALOR COSTO DIRECTO OBRA				**$ 123.385.542,21**	75.070.521,31	18.783.650,48	8.697.779,76	2.039.324,88	15.589.935,18	3.204.330,60		**$ 123.385.542,21**		**$ -**		**$ 123.385.542,21**
	ADMINISTRACION	**(15,00%**			**$ 18.507.831,33**	11.260.578,20	2.817.547,57	1.304.666,96	305.898,73	2.338.490,28	480.649,59		**$ 18.507.831,33**		**$ -**		**$ 18.507.831,33**
	IMPREVISTOS.	**(3,00%**			**$ 3.701.566,27**	2.252.115,64	563.509,51	260.933,39	61.179,75	467.698,06	96.129,92		**$ 3.701.566,27**		**$ -**		**$ 3.701.566,27**
	UTILIDAD.	**(3,00%**	**21,57%**		**$ 3.701.566,27**	2.252.115,64	563.509,51	260.933,39	61.179,75	467.698,06	96.129,92		**$ 3.701.566,27**		**$ -**		**$ 3.701.566,27**
	IVA SOBRE UTILIDAD	**(19,00%**			**$ 703.297,59**	427.901,97	107.066,81	49.577,34	11.624,15	88.862,63	18.264,68		**$ 703.297,59**		**$ -**		**$ 703.297,59**
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 149.999.803,67**	91.263.232,76	22.835.283,88	10.573.890,84	2.479.207,26	18.952.684,21	3.895.504,71		**$ 149.999.803,67**		**$ -**		**$ 149.999.803,67**
	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA												**100,00%**		**$ -**		**100,00%**

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 91.263.232,76	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 76/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS | **OBRA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
1.1	Demolición de piso existente.	M2	178,63	$ 19.963,00	$ 3.565.990,69	178,63	$ 3.565.990,69		$ -	178,63	$ 3.565.990,69
1.2	Demolición de mampostería	M2	1,70	$ 15.321,00	$ 26.045,70	1,70	$ 26.045,70		$ -	1,70	$ 26.045,70
1.4	Desmonte de marcos y puertas	UN	7,00	$ 20.741,00	$ 145.187,00	7,00	$ 145.187,00		$ -	7,00	$ 145.187,00
1.5	Regata instalación sanitaria	ML	22,50	$ 16.682,00	$ 375.345,00	22,50	$ 375.345,00		$ -	22,50	$ 375.345,00
1.6	Demolición de guardaescobas existente	ML	30,64	$ 5.379,00	$ 164.812,56	30,64	$ 164.812,56		$ -	30,64	$ 164.812,56
1.8	Retiro de cableado UTP y eléctrico	ML	1,00	$ 17.760,00	$ 17.760,00	1,00	$ 17.760,00		$ -	1,00	$ 17.760,00
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	6,39	$ 20.494,00	$ 130.956,66	6,39	$ 130.956,66		$ -	6,39	$ 130.956,66
1.12	Desmonte de canaleta metalica	ML	6,00	$ 6.776,00	$ 40.656,00	6,00	$ 40.656,00		$ -	6,00	$ 40.656,00
1.14	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	M3	44,38	$ 92.401,00	$ 4.100.756,38	44,38	$ 4.100.756,38		$ -	44,38	$ 4.100.756,38
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
2.1	Elaboración de viga en concreto armado	M3	0,36	$ 963.727,00	$ 346.941,72	0,36	$ 346.941,72		$ -	0,36	$ 346.941,72
2.5	Suministro e instalación malla electrosoldada 5mm. Incluye corte y fijación.	kg	730,89	$ 45.218,00	$ 33.049.384,02	730,89	$ 33.049.384,02		$ -	730,89	$ 33.049.384,02
3	**MAMPOSTERIA**										
3.2	Elaboración de muro en bloque No. 4	M2	1,71	$ 58.512,00	$ 100.055,52	1,71	$ 100.055,52		$ -	1,71	$ 100.055,52
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**										
5	**PISOS**										
5.1	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3	M2	30,80	$ 34.208,00	$ 1.053.606,40	30,80	$ 1.053.606,40		$ -	30,80	$ 1.053.606,40
5.3	Ceramica piso de 50 X 50 cm	M2	36,74	$ 83.844,00	$ 3.080.428,56	36,74	$ 3.080.428,56		$ -	36,74	$ 3.080.428,56
5.8	Guardaescoba en ceramica de .08 m	ML	27,90	$ 36.556,00	$ 1.019.912,40	27,90	$ 1.019.912,40		$ -	27,90	$ 1.019.912,40
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
7	**IMPERMEABilizacIÓN, PINTURA Y ACABADOS**										
7.3	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	118,21	$ 22.155,00	$ 2.618.942,55	118,21	$ 2.618.942,55		$ -	118,21	$ 2.618.942,55
7.10	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	12,00	$ 32.248,00	$ 386.976,00	12,00	$ 386.976,00		$ -	12,00	$ 386.976,00
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	564,20	$ 32.446,00	$ 18.306.033,20	564,20	$ 18.306.033,20		$ -	564,20	$ 18.306.033,20
7.16	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	ML	16,00	$ 32.380,00	$ 518.080,00	16,00	$ 518.080,00		$ -	16,00	$ 518.080,00
8	**CUBIERTA**										
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
9.3	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	ML	42,00	$ 72.987,00	$ 3.065.454,00	42,00	$ 3.065.454,00		$ -	42,00	$ 3.065.454,00
9.14	Punto sanitario de desague de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1,00	$ 100.277,00	$ 100.277,00	1,00	$ 100.277,00		$ -	1,00	$ 100.277,00
9.17	Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	5,00	$ 146.263,00	$ 731.315,00	5,00	$ 731.315,00		$ -	5,00	$ 731.315,00
9.22	Cajas de inspeccion de 1*1 mts	UN	2,00	$ 489.923,00	$ 979.846,00	2,00	$ 979.846,00		$ -	2,00	$ 979.846,00
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**										
11,5	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	M2	6,39	$ 179.305,00	$ 1.145.758,95	6,39	$ 1.145.758,95		$ -	6,39	$ 1.145.758,95
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 75.070.521,31**	SUB TOTAL	**$ 75.070.521,31**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 75.070.521,31**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 91.263.232,76	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 76/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS					OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
	VALOR COSTO DIRECTO OBRA				$ 75.070.521,31	$ 75.070.521,31	$ -	$ 75.070.521,31
	ADMINISTRACION (15,00%)				$ 11.260.578,20	$ 11.260.578,20	$ -	$ 11.260.578,20
	IMPREVISTOS. (3,00%)				$ 2.252.115,64	$ 2.252.115,64	$ -	$ 2.252.115,64
	UTILIDAD. (3,00%)				$ 2.252.115,64	$ 2.252.115,64	$ -	$ 2.252.115,64
	IVA SOBRE UTILIDAD (19,00%)				$ 427.901,97	$ 427.901,97	$ -	$ 427.901,97
	VALOR TOTAL OBRA				$ 91.263.232,76	$ 91.263.232,76	$ -	$ 91.263.232,76
	PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA					100,00%		100,00%

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE CAIVAS - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 22.835.283,88	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 88/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3	**MAMPOSTERIA**										
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**										
5	**PISOS**										
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
7	**IMPERMEABilizacIÓN, PINTURA Y ACABADOS**										
7.9	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	M2	8,03	$ 99.473,00	$ 799.166,08	8,03	$ 799.166,08		$ -	8,03	$ 799.166,08
8	**CUBIERTA**										
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**										
11,3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	27,70	$ 495.844,00	$ 13.734.878,80	27,70	$ 13.734.878,80		$ -	27,70	$ 13.734.878,80
11,4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	7,20	$ 590.223,00	$ 4.249.605,60	7,20	$ 4.249.605,60		$ -	7,20	$ 4.249.605,60
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 18.783.650,48**	SUB TOTAL	**$18.783.650,48**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 18.783.650,48**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		**$ 18.783.650,48**	**$ 18.783.650,48**	**$ -**	**$ 18.783.650,48**
ADMINISTRACION	**(15,00%)**	**$ 2.817.547,57**	**$ 2.817.547,57**	**$ -**	**$ 2.817.547,57**
IMPREVISTOS.	**(3,00%)**	**$ 563.509,51**	**$ 563.509,51**	**$ -**	**$ 563.509,51**
UTILIDAD.	**(3,00%)**	**$ 563.509,51**	**$ 563.509,51**	**$ -**	**$ 563.509,51**
IVA SOBRE UTILIDAD	**(19,00%)**	**$ 107.066,81**	**$ 107.066,81**	**$ -**	**$ 107.066,81**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 22.835.283,88**	**$ 22.835.283,88**	**$ -**	**$ 22.835.283,88**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA			**100,00%**		**100,00%**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE CAIVAS - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 22.835.283,88	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS: **VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 88/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL X (marque X) **No. Acta** 1 **ACTA FINAL** (marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	: 29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 10.573.890,84	PLAZO TOTAL	: 120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 84/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS | **OBRA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3	**MAMPOSTERIA**										
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**										
5	**PISOS**										
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
6.6	Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, ademas de todo el material y elementos para su correcto funcionamiento e	M2	3,30	$ 590.502,00	$ 1.948.656,60	3,30	$ 1.948.656,60		$ -	3,30	$ 1.948.656,60
7	**IMPERMEABilizacIÓN, PINTURA Y ACABADOS**										
7.9	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalación de tapas contra las ventanas. oficinas segundo piso.	M2	14,57	$ 99.473,00	$ 1.449.520,56	14,57	$ 1.449.520,56		$ -	14,57	$ 1.449.520,56
7.15	Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate	M2	42,12	$ 78.205,00	$ 3.293.994,60	42,12	$ 3.293.994,60		$ -	42,12	$ 3.293.994,60
7.16	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	ML	24,80	$ 32.380,00	$ 803.024,00	24,80	$ 803.024,00		$ -	24,80	$ 803.024,00
8	**CUBIERTA**										
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
10,5	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metalica galvanIZAda, cableado en, tubería EMT, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto	UN	1,00	$ 150.296,00	$ 150.296,00	1,00	$ 150.296,00		$ -	1,00	$ 150.296,00
10,6	Suministro e instalación de Lampara LED. Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable rencauchutado #12 AWG hasta él toma de la salida, clavija aérea; además de caja metálica galvanIZAda hexagonal; suplemento; tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas, resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento	UN	4,00	$ 263.072,00	$ 1.052.288,00	4,00	$ 1.052.288,00		$ -	4,00	$ 1.052.288,00
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**										
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 8.697.779,76**	SUB TOTAL	**$ 8.697.779,76**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 8.697.779,76**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		**$ 8.697.779,76**	**$ 8.697.779,76**	**$ -**	**$ 8.697.779,76**
ADMINISTRACION	(15,00%)	**$ 1.304.666,96**	**$ 1.304.666,96**	**$ -**	**$ 1.304.666,96**
IMPREVISTOS.	(3,00%)	**$ 260.933,39**	**$ 260.933,39**	**$ -**	**$ 260.933,39**
UTILIDAD.	(3,00%)	**$ 260.933,39**	**$ 260.933,39**	**$ -**	**$ 260.933,39**
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,00%)	**$ 49.577,34**	**$ 49.577,34**	**$ -**	**$ 49.577,34**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 10.573.890,84**	**$ 10.573.890,84**	**$ -**	**$ 10.573.890,84**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA			**100,00%**		**100,00%**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 10.573.890,84	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS **DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 84/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS					OBRA EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE URI - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 2.479.207,26	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRA DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 26/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3	**MAMPOSTERIA**										
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**										
5	**PISOS**										
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**										
8	**CUBIERTA**										
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**										
11,1	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	2,16	$ 692.303,00	$ 1.495.374,48	2,16	$ 1.495.374,48		$ -	2,16	$ 1.495.374,48
11,2	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,20	$ 453.292,00	$ 543.950,40	1,20	$ 543.950,40		$ -	1,20	$ 543.950,40
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 2.039.324,88**	SUB TOTAL	**$ 2.039.324,88**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 2.039.324,88**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		**$ 2.039.324,88**	**$ 2.039.324,88**	**$ -**	**$ 2.039.324,88**
ADMINISTRACION	(15,00%)	**$ 305.898,73**	**$ 305.898,73**	**$ -**	**$ 305.898,73**
IMPREVISTOS.	(3,00%)	**$ 61.179,75**	**$ 61.179,75**	**$ -**	**$ 61.179,75**
UTILIDAD.	(3,00%)	**$ 61.179,75**	**$ 61.179,75**	**$ -**	**$ 61.179,75**
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,00%)	**$ 11.624,15**	**$ 11.624,15**	**$ -**	**$ 11.624,15**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 2.479.207,26**	**$ 2.479.207,26**	**$ -**	**$ 2.479.207,26**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA			**100,00%**		**100,00%**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE URI - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 2.479.207,26	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRA DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 26/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS					OBRA EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - KR 23 20 123 CENTRO INTERADMINISTRATIVO

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	: 29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 18.952.684,21	PLAZO TOTAL	: 120,00 DIAS

VALOR EN LETRA DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 21/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3	**MAMPOSTERIA**										
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**										
5	**PISOS**										
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**										
7.9	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos, dilataciones, instalaciòn de tapas contra las ventanas, oficinas segundo piso.	M2	15,33	$ 99.473,00	$ 1.524.921,09	15,33	$ 1.524.921,09		$ -	15,33	$ 1.524.921,09
8	**CUBIERTA**										
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**										
11,4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	23,83	$ 590.223,00	$ 14.065.014,09	23,83	$ 14.065.014,09		$ -	23,83	$ 14.065.014,09
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 15.589.935,18**	SUB TOTAL	**$ 15.589.935,18**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 15.589.935,18**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA					**$ 15.589.935,18**		**$ 15.589.935,18**		**$ -**		**$ 15.589.935,18**
ADMINISTRACION	(15,00%)				**$ 2.338.490,28**		**$ 2.338.490,28**		**$ -**		**$ 2.338.490,28**
IMPREVISTOS.	(3,00%)				**$ 467.698,06**		**$ 467.698,06**		**$ -**		**$ 467.698,06**
UTILIDAD.	(3,00%)	**21,57%**			**$ 467.698,06**		**$ 467.698,06**		**$ -**		**$ 467.698,06**
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,00%)				**$ 88.862,63**		**$ 88.862,63**		**$ -**		**$ 88.862,63**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 18.952.684,21**		**$ 18.952.684,21**		**$ -**		**$ 18.952.684,21**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA							**100,00%**				**100,00%**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - KR 23 20 123 CENTRO INTERADMINISTRATIVO

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 18.952.684,21	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRA **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 21/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL [X] (marque X) **No. Acta** 1 **ACTA FINAL** [ ] (marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

SEDE PALACIO DE JUSTICIA - VILLAVICENCIO - META

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	: 29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 3.895.504,71	PLAZO TOTAL	: 120,00 DIAS

VALOR EN: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 71/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS | **OBRA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	3,70	$ 20.494,00	$ 75.827,80	3,70	$ 75.827,80		$ -	3,70	$ 75.827,80
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3	**MAMPOSTERIA**										
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**										
5	**PISOS**										
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**										
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**										
7.10	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	20,00	$ 32.248,00	$ 644.960,00	20,00	$ 644.960,00		$ -	20,00	$ 644.960,00
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	20,00	$ 32.446,00	$ 648.920,00	20,00	$ 648.920,00		$ -	20,00	$ 648.920,00
8	**CUBIERTA**										
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**										
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**										
11,3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	3,70	$ 495.844,00	$ 1.834.622,80	3,70	$ 1.834.622,80		$ -	3,70	$ 1.834.622,80
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 3.204.330,60**	SUB TOTAL	**$ 3.204.330,60**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 3.204.330,60**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA			**$ 3.204.330,60**	**$ 3.204.330,60**	**$ -**	**$ 3.204.330,60**
ADMINISTRACION	(15,00%)		**$ 480.649,59**	**$ 480.649,59**	**$ -**	**$ 480.649,59**
IMPREVISTOS.	(3,00%)		**$ 96.129,92**	**$ 96.129,92**	**$ -**	**$ 96.129,92**
UTILIDAD.	(3,00%)	#####	**$ 96.129,92**	**$ 96.129,92**	**$ -**	**$ 96.129,92**
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,00%)		**$ 18.264,68**	**$ 18.264,68**	**$ -**	**$ 18.264,68**
VALOR TOTAL OBRA			**$ 3.895.504,71**	**$ 3.895.504,71**	**$ -**	**$ 3.895.504,71**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA				**100,00%**		**100,00%**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 30 - Agosto de 2023 hasta 20 - Octubre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE PALACIO DE JUSTICIA - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 3.895.504,71	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 71/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS				OBRA EJECUTADA		
ITEM			VR. TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		


		1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023	

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.1	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de piso existente.	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA	2,75	11,20	0,15	30,80	1,00	30,80
VVC GUATIQUIA	13,00	15,00	0,20	147,83	1,00	147,83
TOTAL EJECUTADO						178,63

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.2	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de mampostería	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		1,00	1,70	1,70	1,00	1,70
	V					
TOTAL EJECUTADO						1,70

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		

		1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023	

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.4	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de marcos y puertas	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA					3,00	3,00
VVC GUATIQUIA					1,00	1,00
VVC GUATIQUIA					1,00	1,00
VVC GUATIQUIA					1,00	1,00
VVC GUATIQUIA					1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO						7,00

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**	
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.5	DESCRIPCION ITEM:	Regata instalación sanitaria	UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA








LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		15,00				15,00
VVC GUATIQUIA		4,50				4,50
VVC GUATIQUIA		3,00				3,00
TOTAL EJECUTADO						22,50

Elaboró:



RESIDENTE DE OBRA
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ

Vo/Bo



CONTRATISTA
BERMORI GRANADA VALENCIA

Revisó



SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO
EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO



CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		
	1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.6	DESCRIPCION ITEM:	Demolición de guardaescobas existente	UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

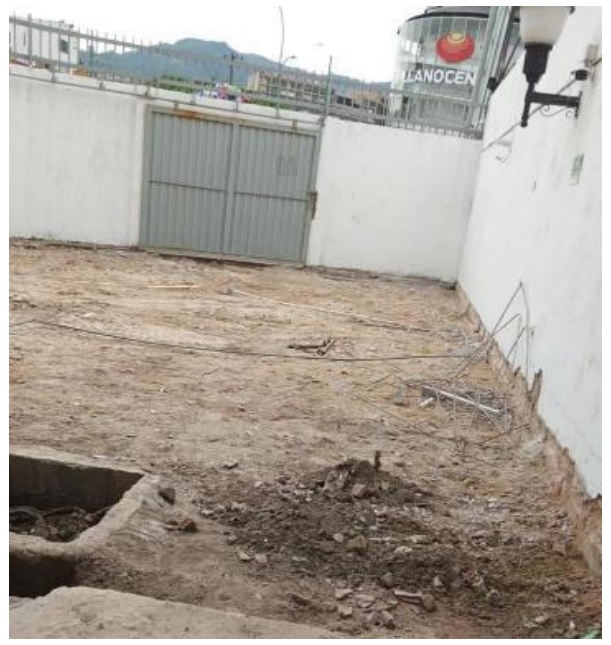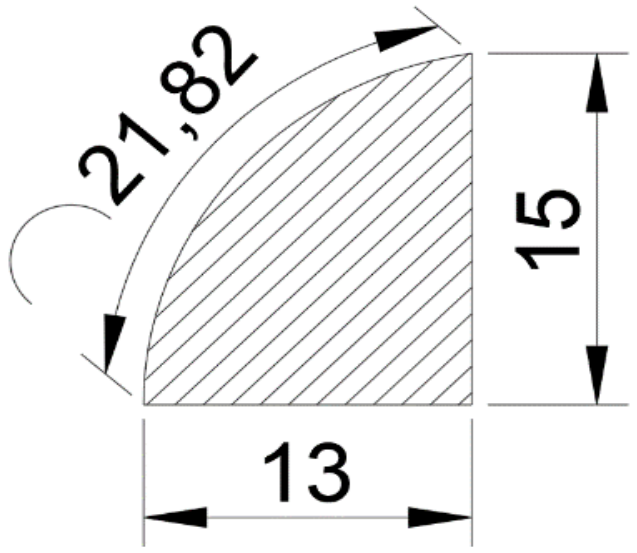

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		15,64		15,64	1,00	15,64
VVC GUATIQUIA		15,00		15,00	1,00	15,00
TOTAL EJECUTADO						30,64

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.8	DESCRIPCION ITEM:	Retiro de cableado UTP y eléctrico	UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		1,00				1,00
TOTAL EJECUTADO						1,00

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**	
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		


	1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023		

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.11	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

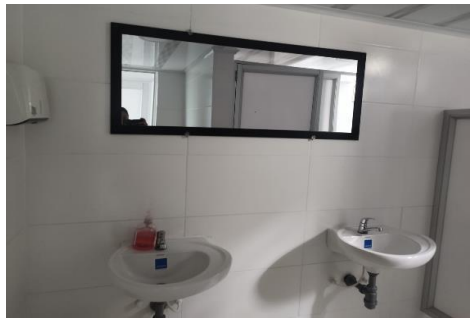



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		1,60	0,90	1,44	1,00	1,44
VVC GUATIQUIA		1,20	0,90	1,08	1,00	1,08
VVC GUATIQUIA		1,50	0,90	1,35	1,00	1,35
VVC GUATIQUIA		2,20	0,90	1,98	1,00	1,98
VVC GUATIQUIA		0,60	0,90	0,54	1,00	0,54
TOTAL EJECUTADO						6,39

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**	
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | GRANVAL INGENIERIA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO


CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**
CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**	**1**	**FECHA : OCTUBRE DE 2023**
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ**		

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	**1.12**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Desmonte de canaleta metalica**	**UND:**	**ML**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

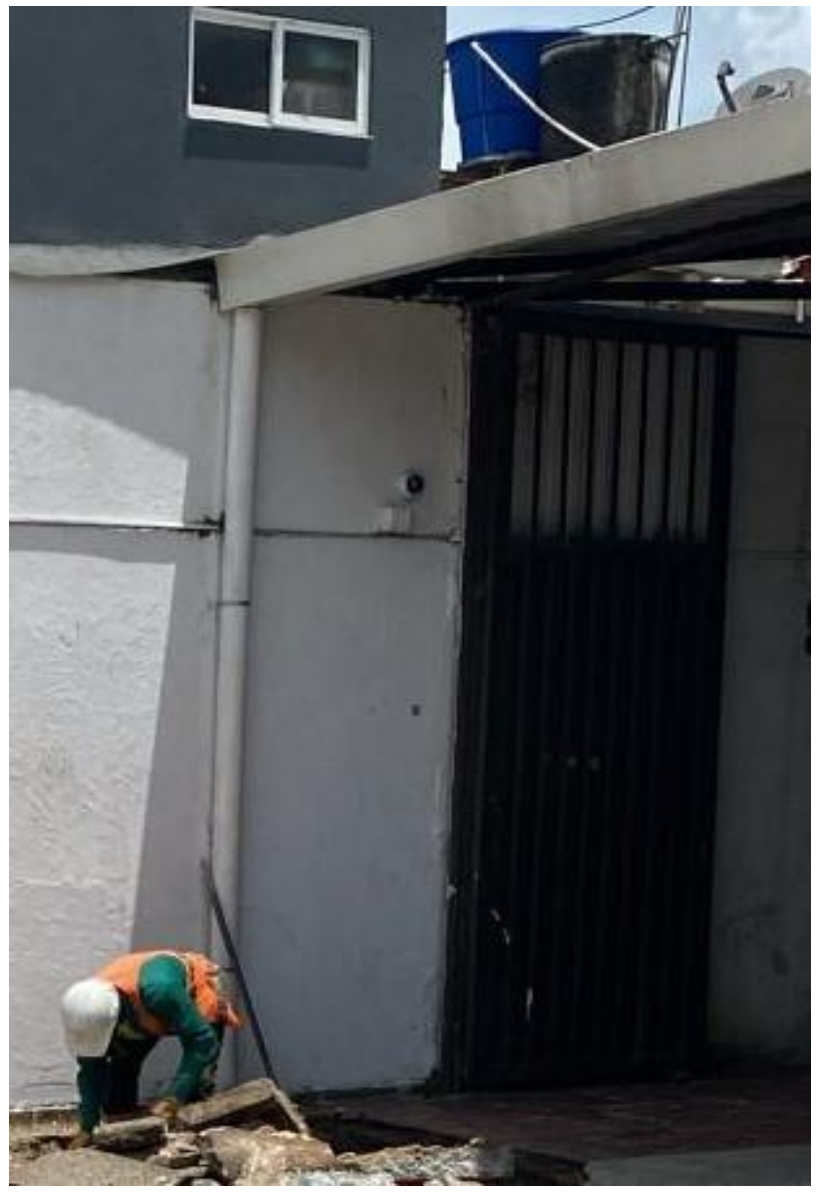





LOCALIZACION	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
VVC GUATIQUIA		3,00		3,00	1,00	3,00
VVC GUATIQUIA		3,00		3,00	1,00	3,00
TOTAL EJECUTADO						**6,00**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.13	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tuberia, griferia	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA









LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA				1,00	2,00	2,00
TOTAL EJECUTADO						2,00

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO


CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					


SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.14	DESCRIPCION ITEM:	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

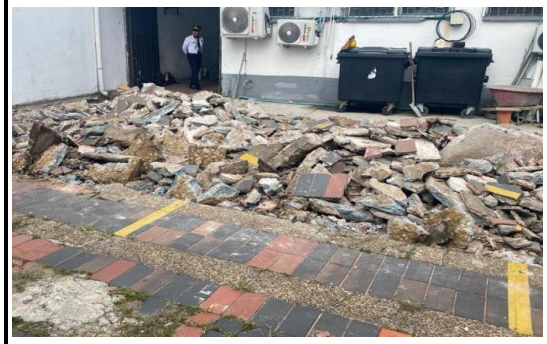







LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		147,00	0,26	38,22	1,00	38,22
VVC GUATIQUIA	2,75	11,20	0,20	6,16	1,00	6,16
TOTAL EJECUTADO						44,38

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	2,5	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación malla electrosoldada 5mm. Incluye corte y fijación.	UND:	kg

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA	2,30	6,00	30,59	30,59	25,00	764,85
TOTAL EJECUTADO						764,85

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		


		1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023	

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	3.2	DESCRIPCION ITEM:	Elaboración de muro en bloque No. 4	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

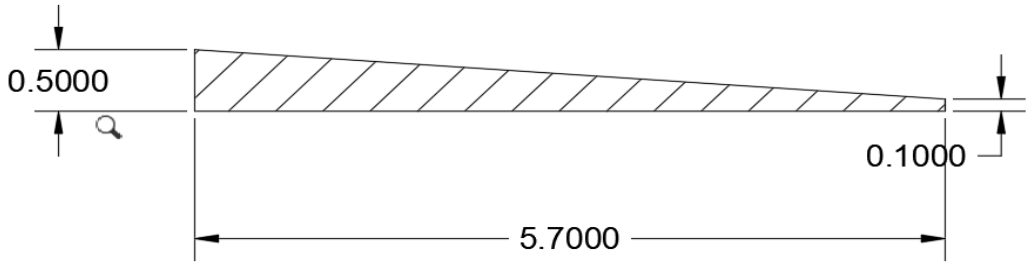

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA	0,60	5,70	0,50	1,71	1,00	1,71
TOTAL EJECUTADO						1,71

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**


CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**		**1**	**FECHA :**	**OCTUBRE DE 2023**
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ**				

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	**5.1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Alistado y afinado de piso en mortero 1:3**	**UND:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

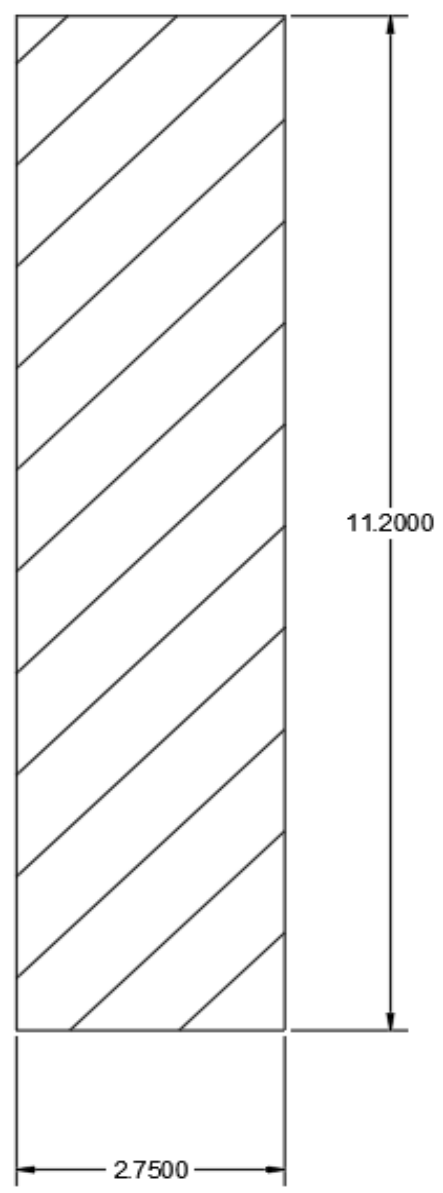



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA	2,75	11,20	0,20	30,80	1,00	30,80
TOTAL EJECUTADO						**30,80**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		


	1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023		

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	7.9	DESCRIPCION ITEM:	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorisado con frescasa), incluye dos manos de pintura,filos,	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

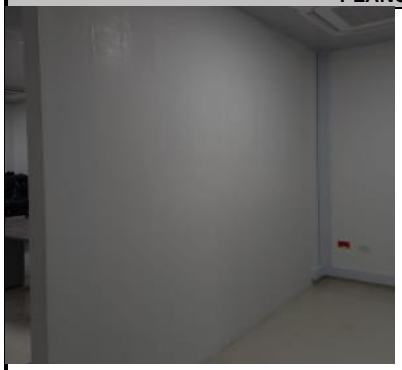



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC CAIVAS		3,20	2,06	6,59	1,00	6,59
VVC CAIVAS		0,70	2,06	1,44	1,00	1,44
VVC EVIDENCIAS		1,50	1,10	1,65	1,00	1,65
VVC EVIDENCIAS		3,90	0,91	3,55	1,00	3,55
VVC EVIDENCIAS		10,30	0,91	9,37	1,00	9,37
TOTAL EJECUTADO						22,61

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
		
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		


		1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023	


SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	7.11	DESCRIPCION ITEM:	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos,	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA







LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		11,20	2,70	30,24	1,00	30,24
VVC GUATIQUIA		11,20	2,70	30,24	1,00	30,24
VVC GUATIQUIA		11,20	2,70	30,24	1,00	30,24
VVC GUATIQUIA		11,20	2,70	30,24	1,00	30,24
VVC GUATIQUIA		211,89	1,25	264,86	1,00	264,86
VVC GUATIQUIA		14,00	9,40	131,60	1,00	131,60
VVC GUATIQUIA		3,00	1,00	3,00	1,00	3,00
VVC GUATIQUIA		4,00	10,00	40,00	1,00	40,00
VVC GUATIQUIA		1,89	2,00	3,78	1,00	3,78
TOTAL EJECUTADO						564,20

Elaboró:	Vo/Bo	Rev
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO


CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	9.3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

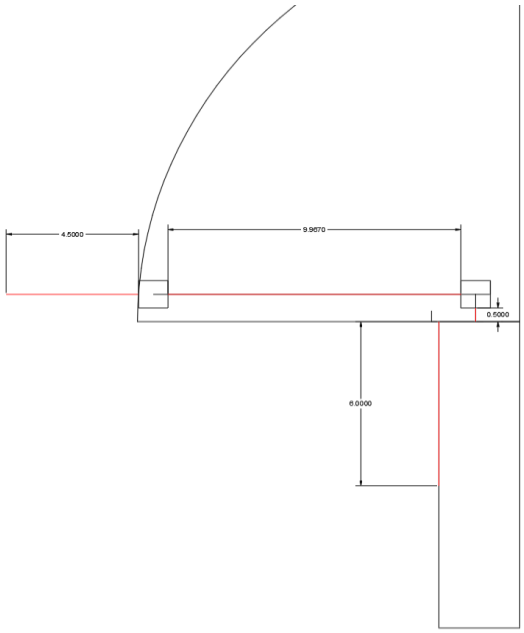





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUÍA		6,00		6,00	1,00	6,00
VVC GUATIQUÍA		0,50		0,50	1,00	0,50
VVC GUATIQUÍA		4,50		4,50	1,00	4,50
VVC GUATIQUÍA		9,97		9,97	1,00	9,97
VVC GUATIQUÍA - 3/4		6,00		6,00	1,00	6,00
TOTAL EJECUTADO						26,97

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**	
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA	GRANVAL INGENIERIA
	MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO	

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ				

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	9.17	DESCRIPCION ITEM:	Punto sanitario de desague de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUÍA		1,00		1,00	3,00	3,00
TOTAL EJECUTADO						3,00

Elaboró:	Vo/Bo	Rev	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**

CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**		**1**	**FECHA :**	**OCTUBRE DE 2023**
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ**				

SEDE:


PRELIMINARES

ITEM Nº	**9.22**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Cajas de inspeccion de 1*1 mts**	**UND:**	**UN**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





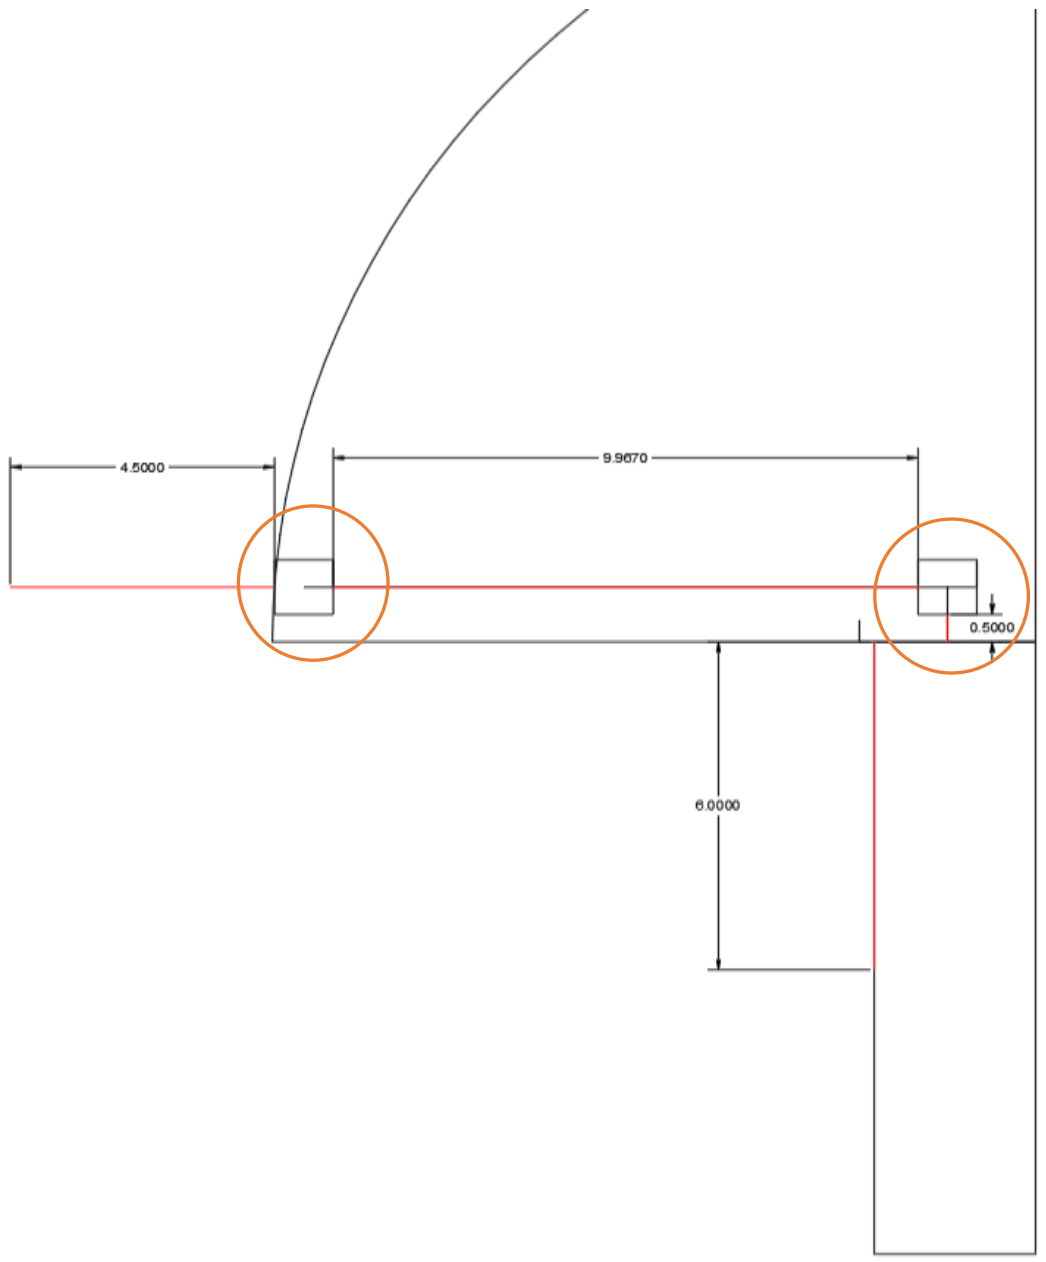

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUÍA		1,00		1,00	2,00	2,00
TOTAL EJECUTADO						**2,00**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO


CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	11,1	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

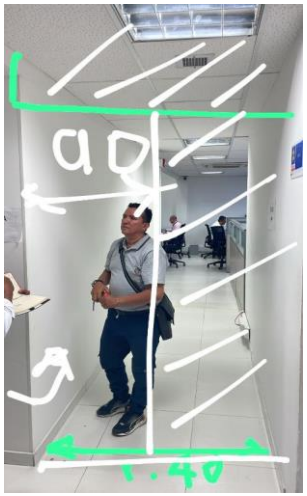



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC URI	0,90		2,40	2,16	1,00	2,16
				S		
TOTAL EJECUTADO						2,16

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**	
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	11,2	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC URI	0,50		2,40	1,20	1,00	1,20
TOTAL EJECUTADO						1,20

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO


CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ					

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	11,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

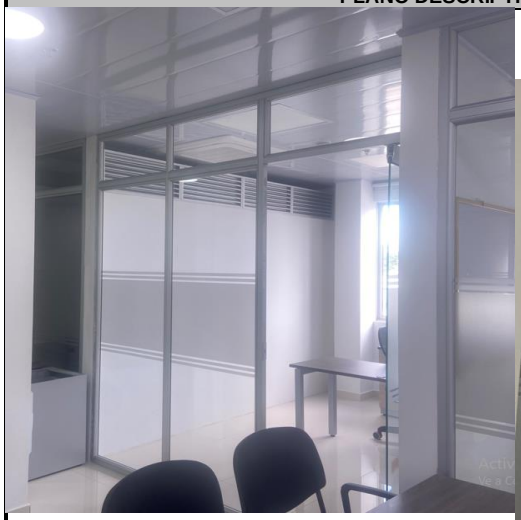



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC CAIVAS		3,20	2,46	7,87	1,00	7,87
VVC CAIVAS		3,20	2,06	6,59	1,00	6,59
VVC CAIVAS		3,12	2,05	6,40	1,00	6,40
VVC CAIVAS		3,00	2,28	6,84	1,00	6,84
TOTAL EJECUTADO						27,70

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**
CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**		
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ**		

		1	**FECHA :**	**OCTUBRE DE 2023**	

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	**11,4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento**	**UND:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC CAIVAS		0,90	2,00	1,80	1,00	1,80
VVC CAIVAS		0,90	2,00	1,80	1,00	1,80
VVC CAIVAS		0,90	2,00	1,80	1,00	1,80
VVC CAIVAS		0,90	2,00	1,80	1,00	1,80
TOTAL EJECUTADO						**7,20**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ		


	1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023		

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	11,5	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

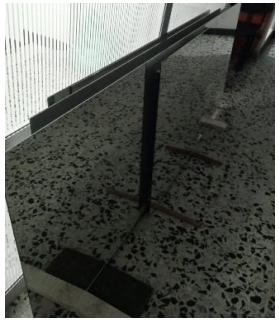









LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUÍA	1,60		0,90	1,44	1,00	1,44
VVC GUATIQUÍA	1,20		0,90	1,08	1,00	1,08
VVC GUATIQUÍA	1,50		0,90	1,35	1,00	1,35
VVC GUATIQUÍA	2,10		0,90	1,89	1,00	1,89
VVC GUATIQUÍA	0,70		0,90	0,63	1,00	0,63
TOTAL EJECUTADO						6,39

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA	GRANVAL INGENIERIA
	MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO	

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		1	FECHA :	OCTUBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ				

SEDE:

PRELIMINARES

ITEM Nº	IC.014	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion concreto reforzado	UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



LOCALIZACION	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
VVC GUTIQUIA	0,12	4,85	0,95	0,55	1,00	0,55
TOTAL EJECUTADO						0,55

Elaboró:	Vo/Bo	Revis	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	
