Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: ACTA DE SUPERVISION Y ACTA DE RECIBO FINAL	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	235-2023	ACTA No	RECIBO FINAL	FECHA DEL ACTA	23/11/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO EN EL SECTOR FINCA SERNA, Y DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO OBRERO EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 17/10/2023 AL 20/11/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	21/11/2023

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA	**C.C.:**	80,279,268
CONTRATISTA:	X	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S.	**NIT.:**	901651525-6
REP. LEGAL:	X	LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA	**C.C.:**	79.729.934
SUPERVISOR:	X	CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS	**CARGO**	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
DEP. SUPERVISOR:	X	OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
INTERVENTOR:	X		**NIT.:**	

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de recibo final, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

						Plazo Cumplido	100%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	2	DIAS	0	**INICIA**	17/10/2023	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENCIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	21			
A5. SUSPENCIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**2**	**DIAS**	**0**			
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**2**	**DIAS**	**0**			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	21/11/2023	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

						Obligaciones Cumplidas	100%

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO EN EL SECTOR FINCA SERNA, Y DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO OBRERO EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.						

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

EN EL PERIODO EVALUADO, EL CONTRATISTA CUMPLE SUS FUNCIONES A SATISFACCION

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

NINGUNA

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:				
NINGUNA				
B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?		**SI**		**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?		**SI** X		**NO**
SEGURIDAD SOCIAL, INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y SOPORTES				
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?		**SI** X		**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-44-101091968	25/08/2023	25/02/2024	N/A	N/A	29/08/2023
PRESTACIONES SOCIALES	18-44-101091968	25/08/2023	25/10/2026	N/A	N/A	29/08/2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	18-44-101091968	5 AÑOS		N/A	N/A	29/08/2023

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	oct-23	16/11/2023	$ 187,100
SALUD	nov-23	16/11/2023	$ 46,800
ARL	nov-23	16/11/2023	$ 51,000

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **99.96%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$ 199,996,250.00**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 199,996,250.00	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	$0.00	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		$0
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$**	**99,925,310.39**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$99,991,266.34
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.) A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	79,673.27
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$**	**99,925,310.39**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000542	FECHA:	25/08/2023
F2. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000543	FECHA:	25/08/2023
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCOLOMBIA - CUENTA AHORROS	No	385-000021-37		
F6.F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	0	RESPONSABLE	X	ESPECIAL	0

G. FORMA DE PAGO:

El municipio pagara al contratista el valor del presente contrato mediante actas de corte parciales de mínimo un 20% los cuales deben ser proporcionales a la obra ejecutada. Los pagos parciales se realizaran mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben estar avaladas previamente por el supervisor designado por el municipio, el valor cancelado mediante las actas será directamente proporcional a la obra ejecutada y/o avance, hasta completar el 80% por ciento del valor del contrato y un pago final del 20% correspondiente al acta de recibo final de obra.
Nota: sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá realizar un único cobro correspondiente al 100 del valor del contrato, contra ejecución del 100% de las actividades contratadas, en todo caso este pago solo se podrá efectuar mediante el acta de recibo final de obra, previo aval del supervisor designado por el municipio.

H. OBSERVACIONES:

LA PRESENTE ACTA SE DEBERA PAGAR BAJO EL REGISTRO PRESUPUESTAL 2023000542 DEL 25 DE AGOSTO DE 2023 Y El presente informe de supervisión y acta final, hace las veces del ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL del contrato de obra No. 235 de 2023 y las partes se declaran a paz y salvo en el marco de la ejecución del contrato de la referencia.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNÁNDEZ MORERA** Alcalde Municipal	
CONTRATISTA:	**LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA** CONTRATISTA	
SUPERVISOR:	**CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	

CONTRATO DE OBRA 235 DE 2023 - ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS QUE CONDUCEN: DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO EN EL SECTOR FINCA SERNA, Y DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO OBRERO EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:		G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S -		VALOR INICIAL	$ 199.996.250,00
SUPERVISION:		OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			
				ACTA PARCIAL No. 1	$ 99.925.310,39
PLAZO:	1 MES	ASEGURADORA / POLIZA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 18-44-101091968	PRESENTE ACTA	$ 99.925.310,39
INICIO:	1-sep-23	CUMPLIMIENTO	25/08/2023 - 25/02/2024		
TERMINACION:	31-oct-23	PRESTACIONES SOCIALES	25/08/2023 - 25/10/2026	TOTAL EJECUTADO	$ 199.850.620,77
		ESTABILIDAD DE OBRA	CINCO AÑOS		
PRESENTE ACTA	31-oct-23			SALDO A FAVOR ENTIDAD	$ 145.629,23

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR FINCA SERNA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

CONDICIONES CONTRACTUALES							MAYORES Y MENORES			PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
							+	-					
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS E N MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,64	$ 73.236,00	$ 705.995,04	46,24		$ 3.386.176,31	55,88	$ 4.092.171,35	55,88	$ 4.092.171,35
2	630.4	CONCRETOS CLASE D , f'c =3000 psi (bases)	M3	34,68	$ 897.203,00	$ 31.115.000,04		-4,50	($ 4.040.105,11)	30,18	$ 27.074.894,93	30,18	$ 27.074.894,93
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	30,78	$ 591.703,00	$ 18.212.618,34		-18,18	($ 10.755.829,21)	12,60	$ 7.456.789,13	12,60	$ 7.456.789,13
4	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	20,67	$ 704.421,00	$ 14.560.382,07	14,72		$ 10.365.555,02	35,39	$ 24.925.937,09	35,39	$ 24.925.937,09
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.623,40	$ 9.771,00	$ 35.404.241,40	99,40		$ 971.276,48	3.722,80	$ 36.375.517,88	3.722,80	$ 36.375.517,88
					Subtotal	$ 99.998.236,89							

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 99.998.236,89					$ 99.925.310,39		$ 99.925.310,39
AJUSTE AL PESO	-0,89							
VALOR TOTAL	$ 99.998.236,00					$ 99.925.310,39		$ 99.925.310,39

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO OBRERO, EN LA SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

CONDICIONES CONTRACTUALES							MAYORES Y MENORES			ACUMULADO ACTA 1		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
							+	-					
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS E N MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 73.236,00	$ 739.683,60		-8,72	($ 638.837,63)	1,38	$ 100.845,97	1,38	$ 100.845,97
2	630.4	CONCRETOS CLASE D , f´c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 897.203,00	$ 33.995.021,67		-3,69	($ 3.312.024,87)	34,20	$ 30.682.996,80	34,20	$ 30.682.996,80
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 591.703,00	$ 9.561.920,48		-0,99	($ 583.419,16)	15,17	$ 8.978.501,32	15,17	$ 8.978.501,32
4	671.1	CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 704.421,00	$ 16.920.192,42	10,69		$ 7.529.203,86	34,71	$ 24.449.396,28	34,71	$ 24.449.396,28
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.969,01	$ 9.771,00	$ 38.781.196,71		-307,20	($ 3.001.670,74)	3.661,81	$ 35.779.525,97	3.661,81	$ 35.779.525,97
					Subtotal	$ 99.998.014,88					$ 99.991.266,34		$ 99.991.266,34

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 99.998.014,88					$ 99.991.266,34		$ 99.991.266,34			
AJUSTE AL PESO	-0,88										
VALOR TOTAL	$ 99.998.014,00					$ 99.991.266,34		$ 99.991.266,34			

TOTAL PRESENTE ACTA	$ 199.996.250,00									$ 99.925.310,39	

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ING. LUIS GABRIEL PEÑA GOMBITA
REPRESENTANTE LEGAL
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING

Villeta COMPETITIVA gestión transparente	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERED SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR FINCA SERNA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	G&C Engineering Construction and Consulting NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 31-oct-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6	1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: EXCAVACIONES VARIAS E N MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRAN ES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

ITEM 600.4 P **UNIDAD** M3

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
VIGAS					
VIGAS	33	2,70	0,15	0,10	1,34
CUNETA					
CUNETA	2	98,00	1,20	0,2	47,04
NIVELACION VIA					
NIVELACION TERRENO	1	15,00	5,00	0,1	7,50
				Subtotal	55,88
				Vienen	
				pasan	55,88
				Total	55,88

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERED SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR FINCA SERNA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 31-oct-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	NIT.	901.651.525-6
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: CONCRETOS CLASE D , f´c =3000 psi (bases)

ITEM	630.4		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
PLACAS					
PLACA HUELLA	2	93,35	0,90	0,15	25,20
VIGAS					
VIGAS	26	2,70	0,15	0,25	2,63
VIGAS	7	3,20	0,15	0,25	0,84
RAMPA					
CONCRETO RAMPAS	1	2,00	5,00	0,15	1,50
				Subtotal	30,18
				Vienen	
				pasan	30,18
				Total	30,18

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA

Villeta COMPETITIVA gestión transparente	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERED SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR FINCA SERNA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA	G&C Engineering Construction and Consulting NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 31-oct-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	**NIT.**	901.651.525-6
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS		

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: CONCRETO CICLÓPEO CLASE G , 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES

ITEM	630.7		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CICLOPEO					
HUELLA CENTRAL	1	93,35	0,90	0,15	12,60
				Subtotal	12,60
				Vienen	
				pasan	12,60
				Total	12,60

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERED SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR FINCA SERNA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA


NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 31-oct-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	NIT.	901.651.525-6	1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

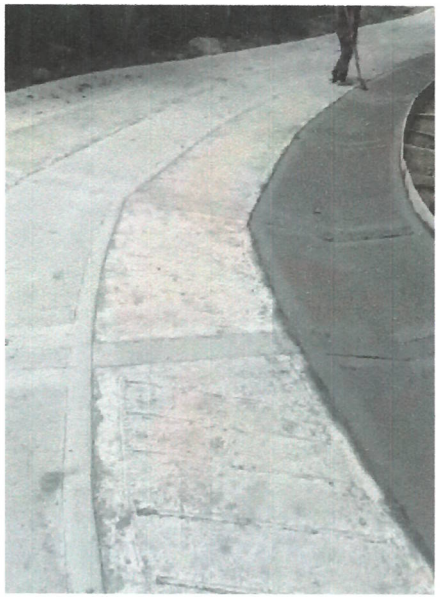

ACTIVIDAD: CUNETA D E CONCRETO CLASE E , 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

ITEM	671.1		UNIDAD	M3	
LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL
CUNETA					
CUNETA	2	98,00	1,15	0,15	33,81
SOBRE ANCHO CURVA	1	21,00	0,50	0,15	1,58
				Subtotal	35,39
				Vienen	
				pasan	35,39
				Total	35,39

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VERED SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO, EN EL SECTOR FINCA SERNA, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

NIT. 901.651.525-6

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: 31-oct-23

CONTRATISTA:	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S	NIT.	901.651.525-6	1 DE 1
SUPERVISION:	ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS			

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD: SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

ITEM: 640.1 — UNIDAD: KG

LOCALIZACION	CANT ELEMT.	LARGO	PESO	CANTIDAD	TOTAL
HUELLAS					
HUELLA LONGITUDINAL	5	98,00	1,00	2,00	980,00
TRASLAPO	10	0,60	1,00	16,00	96,00
HUELLA TRANSVERSAL	467	1,00	1,00	2	933,50
CUNETA					
CUNETA LONGITUDINAL	5	98,00	0,56	2,00	548,80
TRASLAPO	10	0,60	0,56	16,00	53,76
CUNETA TRANSVERSAL	490	1,35	0,56	2,00	740,88
VIGAS					
ACERO VIGAS	2	5,00	0,56	26,00	145,60
FLEJES	14	0,30	0,56	26,00	61,15
					0,00
ACERO VIGAS SOBREANCHO	2	5,50	0,56	7,00	43,12
FLEJES	17	0,30	0,56	7,00	19,99
RAMPA					
RAMPA ACCESO					
ACERO RAMPA	10	5,00	1,00	1,00	50,00
ACERO RAMPA	25	2,00	1,00	1,00	50,00
				Subtotal	3.722,80
				Vienen	
				pasan	3.722,80
				Total	3.722,80

Contratista:

ING. LUIS GABRIEL PEÑA COMBITA
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISORA

Bancolombia

Villeta Cundinamarca, 25 de abril de 2023

A Quien Interese

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **G & C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS** identificado con **NIT. 901651525,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	**385-000021-37**	**2023/04/25**	**ACTIVO**

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 844 5096 Ext. 142 de Villeta Cundinamarca.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Villeta - Of. 385 Villeta
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº

CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GONZALEZ.
Asesor comercial Pyme.
Sucursal Villeta.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-44-101091968	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2023	25	08	2023	00:00	25	10	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	NIT: 901.651.525-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 10 - 79 UR LAS ACACIAS	VILLETA, CUNDINAMARCA	3114930914

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 5 - 61	VILLETA, CUNDINAMARCA	8445092

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LEGALES INHERENTES AL CONTRATO DE OBRA No. 235 DE 2023, CUYO OBJETO ES : CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE CONDUCEN DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO EN EL SECTOR FINCA SERNA, Y DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO OBRERO EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
-SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN.
-NOTA: LA VIGENCIA PARA EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO A SATISFACCION DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2023	25/02/2024	$39,999,250.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2023	25/10/2026	$19,999,625.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$39,999,250.00

ACLARACIONES

** ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO*

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****624,306.00	$ ******20,000.00	$ *****122,418.00	$ **********766,724.00	$ *******99,998,125.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) *GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.*

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-44-101091968

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM SEDE PRINCIPAL: CALLE 85 NO 10-85 TELEFONO: 601-2186877, 601-6019339 DLP173948A 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101067680	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2023	25	08	2023	00:00	25	10	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	NIT: 901.651.525-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 8 NRO. 10 - 79 UR LAS ACACIAS	VILLETA, CUNDINAMARCA	3114930914

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 4 NRO. 5 - 61	VILLETA, CUNDINAMARCA	8445092

BENEFICIARIO: 899999312 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARAN LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR CAUSADOS A TERCEROS, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 235 DE 2023, CUYO OBJETO ES : CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS QUE CONDUCEN DE LA VEREDA SALITRE BLANCO BAJO A LA VEREDA SALITRE NEGRO EN EL SECTOR PINCA SERNA, Y DE LA VEREDA SALITRE NEGRO AL BARRIO OSRERO EN EL SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.
-ASEGURADO: G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING S.A.S NIT. No.901.651.525-6 Y ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT.899.999.312-2
-BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA NIT. 899.999.312-2
-1.LA PRESENTE POLIZA CONTIENE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.
2.OPERA BAJO LA MODALIDAD DE OCURRENCIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	25/10/2023	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	25/10/2023	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	25/10/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******96,931.00	$ *******3,000.00	$ ******18,986.00	$ **********118,918.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA FELISA MARROQUIN PENA	173948	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL *CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA* EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101067680

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHICO	18	18-40-101067680	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	08	2023	25	08	2023	00:00	25	10	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	G&C ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	NIT: 901.651.525-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 8 NRO. 10 - 79 UR LAS ACACIAS	VILLETA, CUNDINAMARCA	3114930914

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT: 899.999.312-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 4 NRO. 5 - 61	VILLETA, CUNDINAMARCA	8445092

BENEFICIARIO: 899999312 - ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	25/10/2023	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	25/10/2023	$232,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/08/2023	25/10/2023	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-40-101067680

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF173948A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901651525-6	GYC ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS	Cr810 79 Urbanizacion las Acasias	6010231380	gyc.ingenieriacc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72467588	$331.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	8	400	0	46.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	8	1.500	0	187.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	50.500				50.500	8	500	51.000			505	51.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	46.400	8	400	46.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.800
Pensión	1	185.600	187.100
Riesgos Laborales	1	50.500	51.000
CCF	1	46.400	46.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	328.900	331.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901651525-6	GYC ENGINEERING CONSTRUCTION AND CONSULTING SAS		Cr810 79 Urbanizacion las Acacias	6010231380	gyc.ingenieriacc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	16/11/2023	72467588	$331.700	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79729934	PEÑA COMBITA LUIS GABRIEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS006	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
