CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%

										ACTA PARCIAL DE OBRA No 003				ESTADO: EN EJECUCION		
766	3.1	TUBERIA ALCANT. D=250 mm (10") T. NOVAFORT	ML	133,00	112.314,00	$ 14.937.762,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	133,00	$ 14.937.762,00
767	3.2	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel precision)	ML	143,00	158.489,00	$ 22.663.927,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	143,00	$ 22.663.927,00
		SUBTOTAL				$ 37.601.689,00				$ -		$ -		$ -		$ 37.601.689,00
POZOS DE INSPECCIÓN Y CÁMARA DE CAÍDA																
768	4.1	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	5,00	1.098.655,00	$ 5.493.275,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 5.493.275,00
769	4.2	PLACA C CUB POZOD=1.2ME=0.2M3000PSI INC HLTAP SEG	UN	5,00	1.933.809,00	$ 9.669.045,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 9.669.045,00
770	4.3	CILINDRO POZO D=1.20M (F'C=21MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	13,01	670.116,00	$ 8.718.209,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,01	$ 8.718.209,00
771	4.4	CAÑUELA POZO TUBERIA 8-15" 4000PSIELAB EN OBRA	UN	5,00	267.981,00	$ 1.339.905,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.339.905,00
		SUBTOTAL				$ 25.220.434,00				$ -		$ -		$ -		$ 25.220.434,00
CONCRETOS																
772	5.1	CONCRETO13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpio	M3	0,90	577.105,00	$ 519.395,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 519.395,00
773	5.2	CONCRETO ZAPATA 20,7MPa,(3000 psi) No inc hierro.	M3	15,58	843.578,00	$ 13.142.945,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,58	$ 13.142.945,00
774	5.3	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ	M3	6,86	1.135.112,00	$ 7.786.668,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,86	$ 7.786.668,00
Subtotal		SUBTOTAL				$ 21.449.208,00				$ -		$ -		$ -		$ 21.449.208,00
ACEROS																
775	6.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	8.299,00	9.454,00	$ 78.458.746,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8299,00	$ 78.458.746,00
776	6.2	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sum\,monta, pint	KG	7.852,00	26.627,00	$ 209.075.204,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7852,00	$ 209.075.204,00
		SUBTOTAL				$ 287.533.950,00				$ -		$ -		$ -		$ 287.533.950,00
		VALOR TOTAL CONSTRUIR COLECTOR (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 522.345.404,00				$ -		$ -		$ -		$ 522.345.404,00
TENDERO TIPO 1																
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																
PRELIMINARES																
DESCAPOTE																
777	1.1.1.2	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,inc retiro.5 kms	M2	94,00	8.947,00	$ 841.018,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	94,00	$ 841.018,00
		SUBTOTAL				$ 841.018,00				$ -		$ -		$ -		$ 841.018,00
SOBREACARREOS, RETIROS																
778	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	70,50	46.198,00	$ 3.256.818,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,50	$ 3.256.818,00
779	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	70,50	32.445,00	$ 2.287.373,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,50	$ 2.287.373,00
780	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	463,46	1.559,00	$ 706.944,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	463,46	$ 706.944,00
781	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	1,50	870,00	$ 1.305,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 1.305,00
		SUBTOTAL				$ 6.252.440,00				$ -		$ -		$ -		$ 6.252.440,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO																
782	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	1.328,22	9.566,00	$ 12.705.753,00			1.328,22	$ 12.705.753,00	0,00	$ -	1328,22	$ 12.705.753,00	0,00	$ -
		SUBTOTAL				$ 12.705.753,00				$ 12.705.753,00		$ -		$ 12.705.753,00		$ -
EXCAVACIONES																

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 003	ESTADO: EN EJECUCION

MANUALES																			
783	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	70,50	76.315,00	$ 5.380.208,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	70,50	$ 5.380.208,00
		SUBTOTAL				$ 5.380.208,00				$ -		$ -		$ -		$ 5.380.208,00
CIMENTACION																			
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																			
784	1.3.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	4,70	577.106,00	$ 2.712.398,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,70	$ 2.712.398,00
		SUBTOTAL				$ 2.712.398,00				$ -		$ -		$ -		$ 2.712.398,00
		CONCRETO ZAPATAS																	
785	1.3.2.1	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Acelar	M3	28,20	1.069.468,00	$ 30.158.998,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	28,20	$ 30.158.998,00
		SUBTOTAL				$ 30.158.998,00				$ -		$ -		$ -		$ 30.158.998,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																			
786	1.4.1.1	PEDEST CONCRETO 27,6 MPa(4000) 35*35	ML	188,00	187.892,00	$ 35.323.696,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	188,00	$ 35.323.696,00
787	1.4.1.2	MORTERO SIN CONTRACCION PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN PEDESTAL (0.35X0.35M -	UN	376,00	138.842,00	$ 52.204.592,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	376,00	$ 52.204.592,00
		SUBTOTAL				$ 87.528.288,00				$ -		$ -		$ -		$ 87.528.288,00
ESTRUCTURAS METALICAS																			
ACERO ESTRUCTURAL																			
788	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	6.754,37	9.454,00	$ 63.855.814,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	6754,37	$ 63.855.814,00
789	1.5.1.2	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36, Inc sumi,fabri,mont,pin	KG	82.070,93	23.944,00	$ 1.965.106.348,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	82070,93	$ 1.965.106.348,00
		SUBTOTAL				$ 2.028.962.162,00				$ -		$ -		$ -		$ 2.028.962.162,00
PINTURA																			
IMPERMEABILIZACIONES																			
790	1.6.1.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	M2	846,00	21.295,00	$ 18.015.570,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	846,00	$ 18.015.570,00
		SUBTOTAL				$ 18.015.570,00				$ -		$ -		$ -		$ 18.015.570,00
ESTRUCTURAS MADERAS INMUNIZADAS																			
MADERAS INMUNIZADAS ESTRUCTURALES																			
791	1.7.1.1	SENDEROS TIPO 1 PUENTE - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA	ML	423,00	2.771.879,00	$ 1.172.504.817,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	423,00	$ 1.172.504.817,00
		SUBTOTAL				$ 1.172.504.817,00				$ -		$ -		$ -		$ 1.172.504.817,00
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 1 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 3.365.061.652,00				$ 12.705.753,00		$ -		$ 12.705.753,00		$ 3.352.355.899,00
SENDERO TIPO 2																			
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																			
PRELIMINARES																			
DESCAPOTE																			
702	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	60,00	8.947,00	$ 536.820,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 536.820,00
		SUBTOTAL				$ 536.820,00				$ -		$ -		$ -		$ 536.820,00
SOBREACARREOS, RETIROS																			
793	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	48,00	46.196,00	$ 2.217.408,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 2.217.408,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 003	ESTADO: EN EJECUCION

794	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km, Inc cargue manual	M3	48,00	32.445,00	$ 1.557.360,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 1.557.360,00
795	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	305,52	1.559,00	$ 476.306,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	305,52	$ 476.306,00
796	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	1,50	870,00	$ 1.305,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 1.305,00
	SUBTOTAL					$ 4.252.379,00				$ -		$ -		$ -		$ 4.252.379,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO																
797	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) Inc plano	M2	745,20	9.566,00	$ 7.128.583,00			745,19	$ 7.128.488,00	0,00	$ -	745,19	$ 7.128.488,00	0,01	$ 95,00
	SUBTOTAL					$ 7.128.583,00				$ 7.128.488,00		$ -		$ 7.128.488,00		$ 95,00
EXCAVACIONES																
MANUALES																
798	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	48,00	76.315,00	$ 3.663.120,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	48,00	$ 3.663.120,00
	SUBTOTAL					$ 3.663.120,00				$ -		$ -		$ -		$ 3.663.120,00
CIMENTACION																
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																
799	1.3.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	3,00	577.106,00	$ 1.731.318,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 1.731.318,00
800	1.3.1.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	18,00	1.069.468,00	$ 19.250.424,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	18,00	$ 19.250.424,00
	SUBTOTAL					$ 20.981.742,00				$ -		$ -		$ -		$ 20.981.742,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																
801	1.4.1.1	PEDEST CONCRETO 27,6 MPa(4000) 35*35	ML	120,00	187.892,00	$ 22.547.040,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	120,00	$ 22.547.040,00
802	1.4.1.2	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN PEDESTAL (0.35X0.35M - 0.40X0.40M), TIPO SIKAGROUT®-212 O SIMILAR. E=0.03M	UN	240,00	138.842,00	$ 33.322.080,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	240,00	$ 33.322.080,00
	SUBTOTAL					$ 55.869.120,00				$ -		$ -		$ -		$ 55.869.120,00
ESTRUCTURAS METALICAS																
ACERO ESTRUCTURAL																
803	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	4.311,40	9.454,00	$ 40.759.976,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	4311,40	$ 40.759.976,00
804	1.5.1.2	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36, Inc sumi,fabri,mont,pin	KG	34.923,60	23.944,00	$ 836.215.467,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	34923,60	$ 836.215.467,00
	SUBTOTAL					$ 876.975.443,00				$ -		$ -		$ -		$ 876.975.443,00
PINTURA																
IMPERMEABILIZACIONES																
805	1.6.1.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	M2	360,00	21.285,00	$ 7.666.200,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	360,00	$ 7.666.200,00
Subtotal	SUBTOTAL					$ 7.666.200,00				$ -		$ -		$ -		$ 7.666.200,00
PINTURA																
IMPERMEABILIZACIONES																
806	1.7.1.1	SENDEROS TIPO 2 PUENTE - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA	ML	180,00	3.388.629,00	$ 609.593.220,00			0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	180,00	$ 609.593.220,00
	SUBTOTAL					$ 609.593.220,00				$ -		$ -		$ -		$ 609.593.220,00
	VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 2 (INCLUYE AIU DEL 31%)					$ 1.586.666.627,00				$ 7.128.488,00		$ -		$ 7.128.488,00		$ 1.579.538.139,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**VALOR ACTAS PARCIALES**	**FECHA DE INICIO CONTRATO**
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**	**TIEMPO DE EJECUCION**
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**VALOR ADICIONAL:**	**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**PORCENTAJE DE EJECUCION:**	**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 003	**ESTADO: EN EJECUCION**

SENDERO TIPO 3																			
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																			
PRELIMINARES																			
DESCAPOTE																			
807	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0,15m,Inc retiro,5 kms	M2	24,00	8.947,00	$ 214.728,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$	214.728,00
		SUBTOTAL				**$ 214.728,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**214.728,00**
SOBREACARREOS, RETIROS																			
808	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	27,00	46.196,00	$ 1.247.292,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$	1.247.292,00
809	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km, Inc cargue manual	M3	27,00	32.445,00	$ 876.015,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$	876.015,00
810	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	164,02	1.559,00	$ 255.707,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	164,02	$	255.707,00
811	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	1,50	870,00	$ 1.305,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,50	$	1.305,00
		SUBTOTAL				**$ 2.380.319,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**2.380.319,00**
LOCALIZACION Y REPLANTEO																			
812	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	262,14	9.566,00	$ 2.507.631,00			262,14	$ 2.507.631,00	0,00	$ -	262,14	$ 2.507.631,00	0,00	$	-
		SUBTOTAL				**$ 2.507.631,00**				**$ 2.507.631,00**		**$ -**		**$ 2.507.631,00**		**$**	**-**
EXCAVACIONES																			
MANUALES																			
813	1.2.1.1.	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	27,00	76.315,00	$ 2.060.505,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,00	$	2.060.505,00
		SUBTOTAL				**$ 2.060.505,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**2.060.505,00**
CIMENTACION																			
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																			
814	1.3.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,20	577.106,00	$ 692.527,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,20	$	692.527,00
		SUBTOTAL				**$ 692.527,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**692.527,00**
CONCRETO ZAPATAS																			
815	1.3.1.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Acelor	M3	9,60	1.069.468,00	$ 10.266.893,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,60	$	10.266.893,00
		SUBTOTAL				**$ 10.266.893,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**10.266.893,00**
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																			
816	1.4.1.1	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35	ML	12,00	187.892,00	$ 2.254.704,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$	2.254.704,00
817	1.4.1.2	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN PEDESTAL (0.35X0.35M - 0.40X0.40M), TIPO SIKAGROUT®-212 O SIMILAR, E=0.03M	UN	24,00	138.842,00	$ 3.332.208,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$	3.332.208,00
		SUBTOTAL				**$ 5.586.912,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$**	**5.586.912,00**
ESTRUCTURAS METALICAS																			
ACERO ESTRUCTURAL																			
818	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	431,13	9.454,00	$ 4.075.903,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	431,13	$	4.075.903,00
819	1.5.1.2	ACERO ESTRUC. ASTM A-572G50 C.Incl sumi,monta, pint	KG	33.152,76	23.909,00	$ 792.616.186,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33152,76	$	792.616.186,00
820	1.5.1.3	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi,monta, pint	KG	4.131,93	26.627,00	$ 110.020.900,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4131,93	$	110.020.900,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 003	ESTADO: EN EJECUCION

821	1.5.1.4	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36, Inc sumi,fabri,mont,pin	KG	16.197,63	23.944,00	$ 387.836.053,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	16197,63	$	387.836.053,00
		SUBTOTAL				$ 1.294.549.042,00				$ -		$ -		$ -		$	1.294.549.042,00
PINTURA																			
IMPERMEABILIZACIONES																			
822	1.6.1.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	M2	162,00	21.295,00	$ 3.449.790,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	162,00	$	3.449.790,00
		SUBTOTAL				$ 3.449.790,00				$ -		$ -		$ -		$	3.449.790,00
ESTRUCTURAS MADERAS INMUNIZADAS																			
MADERAS INMUNIZADAS ESTRUCTURALES																			
823	1.7.1.1	SENDEROS TIPO 3 PUENTE - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA	ML	81,00	608.499,00	$ 49.288.419,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	81,00	$	49.288.419,00
		SUBTOTAL				$ 49.288.419,00				$ -		$ -		$ -		$	49.288.419,00
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 3 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 1.370.998.766,00				$ 2.507.631,00		$ -		$ 2.507.631,00		$	1.368.489.135,00
SENDERO TIPO 4																			
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																			
PRELIMINARES																			
DESCAPOTE																			
824	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	26,25	8.947,00	$ 234.859,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,25	$	234.859,00
		SUBTOTAL				$ 234.859,00				$ -		$ -		$ -		$	234.859,00
SOBREACARREOS, RETIROS																			
825	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	21,00	46.196,00	$ 970.116,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$	970.116,00
826	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargua manual	M3	21,00	32.445,00	$ 681.345,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$	681.345,00
827	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	133,67	1.559,00	$ 208.392,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	133,67	$	208.392,00
828	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	2,70	870,00	$ 2.349,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,70	$	2.349,00
		SUBTOTAL				$ 1.862.202,00				$ -		$ -		$ -		$	1.862.202,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO																			
829	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) Inc plano	M2	797,78	9.556,00	$ 7.631.563,00			797,36	$ 7.627.546,00	0,00	$ -	797,36	$ 7.627.546,00	0,42	$	4.017,00
		SUBTOTAL				$ 7.631.563,00				$ 7.627.546,00		$ -		$ 7.627.546,00		$	4.017,00
EXCAVACIONES																			
MANUALES																			
830	1.2.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	21,00	76.315,00	$ 1.602.615,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$	1.602.615,00
		SUBTOTAL				$ 1.602.615,00				$ -		$ -		$ -		$	1.602.615,00
CIMENTACION																			
CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA																			
831	1.3.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,35	577.106,00	$ 779.093,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,35	$	779.093,00
832	1.3.1.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	7,88	1.069.468,00	$ 8.427.408,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,88	$	8.427.408,00
		SUBTOTAL				$ 9.206.501,00				$ -		$ -		$ -		$	9.206.501,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																			
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																			

CONTRATO No :	3950 DE 2022						**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**			**VALOR ACTAS PARCIALES**				**FECHA DE INICIO CONTRATO**						
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00			$ 811.646.155,00				10 DE FEBRERO DEL 2023						
							VALOR ANTICIPO:			**VALOR AMORTIZADO PARCIALES**				**TIEMPO DE EJECUCION**						
							$ 8.078.740.475,40			$ 243.493.846,50				10 MESES Y 15 DIAS						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						**VALOR ADICIONAL:**			**PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:**				**FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:**						
							$ -			0,701%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023						
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						**VALOR ANTICIPO ADICIONAL**			**VALOR PRESENTE ACTA:**				**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**						
							$ -			$ 188.778.237,00										
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE						**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**			**PORCENTAJE DE EJECUCION:**				**PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:**						
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						$ 26.929.134.918,00			3,715%				3,715%						
										ACTA PARCIAL DE OBRA No 003				**ESTADO: EN EJECUCION**						
833	1.4.1	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35	ML	52,50	187.892,00	$ 9.864.330,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,50	$ 9.864.330,00				
834	1.4.1.1	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN PEDESTAL (0.35X0.35M - 0.40X0.40M), TIPO SIKAGROUT®-212 O SIMILAR. E=0.03M	UN	105,00	138.842,00	$ 14.578.410,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	105,00	$ 14.578.410,00				
		SUBTOTAL				$ 24.442.740,00				$ -		$ -		$ -		$ 24.442.740,00				
ESTRUCTURAS METALICAS																				
ACERO ESTRUCTURAL																				
835	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	2.020,95	9.454,00	$ 19.106.061,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2020,95	$ 19.106.061,00				
836	1.5.1.2	ACERO ESTRUCT T, ASTM A36, Inc sumi,fabri,mont,pin	KG	13.096,43	23.844,00	$ 313.580.920,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13096,43	$ 313.580.920,00				
		SUBTOTAL				$ 332.686.981,00				$ -		$ -		$ -		$ 332.686.981,00				
PINTURA																				
IMPERMEABILIZACIONES																				
837	1.6.1.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	M2	135,00	21.295,00	$ 2.874.825,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	135,00	$ 2.874.825,00				
		SUBTOTAL				$ 2.874.825,00				$ -		$ -		$ -		$ 2.874.825,00				
ESTRUCTURAS MADERAS INMUNIZADAS																				
MADERAS INMUNIZADAS ESTRUCTURALES																				
838	1.7.1.1	SENDEROS TIPO 4 PUENTE - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA	ML	67,50	4.989.381,00	$ 336.783.218,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	67,50	$ 336.783.218,00				
		SUBTOTAL				$ 336.783.218,00				$ -		$ -		$ -		$ 336.783.218,00				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 4 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 717.325.504,00				$ 7.627.546,00		$ -		$ 7.627.546,00		$ 709.697.958,00				
PUENTE EN CONCRETO 1																				
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																				
PRELIMINARES																				
DESCAPOTE																				
839	1.1.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	21,60	8.947,00	$ 193.255,00			0,00	$ -	21,60	$ 193.255,00	21,60	$ 193.255,00	0,00	$ -				
		SUBTOTAL				$ 193.255,00				$ -		$ 193.255,00		$ 193.255,00		$ -				
LOCALIZACION Y REPLANTEO																				
840	1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) Inc plano	M2	124,60	9.558,00	$ 1.184.793,00			0,00	$ -	124,45	$ 1.190.489,00	124,45	$ 1.190.489,00	0,45	$ 4.304,00				
		SUBTOTAL				$ 1.194.793,00				$ -		$ 1.190.489,00		$ 1.190.489,00		$ 4.304,00				
EXCAVACIONES																				
MANUALES																				
841	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	34,56	76.315,00	$ 2.637.445,00			0,00	$ -	28,00	$ 2.136.820,00	28,00	$ 2.136.820,00	6,56	$ 500.626,00				
		SUBTOTAL				$ 2.637.446,00				$ -		$ 2.136.820,00		$ 2.136.820,00		$ 500.626,00				
CIMENTACION																				
842	1.3.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,08	577.106,00	$ 623.274,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,08	$ 623.274,00				
843	1.3.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	10,60	1.089.468,00	$ 11.550.254,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,60	$ 11.550.254,00				
		SUBTOTAL				$ 12.173.528,00				$ -		$ -		$ -		$ 12.173.528,00				
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%

										ACTA PARCIAL DE OBRA No 003				ESTADO: EN EJECUCION		
COLUMNAS																
844	1.4.1.2	CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	M3	2,66	1.710.225,00	$ 4.549.199,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,66	$ 4.549.199,00
		SUBTOTAL				$ 4.549.199,00				$ -		$ -		$ -		$ 4.549.199,00
VIGAS																
845	1.4.2.1	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi), premez,	M3	26,29	1.537.974,00	$ 40.433.336,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,29	$ 40.433.336,00
		SUBTOTAL				$ 40.433.336,00				$ -		$ -		$ -		$ 40.433.336,00
PLACAS																
846	1.4.4.8	PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27,6MPa, (4000psi) PREMEZ	M3	20,22	1.316.424,00	$ 26.618.093,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,22	$ 26.618.093,00
Subtotal		SUBTOTAL				$ 26.618.093,00				$ -		$ -		$ -		$ 26.618.093,00
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																
847	1.4.6.4	CONCRETO PEDESTAL 27,6 MPa, (4000 psi)	M3	10,20	1.348.566,00	$ 13.755.373,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,20	$ 13.755.373,00
848	1.4.6.6	APOYO ELASTOMERICO DUREZA 50 DE DIMENSIONES 160MMX160MMX15MM, INCLUYE MORTERO AUTONIVELANTE TIPO SIKAGROUT-200 O SIMILAR DE DIMENSIONES 0.25MX0.60MX0.03M	UN	6,00	166.508,00	$ 999.048,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 999.048,00
Subtotal		SUBTOTAL				$ 14.754.421,00				$ -		$ -		$ -		$ 14.754.421,00
ESTRUCTURAS METALICAS																
849	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	5.573,17	9.454,00	$ 52.688.749,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5573,17	$ 52.688.749,00
Subtotal		SUBTOTAL				$ 52.688.749,00				$ -		$ -		$ -		$ 52.688.749,00
CARPINTERIA METALICA																
REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS																
850	1.6.1.1	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML	67,40	508.019,00	$ 34.240.481,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	67,40	$ 34.240.481,00
Subtotal		SUBTOTAL				$ 34.240.481,00				$ -		$ -		$ -		$ 34.240.481,00
		VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 189.483.301,00				$ -		$ 3.520.564,00		$ 3.520.564,00		$ 185.962.737,00
PUENTE EN CONCRETO 2																
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																
PRELIMINARES																
DESCAPOTE																
851	1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0,15m,Inc retiro,5 kms	M2	37,80	8.947,00	$ 338.197,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	37,80	$ 338.197,00
		SUBTOTAL				$ 338.197,00				$ -		$ -		$ -		$ 338.197,00
LOCALIZACION Y REPLANTEO																
852	1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) Inc plano	M2	303,85	9.566,00	$ 2.906.629,00			0,00	$ -	303,06	$ 2.899.072,00	303,06	$ 2.899.072,00	0,79	$ 7.557,00
		SUBTOTAL				$ 2.906.629,00				$ -		$ 2.899.072,00		$ 2.899.072,00		$ 7.557,00
EXCAVACIONES																
MANUALES																
853	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	60,48	76.315,00	$ 4.615.531,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,48	$ 4.615.531,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO		
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00			$ 811.646.155,00				10 DE FEBRERO DEL 2023		
							VALOR ANTICIPO:			VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION		
							$ 8.078.740.475,40			$ 243.493.846,50				10 MESES Y 15 DIAS		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						VALOR ADICIONAL:			PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		
							$ -			0,701%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023		
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						VALOR ANTICIPO ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		
							$ -			$ 188.778.237,00						
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE						VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:		
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						$ 26.929.134.918,00			3,715%				3,715%		
										ACTA PARCIAL DE OBRA No 003				ESTADO: EN EJECUCION		

	SUBTOTAL					$ 4.615.531,00				$ -		$ -		$ -		$ 4.615.531,00				
CIMENTACION																				
854	1.3.1	CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,89	577.106,00	$ 1.090.730,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,89	$ 1.090.730,00				
855	1.3.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	18,90	1.069.468,00	$ 20.212.945,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,90	$ 20.212.945,00				
	SUBTOTAL					$ 21.303.675,00				$ -		$ -		$ -		$ 21.303.675,00				
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				
COLUMNAS																				
856	1.4.1.2	CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	M3	36,27	1.710.225,00	$ 62.029.861,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	36,27	$ 62.029.861,00				
	SUBTOTAL					$ 62.029.861,00				$ -		$ -		$ -		$ 62.029.861,00				
VIGAS																				
857	1.4.2.1	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). premez.	M3	130,91	1.537.974,00	$ 201.336.176,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	130,91	$ 201.336.176,00				
	SUBTOTAL					$ 201.336.176,00				$ -		$ -		$ -		$ 201.336.176,00				
PLACAS																				
858	1.4.4.8	PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27,6MPa, (4000psi) PREMEZ	M3	50,34	1.316.424,00	$ 66.268.784,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	50,34	$ 66.268.784,00				
	SUBTOTAL					$ 66.268.784,00				$ -		$ -		$ -		$ 66.268.784,00				
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																				
859	1.4.6.4	CONCRETO PEDESTAL 27,6 MPa, (4000 psi)	M3	13,86	1.348.566,00	$ 18.691.125,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,86	$ 18.691.125,00				
860	1.4.8.6	APOYO ELASTOMERICO DUREZA 50 DE DIMENSIONES 160MMX160MMX15MM, INCLUYE MORTERO AUTONIVELANTE TIPO SIKAGROUT-200 O SIMILAR DE DIMENSIONES 0.25MX0.60MX0.03M	UN	14,00	166.508,00	$ 2.331.112,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 2.331.112,00				
	SUBTOTAL					$ 21.022.237,00				$ -		$ -		$ -		$ 21.022.237,00				
ESTRUCTURAS METALICAS																				
861	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	18.606,47	9.454,00	$ 177.796.367,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18606,47	$ 177.796.367,00				
	SUBTOTAL					$ 177.796.367,00				$ -		$ -		$ -		$ 177.796.367,00				
CARPINTERIA METALICA																				
REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS																				
862	1.6.1.1	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML	167,60	808.619,00	$ 85.245.588,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	167,60	$ 85.245.588,00				
	SUBTOTAL					$ 85.245.588,00				$ -		$ -		$ -		$ 85.245.588,00				
	VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 2 (INCLUYE AIU DEL 31%)					$ 642.863.045,00				$ -		$ 2.899.072,00		$ 2.899.072,00		$ 639.963.973,00				
PUENTE EN CONCRETO 3																				
GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES																				
PRELIMINARES																				
DESCAPOTE																				
863	1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <e= 0.15m,lno retiro,5 kms	M2	21,60	8.947,00	$ 193.255,00			21,60	$ 193.255,00	0,00	$ -	21,60	$ 193.255,00	0,00	$ -				
	SUBTOTAL					$ 193.255,00				$ 193.255,00		$ -		$ 193.255,00		$ -				

CONTRATO No :	3950 DE 2022						VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			VALOR ACTAS PARCIALES				FECHA DE INICIO CONTRATO									
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"							$ 26.929.134.918,00			$ 811.646.155,00				10 DE FEBRERO DEL 2023									
							VALOR ANTICIPO:			VALOR AMORTIZADO PARCIALES				TIEMPO DE EJECUCION									
							$ 8.078.740.475,40			$ 243.493.846,50				10 MESES Y 15 DIAS									
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS						VALOR ADICIONAL:			PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:									
							$ -			0,701%				24 DE DICIEMBRE DEL 2023									
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA						VALOR ANTICIPO ADICIONAL			VALOR PRESENTE ACTA:				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:									
							$ -			$ 188.778.237,00													
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE						VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:			PORCENTAJE DE EJECUCION:				PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:									
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						$ 26.929.134.918,00			3,715%				3,715%									
										ACTA PARCIAL DE OBRA No 003				ESTADO: EN EJECUCION									
LOCALIZACION Y REPLANTEO																							
664	1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	178,22	9.556,00	$ 1.704.853,00			178,21	$ 1.704.757,00	0,00	$ -	178,21	$ 1.704.757,00	0,01	$ 96,00							
		SUBTOTAL				$ 1.704.853,00				$ 1.704.757,00		$ -		$ 1.704.757,00		$ 96,00							
EXCAVACIONES																							
MANUALES																							
665	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	34,56	76.315,00	$ 2.637.446,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,56	$ 2.637.446,00							
		SUBTOTAL				$ 2.637.446,00				$ -		$ -		$ -		$ 2.637.446,00							
CIMENTACION																							
666	1.3.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,08	577.106,00	$ 623.274,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,08	$ 623.274,00							
667	1.3.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Acelor	M3	10,80	1.069.468,00	$ 11.550.254,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,80	$ 11.550.254,00							
		SUBTOTAL				$ 12.173.528,00				$ -		$ -		$ -		$ 12.173.528,00							
ESTRUCTURAS EN CONCRETO																							
COLUMNAS																							
668	1.4.1.2	CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	M3	13,37	1.710.225,00	$ 22.865.708,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,37	$ 22.865.708,00							
		SUBTOTAL				$ 22.865.708,00				$ -		$ -		$ -		$ 22.865.708,00							
VIGAS																							
669	1.4.3.1	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). premez.	M3	71,45	1.537.974,00	$ 109.888.242,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	71,45	$ 109.888.242,00							
		SUBTOTAL				$ 109.888.242,00				$ -		$ -		$ -		$ 109.888.242,00							
ESTRUCTURAS ESBELTAS																							
670	1.4.3.1	CONCRETO MURO PANTALLA 27.6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	M3	1,46	1.607.453,00	$ 2.346.881,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,46	$ 2.346.881,00							
		SUBTOTAL				$ 2.346.881,00				$ -		$ -		$ -		$ 2.346.881,00							
PLACAS																							
671	1.4.4.1	PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27.6MPa, (4000psi) PREMEZ	M3	27,45	1.316.424,00	$ 36.135.839,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,45	$ 36.135.839,00							
		SUBTOTAL				$ 36.135.839,00				$ -		$ -		$ -		$ 36.135.839,00							
PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS																							
672	1.4.6.4	CONCRETO PEDESTAL 27,6 MPa, (4000 psi)	M3	7,92	1.348.566,00	$ 10.680.643,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,92	$ 10.680.643,00							
673	1.4.6.6	APOYO ELASTOMERICO DUREZA 50 DE DIMENSIONES 160MMX160MMX15MM, INCLUYE MORTERO AUTONIVELANTE TIPO SIKAGROUT-200 O SIMILAR DE DIMENSIONES 0,25MX0,60MX0,03M	UN	8,00	166.508,00	$ 1.332.064,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 1.332.064,00							
		SUBTOTAL				$ 12.012.707,00				$ -		$ -		$ -		$ 12.012.707,00							
ESTRUCTURAS METALICAS																							
674	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	8.956,35	9.454,00	$ 84.673.333,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8956,35	$ 84.673.333,00							
		SUBTOTAL				$ 84.673.333,00				$ -		$ -		$ -		$ 84.673.333,00							
PISOS																							

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
		$ -	$ 188.778.237,00	
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%

										ACTA PARCIAL DE OBRA No 003				ESTADO: EN EJECUCION		
PLACAS DE CONTRAPISO																
875	1.6.1.1	PLACA DE CONTRAPISO (27.6 Mpa, 4000psi) PREMEZ	M3	2,74	1.229.418,00	$ 3.368.605,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,74	$ 3.368.605,00
		SUBTOTAL				$ 3.368.605,00				$ -		$ -		$ -		$ 3.368.605,00
CARPINTERIA METALICA																
REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS																
876	1.7.1.1	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML	98,00	508.019,00	$ 49.785.862,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	98,00	$ 49.785.862,00
		SUBTOTAL				$ 49.785.862,00				$ -		$ -		$ -		$ 49.785.862,00
		VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 3 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 337.786.259,00				$ 1.898.012,00		$ -		$ 1.898.012,00		$ 335.888.247,00
ZONAS VERDES (ARBORIZACION)																
EJECTAR COMPONENTE FORESTAL																
TALA DE ARBOLES																
TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m) No incuye desenraice ni transporte residuos																
877	1.1.1	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	42,00	313.254,00	$ 13.156.668,00			26,00	$ 8.144.604,00	0,00	$ -	26,00	$ 8.144.604,00	16,00	$ 5.012.064,00
878	1.2.1	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	171,00	546.366,00	$ 93.426.586,00			143,00	$ 78.130.338,00	0,00	$ -	143,00	$ 78.130.338,00	28,00	$ 15.296.248,00
879	1.3.1	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuo	ARBOL	152,00	910.297,00	$ 138.365.144,00			125,00	$ 113.787.125,00	0,00	$ -	125,00	$ 113.787.125,00	27,00	$ 24.578.019,00
880	1.4.1	TALA DE ARBOLES CLASE IV (15m < H < 20 m) No incluye desenraice ni transporte residuo	ARBOL	29,00	1.530.253,00	$ 44.377.337,00			29,00	$ 44.377.337,00	0,00	$ -	29,00	$ 44.377.337,00	0,00	$ -
881	1.5.1	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>20m) No incuye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	3,00	2.228.907,00	$ 6.686.721,00			3,00	$ 6.686.721,00	0,00	$ -	3,00	$ 6.686.721,00	0,00	$ -
882	2.1.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE I (H<5m) Incluye poda radicular, poda de copa cicatrización	UN	3,00	286.844,00	$ 860.532,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 860.532,00
883	2.2.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) Incluye poda radicular, poda de copa cicatrización	UN	30,00	590.207,00	$ 17.706.210,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 17.706.210,00
884	2.3.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m.) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización	UN	26,00	869.044,00	$ 22.595.144,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ 22.595.144,00
885	2.4.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE IV (15m<H<20m) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización	UN	19,00	1.236.882,00	$ 23.500.758,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 23.500.758,00
886	3.1.1	CERRAMIENTOS DE PROTECCION (Incluye suministro y colocación de durmientes de 2.90m x 0.04m x 0.04m y polisombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal y cambio por reposición de cerramentos del 25%)	UN	2.526,00	143.845,00	$ 363.352.470,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2526,00	$ 363.352.470,00
		SUBTOTAL				$ 724.029.570,00				$ 251.126.125,00		$ -		$ 251.126.125,00		$ 472.903.445,00
VALOR TOTAL CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION) (INCLUYE AIU DEL 31%)						$ 724.029.570,00				$ 251.126.125,00		$ -		$ 251.126.125,00		$ 472.903.445,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO CON AIU 31%						$ 26.781.026.508,00				$ 811.646.155,00		$ 188.778.237,00		$ 1.000.424.392,00		$ 25.780.602.116,00
RETIE PARA BAJA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR						$ 25.000.000,00										$ 25.000.000,00
RETIE PARA MEDIA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR						$ 10.008.410,00										$ 10.008.410,00

CONTRATO No :	3950 DE 2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO	
"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"		$ 26.929.134.918,00	$ 811.646.155,00	10 DE FEBRERO DEL 2023	
		VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCION	
		$ 8.078.740.475,40	$ 243.493.846,50	10 MESES Y 15 DIAS	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	
		$ -	0,701%	24 DE DICIEMBRE DEL 2023	
INTERVENTOR :	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	
		$ -	$ 188.778.237,00		
SUPERVISOR:	LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCION:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	
SECRETARIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	$ 26.929.134.918,00	3,715%	3,715%	
			ACTA PARCIAL DE OBRA No 003	ESTADO: EN EJECUCION	

RETIE PARA USO FINAL (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 22.100.000,00											$ 22.100.000,00		
RETILAP (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 22.500.000,00											$ 22.500.000,00		
INSPECCION Y/O CERTIFICACION DE OPERADOR DE RED (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 5.500.000,00											$ 5.500.000,00		
IMPLEMENTACIÓN PMA (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 28.000.000,00											$ 28.000.000,00		
IMPLEMENTACIÓN PMT (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 35.000.000,00											$ 35.000.000,00		
VALOR TOTAL CONTRATO				$ 26.929.134.918,00				$ 811.646.155,00		$ 188.778.237,00		$ 1.000.424.392,00			$ 25.928.710.526,00		

Valor inicial del contrato	$ 26.929.134.918,00
Valor Actualizado del contrato Acta Modificatoria N1	$ 26.929.134.918,00
Valor anticipo 30%	$ 8.078.740.475,40
Valor ejecutado Acta Parcial No 001	$ 366.449.367,00
Valor ejecutado Acta Parcial No 002	$ 445.196.788,00
Valor ejecutado Acta Parcial No 003	$ 188.778.237,00
Valor anticipo Amortizado Acta Parcial No 003	$ 56.633.471,10
Valor Ejecutado Acumulado	$ 1.000.424.392,00
Valor neto a pagar	$ 132.144.765,90
Valor por Amortizar	$ 7.778.613.157,80
Valor por Ejecutar	$ 25.928.710.526,00

Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL DE OBRA No 003, por los que en ella intervinieron, en Villavicencio a los _____.

Firma
JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
CONTRATISTA

Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

MUSEO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza			
ITEM	9	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	95,20

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	36,00	CANT ACUMULADA	36,00





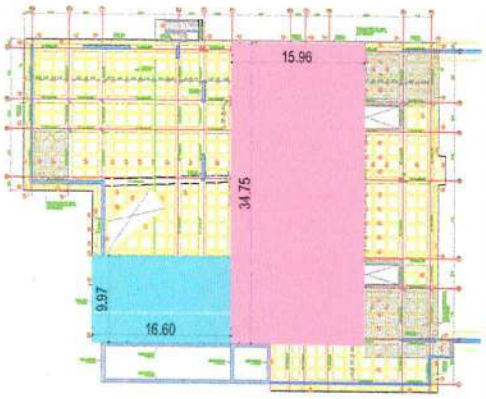

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
16,60	9,97	0,05		8,28
34,75	15,96	0,05		27,72

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	36,00
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	36,00

OSSERVACIONES: MUSEO

MUSEO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1027


Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	9	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	95,20	CANT EJECUTADA	36,00	CANT ACUMULADA	36,00

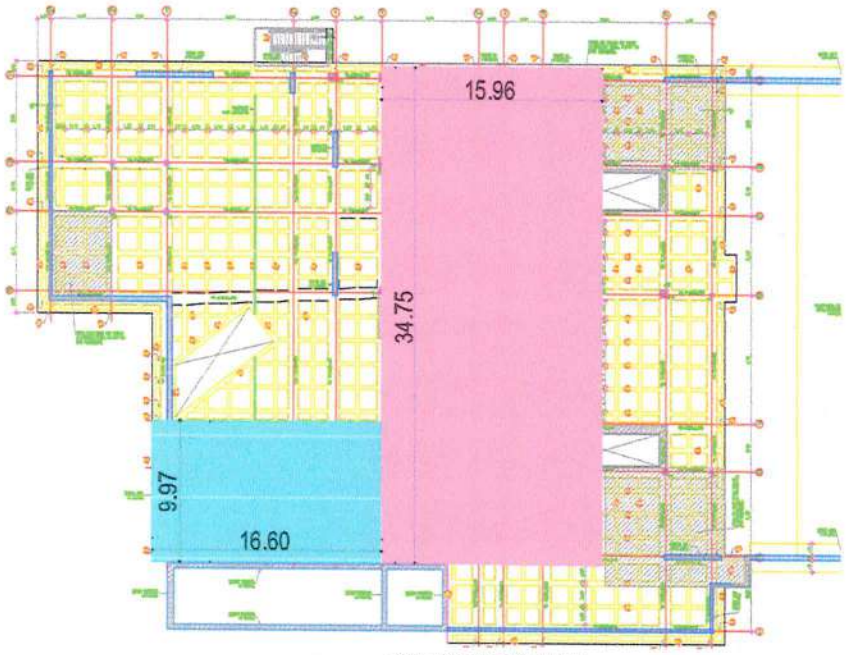

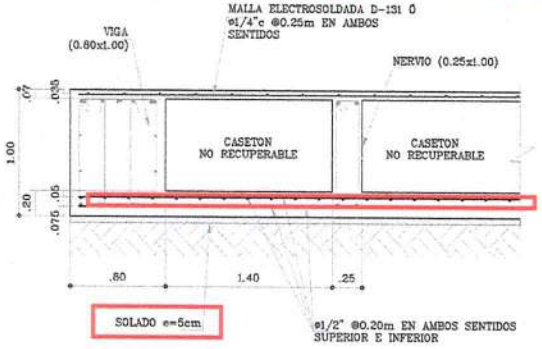

SECCIÓN LOSA 0 (CIMENTACIÓN y SUB-PRESIÓN)

OBSERVACIONES: MUSEO

ELABORÓ
DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM 376	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	6,17	CANT EJECUTADA	5,29	CANT ACUMULADA	5,29







ZAPATAS

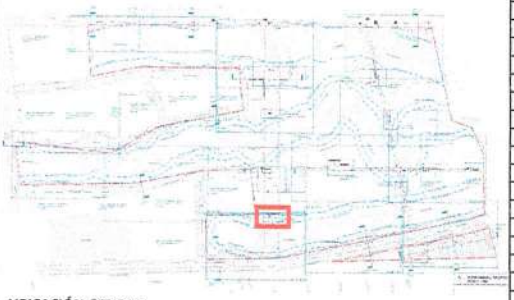

UBICACIÓN GENERAL

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
1,05	0,37	1,05	13,00	5,29

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	5,29
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	5,29

OBSERVACIONES: APROVECHAMIENTO ECONOMICO

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	376	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	6,17	CANT EJECUTADA	5,29	CANT ACUMULADA	5,29

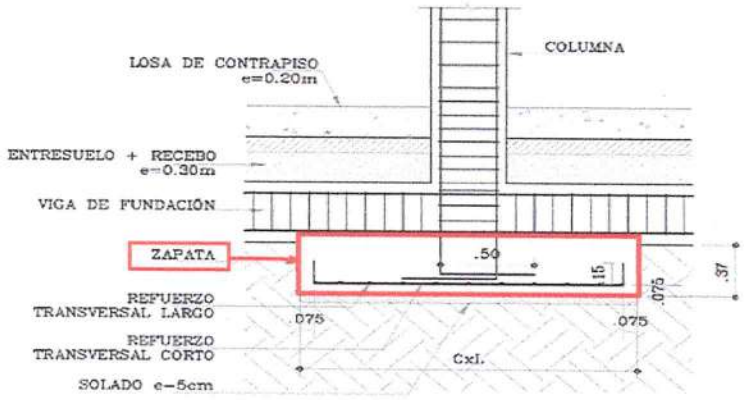

ESQUEMA GENERAL DE ZAPATAS

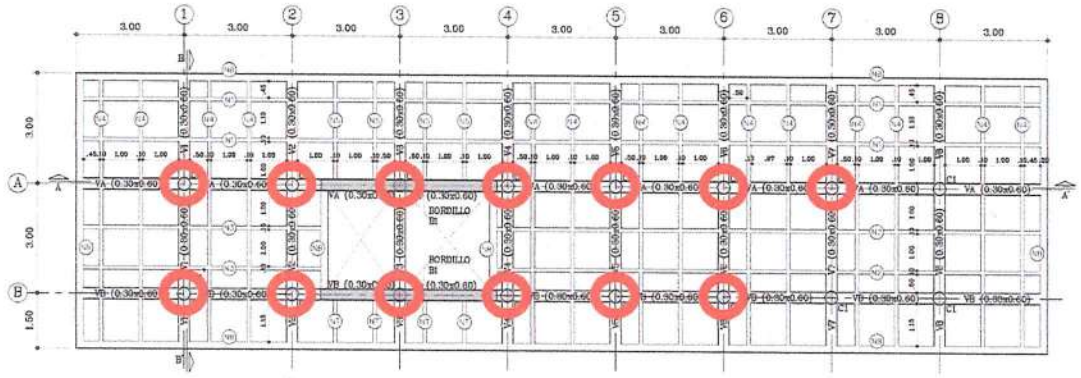

UBICACIÓN ZAPATAS APROVECHAMIENTO

OBSERVACIONES: APROVECHAMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	384	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	6664,17	CANT EJECUTADA	229,02	CANT ACUMULADA	229,02



DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD
0.15 — 0.90 — 0.15	6	#4	1.20
0.15 — 0.90 — 0.15	6	#4	1.20



ACERO ZAPATAS
APROVECHAMIENTO ECONOMICO

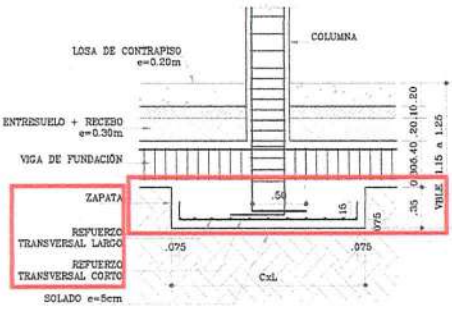

ESQUEMA GENERAL DE ZAPATAS

DIMENSIONES				TOTAL
CANTIDAD	LONGITUD	PESO	No ZAPATAS	
ZAPATAS DIAMETRO 1/2"				
REFUERZO LARGO				
6,00	1,20	0,994	16,00	114,51
REFUERZO CORTO				
6,00	1,20	0,994	16,00	114,51
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				229,02
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				229,02

OBSERVACIONES:

APROVECAHMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa; (4200 kg/cm2,G60)				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	384	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	6664,17	CANT EJECUTADA	229,02	CANT ACUMULADA	229,02

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD
0.15 — 0.90 — 0.15	6	#4	1.20
0.15 — 0.90 — 0.15	6	#4	1.20

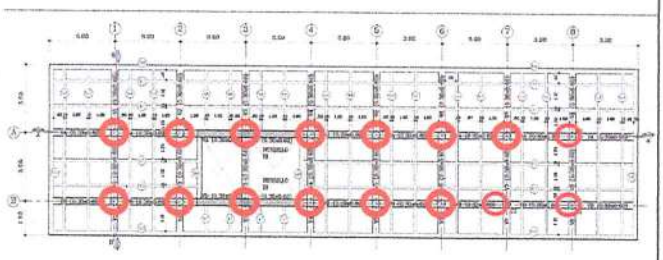

UBICACIÓN ZAPATAS APROVECHAMIENTO ECONOMICO

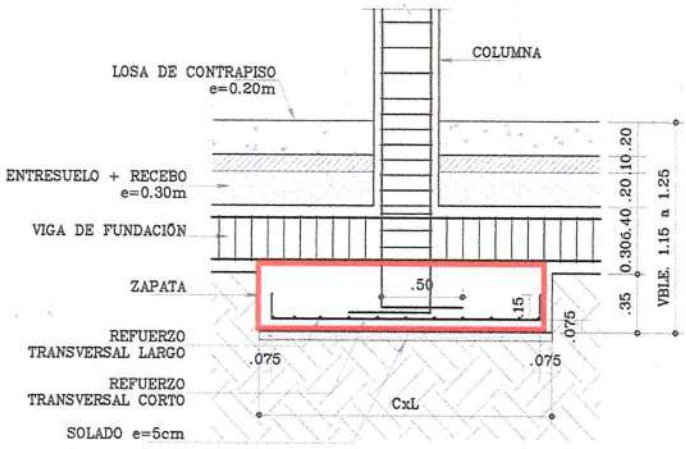

ESQUEMA GENERAL DE ZAPATAS

Designación de la Barra	Diámetro en Pugadas	Diámetro en mm	Masa en kg/ml	Longitud de la Varilla (m)			Varillas por Tonelada		
							6m	9m	12m
No. 2	1/4"	6.4	0.250	6	9	12	666.6	444.4	333.3
No. 3	3/8"	9.5	0.560	6	9	12	297.6	198.4	148.8
No. 4	1/2"	12.7	0.994	6	9	12	167.6	111.7	83.8
No. 5	5/8"	15.9	1.552	6	9	12	107.4	71.6	53.7
No. 6	3/4"	19.1	2.235	6	9	12	74.6	49.7	37.3
No. 7	7/8"	22.2	3.042	6	9	12	54.8	36.5	27.4
No. 8	1"	25.4	3.973	6	9	12	42.0	28.0	21.0
No. 9	1-1/8"	28.7	5.060	6	9	12	33.0	22.0	16.5
No. 10	1-1/4"	32.3	6.404	6	9	12	26.0	17.3	13.0
No. 11	1-3/8"	35.8	7.907	6	9	12	21.0	14.0	10.5
No. 14	1-3/4"	43	11.380	6	9	12	14.6	9.7	7.3
No. 18	2-1/4"	57.3	20.240	6	9	12	8.2	5.5	4.1

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)				
ITEM	384	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	6664,17


CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	2560,80	CANT ACUMULADA	2560,80






ACERO COLUMNAS
APROVECHAMIENTO ECONOMICO







DIMENSIONES				TOTAL
CANTIDAD	LONGITUD	PESO	PESO No COLUMNAS	
MEMORIA ANTERIOR				229,02
COLUMNAS (A2,A3,A4,A5,A6,A7-B2,B3,B4,B5,B6) (SON 11 COLUMNAS) 1"				
3,00	5,50	3,98	722,37	722,37
3,00	5,50	3,98	722,37	722,37
45,00	0,928	0,994	456,60	456,60
COLUMNA (A1,A8) (2 COLUMNA) 1"				
3,00	5,50	3,98	131,34	131,34
3,00	5,45	3,042	99,47	99,47
45,00	0,928	0,994	83,02	83,02
COLUMNA (B1) (1 COLUMNA) 3/4"				
3,00	5,40	2,235	36,21	36,21
3,00	5,40	2,235	36,21	36,21
45,00	0,988	0,994	44,19	44,19
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				2560,80
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				2560,80

OBSERVACIONES:

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10284

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	334	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	6664,17	CANT EJECUTADA	2.560,80	CANT ACUMULADA	2560,80

Columnas C1 (A2, A3, A4, A5, A6, A7, B2, B3, B4, B5, B6, B7) (Son 12) Peso/Elemento= 1

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
0.50 — 4.60 — 0.40	3	#8	5.50	66.0
0.50 — 4.60 — 0.40	3	#8	5.50	66.0
Tras. ø=0.20 Tras.=0.10 g=0.10	45	#4	0.928	41.8

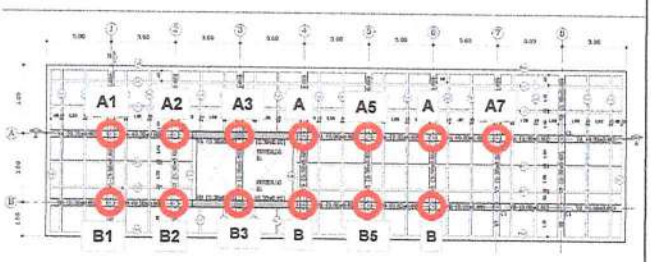

UBICACIÓN COLUMNAS APROVECHAMIENTO ECONOMICO

Columnas C1 (A1, A8) (Son 2) Peso/Elemento= 157.81Kg Peso 2 elementos=315.61Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
0.50 — 4.60 — 0.40	3	#8	5.50	66.0
0.50 — 4.60 — 0.35	3	#7	5.45	50.0
Tras. ø=0.20 Tras.=0.10 g=0.10	45	#4	0.928	41.8

Columnas C1 (B1,B8) (Son 2) Peso/Elemento= 117.37Kg Peso 2 elementos=234.75Kg

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO
0.50 — 4.60 — 0.30	3	#6	5.40	36.5
Tras. ø=0.20 Tras.=0.10 g=0.13	45	#4	0.988	44.5
0.50 — 4.60 — 0.30	3	#6	5.40	36.5

Designación de la Barra	Diámetro en Pugadas	Diámetro en mm	Masa en kg/ml	Longitud de la Varilla (m)			Varillas por Tonelada		
							6m	9m	12m
No. 2	1/4"	6.4	0.250	6	9	12	666.6	444.4	333.3
No. 3	3/8"	9.5	0.560	6	9	12	297.6	198.4	148.8
No. 4	1/2"	12.7	0.994	6	9	12	167.6	111.7	83.8
No. 5	5/8"	15.9	1.552	6	9	12	107.4	71.6	53.7
No. 6	3/4"	19.1	2.235	6	9	12	74.6	49.7	37.3
No. 7	7/8"	22.2	3.042	6	9	12	54.8	36.5	27.4
No. 8	1"	25.4	3.973	6	9	12	42.0	28.0	21.0
No. 9	1-1/8"	28.7	5.060	6	9	12	33.0	22.0	16.5
No. 10	1-1/4"	32.3	6.404	6	9	12	26.0	17.3	13.0
No. 11	1-3/8"	35.8	7.907	6	9	12	21.0	14.0	10.5
No. 14	1-3/4"	43	11.380	6	9	12	14.6	9.7	7.3
No. 18	2-1/4"	57.3	20.240	6	9	12	8.2	5.5	4.1

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	384	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	6664,17	CANT EJECUTADA	3252,42	CANT ACUMULADA	3252,42





PLANTA FUNDACIONES
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 1 Y 2
ESC. 1:75



VIGA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(0.30x0.30) FUNDACIONES



ACERO VIGAS
APROVECHAMIENTO ECONOMICO

	DIMENSIONES				TOTAL
	CANTIDAD	LONGITUD	PESO	DIAMETRO	
MEMORIA ANTERIOR					2560,80
VIGA A					
	2,00	5,55	0,994	#4	11,03
	2,00	8,15	0,994	#4	16,20
	2,00	9,7	0,994	#4	19,28
	2,00	9,70	0,994	#4	19,28
	2,00	7,75	0,994	#4	15,41
	2,00	5,15	0,994	#4	10,24
	280,00	0,800	0,56	#3	125,44
VIGA B					
	2,00	5,55	0,994	#4	11,03
	2,00	8,15	0,994	#4	16,20
	2,00	9,7	0,994	#4	19,28
	2,00	9,70	0,994	#4	19,28
	2,00	7,75	0,994	#4	15,41
	2,00	5,15	0,994	#4	10,24
	280,00	0,800	0,56	#3	125,44
VIGA 1					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 2					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 3					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 4					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 5					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 6					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 7					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
VIGA 8					
	4,00	3,60	0,994	#4	14,31
	40,00	0,80	0,56	#3	17,92
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:					3252,42
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:					3252,42

OBSERVACIONES:

APROVECAHMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	384	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	6664,17	CANT EJECUTADA	3.252,42	CANT ACUMULADA	3252,42

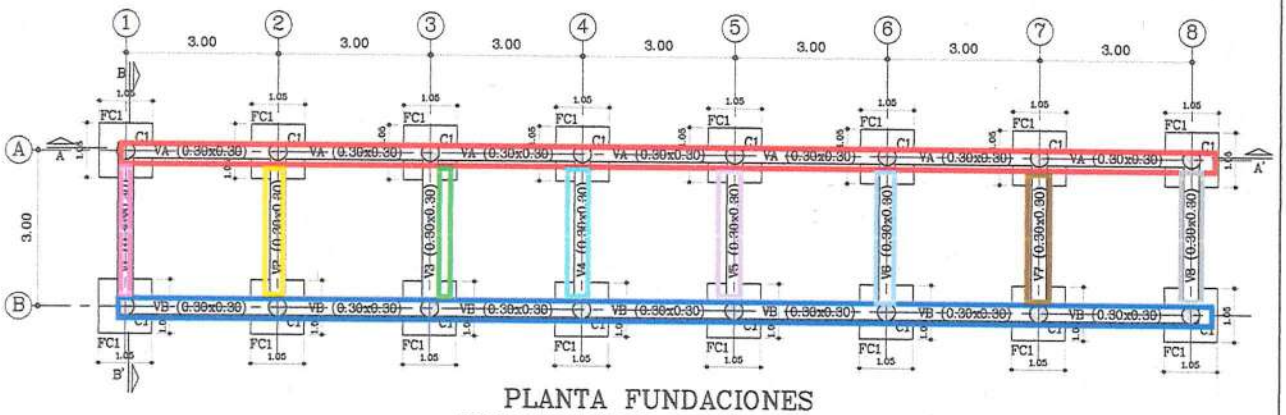


PLANTA FUNDACIONES
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO 1 Y 2
ESC. 1:75

Designación de la Barra	Diámetro en Pulgadas	Diámetro en mm	Masa en kg/m	Longitud de la Varilla (m)			Varillas por Tonelada		
				6m	9m	12m	6m	9m	12m
No. 2	1/4"	6.4	0.250	6	9	12	666.6	444.4	333.3
No. 3	3/8"	9.5	0.560	6	9	12	297.6	198.4	148.8
No. 4	1/2"	12.7	0.994	6	9	12	167.6	111.7	83.8
No. 5	5/8"	15.9	1.552	6	9	12	107.4	71.6	53.7
No. 6	3/4"	19.1	2.235	6	9	12	74.6	49.7	37.3
No. 7	7/8"	22.2	3.042	6	9	12	54.8	36.5	27.4
No. 8	1"	25.4	3.973	6	9	12	42.0	28.0	21.0
No. 9	1-1/8"	28.7	5.060	6	9	12	33.0	22.0	16.5
No. 10	1-1/4"	32.3	6.404	6	9	12	26.0	17.3	13.0
No. 11	1-3/8"	35.8	7.902	6	9	12	21.0	14.0	10.5
No. 14	1-3/4"	43	11.380	6	9	12	14.6	9.7	7.3
No. 18	2-1/4"	57.3	20.240	6	9	12	8.2	5.5	4.1



VIGA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(0.30x0.30) FUNDACIONES



VIGA A, B (0.30x0.30) FUNDACIONES

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SALA AMBIENTAL

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km				
ITEM	491	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	20,27

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	18,23	CANT ACUMULADA	18,23









DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	
EXCAVACIÓN DE ZAPATAS (SON 53 ZAPATAS)				
0,70	0,702	0,70	53,00	18,23

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	18,23
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	18,23

OBSERVACIONES:

APROVECAHMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA


RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	#¡REF!	UNIDAD	#¡REF!	CANT CONTRACTUAL	20,27	CANT EJECUTADA	#¡REF!	CANT ACUMULADA	#¡REF!

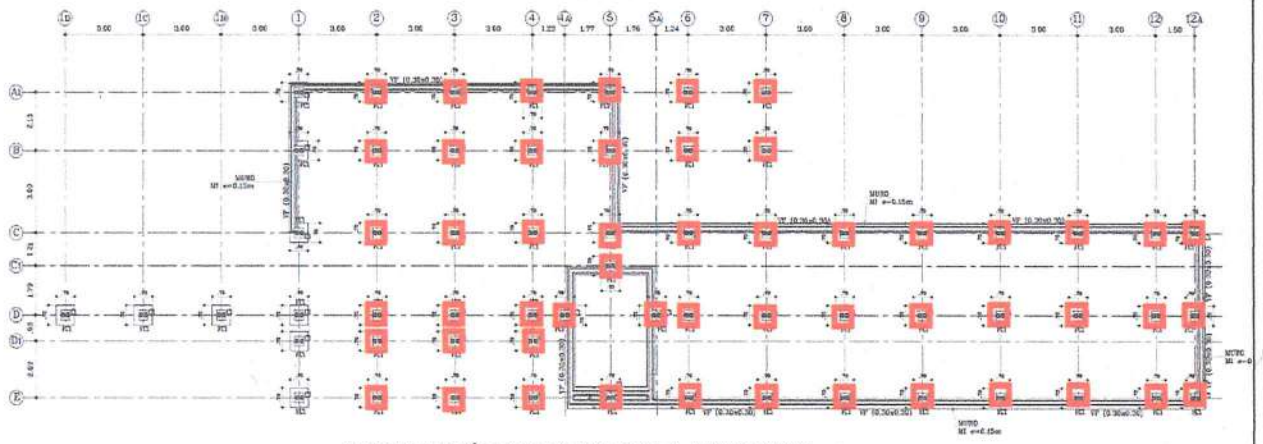

EXCAVACIÓN ZAPATAS SALA AMBIENTAL

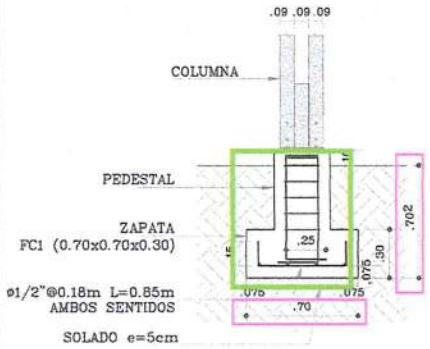

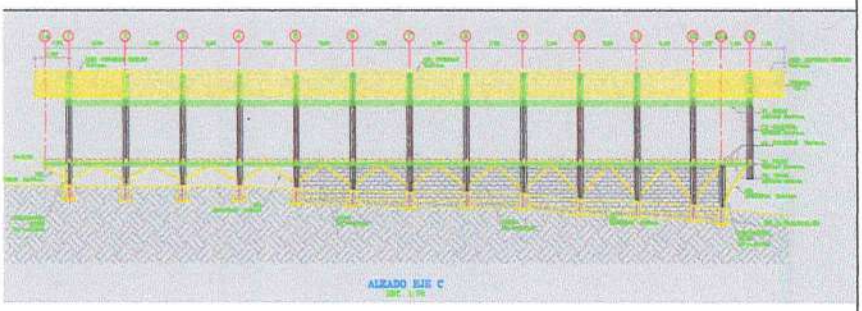

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	492	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	2,90	CANT EJECUTADA	1,30	CANT ACUMULADA	1,30

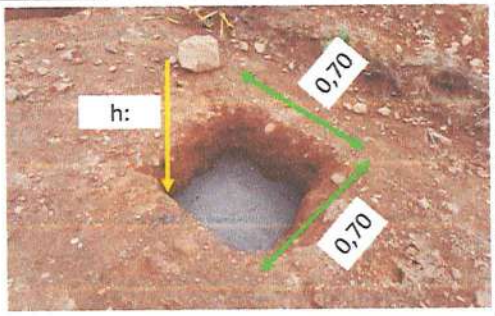





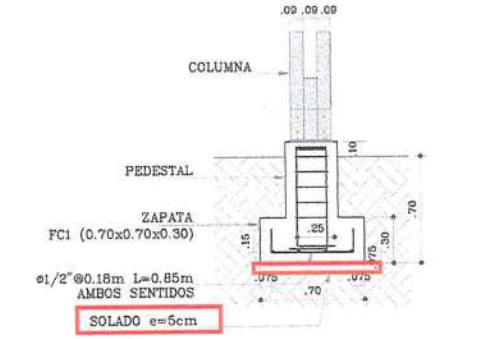

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	
SOLADO EN ZAPATAS (SON 53)				
0,70	0,05	0,70	53,00	1,30
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				1,30
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				1,30

OBSERVACIONES:

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022		INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	493	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	9,11	CANT EJECUTADA	5,88		CANT ACUMULADA	5,88







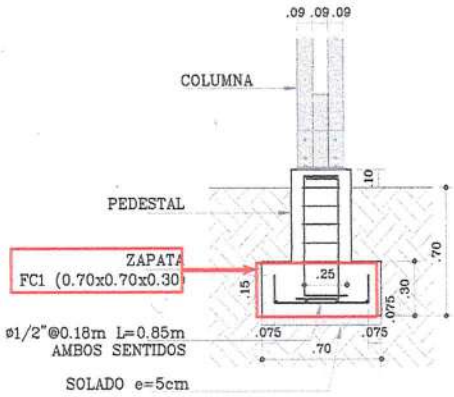

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	
CONCRETO EN ZAPATAS (SON 40 FUNDIDAS)				
0,70	0,30	0,70	40,00	5,88
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				5,88
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				5,88

OBSERVACIONES:

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA


RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	491	UNIDAD	#¡REF!	CANT CONTRACTUAL	20,27	CANT EJECUTADA	18,23	CANT ACUMULADA	18,23

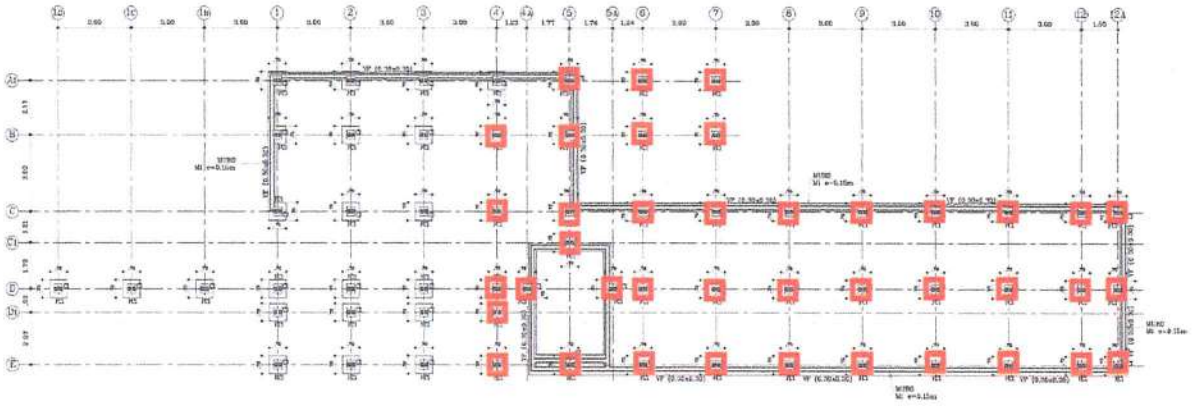

ZAPATAS FUNDIDAS SALA AMBIENTAL

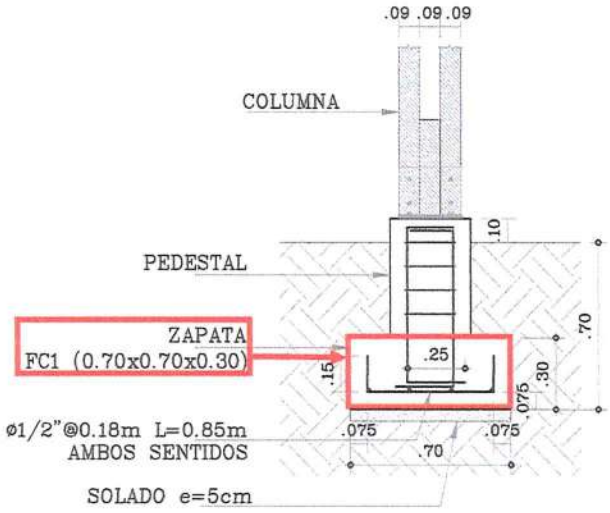

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022		INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	496	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	4972,36	CANT EJECUTADA	1238,21		CANT ACUMULADA	1238,21





DIMENSIONES				TOTAL
CANTIDAD	LONGITUD	PESO	# ELEMENTOS	
ACERO ZAPATAS SON 53				
3,00	0,85	0,994	53,00	134,34
3,00	0,85	0,994	53,00	134,34
ACERO PEDESTALES SON 53				
4,00	1,10	1,552	53,00	361,93
4,00	1,10	0,994	53,00	231,80
5,00	1,00	0,560	53,00	148,40
ACERO EN VIGAS				
3,00	24,42	0,994	1,00	72,82
3,00	24,42	0,994	1,00	72,82
3,00	6,48	0,994	1,00	19,32
3,00	6,48	0,994	1,00	19,32
154,00	0,50	0,56	1,00	43,12



ESQUEMA DE ZAPATAS FC1
AULA AMBIENTAL
ESC. 1:20




DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	3	#4	0,85	2,8	(Total =198)
	3	#4	0,85	2,8	(Total =198)

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
	4	#5	1,10	6,9	(Total =264)
	4	#4	1,10	4,4	(Total =264)
	5	#3	1,00	2,8	(Total =330)

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	1238,21
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	1238,21

OBSERVACIONES:

APROVECAHMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	496	UNIDAD	KG	CANT CONTRACTUAL	4972,36	CANT EJECUTADA	1.238,21	CANT ACUMULADA	1238,21

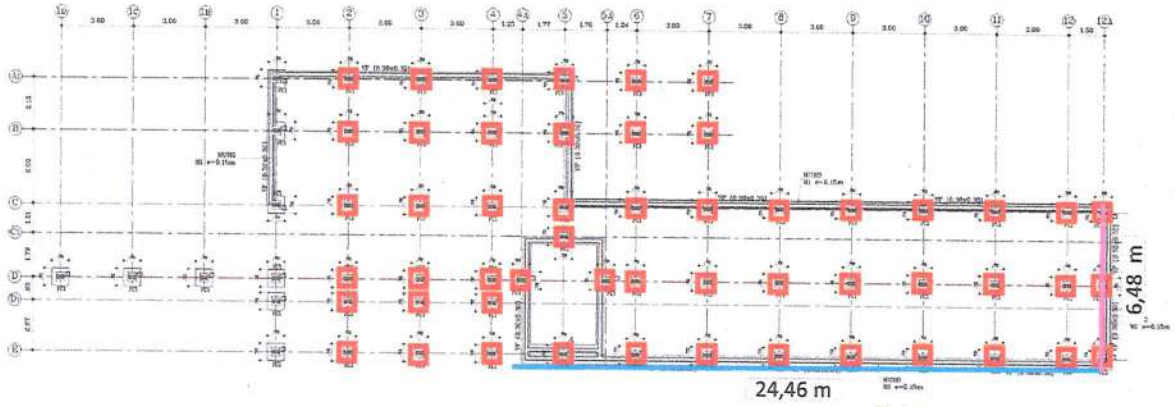

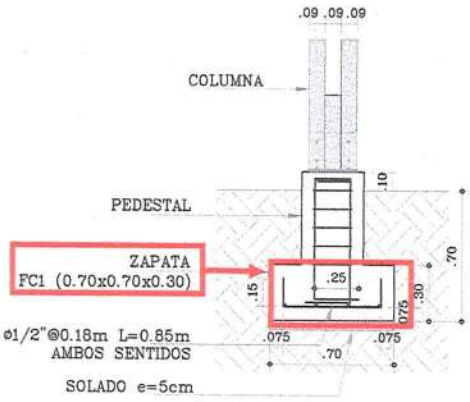



VF (0.30x0.30)

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.20 / 0.85 / 0.25	4	ø5	1.10	6.9	(Total =264)
0.20 / 0.85 / 0.25	4	ø4	1.10	4.4	(Total =264)
h=0.20 b=0.20 g=0.10	5	ø3	1.00	2.8	(Total =320)

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAMETRO	LONGITUD	PESO	NOTAS
0.15 / 0.55 / 0.15	3	ø4	0.85	2.6	(Total =198)
0.15 / 0.55 / 0.15	3	ø4	0.85	2.6	(Total =198)

Designación de la Barra	Diámetro en Pulgadas	Diámetro en mm	Masa en kg/mt	Longitud de la Varilla (m)			Varillas por Tonelada		
							6m	9m	12m
No. 2	1/4"	6.4	0.250	6	9	12	666.6	444.4	333.3
No. 3	3/8"	9.5	0.560	6	9	12	297.6	198.4	148.8
No. 4	1/2"	12.7	0.994	6	9	12	167.6	111.7	83.8
No. 5	5/8"	15.9	1.552	6	9	12	107.4	71.6	53.7
No. 6	3/4"	19.1	2.235	6	9	12	74.6	49.7	37.3
No. 7	7/8"	22.2	3.042	6	9	12	54.8	36.5	27.4
No. 8	1"	25.4	3.973	6	9	12	42.0	28.0	21.0
No. 9	1-1/8"	28.7	5.060	6	9	12	33.0	22.0	16.5
No. 10	1-1/4"	32.3	6.404	6	9	12	26.0	17.3	13.0
No. 11	1-3/8"	35.8	7.907	6	9	12	21.0	14.0	10.5
No. 14	1-3/4"	43	11.380	6	9	12	14.6	9.7	7.3
No. 18	2-1/4"	57.3	20.240	6	9	12	8.2	5.5	4.1

OBSERVACIONES:

ELABORO
DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

REVISO
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

APROBO
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PABELLON DE MAMIFEROS

10296

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	583	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	22,82	CANT EJECUTADA	22,82	CANT ACUMULADA	22,82







DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	AREA	
6,27		3,64		22,82

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	22,82
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	22,82

OBSERVACIONES:

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10292


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	583	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	22,82	CANT EJECUTADA	22,82	CANT ACUMULADA	22,82

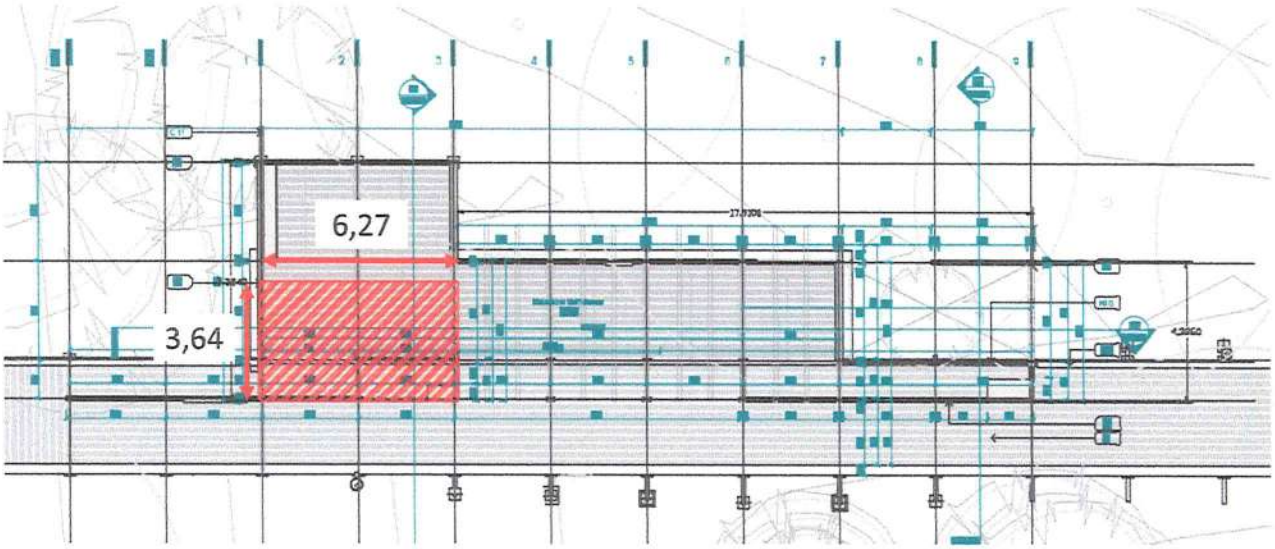

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

Coordenadas		
Punto	Norte	Este
1	1049083,32	947330,639
2	1049086,05	947336,207
3	1049089,35	947334,587
4	1049086,62	947329,019
AREA		22,82M2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

ERANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

Municipio de Villavicencio

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km				
ITEM	589	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	11,89

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	7,31	CANT ACUMULADA	7,31










UBICACIÓN ZAPATAS PABELLON MAMIFEROS



UBICACIÓN VIGA CIMENTACIÓN PABELLON

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	
EXACAVACION DE ZAPATAS				
0,50	0,70	0,50	39,00	6,82
EXACAVACION DE VIGAS				
5,40	0,30	0,30	1,00	0,49
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				7,31
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				7,31

OBSERVACIONES:

APROVECAHMIENTO ECONOMICO

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10300


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	589	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	11,89	CANT EJECUTADA	7,31	CANT ACUMULADA	7,31

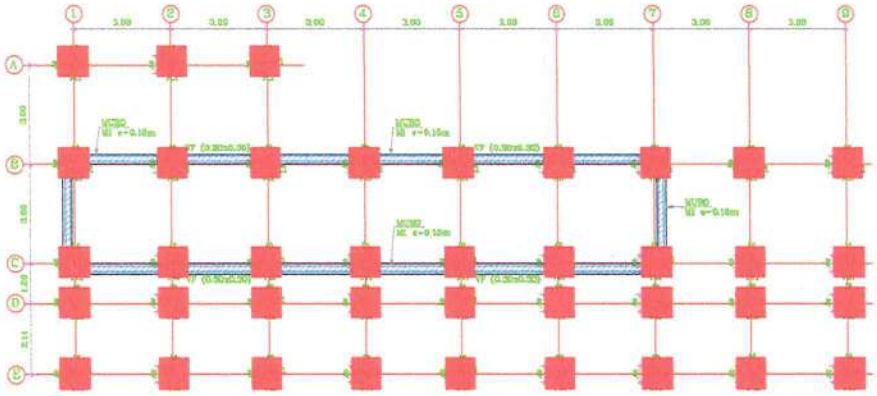


UBICACIÓN ZAPATAS PABELLON

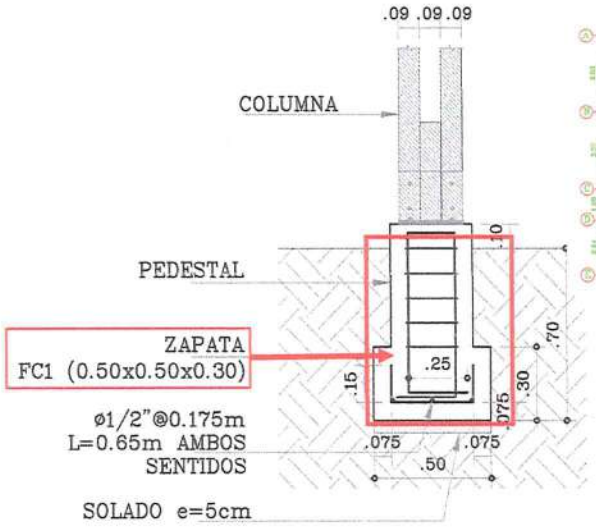

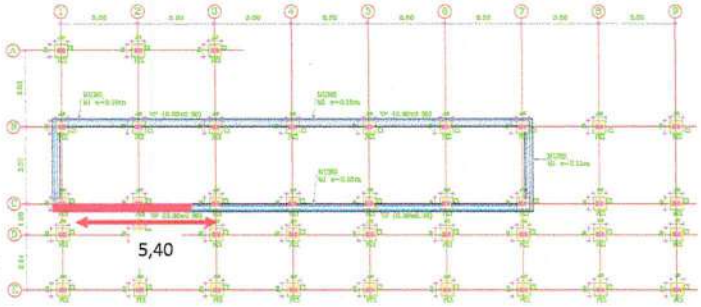

UBICACIÓN VIGA CIMENTACIÓN PABELLON



VF (0.30x0.30)
ESC. 1:15

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10.301

Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	590	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	1,14	CANT EJECUTADA	0,49	CANT ACUMULADA	0,49



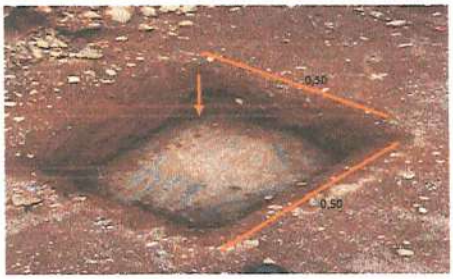



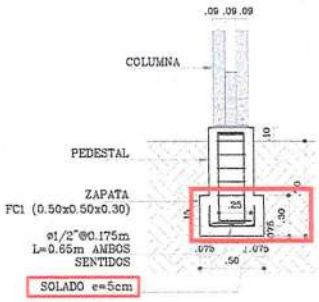

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANT	
SOLADO EN ZAPATAS (SON 39)				
0,50	0,05	0,50	39,00	0,49
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				0,49
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				0,49

OBSERVACIONES:

APROVECHAMIENTO ECONOMICO

ELABORO
DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

REVISO
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

APROBO
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10302


Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	590	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	1,14	CANT EJECUTADA	0,49	CANT ACUMULADA	0,49

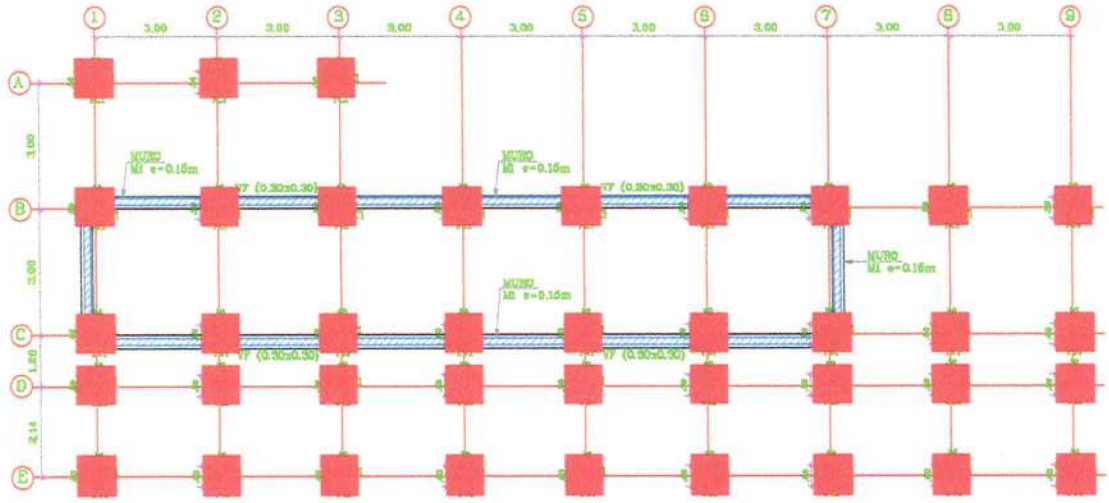

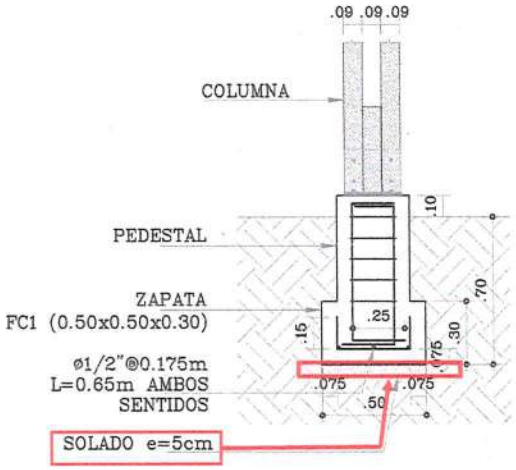

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CALLE 2

10304

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022		INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	601	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	12238,02	CANT EJECUTADA	3589,49		CANT ACUMULADA	3589,49



TRAMO 1

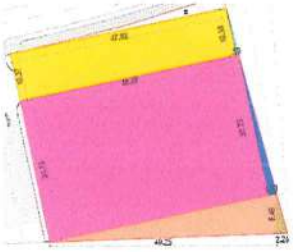

TRAMO 2



UBICACIÓN CALLE 2 - PARQUEADERO



TRAMO 1
TRAMO 2

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	AREA	
TRAMO 1 ZONA PARQUEADERO - CALLE 2				
	10,37	47,92	496,93	496,93
	10,38	0,56	2,91	2,91
	30,73	48,48	1489,79	1489,79
	30,73	1,80	27,66	27,66
	49,25	8,46	208,33	208,33
	8,46	2,24	9,48	9,48
TRAMO 2 ZONA PARQUEADERO - CALLE 2				
	32,51	34,57	1123,87	1123,87
	34,57	5,99	103,54	103,54
	29,06	4,37	126,99	126,99
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				3589,49
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				3589,49

OBSERVACIONES:

CALLE 2

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA


RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	601	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	12238,02	CANT EJECUTADA	3.589,49	CANT ACUMULADA	3589,49

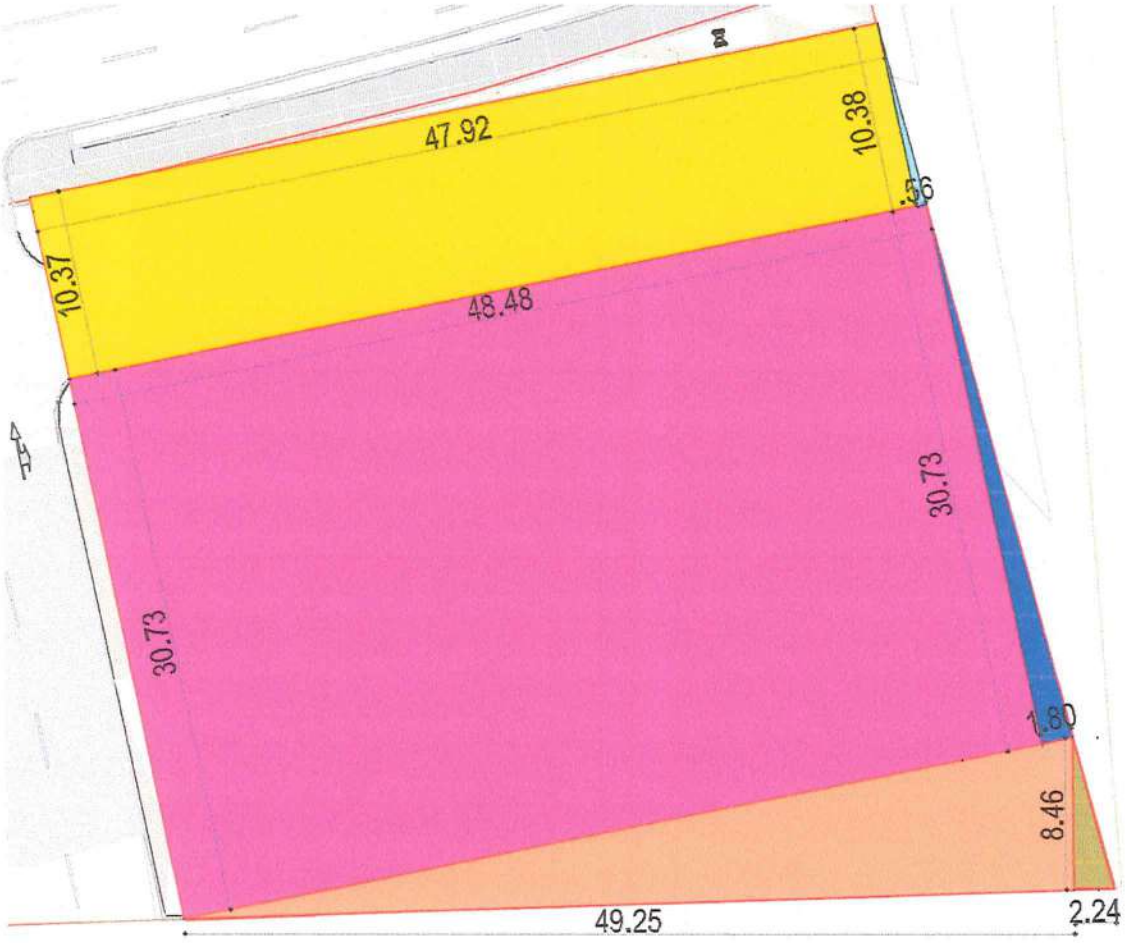

TRAMO 1 PARQUEADERO - CALLE 2

OBSERVACIONES:

ELABORO
DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

REVISO
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

APROBO
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	601	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	12238,02	CANT EJECUTADA	3.589,49	CANT ACUMULADA	3589,49

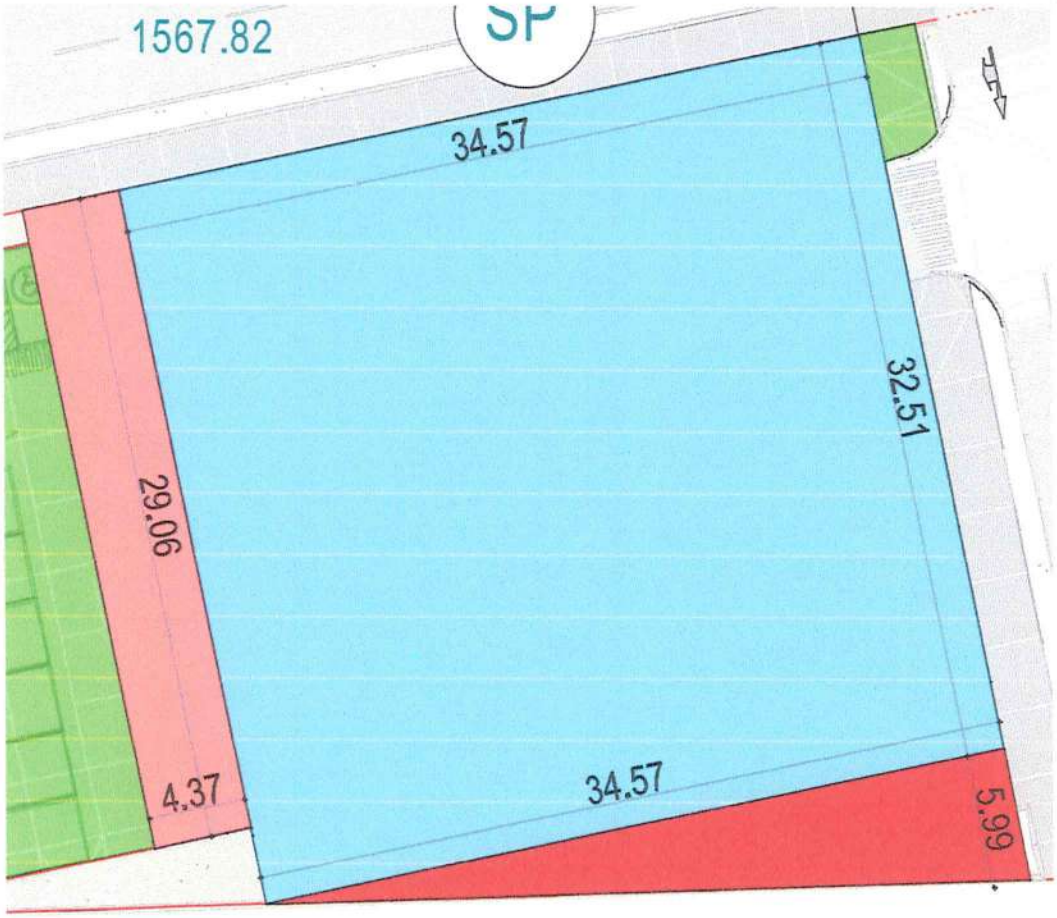

TRAMO 2 PARQUEADERO - CALLE 2

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

CALLE 2

Coordenadas DESCAPOTE CALLE 2		
Punto	Norte	Este
1	947079,872	1049108,352
2	947032,529	1049086,973
3	947085,614	1049016,921
4	947115,989	1049032,749
5	947096,457	1049070,231
6	947087,494	1049089,765
7	947079,872	1049108,352
AREA		3589,49m2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

ERANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS				
ITEM	619	UNIDAD	ML	CANT CONTRACTUAL	2275,27

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	330,00	CANT ACUMULADA	330,00



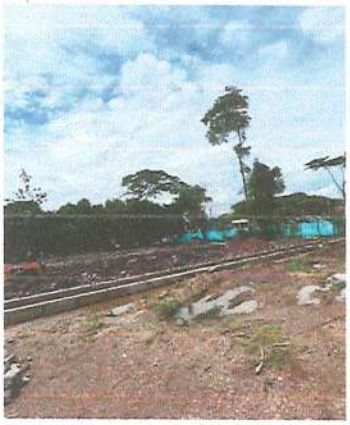



UBICACIÓN CALLE 2 - PARQUEADERO

DIMENSIONES				TOTAL
ALTO	LARGO	ANCHO	AREA	
	78,08			78,08
	20,56			20,56
	21,06			21,06
	30,06			30,06
	13,09			13,09
	1,60			1,60
	27,48			27,48
	81,07			81,07
	30,54			30,54
	26,46			26,46
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				330,00
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				330,00

OBSERVACIONES:

CALLE 2

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

1030


Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	619	UNIDAD	ML	CANT CONTRACTUAL	2275,27	CANT EJECUTADA	330,00	CANT ACUMULADA	330,00

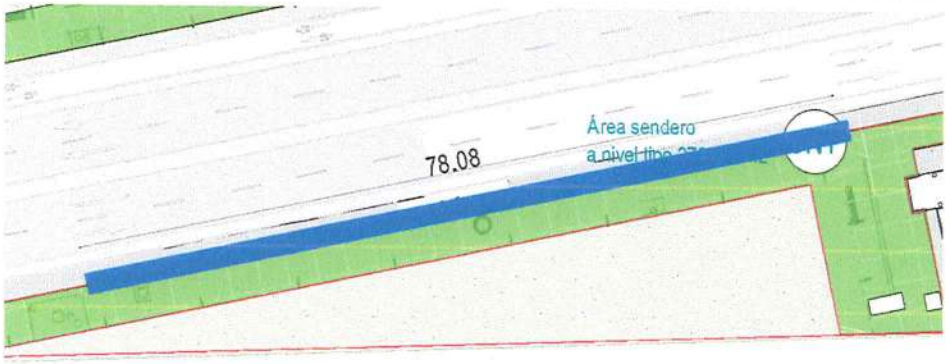

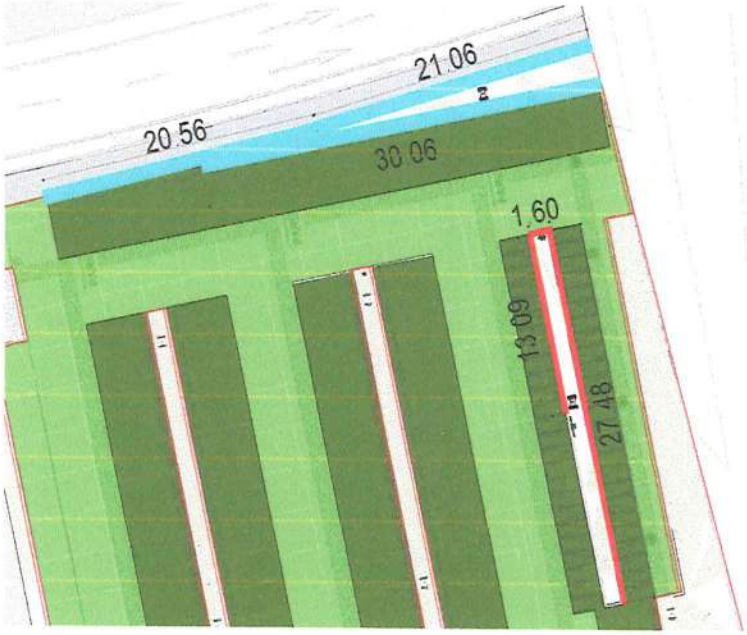

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10310


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	619	UNIDAD	ML	CANT CONTRACTUAL	2275,27	CANT EJECUTADA	330,00	CANT ACUMULADA	330,00

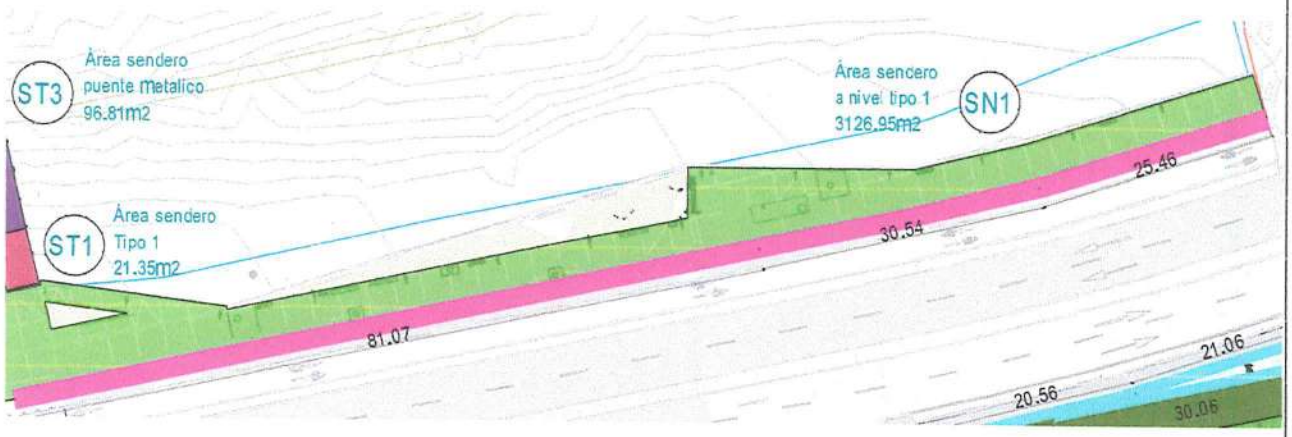

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CALLE 5

10312

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,inc retiro.5 kms				
ITEM	634	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	1582,87

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	1.381,45	CANT ACUMULADA	1.381,45





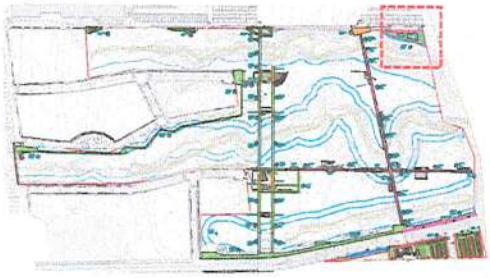



PLAZOLETA CALLE 5 -IGLESIA

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
	5,24	6,96	1,00	36,47
	6,96	1,84	1,00	12,81
	5,81	50,87	1,00	295,55
	50,87	13,45	1,00	684,20
	20,53	9,35	1,00	191,96
	9,35	2,47	1,00	23,09
	23,01	5,97	1,00	137,37
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				1381,45
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				1381,45

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	634	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	1582,87	CANT EJECUTADA	1.381,45	CANT ACUMULADA	1381,45

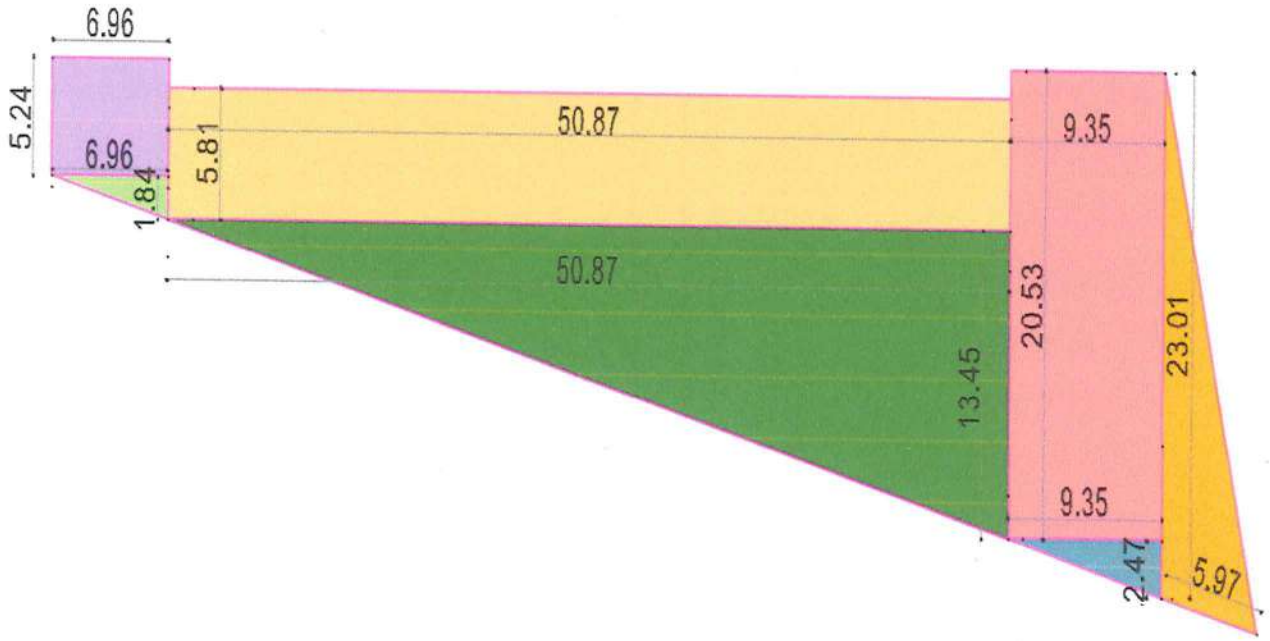

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	**INTERVENTORIA**	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

Coordenadas DESCAPOTE CALLE 5		
Punto	**Norte**	**Este**
1	947383,37	1049231,741
2	947407,952	1049243,805
3	947407,952	1049245,57
4	947447,223	1049204,984
5	947434,328	1049194,694
6	947383,37	1049231,741
AREA		1381.45m2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

FRANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano				
ITEM	639	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	2153,05

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	2.153,03	CANT ACUMULADA	2.153,03





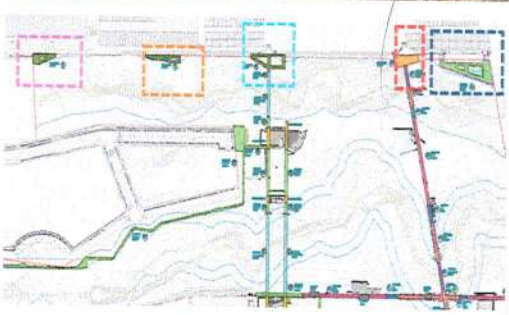

PLAZOLETA 1
PLAZOLETA 2
PLAZOLETA 3
PLAZOLETA 4
PLAZOLETA 5

CALLE 5

DIMENSIONES				
LARGO	ALTO	ANCHO	AREA	TOTAL
	PLAZOLETA 1 CALLE 5			
	5,24	6,96	36,47	36,47
	6,96	1,84	6,40	6,40
	5,81	50,87	295,55	295,55
	50,87	13,45	342,10	342,10
	20,53	9,35	191,96	191,96
	9,35	2,47	11,55	11,55
	23,01	5,97	68,68	68,68
	PLAZOLETA 2 CALLE 5			
	31,59	6,59	104,09	104,09
	6,82	31,59	107,72	107,72
	PLAZOLETA 3 CALLE 5			
	15,14	23,31	352,91	352,91
	4,52	22,14	100,07	100,07
	22,14	10,63	117,67	117,67
	PLAZOLETA 4 CALLE 5			
	1,85	47,97	88,74	88,74
	11,72	2,54	14,88	14,88
	2,54	0,01	22,80	22,80
	2,54	15,02	38,15	38,15
	15,02	3,00	22,53	22,53
	5,55	12,22	67,82	67,82
	PLAZOLETA 5 CALLE 5			
	2,64	30,73	81,13	81,13
	21,50	7,60	81,70	81,70

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	2153,03
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	2153,03

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	639	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	2153,05	CANT EJECUTADA	2.153,03	CANT ACUMULADA	2153,03

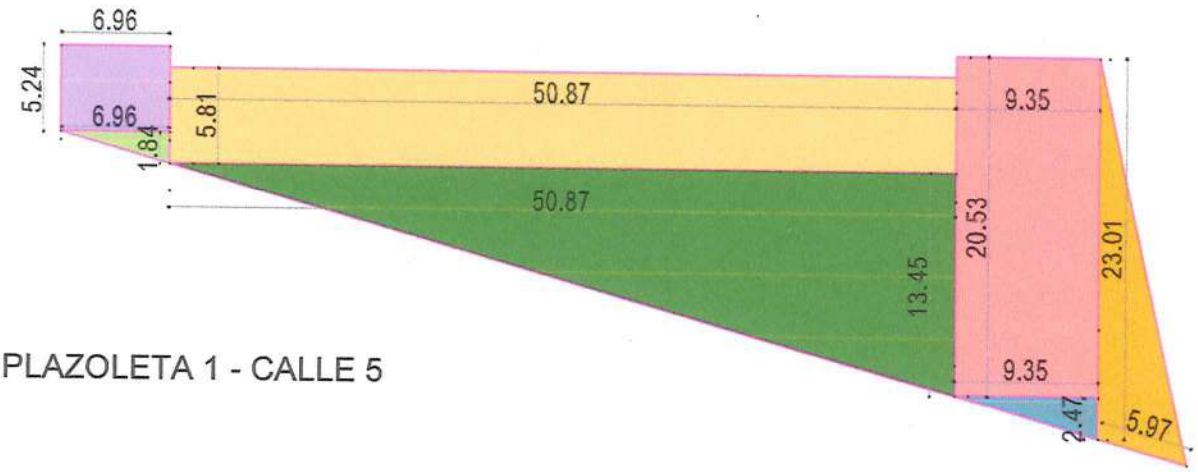

PLAZOLETA 1 - CALLE 5

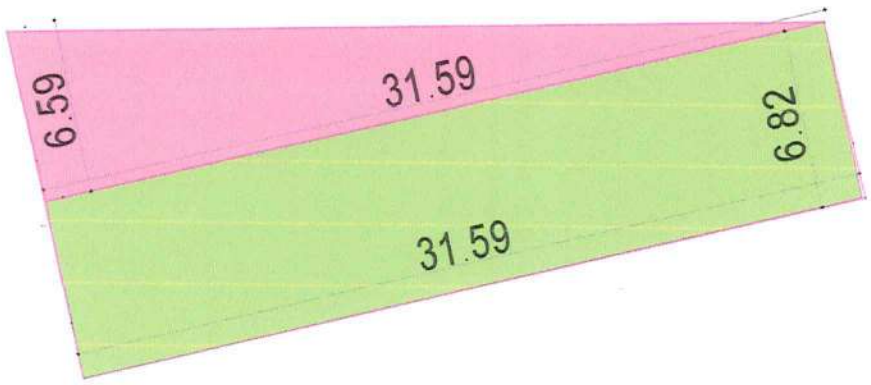

PLAZOLETA 2 - CALLE 5

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM 639	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	2153,05	CANT EJECUTADA	2.153,03	CANT ACUMULADA	2153,03

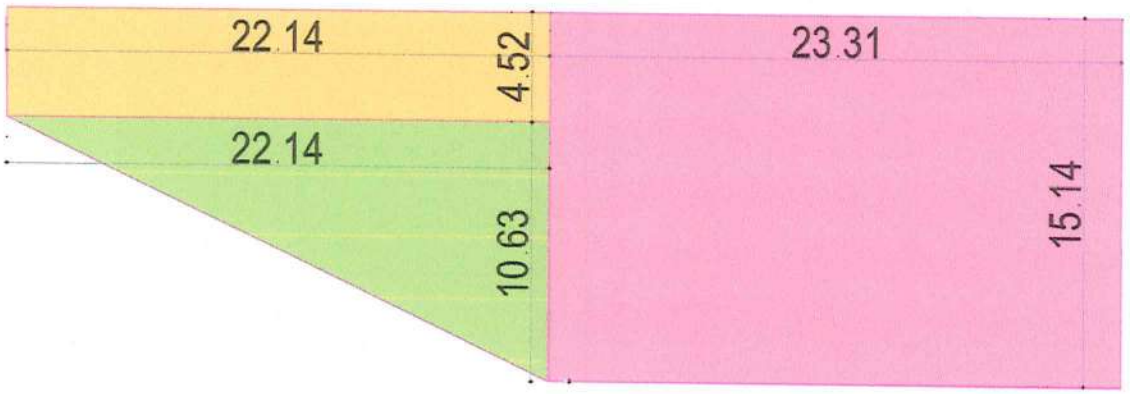

PLAZOLETA 3 - CALLE 5



PLAZOLETA 4 - CALLE 5

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	639	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	2153,05	CANT EJECUTADA	2.153,03	CANT ACUMULADA	2153,03

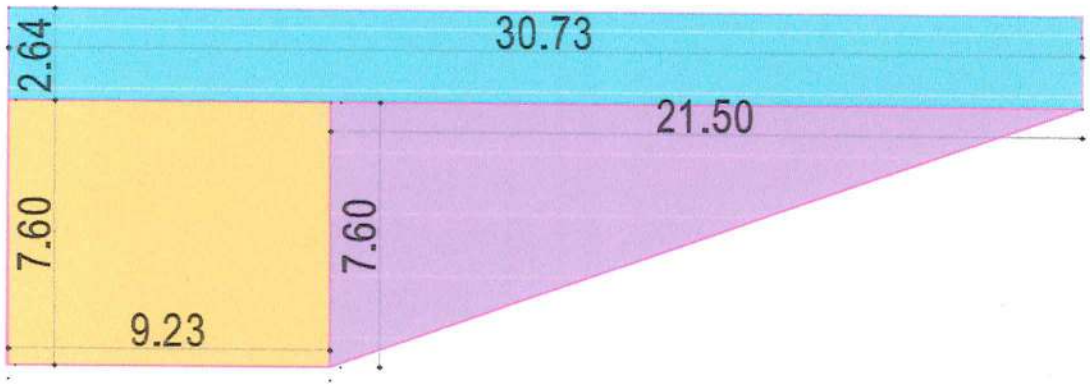

PLAZOLETA 5 - CALLE 5

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

Coordenadas LOCALIZACION Y REPLANTEO CALLE 5 (IMDER)		
Punto	Norte	Este
1	947582,806	1049035,314
2	947582,806	1048999,434
3	947607,814	1048996,59
4	947585,41	1049007,182
5	947570,69	1049025,663
AREA		589.022m2
Coordenadas LOCALIZACION Y REPLANTEO CALLE 5 (ROSA BLANCA)		
Punto	Norte	Este
1	947414,876	1049245,52
2	947454,824	1049195,46
3	947444,552	1049187,262
4	947383,37	1049231,741
5	947407,852	1049243,805
6	947414,739	1049245,57
AREA		1564.008m2
AREA TOTAL		2153.03m2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

FRANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

1032

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	647	UNIDAD	ML	CANT CONTRACTUAL	907,15	CANT EJECUTADA	320,00	CANT ACUMULADA	320,00









PLAZOLETA 1
PLAZOLETA 2

DIMENSIONES				TOTAL
ALTO	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	
	PLAZOLETA 1 CALLE 5			
	12,89		1,00	12,89
	9,03		1,00	9,03
	50,97		1,00	50,97
	9,32		1,00	9,32
	6,86		1,00	6,86
	27,11		1,00	27,11
	75,49		1,00	75,49
MATERA 1				
	2,02		1,00	2,02
	12,00		1,00	12,00
	6,16		1,00	6,16
	12,4		1,00	12,40
MATERA 2				
	6,43		1,00	6,43
	19,7		1,00	19,70
	11,76		1,00	11,76
	20,48		1,00	20,48
	PLAZOLETA 2 CALLE 5			
	20,69		1,00	20,69
	4,27		1,00	4,27
	12,42		1,00	12,42
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				320,00
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				320,00

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10322


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	647	UNIDAD	ML	CANT CONTRACTUAL	907,15	CANT EJECUTADA	320,00	CANT ACUMULADA	320,00

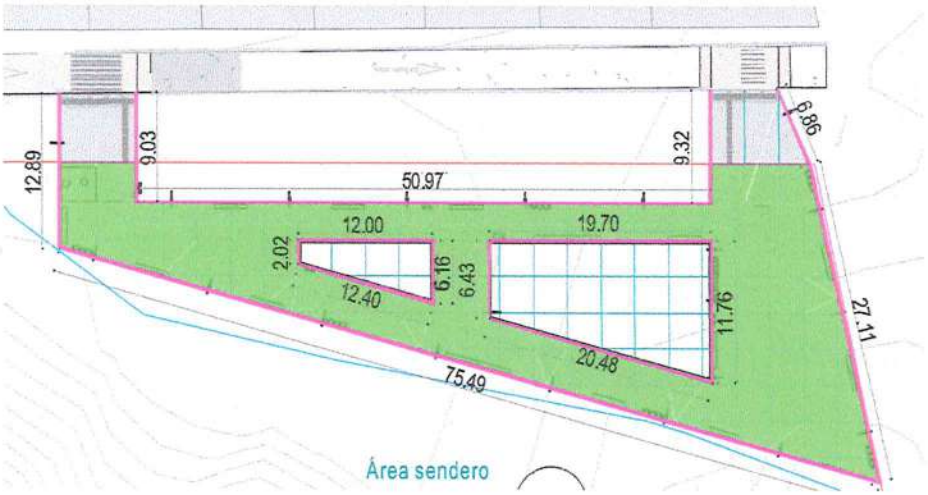

PLAZOLETA 1 - CALLE 5

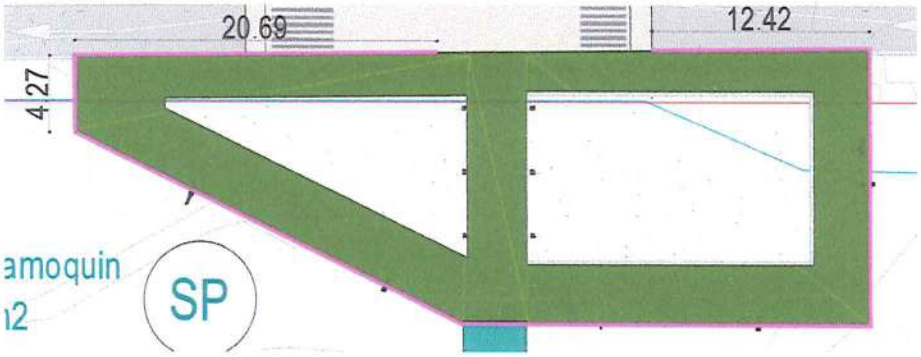

PLAZOLETA 2 - CALLE 5

OBSERVACIONES:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
DANIEL CASTRO GONZALEZ	RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PUENTE EN CONCRETO 1

10324

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	839	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	21,60	CANT EJECUTADA	21,60	CANT ACUMULADA	21,60





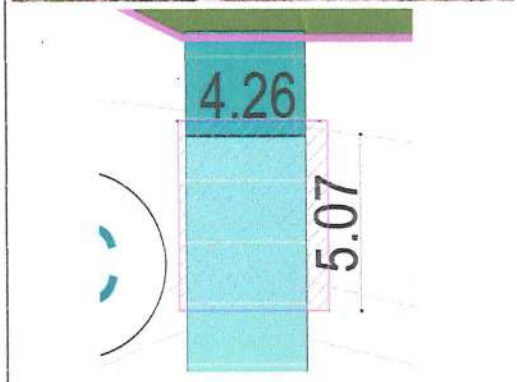

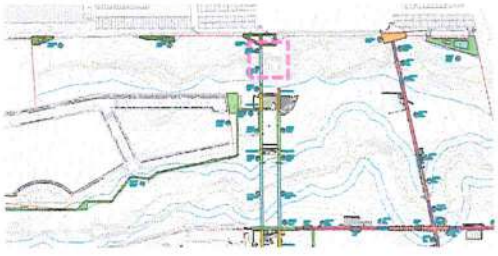

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
4,26		5,07		21,60
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				21,60
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				21,60

OBSERVACIONES:

ELABORO
DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

REVISO
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

APROBO
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	**INTERVENTORIA**	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

Coordenadas DESCAPOTE PUENTE EN CONCRETO 1		
Punto	**Norte**	**Este**
1	1049002,13	947579,091
2	1049005,93	947583,738
3	1049008,72	947581,46
4	1049004,92	947576,813
AREA		21,60 M2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

FRANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano				
ITEM	840	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	124,90

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	124,45	CANT ACUMULADA	124,45





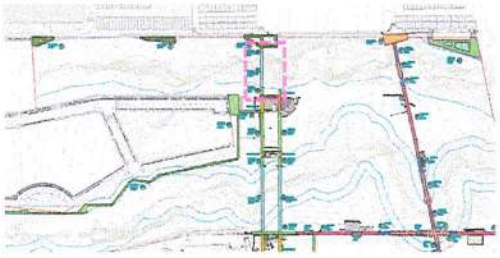

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
34,57		3,60		124,45

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	124,45
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	124,45

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	**INTERVEN**	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

Coordenadas LOCALIZACION Y REPLANTEO PUENTE EN CONCRETO 1		
Punto	**Norte**	**Este**
1	1048984,05	947556,965
2	1049005,93	947583,738
3	1049008,72	947581,46
4	1048986,83	947554,688
AREA		124,45 M2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

FRANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

10329

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"


ACTIVIDAD:	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km					CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022		INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	841	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	34,56	CANT EJECUTADA		28,00	CANT ACUMULADA	28,00





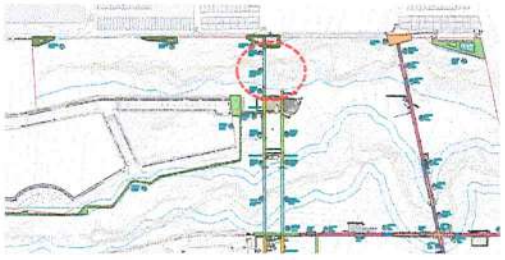





PUENTE EN CONCRETO 1 (SOBRE CAÑO ARMADILLO)

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
ZAPATAS PUENTE CONCRETO 1 (CAÑO ARMADILLO)				
4,00	2,50	2,80	1,00	28,00

CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:	28,00
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	28,00

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10330


Municipio de Villavicencio


Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	841	UNIDAD	M3	CANT CONTRACTUAL	34,56	CANT EJECUTADA	28,00	CANT ACUMULADA	28,00

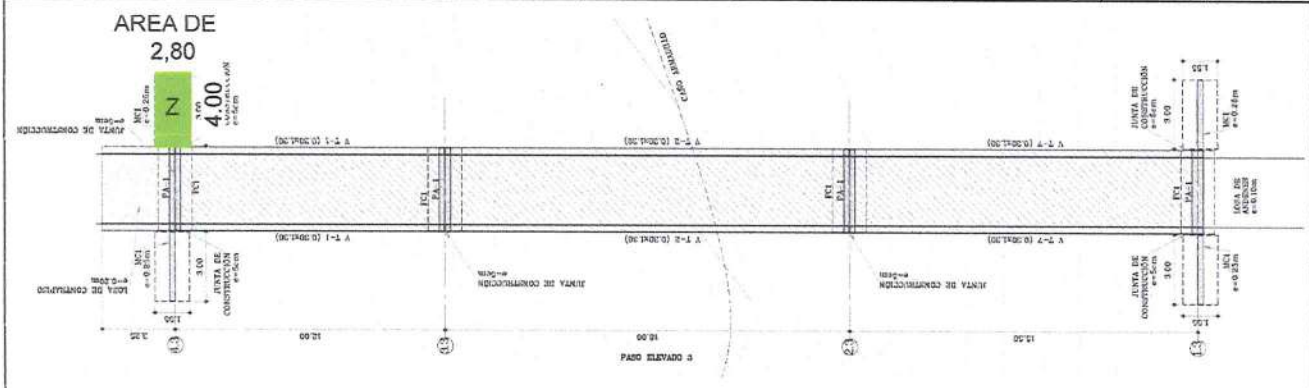

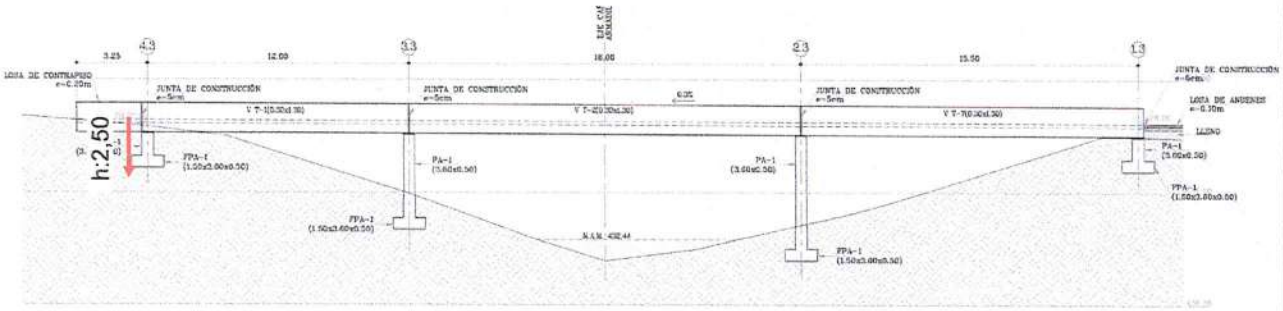

PUENTE CONCRETO 1 (CAÑO ARMADILLO)

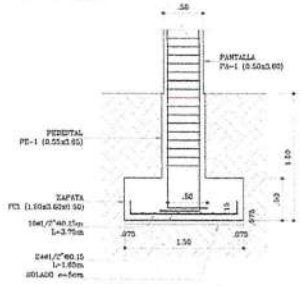

ESQUEMA GENERAL DE ZAPATAS
ESC. 1:25

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

PUENTE EN CONCRETO 2

10332

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO


CONTRATO N° 3950 DEL 2022


OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano			
ITEM	864	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	303,85

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
CANT EJECUTADA	303,06	CANT ACUMULADA	303,06



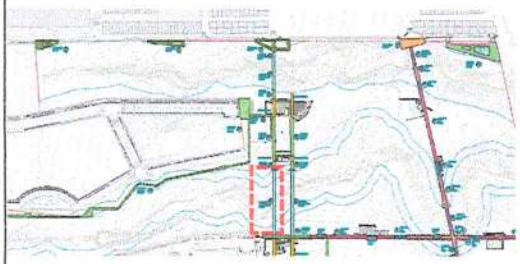



PUENTE EN CONCRETO 2 (SOBRE CAÑO ROSA BLANCA)

DIMENSIONES				TOTAL
LARGO	ALTO	ANCHO	CANTIDAD	
PUENTE CONCRETO 2 (CAÑO ROSABLANCA)				
80,99		3,742		303,06
CANTIDAD REPORTADA EN ESTA HOJA:				303,06
CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:				303,06

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10335


Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
MEMORIA DE CALCULO

CONTRATO N° 3950 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

ACTIVIDAD:		LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano				CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	INTERVENTORIA	Consorcio Interventoria Alma Viva
ITEM	864	UNIDAD	M2	CANT CONTRACTUAL	303,85	CANT EJECUTADA	303,06	CANT ACUMULADA	303,06

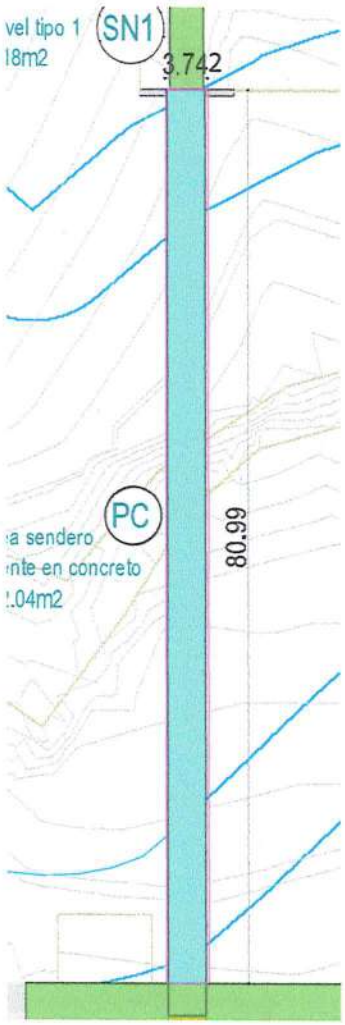

OBSERVACIONES:

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	**INTERVENTORIA**	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

Coordenadas LOCALIZACION Y REPLANTEO PUENTE EN CONCRETO 2		
Punto	**Norte**	**Este**
1	1048860,8	947406,188
2	1048914,08	947471,366
3	1048916,86	947469,088
4	1048863,59	947403,91
AREA		303,06 m2

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

FRANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

REGISTRO FOTOGRAFICO

10337

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 9 / 5 / 2023 D / M / A
TIPO CONTRATO OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER** INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		**INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA

CAPITULO 1: CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 9

DESCRIPCION: Se realiza solado de limpieza para el museo

CAPITULO 1: CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza



FOTOGRAFIA 2,

ITEM: 9

DESCRIPCION: Se realiza solado de limpieza para el museo

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10338

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		9	5	2023
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER**		
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**		
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA		

CAPITULO 2: CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 377



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 377

DESCRIPCION: Una vez realizado la excavacion de la zapata , se realiza el vaciado de la zapata del aprovechamiento economico 1.

CAPITULO 2: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 384



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 384

DESCRIPCION: Se realiza el armado de refuerzo para zapatas del aprovechamiento economico 1

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10539

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		9	5	2023
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER**		
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**		
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA		

CAPITULO 3: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 491



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 491

DESCRIPCION: Se realiza la excavacion manual de la cimentacion para la sala ambiental

CAPITULO 3: CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 492



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 492

DESCRIPCION: Una vez realizado la excavacion de la zapata , se realiza el vaciado de la zapata de la sala ambiental.

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10340

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		9	5	2023
		D	M	A
TIPO CONTRATO		**SECRETARIA LIDER**		
OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**		
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA		

CAPITULO 3: CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 493



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 493

DESCRIPCION: Una vez realizado la excavacion de la zapata , se realiza el vaciado de la zapata de la sala ambiental

CAPITULO 3: ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 496



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 496

DESCRIPCION: Se realiza el armado de refuerzo para zapatas de la sala ambiental

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 9 (D) 5 (M) 2023 (A)
TIPO CONTRATO OBRA PUBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER** INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		**INTERVENTOR** CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA

CAPITULO 4: DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 583



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 583

DESCRIPCION: Se realiza descapote de la zona de construccion del pabellon de mamiferos

CAPITULO 4: EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 20/04/2023
ITEM: 589



FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 20/04/2023
ITEM: 589

DESCRIPCION: Se realiza la excavacion de la cimentacion del pabellon de mamiferos

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10342

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		9	5	2023
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER**		
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**		
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA		

CAPITULO 4: CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 590



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 590

DESCRIPCION: Se realiza el solado de la cimentacion del pabellon de mamiferos

CAPITULO 5: DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 601



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 601

DESCRIPCION: Se realiza el descapote de calle 2

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JHIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME
		9 / 5 / 2023 (D / M / A)
TIPO CONTRATO		**SECRETARIA LIDER**
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**INTERVENTOR**
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA

CAPITULO 5: BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 619



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 619

DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de bordillo prefabricado de calle 2

CAPITULO 6: DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 634



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 634

DESCRIPCION: Se realiza el descapote de calle 5

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10344

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		9	5	2023
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER**		
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**		
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA		

CAPITULO 6: LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 639



FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 639

DESCRIPCION: Se realiza la localizacion y replanteo del terreno de la calle 5

CAPITULO 6: BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS



FOTOGRAFIA 1.

ITEM: 647



FOTOGRAFIA 2.

ITEM: 647

DESCRIPCION: Se realiza la instalacion de bordillo prefabricado de calle 5

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10345

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME D: 9 M: 5 A: 2023
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER**
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA

CAPITULO 15: DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 839



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 839

DESCRIPCION: Se realiza el descapote del puente en concreto 1

CAPITULO 15: LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 840

FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 840

DESCRIPCION: Se realiza la localizacion y replanteo del terreno del puente en concreto 1

(FIRMA)
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

(FIRMA)
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10346

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO No 3950 DE 2022	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		9	5	2023
		D	M	A
TIPO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META	**SECRETARIA LIDER**		
OBRA PUBLICA		INFRAESTRUCTURA		
CONTRATISTA		**INTERVENTOR**		
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA		

CAPITULO 15:EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 841



FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 841

DESCRIPCION: Se realiza la excavacion de la cimentacion del puente en concreto 1

CAPITULO 16: LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano



FOTOGRAFIA 1.
ITEM: 852

FOTOGRAFIA 2.
ITEM: 852

DESCRIPCION: Se realiza la localizacion y replanteo del terreno del puente en concreto 2

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PLANOS

10350

Municipio de Villavicencio

CARTERAS

CONTRATO N° 3920 DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

CONTRATISTA	Union Temporal Metropolitano 2022	**INTERVENTORIA**	Consorcio Interventoria Alma viva

CARTERAS

NUBES DE PUNTOS
1,947079.872,1049108.352,0,Pto
2,947032.529,1049086.973,0,Pto
3,947085.614,1049016.921,0,Pto
4,947115.989,1049032.749,0,Pto
5,947096.457,1049070.231,0,Pto
6,947087.494,1049089.765,0,Pto
7,947079.872,1049108.352,0,Pto
8,947383.37,1049231.741,0,Pto
9,947407.952,1049243.805,0,Pto
10,947414.739,1049245.57,0,Pto
11,947447.223,1049204.984,0,Pto
12,947434.328,1049194.694,0,Pto
13,947383.37,1049231.741,0,Pto
14,947582.806,1049035.314,0,Pto
15,947611.385,1048999.434,0,Pto
16,947607.814,1048996.59,0,Pto
17,947585.41,1049007.182,0,Pto
18,947570.69,1049025.663,0,Pto
19,947414.876,1049245.52,0,Pto
20,947454.824,1049195.46,0,Pto
21,947444.552,1049187.262,0,Pto
22,947383.37,1049231.741,0,Pto
23,947407.952,1049243.805,0,Pto
24,947414.739,1049245.57,0,Pto
25,947330.639,1049083.318,0,Pto
26,947336.207,1049086.048,0,Pto
27,947334.587,1049089.353,0,Pto
28,947329.019,1049086.623,0,Pto
29,947579.091,1049002.132,0,Pto
30,947583.738,1049005.931,0,Pto
31,947581.46,1049008.718,0,Pto
32,947576.813,1049004.919,0,Pto
33,947556.965,1048984.047,0,Pto
34,947583.738,1049005.931,0,Pto
35,947581.46,1049008.718,0,Pto
36,947554.688,1048986.833,0,Pto
37,947406.188,1048860.799,0,Pto
38,947471.366,1048914.076,0,Pto
39,947469.088,1048916.863,0,Pto
40,947403.91,1048863.586,0,Pto

OBSERVACIONES:

FERNANDO ACOSTA PARRA
TOPOGRAFO

FRANZ TOLOZA
TOPOGRAFO

República de Colombia

Nombre: FRANZ IRWIN TOLOZA PRADA

Cédula: 13.541.546

Licencia Profesional No.: **01-13219**

Resolución: 02-3220 - 24/06/2011

* Experiencia o fecha de grado: 13/12/2001

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFIA
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolucion motivada y el Certificado de Vigencia

la documentacion integra acredita al titular para ejercer la profesion de TOPOGRAFO en la Republica de Colombia de acuerdo a la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

*** La experiencia se contará a partir de la fecha de grado para los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.**

RUTH ELENA ACUÑA AGUDELO
PRESIDENTE (E)

ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

Para cualquier informacion comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografia.Email:info@cpnt.org.calle 33 No 7-27 Of 502 Tel 2881490

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

10353

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

LA INTERVENTORIA CERTIFICA:

Que la **UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022**, identificado con NIT **901.667.730-1** y representada legalmente por el **JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS**, en desarrollo y ejecución del contrato No **3950 de 2022**, cuyo objeto es **" CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META "**; cumplió a satisfacción con las obligaciones contractualmente adquiridas en favor del Municipio de Villavicencio acorde a lo pactado en el respectivo Contrato, haciendo procedente el **PAGO PARCIAL N°3.**

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones y recibí el informe por parte del contratista o interventoria, el cual se remitió en original a la Oficina de Contratación, para ser incorporado en el respectivo expediente contractual.

La presente certificación se expide para efectos del **PAGO PARCIAL N°3** por el valor de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($188.778.237,00) MCTE,** un valor a amortizar de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($56.633.471,10) MCTE**, valor neto a pagar: **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($132.144.765,90) MCTE,** el valor se debe afectar de la siguiente manera:

RP	CDP	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA / RUBRO	VALOR
8724 / 2022	5673	0401 – 2 3.40.02.1400.003 - 18	$ 188.778.237,00
		VALOR TOTAL A AFECTAR	$ 188.778.237,00

El pago se debe abonar a la cuenta corriente **No. 098469998151** del **BANCO DAVIVIENDA.**, oficina CENTRO COMERCIAL PRIMAVERA URBANA, Villavicencio, según certificación aportada.

Así mismo hago constar que se verificaron los pagos de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Salud, Pensión, ARL, realizados por el contratista por el periodo certificado, los cuales están ajustados a las normas legales vigentes. Fotocopia de los mismos acompañan el informe que se remitió a la Oficina de Contratación para archivar en el respectivo expediente contractual.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Villavicencio, a los _____.

R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventor

10554

Laura Vanegas
CONTADORA PUBLICA

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO

LAURA STHEPHANY VANEGAS MOLINA

CERTIFICA

Que el **UNION TEMPORAL METROPOLITANO** identificado con **NIT 901.667.730**, no es declarante de renta y complementarios toda vez que:

"Conforme al artículo 18 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 de la l ey 223 de 1995, los consorcios y uniones temporales no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes son los miembros del consorcio o de la unión temporal individualmente considerados, por lo que deben llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, según su participación en los ingresos, costos y deducciones del consorcio o unión temporal. No obstante, según el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del Estatuto tributario, los consorcios y las uniones temporales son responsables de IVA si en forma directa realizan actividades gravadas. Y, son agentes de retención en renta (artículo 368 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 115 de la Ley 488 de 1998)".
Se expide esta certificación a los 15 días del mes de abril de 2023.

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Villavicencio, a los 13 días del mes de julio del año 2023, para el cobro de la parcial 3.

Cordialmente,

LAURA VANEGAS MOLINA
CONTADORA PUBLICA TP 219821-T
DIRECCION: CONDOMINIO CIUDAD REAL
TELEFONO: 3112105612

Anexo copia Cedula de Ciudadania, tarjeta profesional JCC y Antecedentes JCC
3 folios

10555

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

219821-T



LAURA STHEPHANY
VANEGAS MOLINA
C.C. 1121885491
RES. INSCRIPCION 975 DEL 19/09/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

300712 235943

COBRO ACTA PARCIAL 2
CONSORCIO
METROPOLITANO

Identificación Plástica S.A.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

10356

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.885.491
VANEGAS MOLINA
APELLIDOS
LAURA STHEPHANY
NOMBRES



COBRO ACTA PARCIAL 3
CONSORCIO
METROPOLITANO



FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1992
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-FEB-2010 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-5200100-00232700-F-1121885491-20100408 0021947564A 1 34317379

10557

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 9 8 1 4 1 1 9 0 7 8 C 8 8 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LAURA STHEPHANY VANEGAS MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121885491 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 219821-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

METROPOLITANO 2022

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

NUMERO DE CONTRATO:		3850 del 2022	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	10 DE ABRIL 2023	A	9 DE MAYO 2023
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022				
SUPERVISOR:		CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA				

NOMBRE	Cargo y/o oficio	CEDULA	# PLANILLA	VALOR MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	INDEPENDIENTE	DEPENDIENTE	SALUD		PENSIÓN		ARL		I.C.B.F.	SENA	caja de compensación
								EPS	VALOR	PENSION	VALOR	# PLANILLA	VALOR			
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	9.975.479	9452255232	$ 3.200.000,00	30		X	SANITAS	$ 128.000,00	PORVENIR	$ 512.000,00	9452255232	$ 222.600,00			$ 128.000,00
DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA 1	88.059.178	9451256820	$ 4.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 160.000,00	PORVENIR	$ 640.000,000	9451256820	$ 278.400,000			$ 160.000,000
PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA 2	1.121.844.983	9452059330	$ 3.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 120.000	PORVENIR	$ 480.000,000	9452059330	$ 208.800,000			$120.000,000
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	ING ESTRUCTURAL	9.975.479	9452255232	$ 3.200.000,00	30		X	SANITAS	$ 128.000,00	PORVENIR	$ 512.000,00	9452255232	$ 222.600,00			$ 128.000,00
HECTOR HERRERA TORRES	ING HIDRAULICO	79.655.133	9449930505	$ 2.028.183,00	30	X		SANITAS	$ 253.600,00	PROTECCION	$ 324.600,00	9452062273	$ 80.600,00			
MARIA DEL PILAR AREVALO	ING AMBIENTAL	1.020.713.069	9434612448	$ 1.200.000,00	30	X		SANITAS	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9452062273	$ 83.600,00			$ 7.200,00
CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	ING ELECTRICO	1.053.769.421	9449795450	$ 1.160.000,00	30	X		SANITAS	$ 145.000,00	COLPENSIONES	$ 185.600,00	9452062273	$ 80.600,00			
RICARDO ERNESTO VENEGAS	BIOLOGO	11.445.115	9450124391	$ 1.200.000,00	30	X		COMPENSAR	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9452062273	$ 80.600,00			
SANDRA MARCELA IREGUI	HS 1	38.140.095	9452062273	$ 1.160.000,00	30	X		SANITAS	$ 145.000,00	COLPENSIONES	$ 185.600,00	9452062273	$ 80.600,00			$ 7.000,00
BETSY ANDREA HERRO GUZMAN	HS2	40.325.117	9451256820	$ 2.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 80.000,00	PROTECCION	$ 320.000,00	9451256820	$ 139.200,00			$ 80.000,00
DANIELA ALEJANDRA CASTILLO	ING COSTOS Y PRESUPUESTOS	1.122.139.669	9452062273	$ 1.200.000,00	30	X		NUEVA EPS	$ 150.000,00	PROTECCION	$ 192.000,00	9452062273	$ 83.600,00			$ 7.200,00
MARIA ALEJANDRA ORTIZ	GESTOR SOCIAL	11.221.382.664	9452059330	$ 1.160.000,00	30		X	NUEVA EPS	$ 46.400,00	PORVENIR	$ 185.600,00	9452059330	$ 80.600,00			$ 46.400,00
CAMILO ANDRES CABALLERO	GERENTE DE PROYECTOS	80.056.634	6734179	$ 1.280.000,00	30	X		SANITAS	$ 160.000,00	PORVENIR	$ 204.800,00	9452062273	$ 80.600,00			
DIEGO ALEJANDRO GOMEZ FORERO	AUX INGENIERIA 1	1.121.895.654	9452059330	$ 2.000.000,00	30		X	SANITAS	$ 80.000,00	PROTECCION	$ 320.000,00	9452059330	$ 139.200,00			$ 80.000,00
DANIELA LILIANA CRISTANCHO	AUX INGENIERIA 2	1.121.957.570	9451256820	$ 1.500.000,00	30		X	SANITAS	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9451256820	$ 104.400,00			$ 60.000,00
LEIDY PAMELA GALINDO DIAZ	AUX CONTABLE	1.121.916.871	9452059330	$ 1.500.000,00	30		X	SANITAS	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9452059330	$ 104.400,00			$ 60.000,00
CAMILO PLATA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1.053.787.253	65402885	$ 1.160.000,00	30	X		FAMISANAR	$ 145.000,00	PORVENIR	$ 185.600,00	9452062273	$ 80.600,00			$ 7.000,00
LAURA VALERIA CASTILLO	AUX ADMINISTRATIVO	1.006.777.017	9452059330	$ 1.500.000,00	30		X	NUEVA EPS	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9452059330	$ 104.400,00			$ 60.000,00
JANCEL DUBIEL PINTO ACOSTA	AUX BIOLOGO	1.121.905.878	9451256820	$ 1.400.000,00	30		X	CAPITAL SALUD	$ 56.000,00	PORVENIR	$ 224.000,00	9451256820	$ 97.500,00			$ 56.000,00
LIDERMAN CRUZ PALACIOS	OPERADOR 1	17.331.221	9451256820	$ 1.600.000,00	30		X	SANITAS	$ 64.000,00	PROTECCION	$ 256.000,00	9451256820	$ 111.400,00			$ 64.000,00
YILBER JOSE ROMERO LOPEZ	OPERADOR 2	1.125.662	9451256820	$ 1.020.000,00	17		X	SALUD TOTAL	$ 40.800,00	PORVENIR	$ 163.200,00	9451256820	$ 71.000,00			$ 40.800,00
HECTOR JAIME JARA PARRADO	ALMACENISTA	88.049.565	9451256820	$ 1.500.000,00	30		X	COMPENSAR	$ 60.000,00	PORVENIR	$ 240.000,00	9451256820	$ 104.400,00			$ 60.000,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

Firma
JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
CONTRATISTA

Firma
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

10359

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DIRECTOR DE OBRA	PARQUE ALMA VIVA	VILLAVICENCIO-META	6741209	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-05	2136103790	9452255232	N	2023/05/09	2023/06/14	BANCO DAVIVIENDA	36	$64,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	9975479	GONZALEZ RICARDO	230301	30	($3,000,000)	($480,000)	EPS005	30	($3,000,000)	($120,000)	CCF34	30	($3,000,000)	($120,000)	14-4	30	($3,000,000)	($208,800)	30	$0	$0
2	CC	9975479	GONZALEZ RICARDO	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000	$14,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$1,400	$0	$33,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$32,000	$1,400	$0	$33,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,000	$600	$0	$14,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$14,000	$600	$0	$14,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$400	$0	$8,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$8,000	$400	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$400	$0	$8,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$8,000	$400	$0	$8,400
TOTAL				1	$62,000	$2,800	$0	$64,800

2023/06/14 12:04 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.102.81.197
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9452255232
Valor:	64,800
Período de pago:	2023-04
No Transacción (CUS):	2136103790
Fecha:	2023/06/14
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2023 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2073083327	9449930505	I	2023/05/09	2023/05/10	BANCOLOMBIA	1	$628,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183		$49,500		$0	$0		$627,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**		**$49,500**		**$0**	**$0**		**$627,700**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																					**$2,028,183**	**$324,600**			**$2,028,183**	**$253,600**			**$0**	**$0**			**$2,028,183**		**$49,500**		**$0**	**$0**		**$627,700**
1	CC	79865133	HERRERA HECTOR																	23020 1	30	$2,028,183	$324,600	EPS005	30	$2,028,183	$253,600		0	$0	$0	14-11	30	$2,028,183	2.4363	$49,500	0	$0	$0	No	$627,700
Total		**Afiliados(1)**																			$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183		$49,500		$0	$0		$627,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2073083327	9449930505	I	2023/05/09	2023/05/10	BANCOLOMBIA	1	$628,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$324,600	$400	$0	$325,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$324,600	$400	$0	$325,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,500	$100	$0	$49,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$49,500	$100	$0	$49,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,600	$400	$0	$254,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$253,600	$400	$0	$254,000
TOTAL				1	$627,700	$900	$0	$628,600

10362

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1020715089		AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra37-33a22	VILLAVICENCIO-META	6622731	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-04	9434812448	9434812448	I	2022/05/20	2022/05/13	BANCO BOGOTA	0	$391,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1020715089	AREVALO MARIA	230201	30	$1,263,840	$202,300	EPS005	30	$1,263,840	$158,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,263,840	$30,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,263,840	$202,300			$1,263,840	$158,000			$0	$0			$1,263,840	$30,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$202,300	$0	$0	$202,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$202,300	$0	$0	$202,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,800	$0	$0	$30,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,800	$0	$0	$30,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,000	$0	$0	$158,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$158,000	$0	$0	$158,000
TOTAL				1	$391,100	$0	$0	$391,100

2023/06/10 12:12 PM

1039

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-04	2073083327	9449930505	I	2023/05/09	2023/05/10	BANCOLOMBIA	1	$628,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingre tde tae tdp tap vsp cer vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183		$49,500		$0	$0		$627,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183		$49,500		$0	$0		$627,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)							$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183		$49,500		$0	$0		$627,700
1	CC 79865133	HERRERA HECTOR			230201	30	$2,028,183	$324,600	EPS005	30	$2,028,183	$253,600		0	$0	$0	14-11	30	$2,028,183	2.436%	$49,500	0	$0	$0	No	$627,700
Total Afiliados(1)							$2,028,183	$324,600			$2,028,183	$253,600			$0	$0			$2,028,183		$49,500		$0	$0		$627,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-04	2073083327	9449930505	I	2023/05/09	2023/05/10	BANCOLOMBIA	1	$628,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$324,600	$400	$0	$325,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$324,600	$400	$0	$325,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,500	$100	$0	$49,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$49,500	$100	$0	$49,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,600	$400	$0	$254,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$253,600	$400	$0	$254,000
TOTAL				1	$627,700	$900	$0	$628,600

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86056834	CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	CLL 5 25 25	6741210	ing.camilocaballero@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	28/04/2023	67341979	$453.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	204.800	0	0	0	0	0	0		204.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	89.100				89.100	0	0	89.100			691	89.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	160.000	160.000
Pensión	1	204.800	204.800
Riesgos Laborales	1	89.100	89.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	453.900	453.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

10365

compensar | miplanilla.com

PLANI[illegible] INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIO[illegible]E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86056834	CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	CLL 5 25 25	6741210	ing.camilocaballero@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	I	28/04/2023	67341979	$453,600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Comercio	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86056834	CABALLERO BALCAZAR CAMILO ANDRES	57	0			N																	230301	1.280.000	204.800	0	0	0	0	EPS005	1.280.000	160.000	14-11	1.280.000	5	89.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

10367

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053769421		GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 #1-191. Cs 15 Mz 1	VILLAVICENCIO-META	2222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2104513947	9449795450	I	2023/05/05	2023/05/29	BANCO DAVIVIENDA	24	$369,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$5,300	$0	$190,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$5,300	$0	$190,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$900	$0	$29,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$900	$0	$29,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$4,200	$0	$149,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$4,200	$0	$149,200
TOTAL				1	$358,900	$10,400	$0	$369,300

2023/05/29 09:46 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 28B 68 63 P2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2124860760	9450124391	I	2023/05/05	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	33	$362,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300
1	CC	11446115	VENEGAS RICARDO																	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	0.5223	$6,300	0	$0	$0	No	$348,300
Total Afiliados(1)																						$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000		$6,300		$0	$0		$348,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 28B 68 63 P2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2124860760	9450124391	I	2023/05/05	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	33	$362,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$7,500	$0	$199,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$7,500	$0	$199,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,300	$300	$0	$6,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,300	$300	$0	$6,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,000	$5,900	$0	$155,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$150,000	$5,900	$0	$155,900
TOTAL				1	$348,300	$13,700	$0	$362,000

10360

Fecha Actual: 2023/06/07 | **Hora:** 09:27 | **IP:** 181.52.216.90

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **PRIAR PROYECTOS INGENIERI**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **900485933**
Generado por: **natalia echeverri**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	244136
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9450124391
Factura	9450124391
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$362,000.00
Fecha Transacción	2023/06/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6758
No. Producto	*****6758

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-05-07, 11:53:29 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1053992664

Periodo Cotización 202304 **Periodo Servicio** 202304

Cliente:

PAGADA 2023-05-07 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANZ IRWIN TOLOZA PRADA				
Documento	CC 13541546	**Dirección**	CR 33 #34 - 46 SAN FERNANDO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208932711		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 13541546		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00					TOLOZA PRADA FRANZ IRWIN	50001000 - 50		META

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0				$ 1.160.000	230301		16 %	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.160.000	$ 80.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-05	2023-06	2128662212	9452155993	E	2023/06/08	2023/06/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$12,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: EL PARQUE (1 Afiliados)						$38,667	$6,200			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667	$2,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PARQUE (1 Afiliados)						**$38,667**	**$6,200**			**$38,667**	**$1,600**			**$38,667**	**$1,600**			**$38,667**	**$2,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$38,667	$6,200			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667	$2,700		$0	$0
1	CC	3274632	ALFEREZ PEDRO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$38,667**	**$6,200**			**$38,667**	**$1,600**			**$38,667**	**$1,600**			**$38,667**	**$2,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2128662212	9452155993	E	2023/06/08	2023/06/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$12,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,200	$100	$0	$6,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$6,200	$100	$0	$6,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,700	$100	$0	$2,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$2,700	$100	$0	$2,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$100	$0	$1,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$1,600	$100	$0	$1,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,600	$100	$0	$1,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$1,600	$100	$0	$1,700
TOTAL				1	$12,100	$400	$0	$12,500

10373

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2128662212

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452155993

Fecha
09/06/2023

Número de aprobación
00662212

Dirección IP
181.52.216.90

Valor transacción
$ 12.500,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.52.216.90	NIT	901667730

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2124873838	9452062273	Y	2023/05/09	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	29	$1,691,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (15 Afiliados)																								$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$12,476,002	$93,000			$12,476,002		$869,200		$0	$0		$1,634,800
Centro de Trabajo: PARQUE (15 Afiliados)																								**$2,360,000**	**$377,600**			**$2,360,000**	**$295,000**			**$12,476,002**	**$93,000**			**$12,476,002**		**$869,200**		**$0**	**$0**		**$1,634,800**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)																								**$2,360,000**	**$377,600**			**$2,360,000**	**$295,000**			**$12,476,002**	**$93,000**			**$12,476,002**		**$869,200**		**$0**	**$0**		**$1,634,800**
1	CC	1032417027	ALDANA ANDREY																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
2	CC	1020715089	AREVALO MARIA																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$90,800
3	CC	86056834	CABALLERO CAMILO																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
4	CC	1122138669	CASTILLO DANIELA																			23020 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$150,000	CCF34	30	$1,200,000	$7,200	14-4	30	$1,200,000	6.960%	$83,600	30	$0	$0	No	$432,800
5	CC	9975479	GONZALEZ RICARDO		X																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	1	$100,000	$2,000	14-4	1	$100,000	6.960%	$7,000	1	$0	$0	No	$9,000
6	CC	1053769421	GUTIERREZ CRISTIAN																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
7	CC	1121865338	HERNANDEZ ROSA		X																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	1	$38,667	$300	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	No	$3,000
8	CC	79865133	HERRERA HECTOR																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
9	CC	9200413	HORMECHEA GUSTAVO	X	X																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	2	$77,334	$500	14-4	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	No	$5,900
10	CC	38140096	IREGUI SANDRA																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$418,400
11	CC	1121953408	MURILLO JULIAN	X																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	10	$386,667	$2,400	14-4	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	No	$29,400
12	CC	1066174358	PATERNINA MARCOS																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
13	CC	1053767253	PLATA CAMILO																				0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
14	CC	1121931402	SEPULVEDA OSCAR	X																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	5	$193,334	$1,200	14-4	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	No	$14,700
15	CC	11446115	VENEGAS RICARDO	X																			0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
Total			**Afiliados(15)**																					$2,360,000	$377,600			$2,360,000	$295,000			$12,476,002	$93,000			$12,476,002		$869,200		$0	$0		$1,634,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2124873838	9452062273	Y	2023/05/09	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	29	$1,691,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$377,600	$13,000	$0	$390,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$6,400	$0	$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$192,000	$6,600	$0	$198,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$869,200	$29,800	$0	$899,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	15	$869,200	$29,800	$0	$899,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$93,000	$3,200	$0	$96,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	$93,000	$3,200	$0	$96,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$295,000	$10,200	$0	$305,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$5,200	$0	$155,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$5,000	$0	$150,000
TOTAL				15	$1,634,800	$56,200	$0	$1,691,000

1037

Fecha Actual: 2023/06/07 | **Hora:** 09:31 | **IP:** 181.52.216.90

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **PRIAR PROYECTOS INGENIERI**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **900485933**
Generado por: **natalia echeverri**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	246450
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452062273
Factura	9452062273
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,691,000.00
Fecha Transacción	2023/06/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6758
No. Producto	*****6758

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORA.. METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2124818319	9452059330	E	2023/05/09	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	29	$3,094,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (7 Afiliados)																								$9,662,667	$1,546,100			$9,662,667	$386,600			$9,662,667	$386,600			$9,662,667	$672,700		$0	$0		$2,992,000
Centro de Trabajo: MAESTRO HECTOR GUEVARA (2 Afiliados)																								$502,667	$80,500			$502,667	$20,200			$502,667	$20,200			$502,667	$35,100		$0	$0		$156,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																								$502,667	$80,500			$502,667	$20,200			$502,667	$20,200			$502,667	$35,100		$0	$0		$156,000
1	CC	7435559	CARMONA JOSE	X																		230301	4	$154,667	$24,800	ESSC07	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,667	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
2	CC	1124243284	HOYOS JHON	X																		230301	9	$348,000	$55,700	EPSC34	9	$348,000	$14,000	CCF34	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	6.960%	$24,300	9	$0	$0	SI	$108,000
Centro de Trabajo: PARQUE (5 Afiliados)																								$9,160,000	$1,465,600			$9,160,000	$366,400			$9,160,000	$366,400			$9,160,000	$637,600		$0	$0		$2,836,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																								$9,160,000	$1,465,600			$9,160,000	$366,400			$9,160,000	$366,400			$9,160,000	$637,600		$0	$0		$2,836,000
3	CC	1006777017	CASTILLO LAURA																			230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
4	CC	1121E44983	CASTRO PAOLA																			230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
5	CC	1121916871	GALINDO LEIDY																			230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
6	CC	1121965854	GOMEZ DIEGO																			230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
7	CC	1122138264	ORTIZ MARIA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total			**Afiliados(7)**																					$9,662,667	$1,546,100			$9,662,667	$386,600			$9,662,667	$386,600			$9,662,667	$672,700		$0	$0		$2,992,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORA . METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2124838319	9452059330	E	2023/05/29	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	29	$3,094,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,546,100	$53,000	$0	$1,599,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,226,100	$42,000	$0	$1,268,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$11,000	$0	$331,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$672,700	$23,100	$0	$695,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$672,700	$23,100	$0	$695,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$386,600	$13,300	$0	$399,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	7	$386,600	$13,300	$0	$399,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$386,600	$13,500	$0	$400,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$14,000	$500	$0	$14,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$6,200	$300	$0	$6,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$106,400	$3,700	$0	$110,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$260,000	$9,000	$0	$269,000
TOTAL				7	$2,992,000	$102,900	$0	$3,094,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

10379

Fecha Actual: 2023/06/07 | **Hora:** 09:17 | **IP:** 181.52.216.90

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**PRIAR PROYECTOS INGENIERI**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**900485933**
Generado por:	**natalia echeverri**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	239674
Empresa:	APORTES EN LINEA - Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452059330
Factura	9452059330
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$3,094,900.00
Fecha Transacción	2023/06/07
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6758
No. Producto	*****6758

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORA. METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2128640902	9452155893	E	2023/06/28	2023/06/09	BANCO DAVIVIENDA	1	$5,002,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (28 Afiliados)																							$16,124,006	$2,580,400			$16,124,006	$645,900			$16,124,006	$645,900			$16,124,006		$1,123,300				$0	$0		$4,995,500
Centro de Trabajo: COMISION TOPOGRAFICA (1 Afiliados)																							$734,667	$117,600			$734,667	$29,400			$734,667	$29,400			$734,667		$51,200				$0	$0		$227,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$734,667	$117,600			$734,667	$29,400			$734,667	$29,400			$734,667		$51,200				$0	$0		$227,600
1	CC	1121943873	CANDIA YEISON	X																	23030 1	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF34	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
Centro de Trabajo: MAESTRO FELIX (1 Afiliados)																							$38,667	$6,200			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667		$2,700				$0	$0		$12,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$38,667	$6,200			$38,667	$1,600			$38,667	$1,600			$38,667		$2,700				$0	$0		$12,100
2	CC	17346728	GORDILLO ALVARO	X																	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
Centro de Trabajo: MAESTRO HECTOR GUEVARA (13 Afiliados)																							$11,058,668	$1,769,600			$11,058,668	$442,600			$11,058,668	$442,600			$11,058,668		$770,400				$0	$0		$3,425,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																							$11,058,668	$1,769,600			$11,058,668	$442,600			$11,058,668	$442,600			$11,058,668		$770,400				$0	$0		$3,425,200
3	CC	1121921917	ALVARADO ERIC																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1003746412	BAJATIVA MICHAEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	7435559	CARMONA JOSE																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	CC	1121833049	GUEVARA HECTOR																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
7	CC	86071670	HOYOS ALVARO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1124243284	HOYOS JHON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	1242432841	HOYOS JHON																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	1051286997	LEON JESUS																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1122922510	LUENGAS CARLOS	X	X																23030 1	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
12	CC	86066918	ROJAS RAFAEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1121890738	URREGO BRAYAN	X	X																23030 1	1	$38,667	$6,200	EPSC34	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
14	CC	1120562693	VELEZ ANDRES	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
15	CC	1120558658	VELEZ WILLIAM	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS005	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
Centro de Trabajo: MAESTRO IVAN (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800				$0	$0		$359,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800				$0	$0		$359,200
16	CC	86061083	SASTOQUE IVAN		X																23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Centro de Trabajo: MAESTRO JOSE LOPEZ (2 Afiliados)																							$77,334	$12,400			$77,334	$3,200			$77,334	$3,200			$77,334		$5,400				$0	$0		$24,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$77,334	$12,400			$77,334	$3,200			$77,334	$3,200			$77,334		$5,400				$0	$0		$24,200
17	CC	86045164	AGUDELO HUMBERTO	X																	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
18	CC	98326188	LOPEZ JOSE	X																	23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-4	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100

| | | |

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2128640902

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452155893

Fecha
09/06/2023

Número de aprobación
00640902

Dirección IP
181.52.216.90

Valor transacción
$ 5.002.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.52.216.90	NIT	901667730

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORA_ METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2100234933	9451256820	E	2023/05/09	2023/05/26	BANCO DAVIVIENDA	17	$12,501,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (60 Afiliados)																							$39,088,685	$6,255,400			$40,248,685	$1,611,800			$40,248,685	$1,611,200			$40,248,685		$2,773,900		$0	$0		$12,253,900
Centro de Trabajo: ING. DANIEL LONDOÑO (11 Afiliados)																							$2,902,671	$465,200			$2,902,671	$116,700			$2,902,671	$116,700			$2,902,671		$202,600		$0	$0		$901,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)																							$2,902,671	$465,200			$2,902,671	$116,700			$2,902,671	$116,700			$2,902,671		$202,600		$0	$0		$901,200
1	CC	1030678222	BASTIVA ELKIN	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
2	CC	74355559	BELTRAN EDUAR	X																	23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS008	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,657	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
3	CC	1122649129	CORTES DANIEL	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS041	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
4	CC	1121940888	CORTES DAVINSON	X																	23020 1	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
5	CC	1121834237	GUZMAN JOSE	X	X																23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
6	CC	1121948811	HURTADO JEFERSON	X																	23030 1	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	SI	$132,000
7	CC	75094586	LONDOÑO DANIEL	X																	23020 1	7	$466,667	$74,700	EPS010	7	$466,667	$18,700	CCF34	7	$466,667	$18,700	14-4	7	$466,657	6.960%	$32,900	7	$0	$0	SI	$144,600
8	CC	9835170	LONDOÑO OMAR	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS010	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
9	CC	86081283	MOYA DAYRO	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
10	CC	79721839	RODRIGUEZ JOSE	X																	23020 1	7	$270,667	$43,400	EPS008	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
11	CC	1121878674	TORREJANO CRISTHIAN	X	X																23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF34	4	$154,667	$6,200	14-4	4	$154,657	6.960%	$10,800	4	$0	$0	SI	$48,000
Centro de Trabajo: MAESTRO FERNANDO (13 Afiliados)																							$9,280,003	$1,485,400			$9,280,003	$371,600			$9,280,003	$371,600			$9,280,003		$646,600		$0	$0		$2,875,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (13 Afiliados)																							$9,280,003	$1,485,400			$9,280,003	$371,600			$9,280,003	$371,600			$9,280,003		$646,600		$0	$0		$2,875,200
12	CC	1125476543	AGUIRRE YORMAN																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
13	CC	1121947785	ALVAREZ BRAYAN	X																	23030 1	17	$657,334	$105,200	EPS017	17	$657,334	$26,300	CCF34	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	6.960%	$45,800	17	$0	$0	SI	$203,600
14	CC	1121907667	BARRETO JHON	X																	23030 1	10	$386,667	$61,900	EPSC34	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,657	6.960%	$27,000	10	$0	$0	SI	$119,900
15	CC	1006737219	CANO ANDRES	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPSC34	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
16	CC	1121924041	HERNANDEZ OSCAR	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS005	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	SI	$323,400
17	CC	6844763	HERRERA RAUL	X																	23030 1	14	$541,334	$86,700	EPS017	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	6.960%	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
18	CC	1193092903	LEAL JAIDER																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC	1121883650	MEDINA WILSON	X																	23030 1	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,657	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
20	CC	86059130	MORENO JIMMY	X	X																23020 1	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$193,334	$7,800	14-4	5	$193,334	6.960%	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
21	CC	19773921	PEREZ MANUEL	X																	23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS017	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	SI	$323,400
22	CC	1010057582	SERRANO DIEGO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
23	CC	93129456	SERRANO FERNANDO																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
24	CC	17267260	TORRES EDITH	X																	23030 1	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF34	6	$232,000	$9,300	14-4	6	$232,000	6.960%	$16,200	6	$0	$0	SI	$72,000

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORA. METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2100234933	9451256820	E	2023/05/09	2023/05/26	BANCO DAVIVIENDA	17	$12,501,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				59	$6,256,400	$126,300	$0	$6,382,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$68,100	$1,400	$0	$69,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$4,287,500	$86,500	$0	$4,374,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$1,900,800	$38,400	$0	$1,939,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$2,773,900	$56,000	$0	$2,829,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	60	$2,773,900	$56,000	$0	$2,829,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$1,611,800	$32,500	$0	$1,644,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	60	$1,611,800	$32,500	$0	$1,644,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				60	$1,611,800	$33,000	$0	$1,644,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$26,300	$600	$0	$26,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	$245,000	$5,000	$0	$250,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$27,100	$600	$0	$27,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$51,300	$1,100	$0	$52,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$300,600	$6,100	$0	$306,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$150,800	$3,100	$0	$153,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$69,800	$1,500	$0	$71,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$265,400	$5,400	$0	$270,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$475,500	$9,600	$0	$485,100
TOTAL				60	$12,253,900	$247,800	$0	$12,501,700

FACTURA

1038

METROPOLITANO 2022

Factura Electrónica de Venta FE - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764044795951 de 21/02/2023 - 21/02/2024 autoriza FE-1 a FE-500

UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 NIT 901667730
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/07/2023 04:03
Fecha de Vencimiento	13/07/2023 04:03
Fecha de Validación	13/07/2023 04:05
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022
NIT	901667730
Obligación	NO APLICA
Email	CONSORCIOMETROPOLITANO2022@GMAIL.COM
Teléfono	6086741209
Dirección	CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 825
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT	892099324
Obligación	IVA
Email	DIRCONTABILIDAD.VILLAVICENCIO@GMAIL.COM
Teléfono	6713228
Dirección	CL 40 33 64
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OBRA	ACTA PARCIAL No 3 DEL CONTRATO DE OBRA No 3950-2022 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	1	EA	$188.778.237,00		$188.778.237,00	$188.778.237,00

1

Subtotal	$188.778.237,00
Total a Pagar	$188.778.237,00

El periodo a cobrar que comprende del 10 de abril al 9 de mayo 2023
Porcentaje de consorciados Priar 98 % Arquiciviles 1% innovar 1%
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 67543c7828c3ed8a607f7a3377982c64b6691daac41634507995979c754f1fa2ab3a2edea6b9a42cd1c860f33638b23b
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

10584
5

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764044795951

(415)7707212489984(8020) 001876404479595 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901667730	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 2 2

24. Dirección
CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 825

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-02-21 / 07:24:04 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GOMEZ MOLANO JOAQUIN EDUARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 80086876 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

997. Fecha formalización 2023-02-21 19:24:04

1039
6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764044795951

(415)7707212489984(8020) 001876404479595 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901667730	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 CL 15 40 01 LOBBY 2 OF 825	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO
