
PROYECTO AVENIDA 68 TRAMO 1 - SECTOR 2 - DEL K2+095 A K3+880

Id	EDT	Nombre de la Actividad	Plazo
1	**1**	**PROYECTO AVENIDA 68 TRAMO 1 - SECTOR 2 - DEL K2+095 A K3+880**	**56 MESES**
2	***1.1***	***ACTA DE INICIO***	***HITO***
3	**1.2**	**ETAPA PRELIMINARES**	**9 MESES**
4	**1.3**	**ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**	**46 MESES**
5	*1.3.1*	*INICIO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 - SECTOR 2*	*Hito*
6	**1.3.2**	**VIAS, REDES Y ESPACIO PÚBLICO**	**46 meses**
7	1.3.2.1	*INICIO VIAS REDES Y ESPACIO PÚBLICO*	*Hito*
8	**1.3.2.2**	**Sector 1**	**17 meses**
9	**1.3.2.2.1**	**VIAS**	**9½ meses**
10	1.3.2.2.1.1	Corredor BRT	4½ meses
11	1.3.2.2.1.2	Carril Mixto	5 meses
12	1.3.2.2.1.3	Señalización y Demarcación	2 meses
13	1.3.2.2.2	REDES	6½ meses
14	1.3.2.2.3	ESPACIO PUBLICO	8 meses
15	1.3.2.2.4	CICLORRUTA	5½ meses
16	**1.3.2.3**	**Sector 2**	**17 meses**
17	**1.3.2.3.1**	**VIAS**	**10 meses**
18	1.3.2.3.1.1	Corredor BRT	4½ meses
19	1.3.2.3.1.2	Carril Mixto	5 meses
20	1.3.2.3.1.3	Señalización y Demarcación	2 meses
21	1.3.2.3.2	REDES	6½ meses
22	1.3.2.3.3	ESPACIO PUBLICO	8 meses
23	1.3.2.3.4	CICLORRUTA	5½ meses
24	**1.3.2.4**	**Sector 3**	**16 meses**
25	**1.3.2.4.1**	**VIAS**	**10 meses**
26	1.3.2.4.1.1	Corredor BRT	4½ meses
27	1.3.2.4.1.2	Carril Mixto	5 meses
28	1.3.2.4.1.3	Señalización y Demarcación	2 meses
29	1.3.2.4.2	REDES	6½ meses
30	1.3.2.4.3	ESPACIO PUBLICO	7½ meses
31	1.3.2.4.4	CICLORRUTA	5½ meses
32	*1.3.2.5*	*FIN VIAS REDES Y ESP. PÚBLICO*	*Hito*
33	**1.3.3**	**INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (Son dos)**	**36 ½ meses**
34	*1.3.3.1*	*INICIO INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (dos)*	*Hito*
35	1.3.3.2	DEMOLICIÓN PUENTE EXISTENTE	5½ meses
36	1.3.3.3	CIMENTACIÓN	18 meses
37	1.3.3.4	INFRAESTRUCTURA	14 meses
38	1.3.3.5	SUPERESTRUCTURA	25 meses
39	1.3.3.6	ACABADOS	6 meses
40	*1.3.3.7*	*FIN INTERSECCIÓN ELEVADA - CALLE 3 (dos)*	*Hito*
41	**1.3.4**	**BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 1 RÍO FUCHA (SON DOS) CALZADA 1**	**9½ meses**
42	*1.3.4.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 1 RÍO FUCHA (SON DOS) CALZADA 1*	*Hito*
43	1.3.4.2	DEMOLICIÓN CANAL Y ESTRUCTURA EXISTENTE	1½ meses
44	1.3.4.3	CIMENTACIÓN	5½ meses
45	1.3.4.4	INFRAESTRUCTURA	3½ meses
46	1.3.4.5	SUPERESTRUCTURA	2 meses
47	1.3.4.6	ACABADOS	1 mes
48	1.3.4.7	ESPACIO PUBLICO	2 meses
49	*1.3.4.8*	*FIN CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 1 RÍO FUCHA (SON DOS) CALZADA 1*	*Hito*
50	**1.3.5**	**BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 1 RÍO FUCHA (SON DOS) CALZADA 2**	**10 meses**
51	*1.3.5.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 1 RÍO FUCHA (SON DOS) CALZADA 2*	*Hito*
52	1.3.5.2	CIMENTACIÓN	5½ meses
53	1.3.5.3	INFRAESTRUCTURA	3½ meses
54	1.3.5.4	SUPERESTRUCTURA	2½ meses
55	1.3.5.5	ACABADOS	1 mes
56	1.3.5.6	ESPACIO PUBLICO	2 meses
57	*1.3.5.7*	*FIN CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 1 RÍO FUCHA (SON DOS) CALZADA 2*	*Hito*
58	**1.3.6**	**BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 3 (CANAL DE LOS COMUNEROS) - (SON 2) CALZADA 1**	**9½ meses**
59	*1.3.6.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 3 (CANAL DE LOS COMUNEROS) - (SON 2) CALZADA 1*	*Hito*
60	1.3.6.2	DEMOLICIÓN CANAL Y ESTRUCTURA EXISTENTE	1½ meses
61	1.3.6.3	CIMENTACIÓN	5½ meses
62	1.3.6.4	INFRAESTRUCTURA	3½ meses
63	1.3.6.5	SUPERESTRUCTURA	2 meses
64	1.3.6.6	ACABADOS	1 mes
65	1.3.6.7	ESPACIO PUBLICO	2 meses
66	*1.3.6.8*	*FIN CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 3 (CANAL DE LOS COMUNEROS) - (SON 2) CALZADA 1*	*Hito*
67	**1.3.7**	**BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 3 (CANAL DE LOS COMUNEROS) - (SON 2) CALZADA 2**	**10 meses**
68	*1.3.7.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 3 (CANAL DE LOS COMUNEROS) - (SON 2) CALZADA 2*	*Hito*
69	1.3.7.2	CIMENTACIÓN	5½ meses
70	1.3.7.3	INFRAESTRUCTURA	3½ meses
71	1.3.7.4	SUPERESTRUCTURA	2½ meses
72	1.3.7.5	ACABADOS	1 mes
73	1.3.7.6	ESPACIO PUBLICO	2 meses
74	*1.3.7.7*	*FIN CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT VEHICULAR CALLE 3 (CANAL DE LOS COMUNEROS) - (SON 2) CALZADA 2*	*Hito*
75	**1.3.8**	**ESTACIÓN TRANSMILENIO 4 - CALLE 18 SUR (Incluye Cicloparqueadero)**	**9 meses**
76	*1.3.8.1*	*INICIO ESTACIÓN TRANSMILENIO 4 - CALLE 18 SUR*	*Hito*
77	1.3.8.2	CIMENTACIÓN	1½ meses
78	1.3.8.3	ESTRUCTURA	5½ meses
79	1.3.8.4	ACABADOS	3 meses
80	1.3.8.5	REDES SECAS	2½ meses
81	1.3.8.6	TAQUILLAS	1 mes
82	1.3.8.7	CICLOPARQUEADERO - CALLE 18 SUR	2 meses
83	*1.3.8.8*	*FIN ESTACIÓN TRANSMILENIO 4 - CALLE 18 SUR*	*Hito*
84	**1.3.9**	**ESTACIÓN TRANSMILENIO 5 - CALLE 8 SUR (Incluye Cicloparqueadero)**	**9 meses**
85	*1.3.9.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSMILENIO 5 - CALLE 08 SUR*	*Hito*
86	1.3.9.2	CIMENTACIÓN	1½ meses
87	1.3.9.3	ESTRUCTURA	5½ meses
88	1.3.9.4	ACABADOS	3 meses
89	1.3.9.5	REDES SECAS	2½ meses
90	1.3.9.6	TAQUILLAS	1 mes
91	1.3.9.7	CICLOPARQUEADERO - CALLE 8 SUR	2 meses
92	*1.3.9.8*	*FIN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSMILENIO 5 - CALLE 08 SUR*	*Hito*
93	**1.3.10**	**ESTACIÓN TRANSMILENIO 6 - AMÉRICAS (Incluye Cicloparqueadero)**	**9½ meses**
94	*1.3.10.1*	*INICIO CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSMILENIO 6 - AMÉRICAS*	*Hito*
95	1.3.10.2	CIMENTACIÓN	1 mes
96	1.3.10.3	ESTRUCTURA	6½ meses
97	1.3.10.4	ACABADOS	3½ meses
98	1.3.10.5	REDES SECAS	2½ meses
99	1.3.10.6	TAQUILLAS	1 mes
100	1.3.10.7	CICLOPARQUEADERO - AV.AMERICAS	2 meses
101	*1.3.10.8*	*FIN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN TRANSMILENIO 6 - AMÉRICAS*	*Hito*
102	**1.3.11**	**PUENTE PEATONAL - AMERICAS COSTADO SUR**	**9½ meses**
103	*1.3.11.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - AMERICAS COSTADO SUR*	*Hito*
104	1.3.11.2	CIMENTACIÓN	1 mes
105	1.3.11.3	ESTRUCTURA	6½ meses
106	1.3.11.4	ACABADOS	2 meses
107	1.3.11.5	REDES SECAS	3 meses
108	*1.3.11.6*	*FIN PUENTE PEATONAL - AMERICAS COSTADO SUR*	*Hito*
109	**1.3.12**	**PUENTE PEATONAL - CALLE 18 SUR COSTADO SUR COSTADO NORTE**	**10 meses**
110	*1.3.12.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - CALLE 18 SUR COSTADO SUR COSTADO NORTE*	*Hito*
111	1.3.12.2	CIMENTACIÓN	2 meses
112	1.3.12.3	ESTRUCTURA	6 meses
113	1.3.12.4	ACABADOS	3 meses
114	1.3.12.5	REDES SECAS	3 meses
115	*1.3.12.6*	*FIN PUENTE PEATONAL - CALLE 18 SUR COSTADO SUR COSTADO NORTE*	*Hito*
116	**1.3.13**	**PUENTE PEATONAL - CALLE 1 SUR COSTADO NORTE FUCHA CICLOPUENTE**	**10 meses**
117	*1.3.13.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - CALLE 1 SUR COSTADO NORTE FUCHA CICLOPUENTE*	*Hito*
118	1.3.13.2	DEMOLICIÓN PTE. PEATONAL (Incluye desmonte estructura metálica)	1 mes
119	1.3.13.3	CIMENTACIÓN	2 meses
120	1.3.13.4	ESTRUCTURA	6 meses
121	1.3.13.5	ACABADOS	3 meses
122	1.3.13.6	REDES SECAS	3 meses
123	*1.3.13.7*	*FIN PUENTE PEATONAL - CALLE 1 SUR COSTADO NORTE FUCHA CICLOPUENTE*	*Hito*
124	**1.3.14**	**PUENTE PEATONAL - CALLE 3 COMUNEROS**	**10 meses**
125	*1.3.14.1*	*INICIO PUENTE PEATONAL - CALLE 11 NICOLAS ESGUERRA*	*Hito*
126	1.3.14.2	CIMENTACIÓN	2 meses
127	1.3.14.3	ESTRUCTURA	6 meses
128	1.3.14.4	ACABADOS	3 meses
129	1.3.14.5	REDES SECAS	3 meses
130	*1.3.14.6*	*FIN PUENTE PEATONAL - CALLE 11 NICOLAS ESGUERRA*	*Hito*
131	*1.3.15*	*FIN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN T1-S2*	*Hito*
132	**1.4**	**ETAPA DE ENTREGA**	**2 MESES**
133	***1.5***	***FIN TRAMO 1-SECTOR 2***	***HITO***

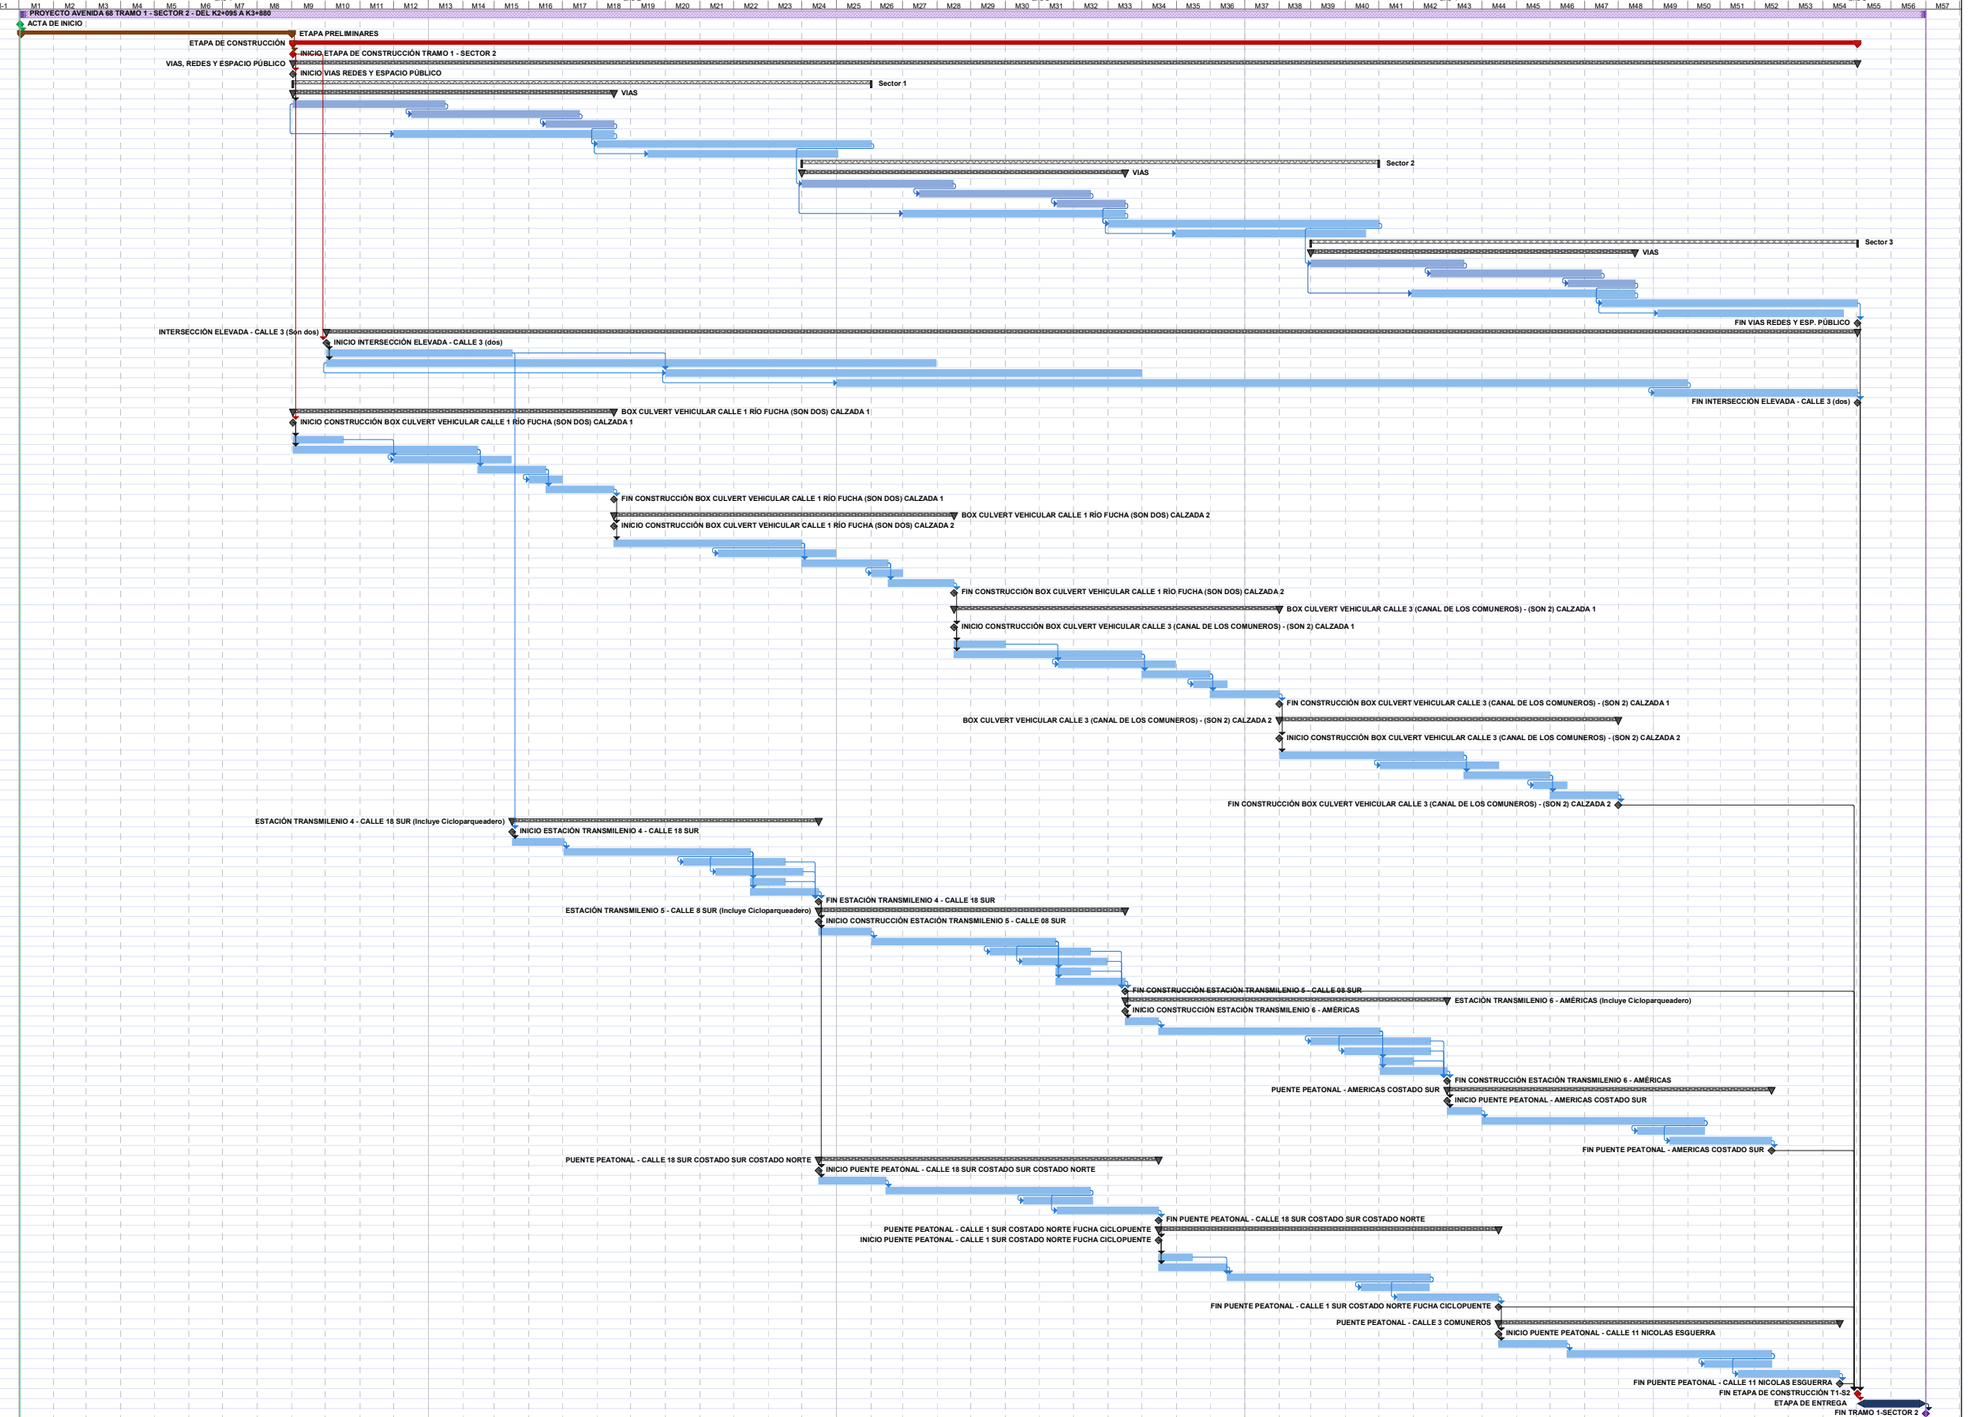

Proyecto: Cronograma Av.68 - Sector 2 (2019-12)
Plazo: 56 MESES

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
