Martes 27 Junio

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 Oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am - 12pm.

Una UCZ. Finalizada instalado el Cielo Raso en PVC Se Procede a Realizar la demolicion de placa y excavaciones para la instalacion de tuberia de 6" y Cajas de inspeccion, para Conducir las Aguas lluvias hasta el Colector principal.

Hora 2pm - 5pm.
Clima: Soleado

Se Continúa Realizando las actividades Programadas del día Con normalidad.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA.

Miércoles 28 de JUNIO - 2023
Se Suspende el Contrato desde el 28 Junio, hasta el 27 Julio 2023.

INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA

Jueves 27 Julio -2023.

Clima: Soleado
equipo: Herramienta Menor
personal: Ingeniero, 1 Maestro de Obra, 1 oficial, 2 ayudantes.

Hora:
7am- 12 pm

Se Continúa Realizando las excavaciones para la instalacion de tubería de 6" en pvc para Conducir las aguas lluvias, hacia el Colector final


Hora 2pm - 5pm

Clima: Soleado

Se Continúa Realizando las actividades programadas del dia.

INSPECTOR/A

CONTRATISTA DE OBRA

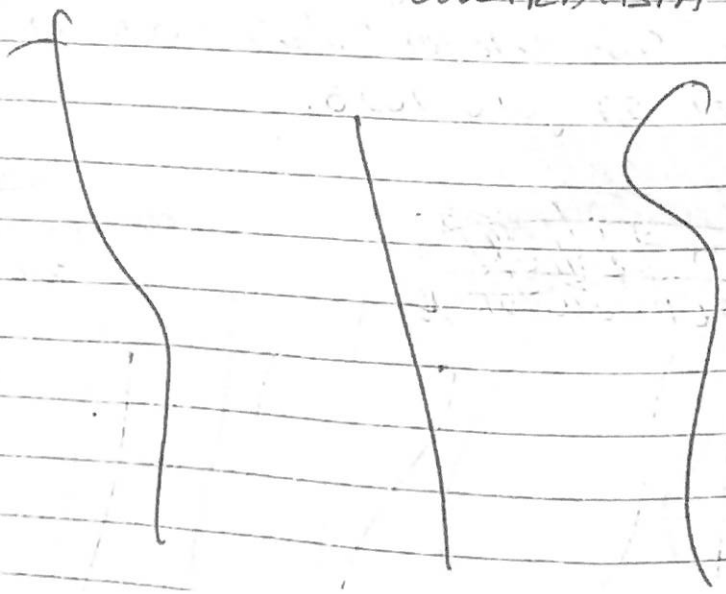

Viernes 28 de Julio - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 2 Ayudades, 1 oficial:

Hora 7am - 12pm
Se comienza el dia realizando las regatas en las paredes existentes, donde va pasar la tubena conduit para los tomacorrientes e interruptores contemplados dentro del proyecto.

Hora: 2pm - 5pm
Clima: Soleado
Se continua con lo programado del dia con normalidad

Interventoria

Contratista de obra

Sabado 29 de julio - 2023


Clima: Nublado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 Ayu

Hora: 7am - 2pm

Se comienza a colocar la tubería dentro de las regatas anteriormente hechas,

Interventoría

Contratista de obra

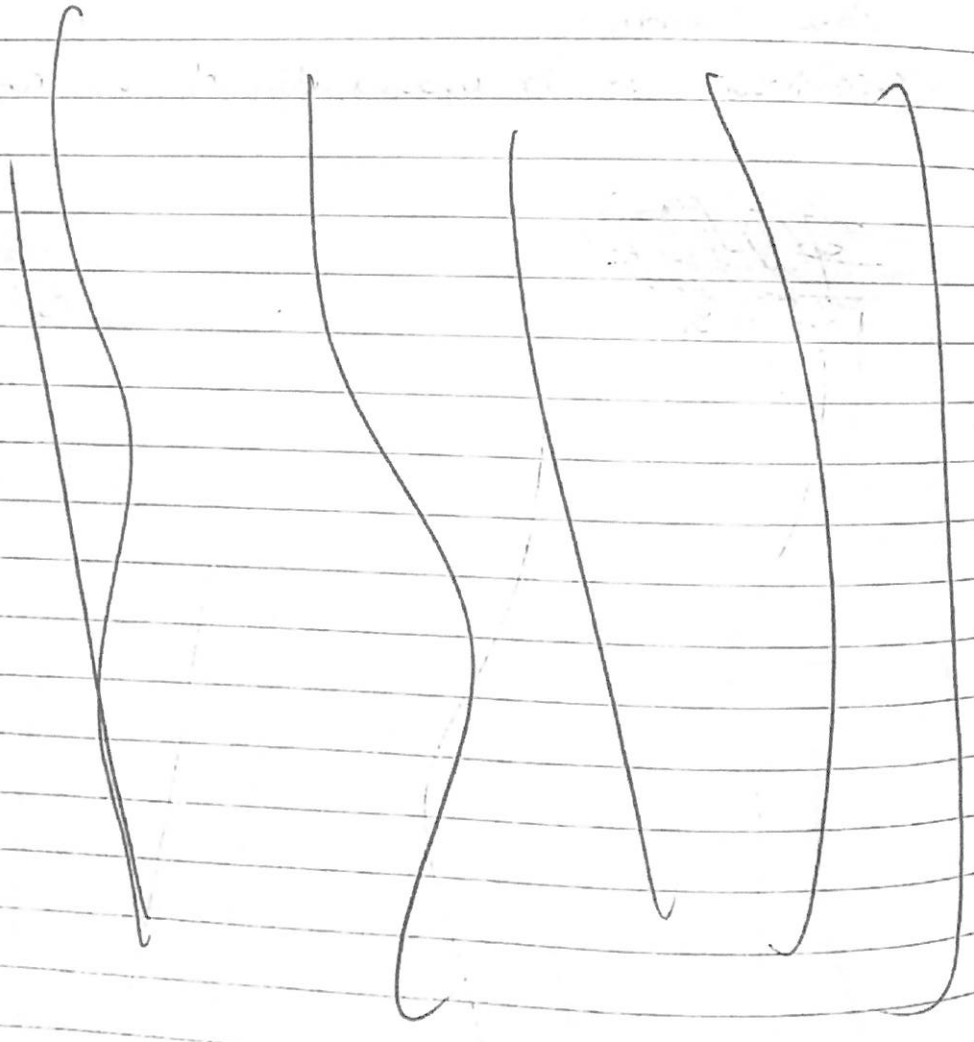

Lunes 31 de Julio - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramiento Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes.

Hora: 7am - 12pm


Se continua colocando la tubería conduit dentro do las regatas anteriormente hechas, y a su vez, ir tapandolas, con mezcla en mortero.

Hora: 2pm - 5pm
Clima: Nublado

Se continua realizando las actividades programadas del dia con normalidad

Interventoria

Contratista de obra.

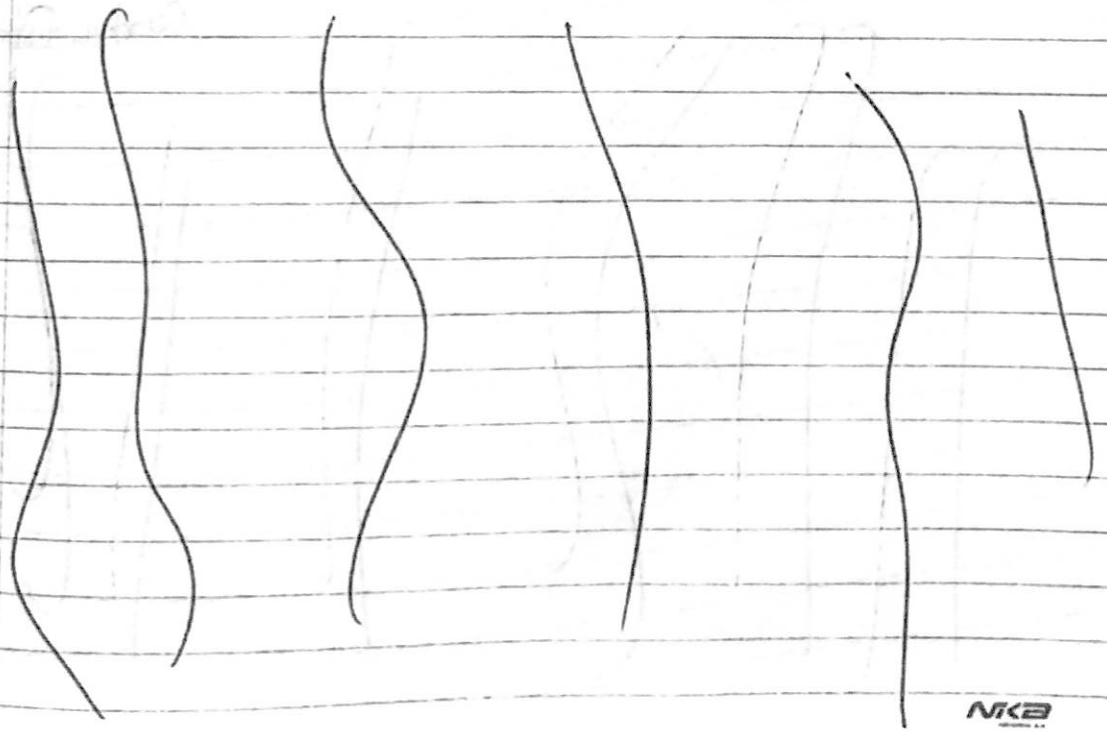

Martes 1 de agosto - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial
2 ayudantes

Hora: 7am a 12pm

Se comienza el dia instalando la tuberia conduit de las luminarias, Sobre la estructura del reflo Razo ya instalado,

Hora 2pm a 5pm
Clima: Nublado

Se continua las actividades del dia sin ningun Contratiempo.

Interventoria

Contratista de

Miercoles 2 de Agosto de 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramiento Menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial
1 ayudante

Hora: 7am - 12pm

Se continua instalando la tuberia, conduit y
a su vez las cajas de repartician para
cada luminaria contemplada dentro del proyecto.

Hora: 2pm a 5pm
Clima: Soleado

Se continua ejecutando las actividades programadas
del dia, con normalidad.

Interventoria

Contratista de obra

Jueves 3 de Agosto - 2023

Clima: Soleado
Equipo: Herramienta menor
Personal: Ingeniero Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial, 2 ayudantes

Hora: 7am - 12pm

Se continua instalando la tubería conduit para luminarias para finalizar esta actividad, y posteriormente continuar con el alambrado de tomacorrientes, interruptores y luminarias

Hora: 2pm - 5pm
Clima: Nublado

Se continua ejecutando las actividades programadas del día con normalidad

Interventoría

Contratista de obra
