
INFORME DE ACTIVIDADES

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	067 DE 2023
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL ESTADIO MUNICIPAL RAMÓN RÁPELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
CONTRATISTA	OSCAR ARRIETA LAGUADO
CEDULA	98701084
CONTRATRANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION


Desconexión e instalación de ductreia galvanizada IMC de 2"

El contratista realizo en la torre sur y norte del estadio municipal ramón rápelo Desconexión e instalación de ductreia galvanizada IMC de 2", la cual se utiliza para proteger el cabe de alimentación de los reflectores de cada torre.

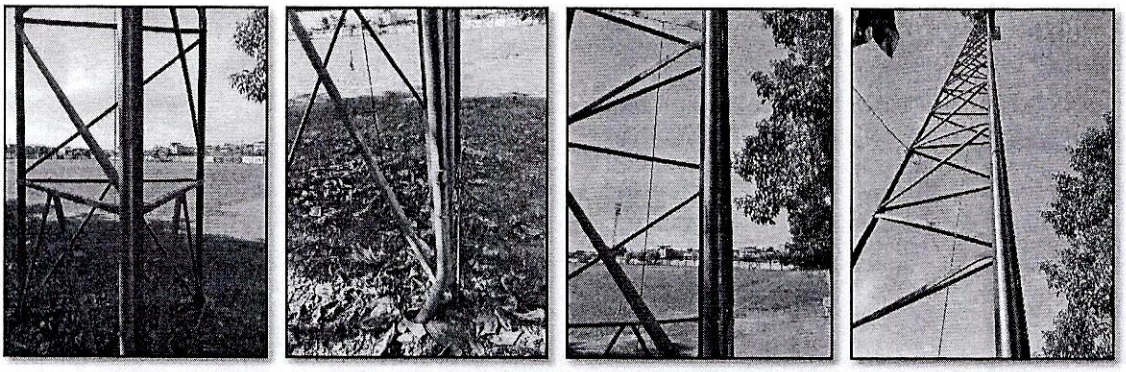

Suministro e instalación de acometida bifásica 2 x4+4 libre de halógenos

El contratista suministro e instalo acometida bifásica 2 x4+4 libre de halógenos en la torre sur y norte del estadio municipal ramón rápelo





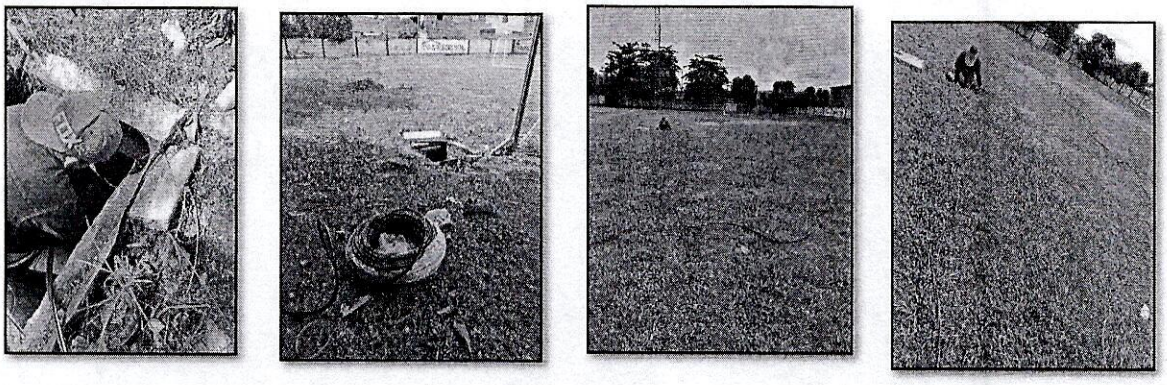







Suministro e instalación de puesta a tierra


El contratista suministro varilla cooper weld y soldadura a su vez realizo instalación de la misma en la torre sur y norte del estadio municipal ramón rápelo

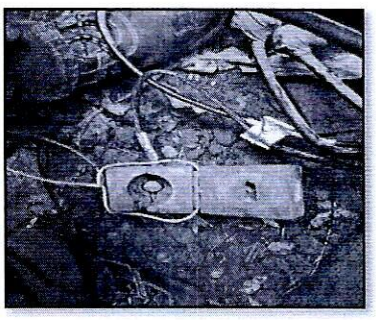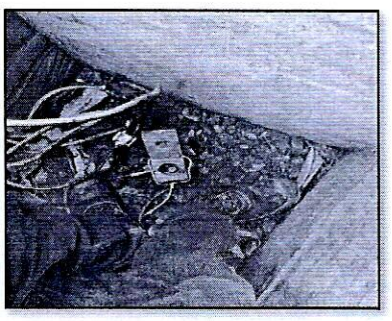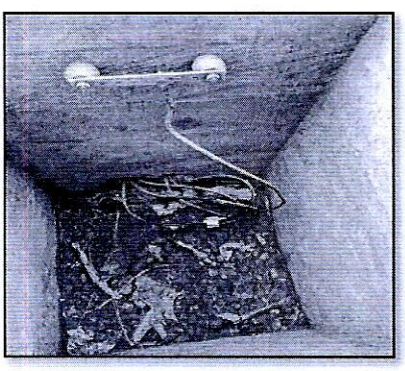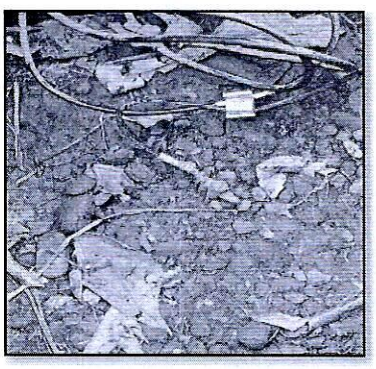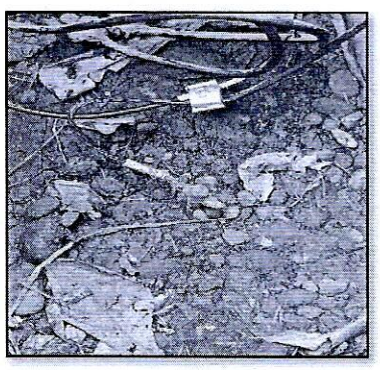
Suministro de Led Highbay 100 W





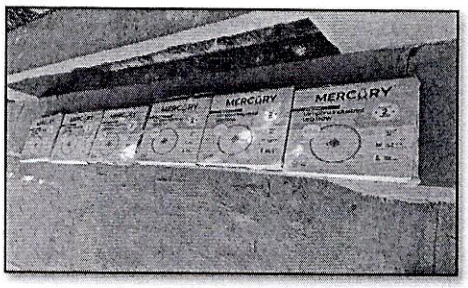

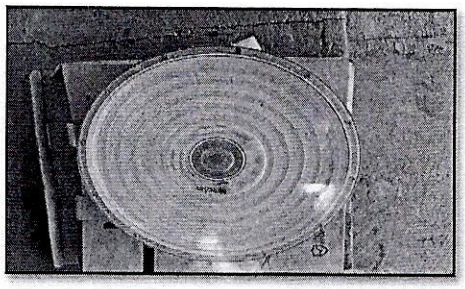

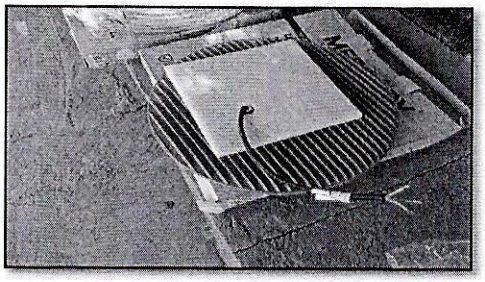

OSCAR ARRIETA LAGUADO
