ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 35, semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2023; 2022-2025	
FECHA 28/09/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Felipe Saenz	TPD
Laura Catalina Henao Corredor	SDM/DIT
Edwin Novoa Arévalo	SDM-DIT
Tania Victoria	SDM-DIT
Camilo Ardila	TPD
José Fernando Sánchez	TPD
Julieth Chacón Archila	TPD
Luis Nicolai Wilches Palomo	SDM-DIT-SS
Alfredo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de generalidades del contrato
2. Informe de seguimiento de avance semanal a cargo del director del proyecto de la consultoría – Ingeniero Camilo Ardila
3. Recomendaciones y conclusiones
4. Temas de la SDM – Ingeniero Nicolas Wilches

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Presentación de generalidades del contrato

El director del proyecto por parte de la consultoría ingeniero Camilo Ardila inicia la reunión presentando las generalidades del contrato:

2. Contrato 2025 de 2022
3. Contratista: TPD Ingeniería S.A.S.
4. Acta de inicio del 16 de enero de 2023
5. Duración: 10 meses

6. Informe de seguimiento de avance semanal

Durante la semana reportada se recibió aprobación del tramo etapa [3] 3_15, [1_tramo] para comenzar etapa 4.
Durante la semana reportada se recibieron aprobaciones de los tramos etapa [3] 3_21, 3_15, [2_tramos] finalizando así todas sus etapas de diseño.
Durante la semana reportada se enviaron 10 tramos etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023, tramos 3_58, 3_59, 19_28, 19_36, 18_7, 11_18, 11_19, 3_65, 3_70 y 3_79.
Durante la semana reportada se envió versión 0 de los tramos etapa [3] 3_25, 3_28, 3_36, 4_16, 4_13, 4_19, 3_39, 3_50, 3_51, 3_54, 19_35 y 11_18 [12_tramos].


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0


TEMA	Comité Semanal 35, semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2023; 2022-2025	
FECHA 28/09/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se presenta el avance por metas



Total tramos en proceso: 50

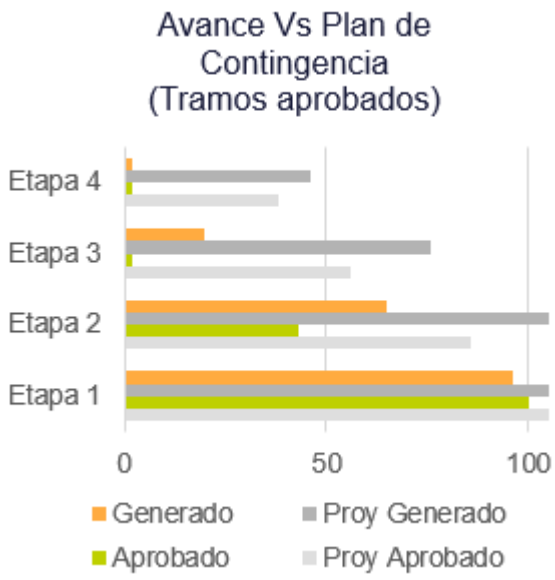

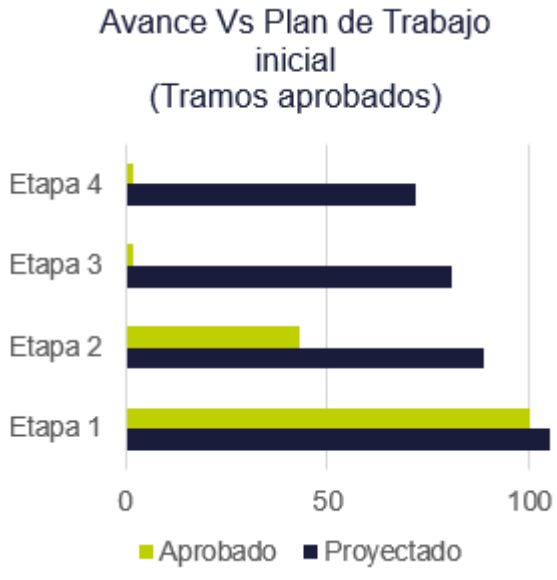

Avance ejecución financiera

TEMA	**Comité Semanal 35, semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2023; 2022-2025**	
FECHA 28/09/2023	**HORA 07:00**	**LUGAR Virtual :** https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Presupuesto total

$853,808,304 (Inc. IVA)


Ejecutado etapa 1:$81.315.077

Ejecutado etapa 2: $244.758.380

Ejecutado etapa 3: $2.439.452

Ejecutado etapa 4: $813.151

Total ejecutado: $ 329.326.060

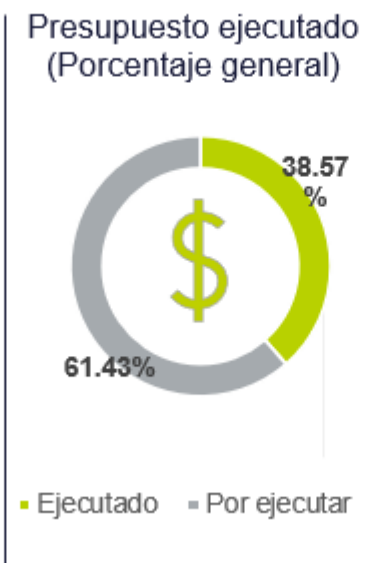



7. Recomendaciones y conclusiones

- Se tiene programado la entrega del producto en versión 0 de la etapa 3 de tramos en proceso
- Se tiene programado la entrega del producto en versión 0 de la etapa 1 de los tramos 2_75, 2_76, 3_72, 18_8 [4 Tramos].
- Se tiene programado la entrega de 16 informes etapa [2] acoplados al tramo 3_21 dando alcance a las precisiones y aclaración de observaciones tratadas en las diferentes mesas de trabajo durante los días 10 y 11 de agosto de 2023, tramos 3_26, 3_63, 3_64, 19_27, 8_26, 19_34, 3_66, 3_67, 3_68, 3_69, 11_20, 11_21, 11_22, 11_23, 19_37 y 5_8.
- Se continúan con las mesas de trabajo con el fin de generar las aprobaciones faltantes de las Etapas 2. Se tiene previsto culminación de entregas para las próximas dos semanas.
- Teniendo en cuenta las ultimas aprobaciones. Se generarán Etapas 3 para tramos de Choachí y Sumapaz buscando generar insumos para la revisión de solicitudes por parte de equipo SIG.

8. Temas de la SDM

La entidad anuncia que se hace necesario una revisión del plan de contingencia teniendo en cuenta que algunos avances no se están cumpliendo a cabalidad con lo propuesto, por lo cual se está preparando una comunicación por parte de la entidad con respecto a esta situación. La consultoría anuncia que estarán atentos a la comunicación mencionada para generar las respuestas requeridas.

Se menciona por parte de la entidad que la prioridad seguirá siendo sacar adelante el proyecto y su finalización, y se solicita dar más celeridad a las entregas de Etapa 3.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Comité Semanal 35, semana del 18 de septiembre al 24 de septiembre de 2023; 2022-2025	
FECHA 28/09/2023	HORA 07:00	LUGAR Virtual : https://meet.google.com/jzw-fwix-zhq

Se da por terminado el comité.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
N/A	NA	NA

APROBADO

LUIS NICOLAI WILCHES PALOMO
SUPERVISOR CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025
