CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION
CORNARE- MUNICIPIO DE CONCEPCION NUMERO 344-2023

INFORME NRO 1 Y FINAL

OBJETO: **PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION CON METODOLOGIA PRISER.**

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CONCEPCION
CONTRATANTE:	CORNARE
SUPERVISOR:	OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO
VALOR TOTAL:	**$ 17.389.970**
APORTE CORNARE:	**$ 14.677.070**
APORTE MUNICIPIO:	**$ 2.712.900**
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	21 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO:	SEIS (06) MESES
FECHA DEL INFORME:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

En la siguiente tabla se relacionan las actividades desarrolladas en el periodo del 21 junio al 15 de noviembre de 2023

Actividad	Unidad	Cantidad	Cantidad ejecutada Acta de Avance No. 1	Cantidad ejecutada acumulada	Porcentaje de ejecución
Protección de microcuenca, mediante el cercamiento	Metro	310 ML	310 ML	310 ML	100%
Siembra especies protectoras, para la conservación del recurso Hídrico (0.3Ha)	unidad	300	300	300	100%
Instalación de tanques plásticos de 250 litros, para el almacenamiento de agua para abasto	Unidad	2	2	2	100%
Mejoramiento de la conducción de agua de abasto, para evitar procesos erosivos.	Metro	200	200	200	100%
Instalación de tanques plásticos de 500 litros, para el almacenamiento de agua para abasto	Unidad	1	1	1	100%
Instalación de tanques plásticos de 1000 litros, para el almacenamiento de agua para abasto	Unidad	1	1	1	100%
Establecimiento de huertas agroecológicas	Unidad	4	4	4	100%
Establecimiento de composteras	Unidad	4	4	4	100%
Realizar taller de	Taller	1	1	1	100%

socialización					
Taller teórico sobre manejo de envases y empaques de plaguicidas y uso racional de agroquímicos	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100 %**
Taller sobre huertas agroecológicas	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100 %**
Taller de siembra de arboles	**Taller**	**1**	**1**	**1**	**100%**
Evento de evaluación del proyecto	**Evento**	**1**	**1**	**100**	**100%**
TOTAL, PROCENTAJE DE EJECUCIÓN					**100%**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. PROTECCIÓN DE MICROCUENCA, MEDIANTE EL CERCAMIENTO

Se realizo cercamiento de 310 ML con estacones de madera de pino de cuatro caras, de 2 m de largo, punta diamante, se inmunizo con brea, la distancia entre cada estacón fue de 2 mt y cada 20 mt se colocó un pie de amigo y en los puntos de quiebre del terreno. Se colocaron 3 cuerdas de alambre de púa calibre 14 bien tensionadas.

Esto mejoro las condiciones de vida de los beneficiarios, ya que el agua es de mejor calidad, ya que la cerca permite que los animales no ingresen al nacimiento al mismo tiempo que se está conservando el nacimiento contribuyendo la restauración natural.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
ROSMIRA SALAZAR	21.430.388	3225449310	70 ML	6°21'35"	– 75°9'41"
DIEGO CEBALLOS AGUILAR	15.453.072	3128358535	120 ML	6°21'16"	– 75°9'38"
RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA	3.451.962	3116367556	120 ML	6°21'34"	– 75°9'41"

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

CERCAMIENTO DE FUENTE HIDRICA- DIEGO ALCIDES CEBALLOS AGUILAR









CERCAMIENTO DE FUENTE HIDRICA- ROSMIRA SALAZAR

















CERCAMIENTO DE FUENTE HIDRICA- RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA

2. SIEMBRA ESPECIES PROTECTORAS, PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO (0.3HA)

Se realizó la siembra de trecientos (300) árboles, de guamo, quiebrabarrigo, kimula, chagualo, drago, pira canta, arrayanes, arboloco, sauco, guayabo y uparán a continuación, se relaciona las actividades que se hizo en el proceso de siembra:
Trazado: Se demarco los sitios donde se sembraron los árboles, esta se realizó de 2 x 2 metros.
Plateo: Se hizo limpieza de las malezas en un radio de 50 cm, en los sitios que se demarco.
Hoyado: En el plateo se hizo un hoyo de 30 x 30 x 30 cm.
Abonado y encalado: En cada hoyo se aplicó abono orgánico y cal.
Plantación: Cuando ya se realizó cada una de las actividades realizadas se sembró los árboles.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
DIEGO CEBALLOS AGUILAR	15.453.072	3128358535	100	6°22'16"	75°9'38"
RIGOBERTO CEBALLOS AGUILAR	3.451.962	3116367556	100	6°21'57"	75°9'37"
GLORIA LOPEZ SALAZAR	21.431.047	3176987330	100	6°21'34"	75°9'41"





SIEMBRA DE ARBOLES RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA

SIEMBRA DE ARBOLES GLORIA LOPEZ SALAZAR





SIEMBRA DE ARBOLES DIEGO CEBALLOS AGUILAR





3. INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 250 LITROS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTO DE CONSUMO HUMANO

Se instaló dos **(2)** tanque plástico con capacidad de 250 litros; para abastecimiento de agua de 2 familias de la vereda, dado que estaban en mal estado el cual estaba generando varios problemas ambientales. Con la instalación de cada uno de los tanques se generó gran impacto en la comunidad, ya que se solucionaron las necesidades que las familias tenían mejorando así la calidad y cantidad del agua.


Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
OMAR CARDENAS CASTAÑO	80.054.760	3113137735	1 (250 lt)	6°21'38"	– 75°9'54"
LUCELLY CEBALLOS VALENCIA	32.481.768	3193974224	1 (250 lt)	6º22'16"	-75º9'38"

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS








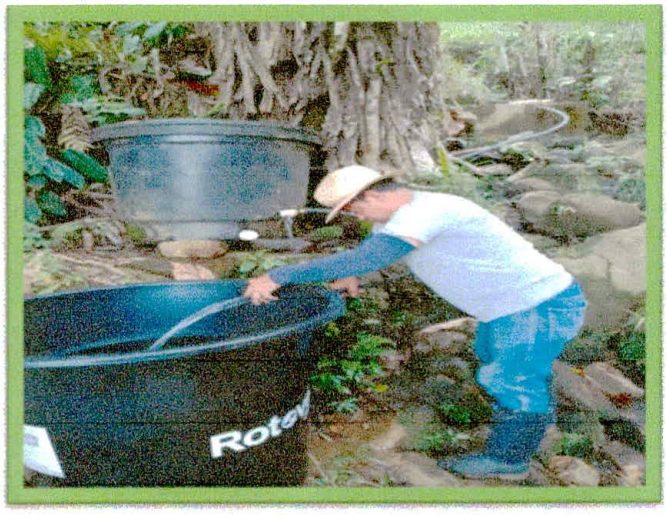

TANQUE OMAR CARDENAS CASTAÑO

TANQUE DE LUCELLY CEBALLOS AGUILAR

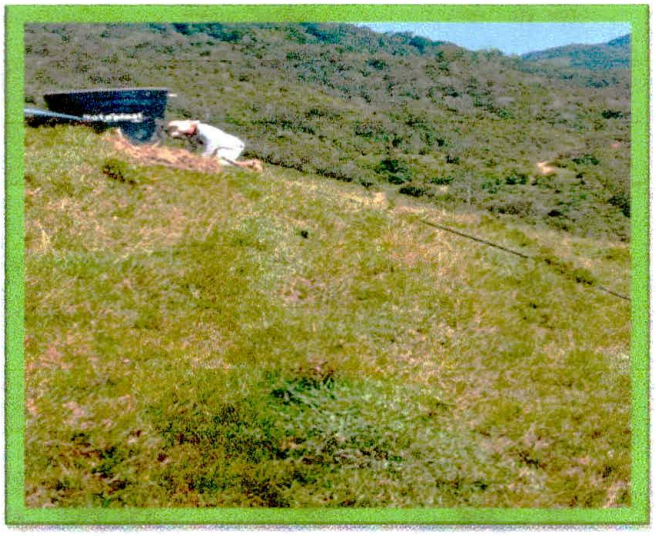



4. MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA DE ABASTO, PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS.

Se mejoró el sistema de conducción de agua para consumo de una **(1)** familia de la vereda, dado que las mangueras que tenían estaban en muy mal estado, tenían fugas que provocaba procesos erosivos y desperdicio de agua, además el servicio de agua era muy inestable ya que en innumerables ocasiones se quedaban sin agua.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
LUCELLY CEBALLOS VALENCIA	32.481.768	3193974224	200 metros de 3/4	6º22'16"	-75º9'38"

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS







MANGUERA LUCELLY CEBALLOS AGUILAR

5. INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 500 LITROS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTO DE CONSUMO HUMANO

Se instaló un **(1)** tanque plástico con capacidad de 500 litros para abastecimiento de agua de varias familias de la vereda, dado que estaban en mal estado los cuales estaban generando varios problemas ambientales. Con la instalación de cada uno de los tanques se generó gran impacto en la comunidad, ya que se solucionaron las necesidades que las familias tenían mejorando así la calidad y cantidad del agua.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
HENRY CARDONA LOPEZ	15.454.007	3184369510	1 (500 lt)	6°21'37"	– 75°9'40"

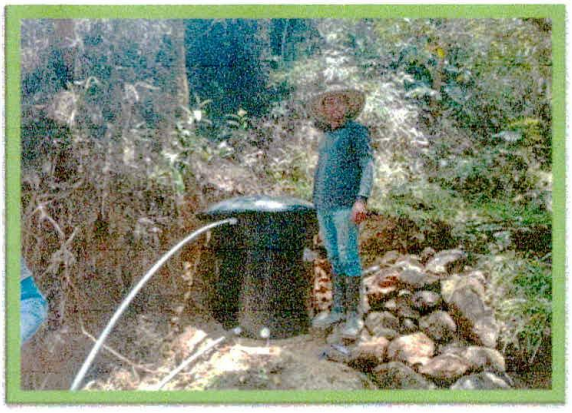

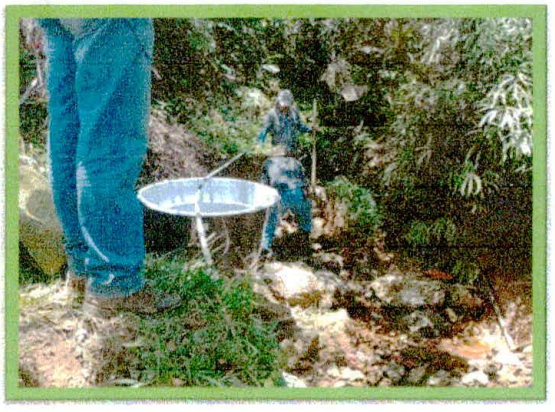

6. INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE 1000 LITROS, PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA ABASTO DE CONSUMO HUMANO

Se instaló un **(1)** tanque con capacidad de 1000 litros para abastecimiento de agua de varias familias de la vereda, dado que estaban en mal estado los cuales estaban generando varios problemas ambientales. Con la instalación de cada uno de los tanques se generó gran impacto en la comunidad, ya que se solucionaron las necesidades que las familias tenían mejorando así la calidad y cantidad del agua

.

Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
DIEGO CEBALLOS AGUILAR	15.453.072	3128358535	1 (1000 lt)	6°21'16"	– 75°9'38"

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS











7. ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS AGROECOLÓGICAS


Se establecieron cuatro **(4)** huertas agroecológicas de 100 mt2, se hizo cercamiento perimetral con malla plástica y estacones de madera para evitar que los animales ingresen y dañen las especies de hortalizas que se sembraron. Se utilizo abono mejoragro para las parcelas, el cual se produce en el vivero municipal. Con el establecimiento de las huertas se está generando en las familias seguridad y soberanía alimentaria, consumo de alimentos sanos y nutritivos.


Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
ARELIS LOPEZ SALAZAR	1.032.070.296	3127783361	1	6°21'44"	– 75°9'40"
OMAR CARDENAS CASTAÑO	80.054.760	3113137736	1	6°21'38"	– 75°9'54"
HENRY CARONA LOPEZ	15.454.007	3184369510	1	6°21'37"	– 75°9'40"
RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA	3.451.962	3128358535	1	6°21'57"	– 75°9'37"

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

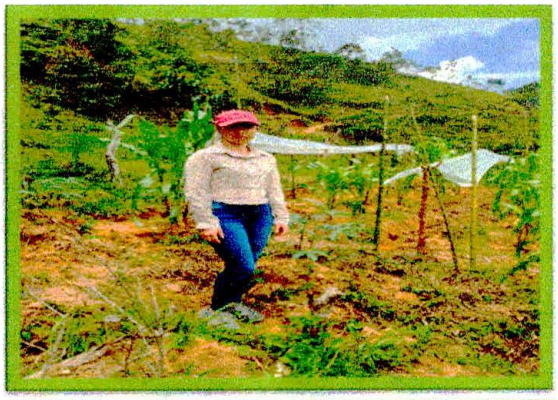

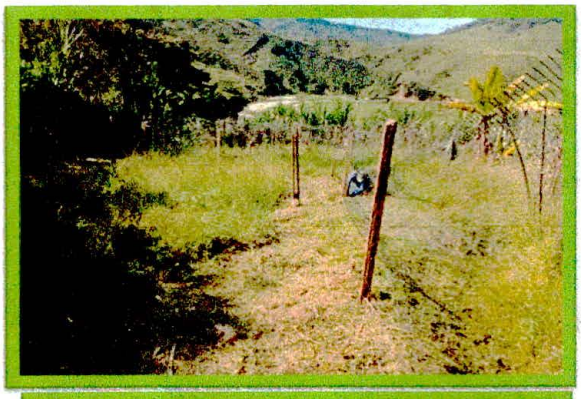

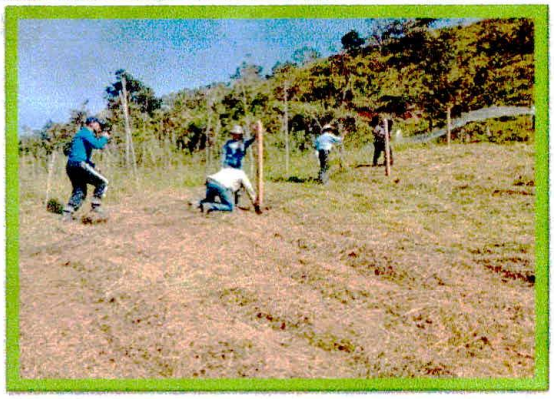

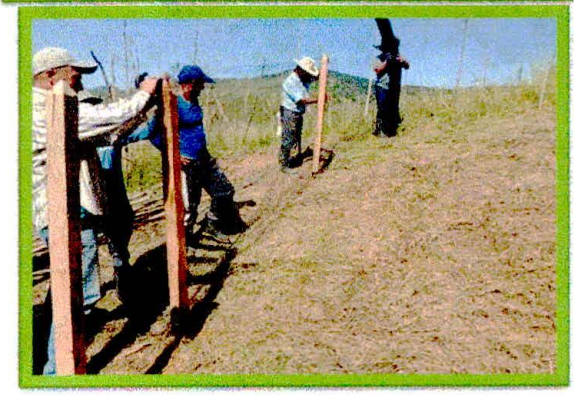

HUERTA ARELIS LOPEZ SALAZAR











HUERTA OMAR CARDENAS CALDERON





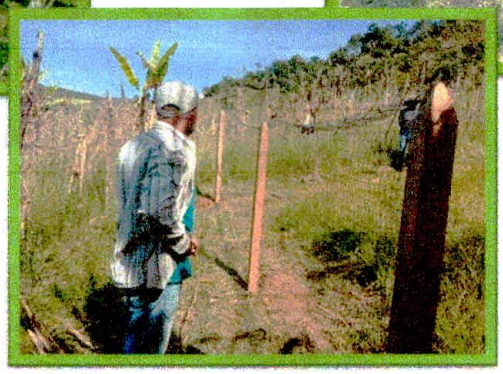

HUERTA HENRY LOPEZ SALAZAR

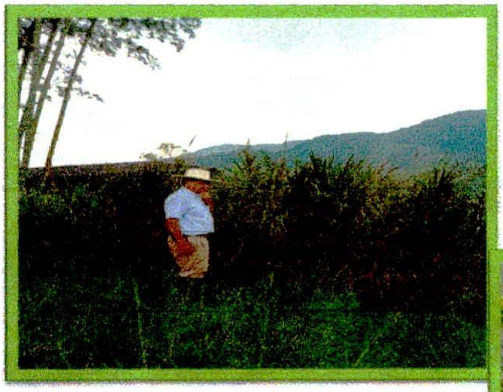





HUERTA

RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA

8. ESTABLECIMIENTO DE COMPOSTERAS

Se construyeron cuatro (4) composteras en guadua, se hicieron de 1 metro de alto x 2 m de ancho x 2 m de largo. Están cubiertas con tejas de zinc. Estas permitirán que los beneficiarios tengan un lugar adecuado para descomponer los residuos que se producen en la finca y así poder producir abono que puede utilizar para los cultivos.


Beneficiario	N°. Doc. Identidad	Teléfono	Cantidad	Coordenadas	
				X	Y
HENRY CARDONA LOPEZ	15.454.007	3184369510	1	6°21'37"	– 75°9'40"
RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA	3.451.962	3128358535	1	6°21'57"	– 75°9'37"
OMAR CARDENAS CASTAÑO	80.054.760	3113137735	1	6°21'38"	– 75°9'54"
JUAN FERNEY OROZCO	1.032.270.150	3127783661	1	6°21'44"	– 75°9'40"


EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





COMPOSTERA HENRY LOPEZ SALAZAR

COMPOSTERA RIGOBERTO CEBALLOS VALENCIA

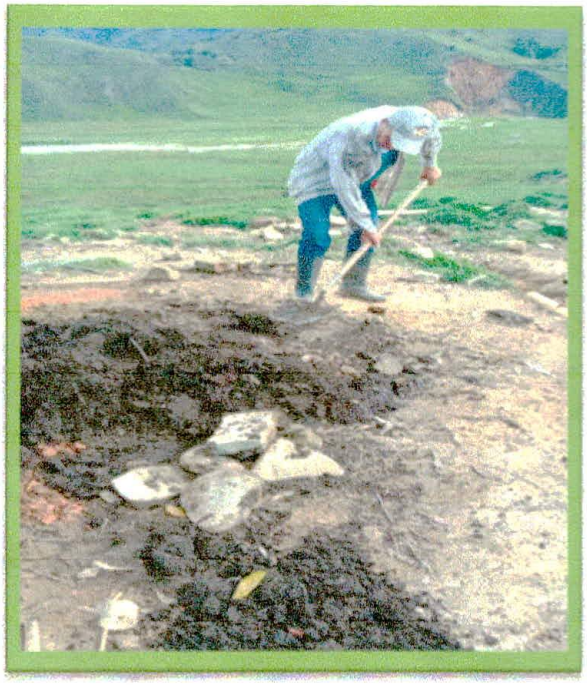

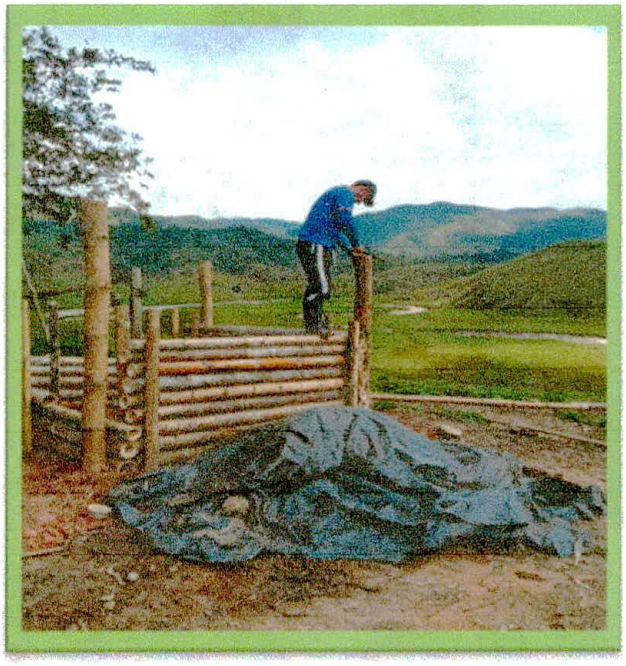

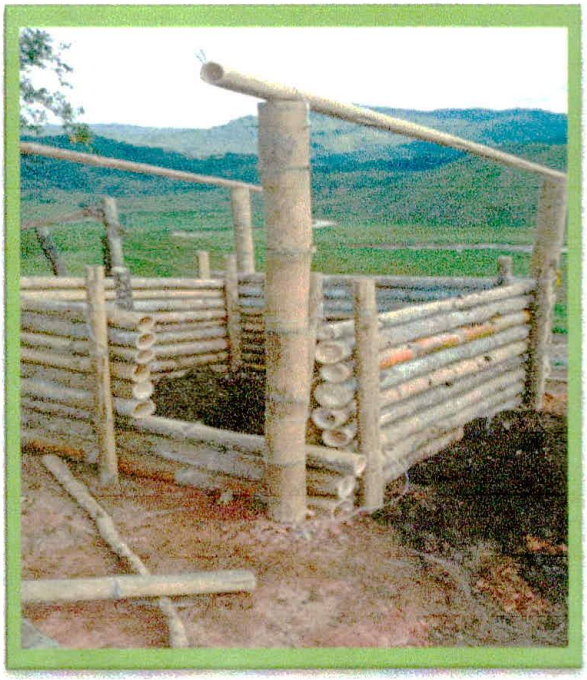

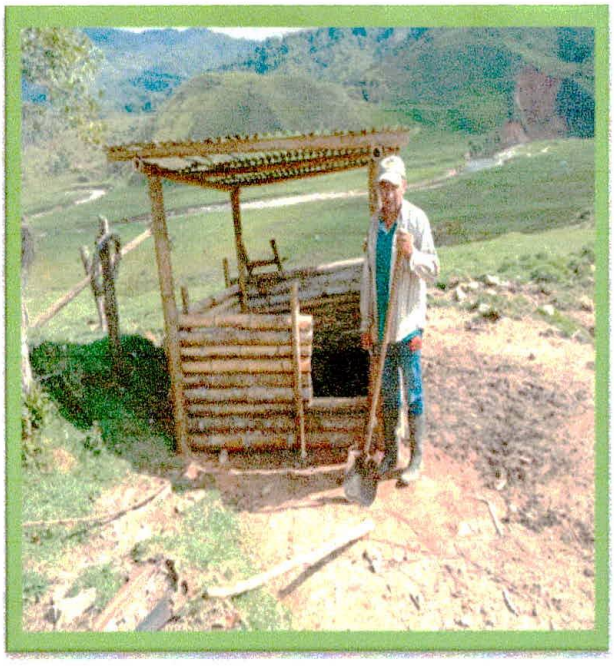



Parque Principal, Cra. 21 Nº 19 – 23 Nit. 890.983.718-6 Código Postal CP053810
Conmutador: 856 70 83, 7084, 7106, 7274 Fax: 856 70 85
alcaldia@concepcion-antioquia.gov.co / www.concepcion-antioquia.gov.co
@ConcepcionAnt

COMPOSTERA OMAR CARDENAS CASTAÑO





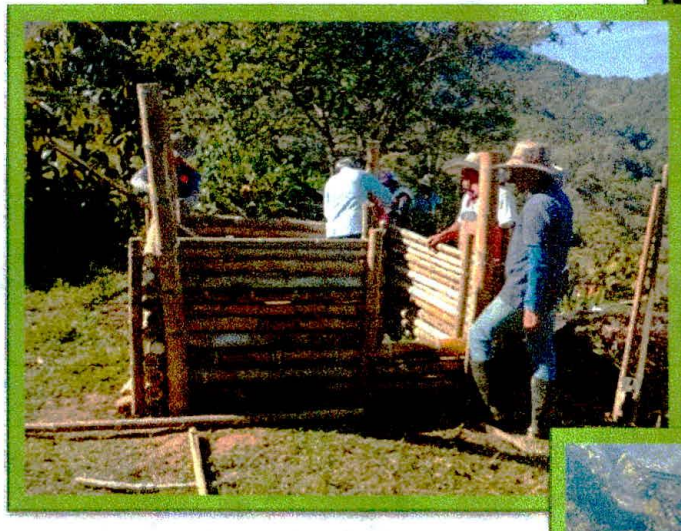

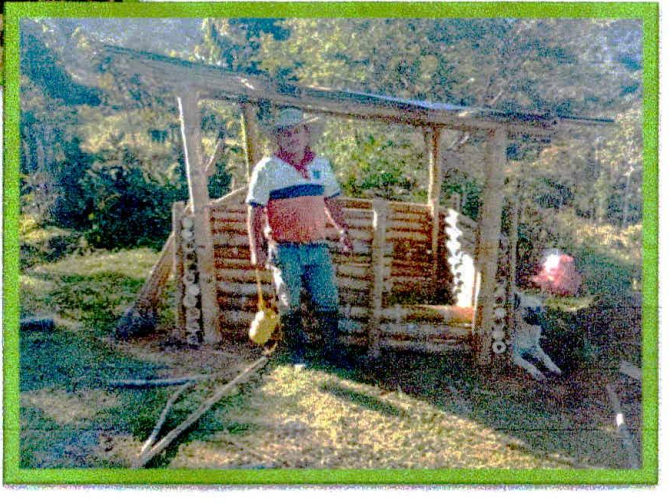









COMPOSTERA JUAN FERNEY OROZCO

9. REALIZACIÓN TALLER DE SOCIALIZACIÓN

Se realizó la socialización del proyecto a los beneficiarios de la vereda con la presencia de la señora Martha Cecilia Ceballos Ceballos secretaria de la Unidad de Desarrollo Rural y del técnico del proyecto Jaime esteban Ceballos. En la socialización se les dio a conocer a la comunidad cada uno de los beneficiarios del proyecto y las actividades a realizar, las cuales fueron focalizadas con anterioridad en el diagnostico veredal que se realizó casa a casa donde se identificaron las principales necesidades que se tenían en la comunidad. Además, se conformó el comité de compras.

Finalmente, se motivó a la comunidad para que desarrollaran las actividades con mucho empeño, responsabilidad y compromiso. Poniendo en práctica el trabajo en equipo, la participación y la cooperación, para así poder alcanzar los objetivos propuestos.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS









10. REALIZACIÓN TALLER SOBRE MANEJO ADECUADO DE EMPAQUES Y ENVASES DE PLAGUICIDAS

Se realizo capacitación sobre el manejo adecuado de empaques y envases de plaguicidas teniendo en cuenta que es de vital importancia que ellos conozcan que manejo les puede dar a estos empaques de plaguicidas, se les explico a profundidad que son, cuáles son sus categorías, el daño que ocasionan al medio ambiente y al ser humano, de igual manera se les explico todo el proceso del triple lavado y su disposición en las jornadas de recolección de empaques y envases de plaguicidas.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS









11. REALIZACIÓN TALLER SOBRE HUERTAS AGROECOLÓGICAS

se realizó el taller sobre huertas agroecológicas a cargo del señor Edgar Orlando restrepo valencia Tecnólogo en Producción Agroecológica.

Se sensibilizó sobre la importancia de establecer una huerta agroecológica en las fincas y los beneficios que trae para las familias, ya que esta es una manera para tener alimentos sanos, variados y a bajos costos asegurando una seguridad y soberanía alimentaria en los hogares.

Se explico los aspectos a tener en cuenta al momento de establecer la huerta y se les dio algunas recomendaciones para hacer una buena planeación de esta, se les expuso un modelo de huerta que pueden implementar y lo que deben tener presente en el momento de sembrar las hortalizas como lo es: la preparación del terreno, la realización de las eras o camas, la realización de semilleros, el manejo de distancias de siembra, la profundidad y la siembra escalonada.

Además, se habló de las plagas y enfermedades de las hortalizas, donde se les enseño como controlarlas mediante la aplicación de biopreparados y extractos naturales.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS






12. REALIZACION DE TALLER BOBRE SIEMBRA DE ARBOLES

El día 23 de septiembre del 2023, se llevó a cabo el taller sobre plantaciones forestales, el cual fue dictado por el señor Albeiro de Jesús Salazar Tecnólogo Agrícola.

En este taller el facilitador expuso sobre las diferencias de los bosques nativos y los bosques plantados, los beneficios que tiene cada uno. Además, explico de manera detallada lo que se debe tener en cuenta en el momento de la siembra. Entre los factores para el establecimiento de las plantaciones es importante tener presente: La profundidad efectiva, PH, textura, fertilidad, precipitación, temperatura, altura y ecóloga. Además de la calidad genética del material y elección de las especies a sembrar.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS






13. **Evento de evaluación del proyecto**

Se realizó el evento de evaluación del proyecto donde se le dio a conocer a la comunidad y a las personas los resultados obtenidos, donde se les específica cada actividad y el costo de esta. Además, se vivió un día agradable entre la institucionalidad y la comunidad, donde se compartió experiencias del proyecto y del trabajo en comunidad.





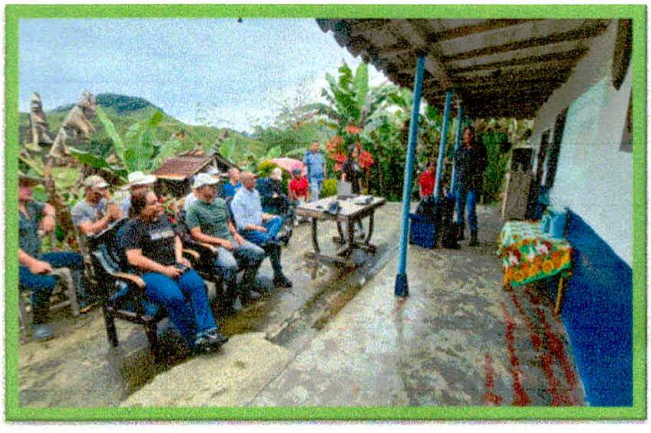



JAIME ESTEBAN CEBALLOS CEBALLOS
Apoyo en la coordinación del proyecto

Vo/Bo.

MARTHA CECILIA CEBALLOS
Secretaria Unidad de Desarrollo Rural
