INFORME DE SUPERVISIÓN N°1
FECHA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023
DATOS GENERALES

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT.	800.098.911-8
NÚMERO DEL CONTRATO	1968-SGR DEL 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE DEL 2023
CONTRATISTA	ADRIAN NIEVES IBARRA
CEDULA	77.016.025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, EL TRANSFORMADOR DE 500 KVA Y LAS REDES EXTERNAS E INTERNAS DEL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.
VALOR	NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($96.829.000.oo) MCTE
IVA 19%	QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($15.460.092,45) MCTE
VALOR ANTES DE IVA	OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($81.368.907.55) MCTE
FORMA DE PAGO	El Municipio de Valledupar pagará el valor del presente contrato una vez entregados los bienes y prestados los servicios, de acuerdo con el informe presentado por el contratista, en el que se especificarán los bienes entregados y/o las actividades realizadas y/o desarrolladas, debiendo además presentar la constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, Pensión y Riego profesional) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR), acompañada de la Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El Municipio de Valledupar cancelará de conformidad con el acta o informe de actividades, debiendo además presentar: Presentación del informe de actividades y/o de ejecución del contrato previa verificación de las características técnicas, acompañada de los documentos soportes. Acreditación que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de sus empleados. Presentación del documento equivalente a la factura cuando corresponda. Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II.
FECHA INICIO EJECUCIÓN	09 DE OCTUBRE DEL 2023

DATOS FINANCIEROS.

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP INICIAL					
N°	3198	VALOR(ES)	$96.909.237,00	FECHA(S)	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP INICIAL					
N°	5097	VALOR(ES)	$96.829.000.00	FECHA(S)	04 DE OCTUBRE DEL 2023
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)			8715202-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES TRANSFORMADORES Y GENERADORES ELECTRICOS		

POLIZA

N° 320-47-994000026860	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		09-10-2023
AMPAROS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	04-10-2023	29-02-2024	968.290.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03-08-2023	29-10-2023	9.682.900.00
FECHA DE APROBACION EN SECOP	09 DE OCTUBRE DEL 2023		
TOTAL ASEGURADO	$10.651.190.00		

NOTA: Se realizo anexo 1 a la póliza para ajustar el porcentaje que ampara la garantía de cumplimiento al 10% de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

TRIBUTOS MUNICIPALES.

DETALLE	FECHA DE PAGO	LIQUIDACION No.	PORCENTAJE	VALOR
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR			4%	
ESTAMPILLA PRO-UNICESAR			0.5%	
ESTAMPILLA PRO – CULTURA			2%	
ESTAMPILLA PRODEPORTE			1%	

EL CONTRATISTA SE ACOGIÓ AL DECRETO 000062 DEL 27 DE ENERO DEL 2023, QUE REGLAMENTA EL RECAUDO, SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RETENCIÓN Y DECLARACIÓN DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA, ADULTO MAYOR Y PROUNIVERSIDAD. ESTOS SERAN DESCONTADOS EN LA PRIMERA Y UNICA CUENTA CUENTA.

TRIBUTOS DEPARTAMENTALES.

IMPUESTOS	LIQUIDACION No.	PORCENTAJE	FECHA DE PAGO	VALOR
Estampilla Pro-desarrollo Fronterizo	32023025496	1.5%	23-10-2023	$1.221.000

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	VALOR APORTE	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE
El Señor ADRIAN NIEVES IBARRA certifica, se encuentra al dia con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales durante los últimos seis (6) meses			

EJECUCION FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO		$96.829.000.oo
	FACTURA N°	
(1) VALOR A CANCELAR	SF-7501	$96.829.000.oo
SALDO POR EJECUTAR		$0

Se deja constancia que la presente cuenta responde al proceso de liquidación ya surgido y se da de acuerdo con los valores enunciados en esta.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

SÍ	x	Se da visto bueno para realizar el pago de **NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($96.829.000.00) MCTE IVA**

	INCLUÍDO, por concepto del **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, EL TRANSFORMADOR DE 500 KVA Y LAS REDES EXTERNAS E INTERNAS DEL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.**
NO	Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: _____

Observaciones:

LUIS ENRIQUE GALVIS NUÑEZ
Secretario general
Supervisor

PROYECTO: DANIEL EDUARDO DAZA RUIZ
Profesional especializado contratista

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

CERTIFICA.


Que el señor **ADRIAN NIEVES IBARRA, CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SERVIELECTRIC FERRETERIA., CEDULA 77.016.025 expedida en Valledupar**, ejecuto el Contrato de prestación de servicios No. **1968** de fecha 04 de Octubre del 2023, cuyo objeto es "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, EL TRANSFORMADOR DE 500 KVA Y LAS REDES EXTERNAS E INTERNAS DEL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.**", cumpliendo a satisfacción con el objeto contractual.


De igual forma se certifica el pago del impuesto departamental y el pago de la seguridad social.

Se expide a los 24 días del mes de Octubre de 2023.

LUIS ENRIQUE GALVIS NUÑEZ
Secretario General
Supervisor

PROYECTO: DANILO EDUARDO DAZA RUIZ
Profesional Esp. contratista.

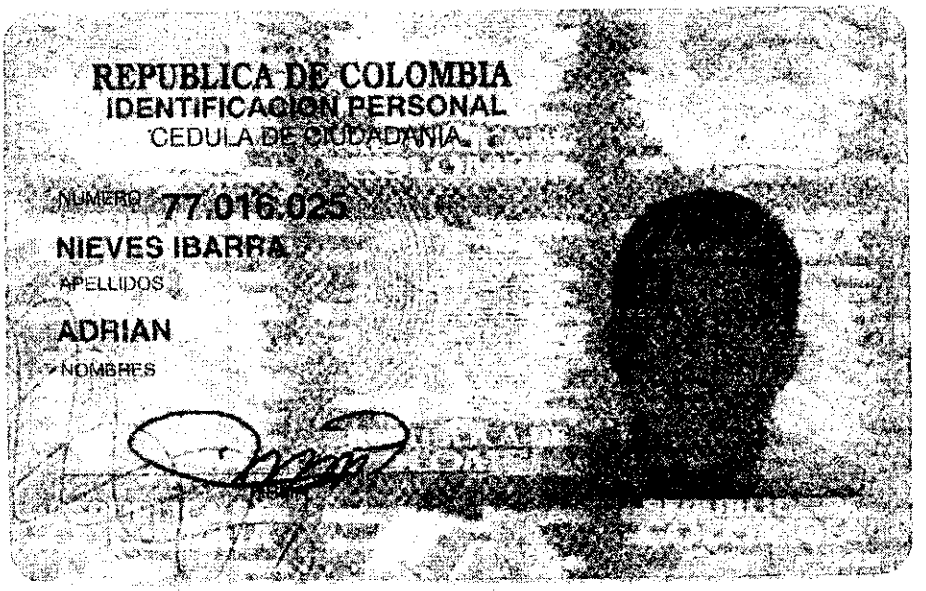
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 77.016.025
NIEVES IBARRA
APELLIDOS
ADRIAN
NOMBRES

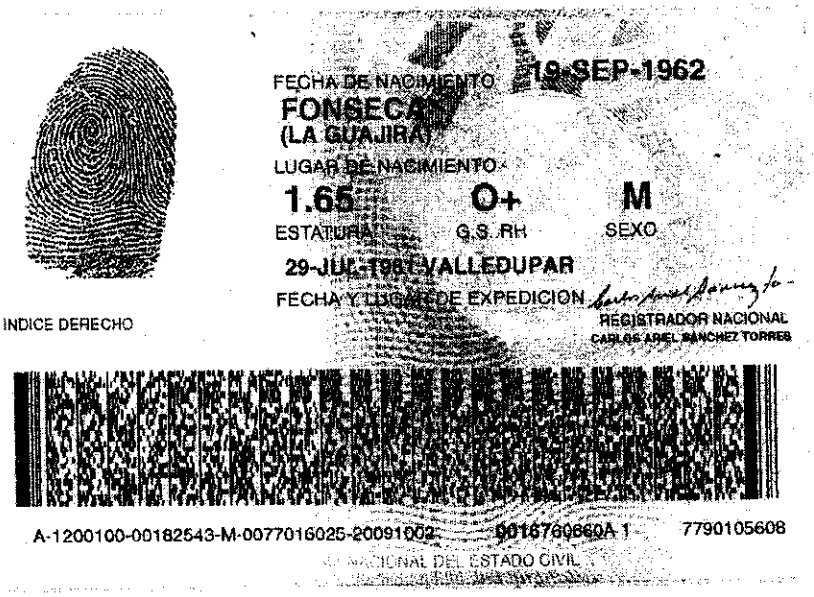
INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1962
FONSECA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-JUL-1981 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
A-1200100-00182543-M-0077016025-20091002 0016760660A 1 7790105608
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

SERVIELECTRIC FERRETERIA

NIT. 77.016.025-4

MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

Valledupar, octubre 20 de 2023

Señores
GOBERNACION DEL CESAR
Atn. Oficina de Impuestos
Valledupar

Asunto. Certificado Base para liquidación Impuestos Contrato Electrónico de Prestación de Servicios No. 1968-SGR-2023.

Certifico que: El Contrato No. 1968-SGR-2023 celebrado entre el Municipio de Valledupar y Adrian Nieves Ibarra; por un Total de $96.829.000 tiene una base antes de Iva para la liquidación de los respectivos impuestos por valor de $81.368.908; la cual detallamos a continuación:

81.368.908=	Sub-total
15.460.092=	IVA
96.829.000	Total

Anexos:

- Copia del Contrato No. 1968-SGR-2023
- Rut
- Copia cédula Representante Legal

Atentamente,

ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77.016.025 de V/par

JZJZ (●↑ZZ

ADRIAN NIEVES IBARRA
NIT 77.016.025-4
CALLE 19 No. 8 - 46
Tel: (5) 5713096
Valledupar - Colombia
servielectricferreteria@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. SF 7501

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(095) 5742400 - 3176577801
Dirección	CR 5 15 69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/10/2023, 14:35
Expedición	20/10/2023, 14:38
Vencimiento	20/10/2023

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	60101	1.00	UND	Apertura y cierre de circuito incluye (servicio de carro canasta, y accesorios de fijación y terminación: 3 conectores ampa para puentes)	2,579,831.93	2,579,831.93	0 %	19 %	0 %	3,070,000.00
2	60102	950.00	UND	Tendido e instalación cable ascr # 1/0 awg (para potenciar líneas existentes en deterioro)	11,260.50	10,697,478.99	0 %	19 %	0 %	12,730,000.00
3	60103	1.00	UND	Configuración de mufa trifásica (incluye cableado, elementos y accesorios necesarios:2 crucetas autosoportadas, 3 cortacircuitos, 3 fusibles de soga3 pararrayos 15kva . 2 collarines)	2,721,848.74	2,721,848.74	0 %	19 %	0 %	3,239,000.00
4	60104	120.00	UND	Suministro e instalación de acometida xlp 1/0	88,235.29	10,588,235.29	0 %	19 %	0 %	12,600,000.00
5	60105	1.00	UND	Mantenimiento preventivo a transformador de baja tensión (transformadores iguales menores a 75kva nivel de tensión baja) alcances del mantenimiento pruebas eléctricas de diagnóstico a transformador (en la posición actual del conmutador) medición de la relación de transformación (ttr) en todas las posiciones del cambiador de tomas, norma ntc 471 medición de la resistencia de devanados en todas las posiciones del cambiador de tomas, norma ntc 375 medición de resistencia de aislamientos (megger) Mantenimiento tipo b a transformadores tipo secos. Desenergización del transformador (a cargo del cliente) desconexión de los terminales de alta y baja tensión desplazamiento de los residuos de polvo con aire ultra seco nitrógeno (aplica para transformadores secos, seccionadores y tableros) cableado y accesorio necesario para puesta en marcha en sitio limpieza y ajuste general de los transformadores ajuste de conexión de los taps del conmutador conexión de los terminales de alta y baja tensión	4,327,731.09	4,327,731.09	0 %	19 %	0 %	5,150,000.00
6	60106	1.00	UND	Mantenimiento correctivo y/o reparación de transformador media tensión (transformadores de 500 kva) incluye(rebobinar parte activa del transformador, secado de la parte activa del transformador, cambio del aceite dieléctrico, cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión, limpieza interior y exterior del tanque, pintura, filtro prensado y calentado del aceite, puesta en marcha en sitio) accesorios y cableado para la energización y puesta en marcha: 27 ml cable 4/0 awg, 24ml cable 250mcm, 20ml cable 500mcm, 24ml cable 1/0 awg,16 terminales 4/0, 8 terminales 500mcm, 8 terminales 250mcm, 1 juego de premoldeados, 3 fusibles tipo ballesta.	35,361,344.54	35,361,344.54	0 %	19 %	0 %	42,080,000.00
7	60107	1.00	UND	Iluminación de áreas comunes, (incluye suministro e instalación de 9 reflectores led de 400w, mantenimiento correctivo y preventivo de 12 reflectores metal hilide de 1000w existentes, cableado y accesorios: 12 kits para reflectores de 1000w m/h)	15,092,436.97	15,092,436.97	0 %	19 %	0 %	17,960,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.095.213-0. Resolución 1.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

Total items: 7

Valor en Letras:
Noventa y seis millones ochocientos veintinueve mil pesos m/cte

Total Bruto	81,368,907.55
IVA 19%	15,460,092.45
Total a Pagar	96,829,000.00

Condiciones de Pago:
Indeterminado - Cuota No. 001 vence el 2023-10-20 por $ 96,829,000.00

Observaciones:
Favor consignar en la Cta Corriente No. 657064309 Banco de Bogotá a Nombre de Adrian Nieves

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025349851 aprobado en 20220214 prefijo SF desde el número 3164 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 7XMil
CUFE: 030c6a3331039c2520aa0a6fe106c8ba2911e93ba073bf2f931839150e4ac8a993da6efb917940fa64d34529e7146651

INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Valledupar, 19 de octubre de 2023.

Señores
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATO No. 1968-SGR DE 2023.
Valledupar

Asunto: Informe de ejecución contractual octubre año 2023.

Referencia: No 1968-SGR DE 2023.

ADRIAN NIEVES IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77016025 de VALLEDUPAR, en mi calidad de Contratista del MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, en cumplimiento del Contrato No 1968-SGR DE 2023 del año 2023., a continuación, presento el Informe de actividades realizadas desde el 9 de octubre al 19 de octubre 2023.

forma de Pago El Municipio de Valledupar pagará el valor del presente contrato una vez entregados los bienes y prestados los servicios, de acuerdo con el informe presentado por el contratista, en el que se especificarán los bienes entregados y/o las actividades realizadas y/o desarrolladas, debiendo además presentar la constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, Pensión y Riego profesional) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR), acompañada de la Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato.
El Municipio de Valledupar cancelará de conformidad con el acta o informe de actividades, debiendo además presentar:
□ Presentación del informe de actividades y/o de ejecución del contrato previa verificación de las características técnicas, acompañada de los documentos soportes.
□ Entrada y salida de almacén.
□ Acreditación que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de sus empleados.
□ Presentación del documento equivalente a la factura cuando corresponda.

Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato
PLAZO INICIAL: El plazo de ejecución será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir de del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II..

Fecha Inicio: 4 de octubre de 2023.
Fecha terminación: 19 de octubre de 2023.

OBJETO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO, EL TRANSFORMADOR DE 500 KVA Y LAS REDES EXTERNAS E INTERNAS DEL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.


ACTIVIDADES REALIZADAS:


ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
1	Apertura y cierre de circuito incluye (servicio de carro canasta, y accesorios de fijación y terminación: 3 conectores ampa para puentes)	UND	1
2	Tendido e instalación cable ascr # 1/0 awg (para potenciar líneas existentes en deterioro)	ML	950
3	Configuración de mufa trifásica (Incluye cableado, Elementos y accesorios necesarios: 2 crucetas autosoportadas, 3 cortacircuitos, 3 fusibles de soga, 3 pararrayos 15kva, 2 collarines)	UND	1
4	Suministro e instalación de acometida xlp 1/0	ML	120
5	"Mantenimiento preventivo a transformador de baja tensión (transformadores iguales menores a 75kva nivel de tensión baja). Alcances del mantenimiento: Pruebas eléctricas de diagnóstico a transformador (en la posición actual del conmutador), medición de la relación de transformación (ttr) en todas las posiciones del cambiador de tomas, norma ntc 471, medición de la resistencia de devanados en todas las posiciones del cambiador de tomas, norma ntc 375, medición de resistencia de aislamientos (megger), mantenimiento tipo b a transformadores tipo secos, desenergización del transformador (a cargo del cliente), desconexión de los terminales de alta y baja tensión, desplazamiento de los residuos de polvo con aire ultra seco nitrógeno (aplica para transformadores secos, seccionadores y tableros), cableado y accesorio necesario para puesta en marcha en sitio, limpieza y ajuste general de los transformadores, ajuste de conexión de los taps del conmutador, conexión de los terminales de alta y baja tensión"	UND	1

6	"Mantenimiento correctivo y/o reparación de transformador media tensión (transformadores de 500 kva) incluye (rebobinar parte activa del transformador, secado de la parte activa del transformador, cambio del aceite dieléctrico, cambio de las empaquetaduras de los aisladores de alta y baja tensión, limpieza interior y exterior del tanque, pintura, filtro prensado y calentado del aceite, puesta en marcha en sitio)" accesorios y cableado para la energización y puesta en marcha: 27 ml cable 4/0 awg, 24ml cable 250mcm, 20ml cable 500mcm, 24ml cable 1/0 awg,16 terminales 4/0, 8 terminales 500mcm, 8 terminales 250mcm, 1 juego de premoldeados, 3 fusibles tipo ballesta.	UND	1
7	Iluminación de áreas comunes, (incluye suministro e instalación de 9 reflectores led de 400w, mantenimiento correctivo y preventivo de 12 reflectores metal hilide de 1000w existentes, cableado y accesorios: 12 kits para reflectores de 1000w m/h)	UND	1

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y anexos de material fotografico.
Evidencias en ( ) folios



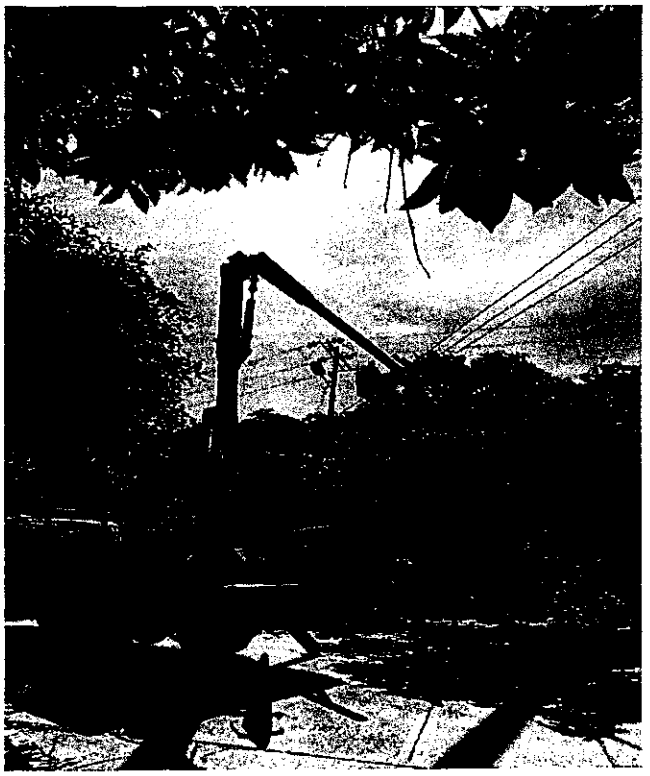

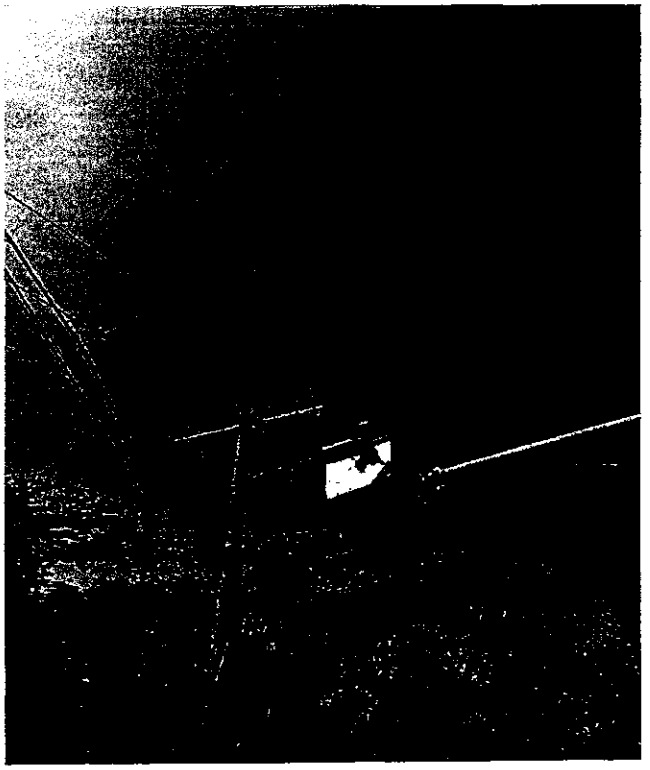





Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 – Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar


Email: servielectricferreteria@hotmail.com



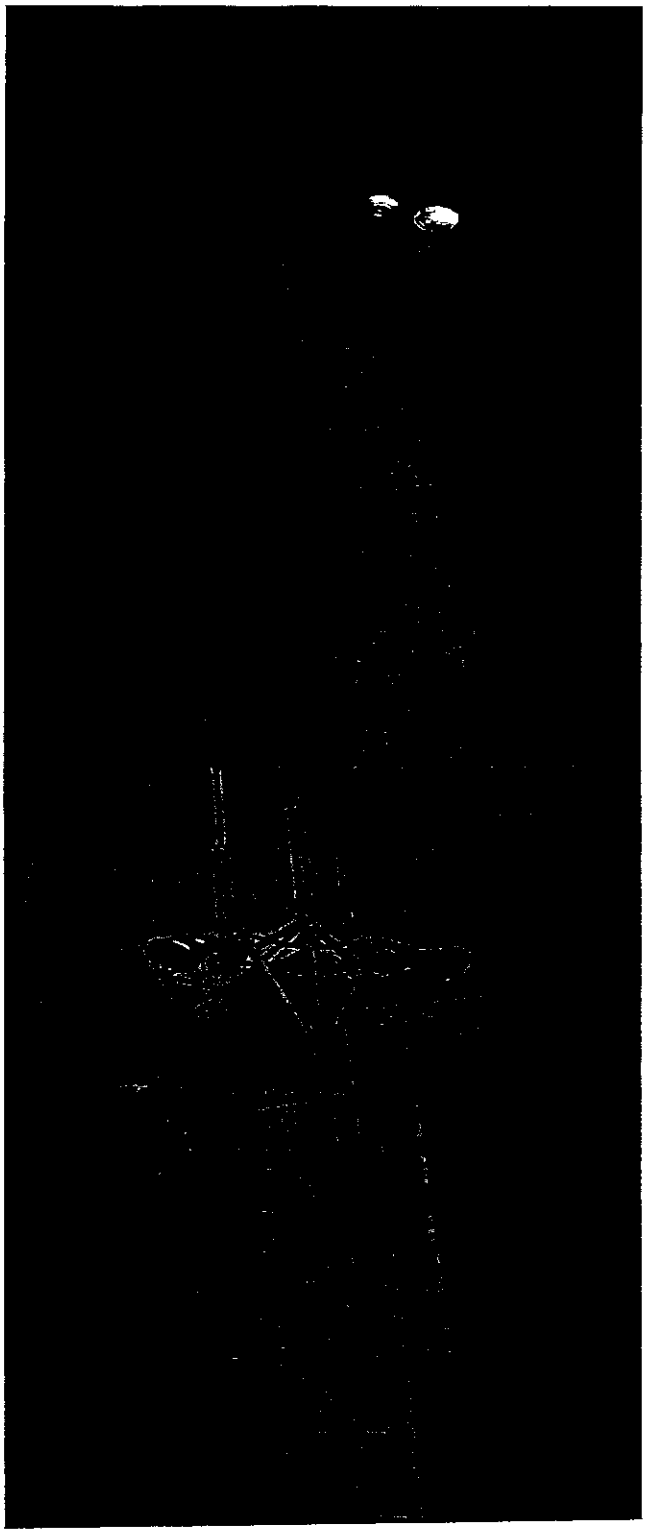


Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 – Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar
Email: servielectricferreteria@hotmail.com

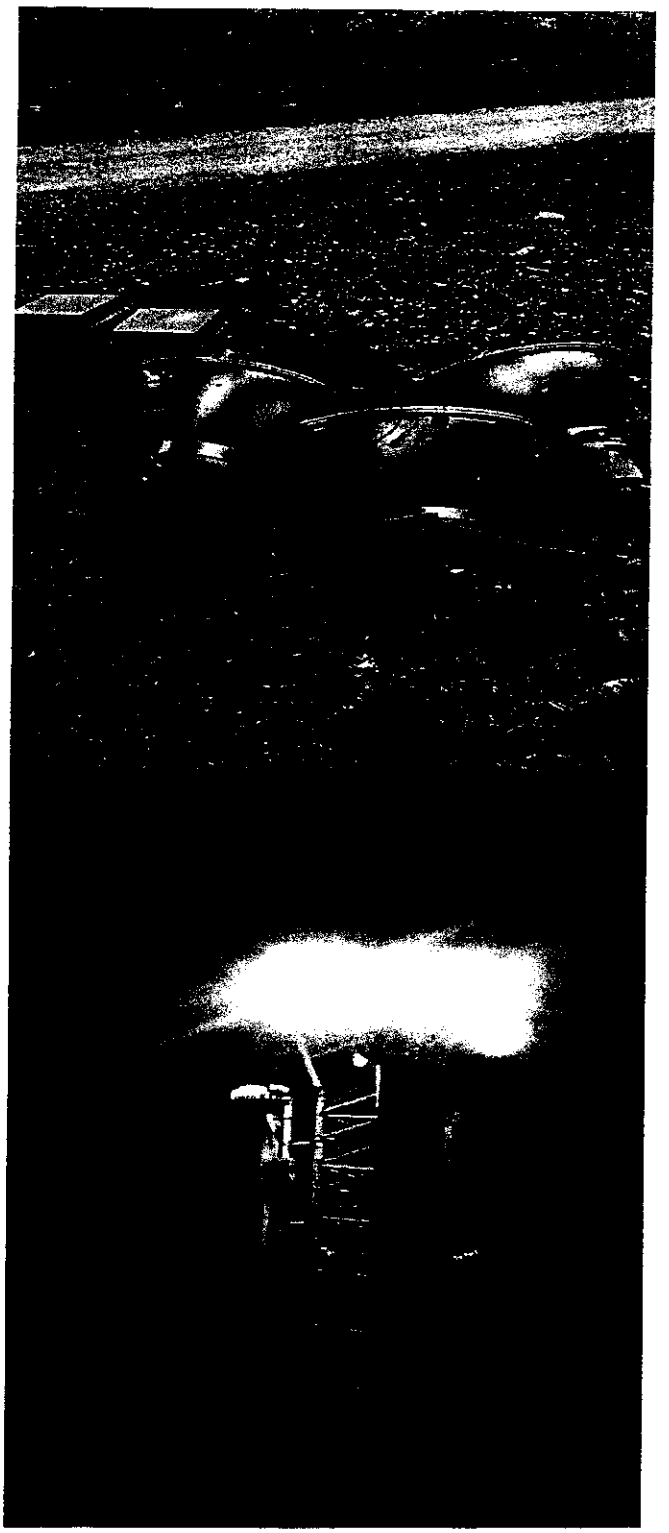

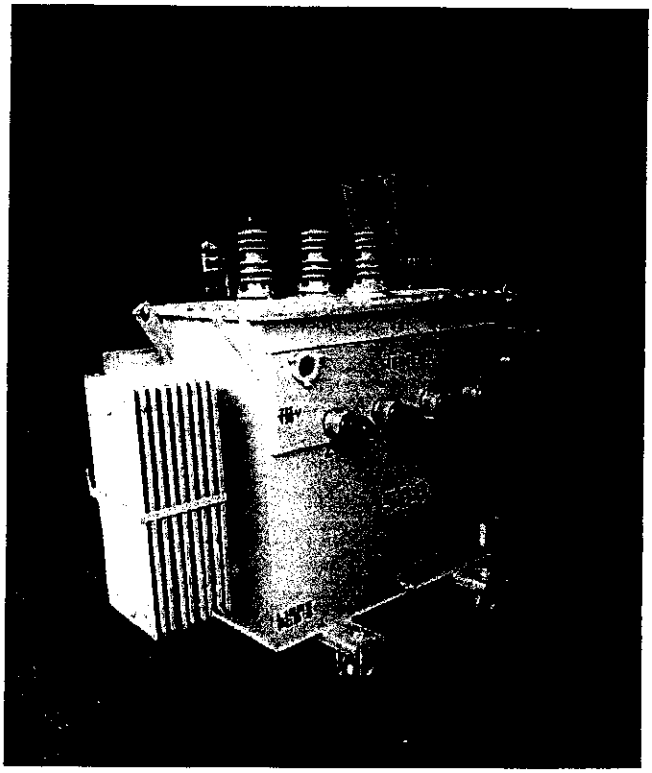


Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 -- Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar

Email: servielectricferreteria@hotmail.com

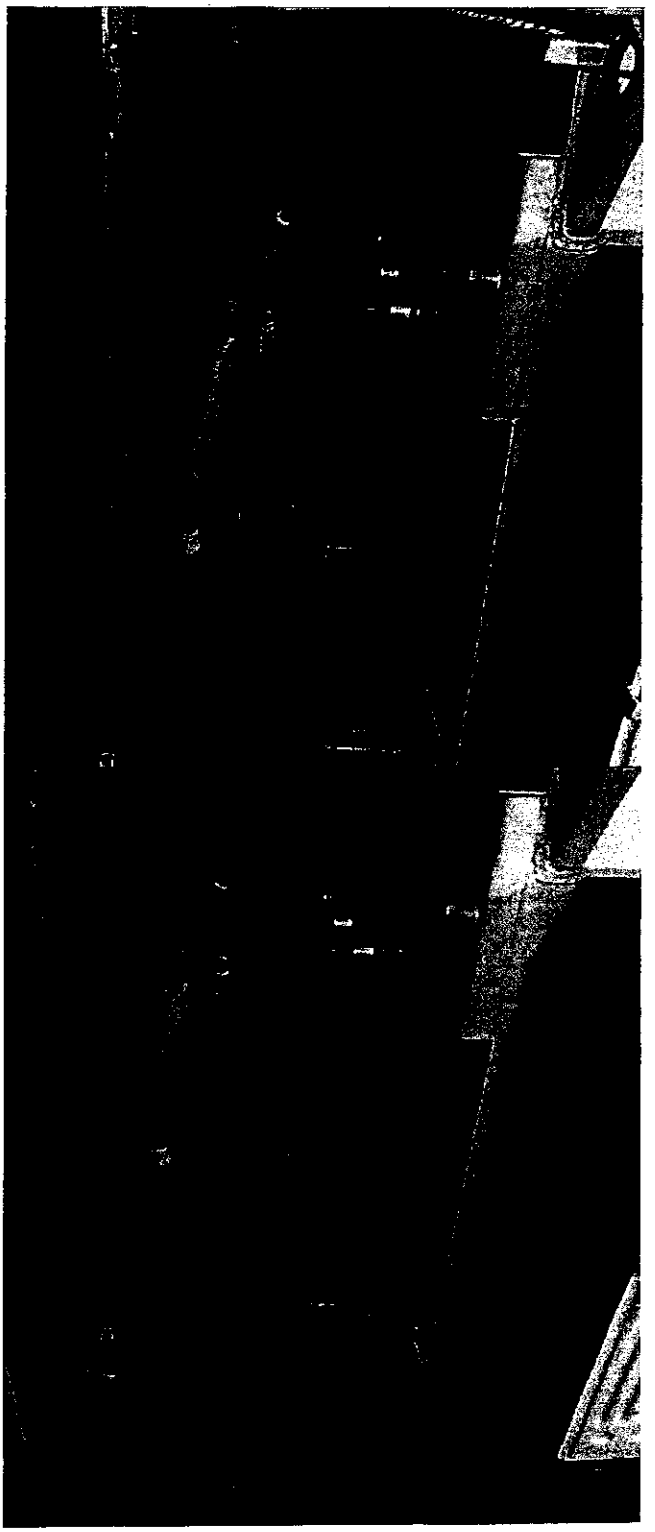

Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 – Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar

Email: servielectricferreteria@hotmail.com

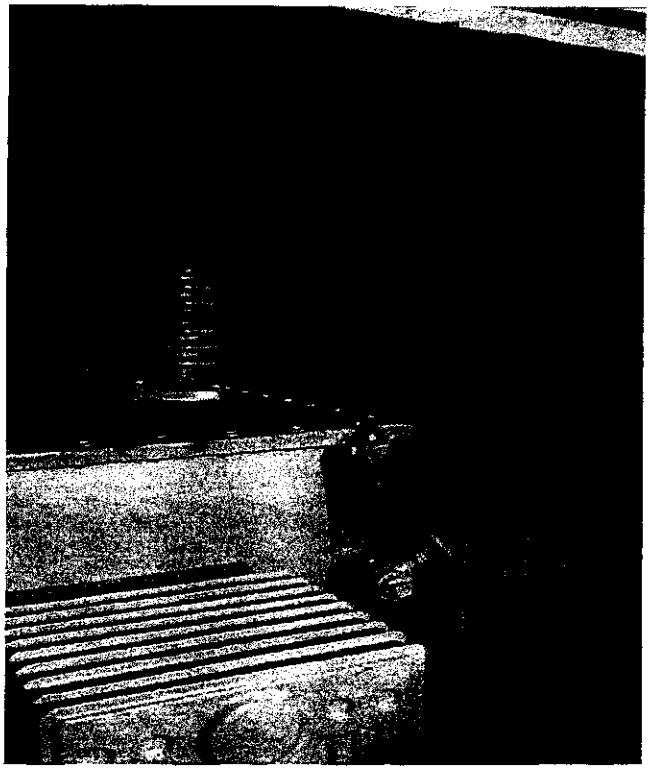

Cordialmente,

ADRIAN NIEVES IBARRA
CC 77016025
Contratista

Recibí a satisfacción:
Supervisor Contrato No. 1968-SGR DE 2023.

SERVIELECTRIC FERRETERIA

NIT. 77.016.025-4

MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

CERTIFICACIÓN PERSONA NATURAL

El Suscrito ADRIAN NIEVES IBARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.016.025 de Valledupar, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y cumplimiento al Sistema de Riesgos Laborales, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Certifico que: a la fecha de hoy he realizado el pago de los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses del calendario.

La presente se expide a los 23 días del mes de octubre de 2023, en la ciudad de Valledupar.

ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77.016.025

Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 – Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar
Email: servielectricferreteria@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77016025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIAN NIEVES IBARRA / SERVIELECTRIC FERRETERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 18 8-46 SECTOR CENTRO	TELÉFONO:	5742922
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	78885925B3		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		190642302

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.2
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800	$ 0	$ 185.8
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 742.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.400	$ 0	$ 742.4
SUBTOTALES:										$ 1.299.200	$ 0	$ 1.299.2

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPB005	EPB005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.4
EPB037	EPB037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 40.4
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 232.0
SUBTOTALES:													$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 324.8

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.7
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.7

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	7	$ 324.800	$ 0	$ 324.8
SUBTOTALES:			$ 324.800	$ 0	$ 324.8

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESIDENTE | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

INFORMACIÓN DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77016025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIAN NIEVES IBARRA / SERVIELECTRIC FERRETERIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 19 5-46 SECTOR CENTRO	TELÉFONO:	5742822
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7808592563	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		190842302

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	77016025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIAN NIEVES IBARRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 19 8 46 SECTOR CENTRO	TELÉFONO:	5742922
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7898597719**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			196876907

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 1.099.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.099.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 808.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 808.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 33.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 33.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.941.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO	**$ 1.941.800**

SERVIELECTRIC FERRETERIA

NIT. 77.016.025-4

MATERIALES ELECTRICOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

Valledupar, octubre 20 de 2023

Señores
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Atn. SECRETARIA DE HACIENDA
Valledupar

Cordial Saludo.

El objeto de la presente es para manifestarles que me acojo al del Decreto 000062 del 27 de enero del 2023, que reglamenta el recaud, se establece el mecanismo de retención y declaración de la estampilla procultura, adulto mayor y prouniversidad para que estos se descuenten en la cuenta.

- Estampilla pro – cultura 2%
- Estampilla Bienestar del adulto mayor 4%
- Estampilla pro- universidad 0.5%

Certifico el pago del impuesto Departamental.

Atentamente,

ADRIAN NIEVES IBARRA
C.C. 77.016.025 de V/par
Contratista

Calle 19 No. 8 – 46 Teléfono 5742922 – Cel. 3157282309 Valledupar - Cesar
Email: servielectricferreteria@hotmail.com
