| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |

| Acta Consecutivo No. | FAC-S-2023-086254-AG | Lugar y Fecha | Grupo Aereo del Casanare,23-11-2023 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Asunto** | Cambio Sensor pedal del freno vehiculo Oshkos P19 A GACAS | | |
| **Oficina Productora** | Oficina Seguridad Operacional | | |
| **Hora Inicio** | 07:00 | **Hora Finalización** | 16:00 |
| **Ausentes** | Ninguno | | |


**Orden del día:**

**Desarrollo:**

El día 23 de noviembre del presente año se realiza cambio del sensor de aire del pedal del freno del vehículo OSHKOS P19A de matrícula FAC 8H 063 asignado al Grupo Aéreo del Casanare, mencionado sensor presentaba fuga de aire lo que ocasionaba la descarga prematura del sistema neumático de la maquina por lo cual se informa de la novedad y se realizan todas las coordinaciones con el señor T3. CONTRERAS GONZALES CRISTIAN quien es la persona encargada del contrato 034-00-A-COFAC-DILOS-023 quedando corregido el problema.

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**

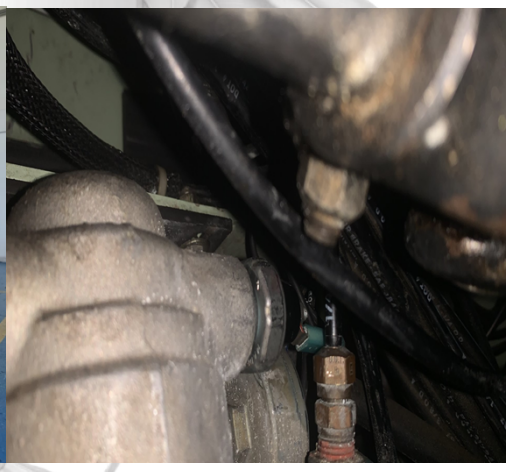

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |





| Actividades a Realizar | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** |
| N/A | N/A | N/A |

| Convocatoria Próxima Reunión | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema** | | | |
| **Fecha - Hora** | - | **Lugar** | |

Ayala Amaya

Teniente JEPHERSON LEONARDO AYALA AMAYA
Jefe Oficina Seguridad Operacional

FAC-S-2023-086254-AG



Técnico Tercero ROBINSON ALEJANDRO GARZON NOVOA
Técnico De Coordinación Operativo Bomberos Aeronáuticos

Técnico Primero JAMES OSWALDO ACOSTA ACOSTA
Técnico De Coordinación Operativo Bomberos Aeronáuticos

Elaboró: T3. GARZON / DESOP Revisó: Aprobó:T3. GARZON / DESOP

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |

| Acta Consecutivo No. | FAC-S-2023-088496-AG | Lugar y Fecha | CACOM-6, 16-12-2023 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Asunto** | Trabajos de mantenimiento FASE 2 y 3 vehículos de Bomberos CACOM-6 | | |
| **Oficina Productora** | OFSOP | | |
| **Hora Inicio** | 15:00 | **Hora Finalización** | 16:00 |
| **Ausentes** | N/A | | |

**Orden del día:**
Trabajos de mantenimiento FASE 2 y 3 vehículos de Bomberos CACOM-6

**Desarrollo:**
En el Comando Aereo de Combate No. 6, Se realiza la presente acta con el fin de dejar constancia de los trabajos de mantenimiento FASE 2 y FASE 3 de los siguientes vehículos de Bomberos asignados a la Unidad:

**Mantenimiento fase 2 vehículo PANTHER**
**De acuerdo a la orden de mantenimiento No. 100323286**

| Vehículo | Placa | ítem | Descripción de la Novedad |
|---|---|---|---|
| PANTHER 4X4 AT | DIN 343 | 2 | Cambio y suministro de aceite transmisión automática. (A todo costo). |
| | | 5 | Cambio y suministro de filtro de aceite transfer transmisión automática. (A todo costo). |
| | | 12 | Cambio y suministro del aceite diferencial delantero.(A todo costo). |
| | | 13 | Cambio y suministro de aceite diferencial trasero. (A todo costo). |
| | | 20 | Cambio y suministro de aceite hidráulico. (A todo costo). |
| | | 22 | Cambio y suministro filtro de aceite hidráulico. (A todo costo). |
| | | 36 | Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). |
| | | 45 | Cambio, suministro e instalación de (los) filtro(s) de aire del motor. (A todo costo) |
| | | 51 | Cambio y suministro e instalación filtro primario de combustible (trampa). (A todo costo). |
| | | 53 | Cambio y suministro e instalación filtro secundario de combustible. (A todo costo). |
| | | 56 | Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo). |
| | | 58 | Cambio y suministro filtro liquido refrigerante. (A todo costo). |
| | | 79 | Cambio y suministro de aceite bomba de agua. (A todo costo).. |

FAC-S-2023-088496-AG



**Mantenimiento fase 3 vehículo PANTHER**

**De acuerdo a la orden de mantenimiento No. 100323334**

| Vehículo | Placa | ítem | Descripción de la Novedad |
|---|---|---|---|
| PANTHER 4X4 AT | DIN 343 | 9.2.26 | Cambio, Suministro e instalación baterías. (A todo costo). |
| | | 8.1.12 | Cambio, Suministro e instalación tanques de aire. (A todo costo). |
| | | 8.1.13 | Cambio, Suministro e instalación Tanque de acumulación rápida. (A todo costo). |
| | | 7.1.43 | Reparación total de fugas de aire sistema freno delantero. (A todo costo). |
| | | 7.1.46 | Reparación total de fugas de aire sistema freno trasero (A todo costo). |
| | | 8.1.44 | Cambio, Suministro e instalación válvula de retención simple en línea. (A todo costo). (03 Unidades) |
| | | 16.1.19 | Cambio, suministro e instalacion de la perilla de regulacion de presion/revoluciones del sistema de extincion de incendios panel estructural (A todo costo) |
| | | 8.1.26 | Cambio, Suministro e instalación mangueras tubin teflón de 5/8" sistema extinción y frenos. (A todo costo). |
| | | 8.1.39 | Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo). |
| | | 2.1.59 | Soldadura lamina de acero lisa. (A todo costo). |
| | | 8.1.35 | Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas drenaje de los tanques de aire (tipo presión). (A todo costo). |
| | | 8.1.14 | Cambio, Suministro e instalación tendido total de mangueras sistema extinción. (A todo costo). |
| | | 8.1.29 | Cambio, Suministro e instalación válvula de acople rápido. (A todo costo). (40 unidades) |
| | | 16.1.30 | Reparación general dosificador de espuma. (A todo costo). |
| | | 16.3.34 | Cambio, Suministro e instalación válvula tipo mariposa 4'. (A todo costo). |
| | | 16.3.37 | Cambio, Suministro e instalación actuador neumático para válvula 3'. (A todo costo). |
| | | 16.3.34 | Cambio, Suministro e instalación válvula tipo mariposa 4'. (A todo costo). |
| | | 16.3.37 | Cambio, Suministro e instalación actuador neumático para válvula 3'. (A todo costo). |
| | | 16.3.4 | Reparación todas las válvulas de bola sistema de extinción de incendios P.Q.S. (A todo costo). |
| | | 9.5.37 | Reparación electroválvulas. (A todo costo). |
| | | 8.1.37 | Corrección de fugas de aire. (A todo costo). |
| | | 9.2.15 | Cambio, Suministro e instalación interruptor de presión de aire. (A todo costo). |
| | | 9.3 | Cambio, Suministro e instalación luces exploradoras. (A todo costo). |
| | | 9.3.7 | Cambio, Suministro e instalación bombillos unidades frontales del vehículo. (A todo costo). (02 unidades) |

FAC-S-2023-088496-AG



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 9.3.9 | Cambio, Suministro e instalación unidades direccionales delanteras del vehículo tipo led. (A todo costo). |
| | | 9.3.31 | Cambio, Suministro e instalación luces de identificación tipo led. (A todo costo). (04 unidades) |
| | | 16.1.74 | mantenimiento aspersores bajo camión. (A todo costo). |
| | | 9.5.77 | Reparación caja y componentes eléctricos luz telescópica. (A todo costo). |
| | | 9.3.51 | Mantenimiento WINCH. (A todo costo). |
| | | 9.3.55 | Reparación del sistema eléctrico del WINCH. (A todo costo). |
| | | 16.1.46 | Mantenimiento torreta de techo. (A todo costo). |
| | | 16.1.60 | Mantenimiento torreta de bomper. (A todo costo). |
| | | 2.2.30 | cambio, suministro e instalacion seguro en caucho y punto de sujecion del tanque de espuma. (A todo costo). |
| | | 2.2.31 | cambio, suministro e instalacion seguro en caucho y punto de sujecion del tanque de agua. (A todo costo). |
| | | 2.2.32 | cambio, suministro e instalacion seguro en caucho y punto de sujecion de puerta de acceso al motor. (A todo costo). |
| | | 7.1.15 | Cambio y Suministro e instalación juego de cámaras de freno trasero. (A todo costo). |
| | | 7.1.20 | Cambio y Suministro e instalación juego de cámaras de frenado delantero. (A todo costo). |
| | | 10.1.16 | Cambio, Suministro e instalación todas las correas del motor. (A todo costo). |
| | | 9.3.5 | Cambio, Suministro e instalación dos unidades con bombillo frontales. (A todo costo). (02 Unidades) |
| | | 1.15.1 | Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). |









FAC-S-2023-088496-AG






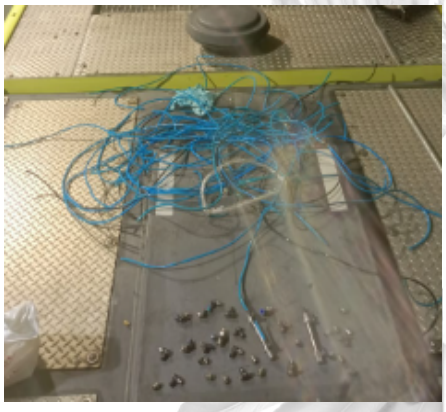


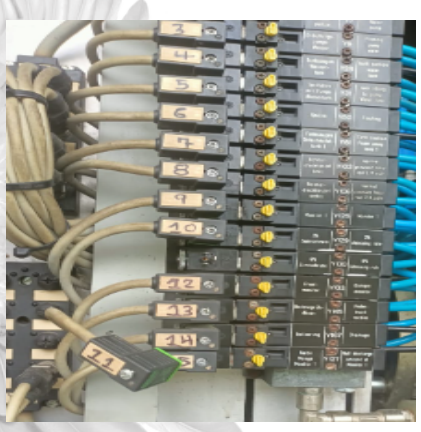




FAC-S-2023-088496-AG



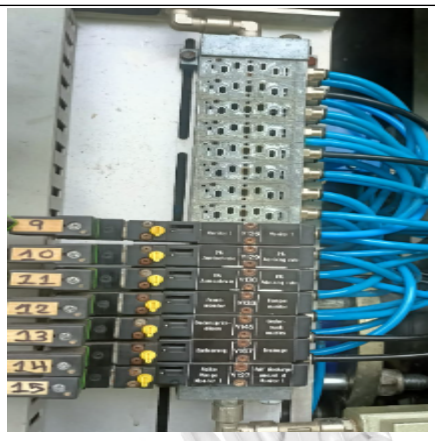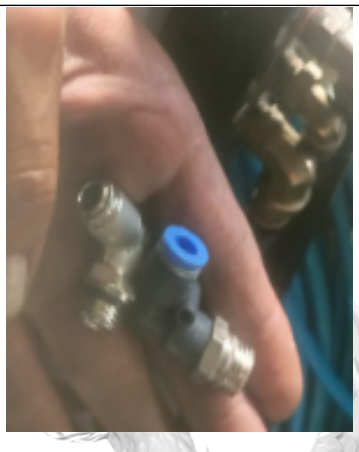



SIC ITUR AD ASTRA

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |














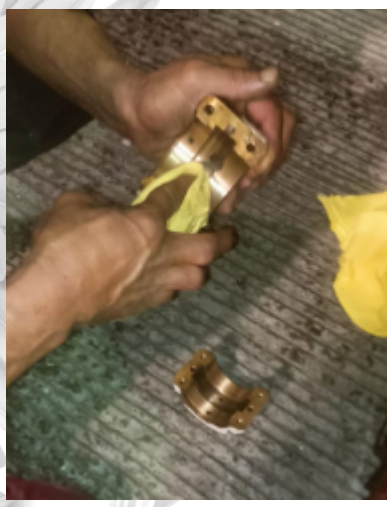

SIC ITUR AD ASTRA


FAC-S-2023-088496-AG










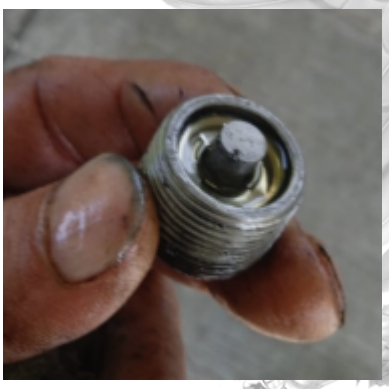



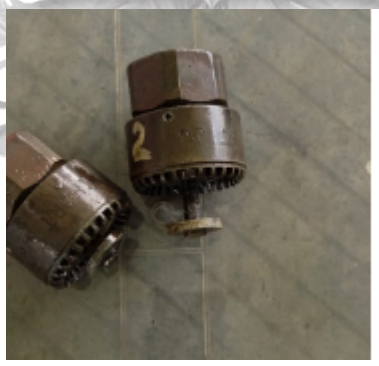

FAC-S-2023-088496-AG
















SIC ITUR AD ASTRA


FAC-S-2023-088496-AG









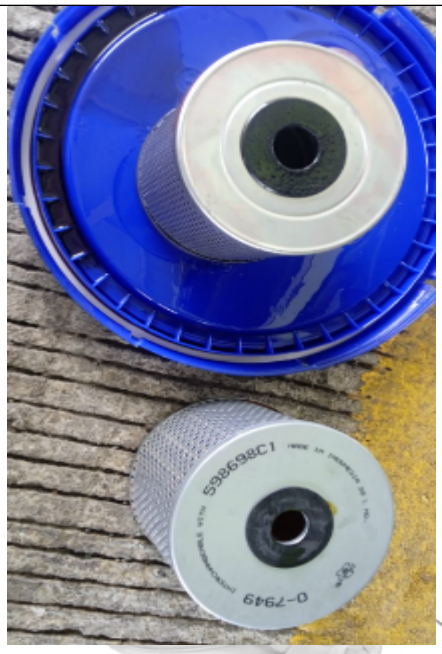

5986981
0-7949


PIX-FORCE
6PK1462


PIX-FORCE
6PK1462

FAC-S-2023-088496-AG











FAC-S-2023-088496-AG











SIC ITUR AD ASTRA





**DATOS DEL VEHICULO.**
Marca: RosenbauerTipo: Panther 4x4
Modelo: 2010
Registro FAC: 4-9024
Placa civil:DIN-343
No. Motor: 35270472No.
Chasis: 1R94ND58XAW490546
Kilometraje:6400
Horas motor: 3504

Del mismo modo se deja constancia de los trabajos de Mantenimiento del vehiculo Kodiak relacionados a continuación:

**Mantenimiento fase 2 vehículo Kodiak**
**De acuerdo a la orden de mantenimiento No. 100323283**

| Vehículo | Placa | ítem | Descripción de la Novedad |
|---|---|---|---|
| KODIAK | SLE 050 | 36 | Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). |
| | | 13 | Cambio y suministro de aceite diferencial trasero. (A todo costo). |
| | | 20 | Cambio y suministro de aceite hidráulico. (A todo costo). |
| | | 56 | Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo). |
| | | 48 | Cambio y suministro e instalación filtro(s) de combustible. (A todo costo). |
| | | 62 | Cambio y suministro e instalación filtro de aire motor. (A todo costo). |
| | | 64 | Cambio y suministro e instalación filtro interno de aire. (A todo costo). |

FAC-S-2023-088496-AG



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 8 | Cambio y suministro de aceite transmisión mecánica. (A todo costo). |
| | | 94 | Cambio y suministro e instalación de aceite y filtros del motor. (A todo costo). |
| | | 87 | Cambio y suministro e instalación filtro de aceite motor. (A todo costo). |
| | | 83 | Cambio y suministro e instalación filtro de aire. (A todo costo). |
| | | 73 | Cambio y suministro e instalación filtro de combustible. (A todo costo). |
| | | 89 | Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo). |

**Mantenimiento fase 3 vehículo Kodiak**

**De acuerdo a la orden de mantenimiento No. 100323341**

| Vehículo | Placa | ítem | Descripción de la Novedad |
|---|---|---|---|
| CHEVROLE T KODIAK | SLE 050 | 1.15.4 | Cambio y Suministro de tornillería brazos limpiaparabrisas. (A todo costo). (02 unidades) |
| | | 1.15.1 | Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). |
| | | 8.1.26 | Cambio, Suministro e instalación mangueras tubin teflón de 5/8" sistema extinción y frenos. (A todo costo). |
| | | 7.1.43 | Reparación total de fugas de aire sistema freno delantero. (A todo costo). |
| | | 7.1.46 | Reparación total de fugas de aire sistema freno trasero (A todo costo). |
| | | 8.1.44 | Cambio, Suministro e instalación válvula de retención simple en línea. (A todo costo). |
| | | 8.1.35 | Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas drenaje de los tanques de aire (tipo presión). (A todo costo). |
| | | 8.1.45 | Cambio, Suministro e instalación válvula relay. (A todo costo). |
| | | 7.1.39 | Cambio, Suministro e instalación válvula relay frenos traseros. (A todo costo). |
| | | 7.1.45 | Reparación parcial de fugas de aire sistema freno trasero (A todo costo). |
| | | 16.1.15 | Cambio, Suministro e instalación manguera Carretel para agua de 1-1/2" x 30m. (A todo costo). |
| | | 92 | Cambio y suministro e instalacion del cableado con condiciones de pérdida de material de aislamiento. (A todo costo). |
| | | 9.2.26 | Cambio, Suministro e instalación baterías. (A todo costo). |
| | | 1.3.1 | Cambio y/o ajuste pantallas, testigos de indicación. (A todo costo). |
| | | 1.4.4 | Cambio y Suministro e instalación bombilleria tablero de instrumentos. (A todo costo). |
| | | 9.1.1 | Reparación parcial sistema eléctrico. (A todo costo). |
| | | 9.4.2 | Reparación instalación eléctrica luces de emergencia de techo y laterales. (A todo costo). |

FAC-S-2023-088496-AG



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 9.2.28 | Cambio, Suministro e instalación bornes para baterías. (A todo costo). |
| | | 9.5.43 | Cambio y Suministro instalación total de luces del sistema de extinción de incendios. (A todo costo). |
| | | 9.5.66 | Cambio, Suministro e instalación switch de encendido motor de arranque sistema extinción de incendios. (A todo costo). |
| | | 16.3.45 | Mantenimiento carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo). |
| | | 9.2.26 | Cambio, Suministro e instalación baterías. (A todo costo). |










SLE 056







FAC-S-2023-088496-AG









| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |



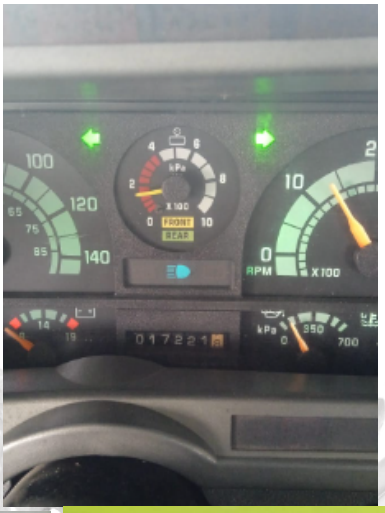




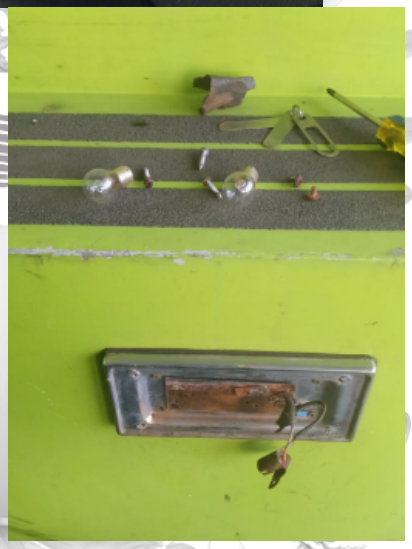

SIC ITUR AD ASTRA



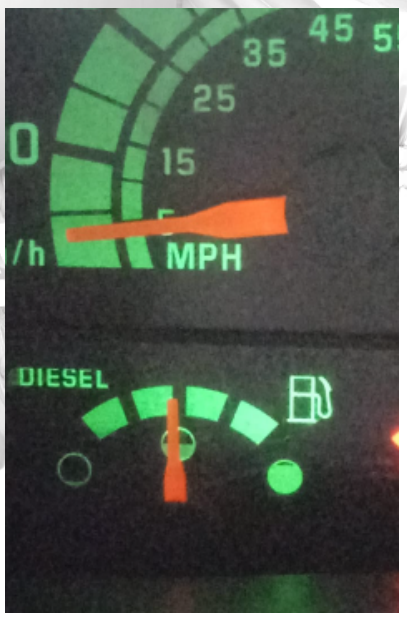



45
35
25
0
15
/h
MPH
DIESEL



FAC-S-2023-088496-AG








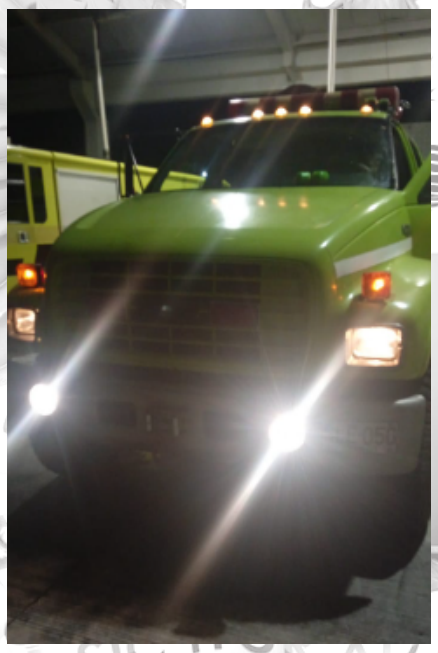


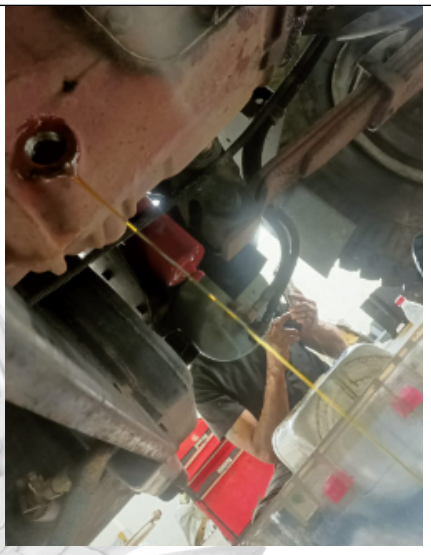


BALDWIN
MANN FILTER

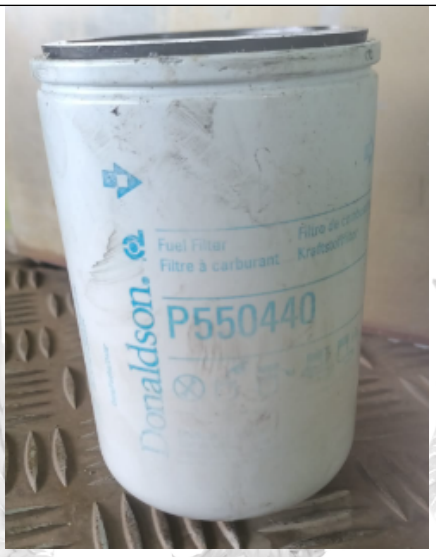

Donaldson
P550440
Fuel Filter
Filtre à carburant

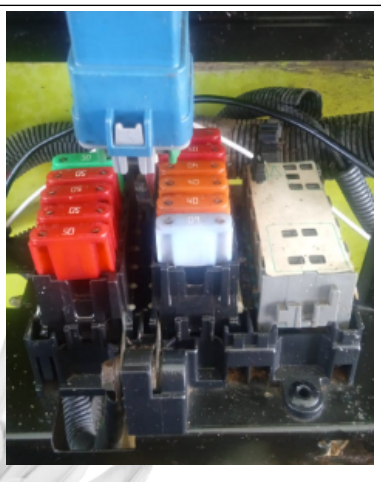
B329








FAC-S-2023-088496-AG














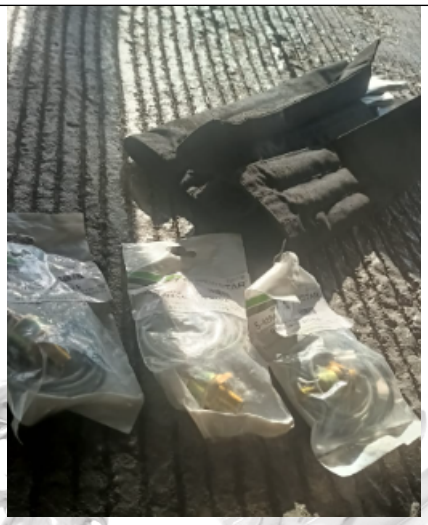

**Datos del vehículo:**
Marca: Chevrolet.
Tipo: Kodiak.
Modelo: 2008.
Registro FAC: 9-6889.
Placa civil: SLE-050.
No. Motor: 9SZ36437
No. Chasis: 9GDP7H1C28B008017.
Kilometraje: 17387
Horas motor: 12150

Para finalizar se deja constancia de los trabajos de mantenimiento del vehículo Ford Duty relacionados a continuación:
De acuerdo a la orden de mantenimiento No. 100323343

| Vehículo | Placa | ítem | Descripción de la Novedad |
|---|---|---|---|
| FORD SUPER DUTY 350 | CES 844 | 9.1.59 | Cambio y Suministro llave de encendido. (A todo costo). |

FAC-S-2023-088496-AG

















| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |

**ATOS DEL VEHICULO.**
Marca: FORD 350 SUPER DUTY
Modelo: 2010
Registro FAC: 9-7123
Placa civil: CES 844
No. Motor: N/A
No. Chasis: 1FTWW3DR7AEA74619
Kilometraje 53.609
Horas motor: 8.018

Nota: los trabajos fueron realizados, por los señores Iván Alexander Tejada Sánchez con numero de Cedula CC 79865583, y el señor Giankarlo Pérez Cárdenas Numero de cedula CC 1030645034 de la empresa William Sarmiento SA.

| **Actividades a Realizar** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** |
| | | |
| | | |

| **Convocatoria Próxima Reunión** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema** | | | |
| **Fecha - Hora** | - | **Lugar** | |

Teniente FRANK STIVEN ESCOBAR FONSECA
Especialista Investigación de Seguridad Operacional

FAC-S-2023-088496-AG



Técnico Segundo ANDRES GUILLERMO ZEA PEREZ
Técnico De Coordinación Operativo Bomberos Aeronáuticos




Elaboró: T2. ZEA / DESOP Revisó: Aprobó:T2. ZEA / DESOP

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-AYUGE-FR-021 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA GENERAL | Versión N°: | 3 |
| | | Vigencia: | 25-08-2023 |

| Acta Consecutivo No. | FAC-S-2023-088641-AG | Lugar y Fecha | Estación de Bomberos CACOM-4,01-12-2023 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Asunto** | Mantenimiento Preventivo y Correctivo vehículos ITURRI N°11 y N°12 CACOM-4. | | |
| **Oficina Productora** | OFSOP | | |
| **Hora Inicio** | 09:00 | **Hora Finalización** | 17:00 |
| **Ausentes** | N/A | | |

**Orden del día:**
- Mantenimiento Preventivo y Correctivo vehículos ITURRI N°11 y N°12.

**Desarrollo:**

Siendo los días, miércoles 29, jueves 30 de noviembre y viernes 01 de diciembre de 2023, hace presencia a la Estación de Bomberos del Comando Aéreo de Combate N°4, los señores, GIANKARLO PÉREZ CARDENAS, NELVIS DAEL SEMPRUN PEREZ y MILLER CAICEDO MURILLO, representantes de la compañía WILLSAR FIRE S A S, empresa contratista en realizar mantenimiento automotriz.

De acuerdo con las novedades presentadas por el vehículo ITURRI N°12 FAC 8 – H0848, se inicia el mantenimiento preventivo y correctivo, donde se realizaron los siguientes trabajos:

- Cambio y suministro filtro secador de aire.
- Cambio, suministro e instalación de aceite y filtros del motor.
- Cambio, suministro e instalación de los filtros de combustible del motor.
- Cambio, suministro e instalación de los filtros de aire del motor.
- Suministro e instalación de platinas en la base del soporte del agente extintor PQS.












Gewechselt am:
Date of change:
YEAR
Trockenmittelbehälter
Dryer reservoir
81.52155-0043
Made in Czech Republic

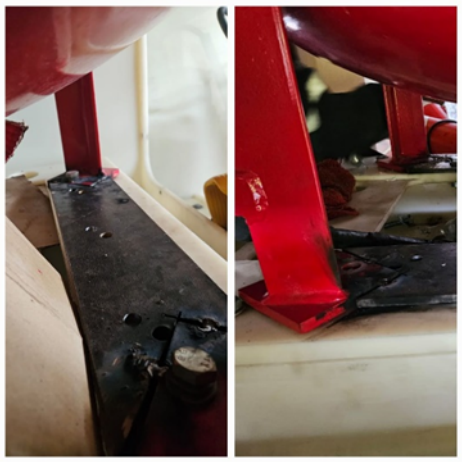

De acuerdo con las novedades presentadas por el vehículo ITURRI N°11 FAC 8 – H0839, se inicia el mantenimiento preventivo y correctivo, donde se realizaron los siguientes trabajos:

- Cambio y suministro filtro secador de aire.
- Cambio, suministro e instalación de aceite y filtros del motor.
- Cambio, suministro e instalación de los filtros de combustible del motor.
- Cambio, suministro e instalación de los filtros de aire del motor.
- Suministro e instalación de platinas en la base del soporte del agente extintor PQS.




WABCO









FAC-S-2023-088641-AG







Fin de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de bomberos de CACOM-4.

| **Actividades a Realizar** | | |
|---|---|---|
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** |
| | | |
| | | |

| **Convocatoria Próxima Reunión** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tema** | | | |
| **Fecha - Hora** | - | **Lugar** | |



Capitán JULIO ANDRES MEDINA RESTREPO
Especialista Investigación de Seguridad Operacional



Técnico Segundo EDWARD ROBERTO ROA ROA
Técnico De Coordinación Operativo Bomberos Aeronáuticos



Aerotécnico JULIAN CAMILO PEREZ RODRIGUEZ
Técnico Equipo y Material Bomberos Aeronáuticos

Elaboró: AT. PEREZ / DESOP Revisó: Aprobó:AT. PEREZ / DESOP
