"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			3		
1.2. Período del informe	Del	28/10/2023			
	Al	24/11/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RO-0021	Fecha	18/08/2023	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINIA/VAUPES Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS					
1.5. Nombre del contratista					
BERMORI GRANADA VALENCIA					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
76.325.377			granvalingenieria@gmail.com		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
CALLE 3 No. 6-80 Buenaventura (Valle del cauca)			315 - 497 - 0774		
1.10. Fecha de Inicio			31/08/2023		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)			SI APLICA		N/A

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*	
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)	
EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL	
2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO – ORINOQUIA – SECCION BIENES, SOPORTE Y APOYO ADMINISTRATIVO	**608 6611990 ext. 85019**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2.4. Correo electrónico	**orlando.fernandez@fiscalia.gov.co**

2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)

N/A

2.6. Dependencia	**2.7. N° Extensión o teléfono**
N/A	N/A

2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 400.000.000	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras ○ SI ◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A		
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
4723	2023-02-06

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
218833	2023-08-18

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	N/A

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/10/2023	$ 400.000.000,00	$ 0	$ 0	$ 400.000.000,00
27/10/2023	$ 400.000.000,00	$ 0	$149.999.803,63	$ 250.000.196,37
24/11/2023	$ 400.000.000,00	$ 149.999.803,63	$ 79.299.885,93	$ 170.700.310,44

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales N/A

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).N/A

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	57,32%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	66,00%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 23/11/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

01 Recibo Satisfacción de Noviembre
03 Facturas BGV94; BGV95; BGV97 y BGV98
04 Factura BGN96
05 Nota Crédito 4 A Factura BGN96
06 Certificación de pago de parafiscales 23/11/2023
08 Soporte pago de Seguridad Social 2023 Bermori Granada Valencia

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

09 Soporte pago de Daniel Londoño G- Octubre 2023
10 Soporte pago de Erika Londoño - Octubre 2023
11 Acta de Reunión 2 Mantenimiento de sedes
13 Acta de Reunión 3 Mantenimiento de sedes
15 Comunicado 30940-0723 permisos a personal.
16 comunicado 30940-0731 permisos a personal.
17 Planilla Seguridad social de Personal de obra
18 Soporte pago de Personal Obra

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A

Tipo y detalle del informe:	Acta de obra 02 y Memorias de cálculo obras.

5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Se realizan las siguientes actividades durante la ejecución del contrato.
Seguimiento 2023/11/02

No	SEDE	OBERVACIONES
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Detalles de instalación de piso de garaje, revisión de espejos, , se adiciona arreglo de canal bajante dañada.
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Verificación correcta de instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED
3	CAIVAS KR 37 34 108	Revisión de Divisiones en vidrio en piso 2 y 3
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	Revisión de división DryWall y techo en PVC
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Revisión instalación de recepción de recibo de documentos ventanilla única
6	SEDE SAN JOSÉ DE GUAVAIRE	Revisión de Divisiones en vidrio y puerta en vidrio

Seguimiento 2023/11/10

No	SEDE	OBERVACIONES
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Detalles de instalación de piso de garaje, revisión de espejos, se adiciona arreglo de canal bajante dañada. Se verifica las cantidades y se ajustan para elaboración de acta 2.
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Verificación correcta de instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED. Se hizo revisión de la instalación y correcto funcionamiento. No hay observaciones.
3	CAIVAS KR 37 34 108	Revisión de Divisiones en vidrio en piso 2 y 3.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

		Se encontró un error en el ítem utilizado para realizar el acta 1, se realiza el ajuste con el ítem complementario de acuerdo a lo revisado y recibido.
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	Revisión de división DryWall y techo en PVC. Se revisa iluminación y puerta que este funcional Se hacen observaciones sobre iluminación que serán atendidas y revisadas el miércoles 15/11/2023.
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Revisión instalación de recepción de recibo de documentos ventanilla única. Se hace verificación de la correcta funcionalidad de la puerta recibida.
6	SEDE SAN JOSÉ DE GUAVAIRE	Revisión de Divisiones en vidrio y puertas en vidrio. Se identifica error en el ítem 11.4 utilizado para el acta 1. Se deben distribuir en los ítems 11.3 y 11. 4 Se realiza la verificación en sitio de la correcta funcionalidad de lo recibido. Se adiciona la necesidad de una división en vidrio templado en la oficina de Apoyo a la administración. Se requiere la garantía de puerta metálica. Se evidencia la necesidad de persiana en aluminio.
7	Se entregan documento de necesidades en Vichada.	El contratista evaluara las necesidades para presentar una propuesta.

Se realiza registro de grafico que permite hacer seguimiento a intervenciones.

Se autoriza el ingreso de personal a las sedes para efectos de diagnostico inspección y levantamiento de información, se verifica los certificados de alturas y ARL.

Se presenta factura BGV94 y se hace nota crédito.

Se tramita con la facturación para pago de los servicios**.**

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

MALO	REGULAR	BUENO	N/A
○	○	○	◉

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

FIRMA RESPONSABLES



Interventor(es) / Supervisor (es)

Nombre	Cédula

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Eddie Orlando Fernandez Gil			17.335.913
Ciudad	Villavicencio	**Fecha**	24/11/2023

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	**Eddie Orlando Fernandez Gil.**		**24/11/2023**
Revisó	**Eddie Orlando Fernandez Gil.**		**24/11/2023**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RO-21 **VIGENCIA** 2023

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BERMORI GRANADA VALENCIA

CÉDULA O NIT C.C. 76.325.377

CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO granvalingenieria@gmail.com

PERIODO DEL SERVICIO: Del 27 octubre al 24 noviembre de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINIA/VAUPES Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

PLAZO DE EJECUCIÓN Del 04 septiembre al 31 diciembre de 2023

CONCEPTO DE PAGO:
(Según clausula forma de pago) Se realizarán PAGOS MENSUALES de acuerdo con los mantenimientos realizados y recibos a satisfacción por parte del SUPERVISOR, en concordancia con los proyectos y solicitudes realizados por la Fiscalía General de la Nación, previa presentación de la factura correspondiente y certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato hasta agotar el presupuesto asignado.

Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:

Factura	Valor
BGV94	$ 53.108.722,24
BGV95	$ 2.159.175,92
BGV97	$ 21.438.751,25
BGV98	$ 2.593.236,52
	$ 79.299.885,93

VALOR A PAGAR: $ 79.299.885,93

			DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No** 37-44-101041452	Fecha:	18/08/2023		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No** 218833	Fecha:	18/08/2023	Vr. $	79.299.885,93
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.** 218833	Fecha:	18/08/2023	Vr. $	400.000.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO: Eddie Orlando Fernandez Gil

No. CÉDULA DEL SUPERVISOR: 17335913

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL DE GESTIÓN III

DEPENDENCIA: SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO C **TEL. Ext.:** 608 6611990 ext. 85019

CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR orlando.fernandez@fiscalia.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR  **FECHA:** 23/11/2023

OBSERVACIONES: N/A

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 94

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META; SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2023	25/11/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	52.859.713,67

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**43.685.713,78**
SUBTOTAL	**52.859.713,67**
IVA UTILIDAD	**249.008,57**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.108.722,24**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	6.552.857,07	15,00
Imprevistos	1.310.571,41	3,00
Utilidad	1.310.571,41	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2023 21:59:37

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 0bfe6b40aa813997ad9c91adcaf077a315a045efc8638cc2dd7d059d1929b1f019a82a12a14fa48b34f62387884dc3ea--Expedición:24/11/2023 10:12 PM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 95

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2023	24/12/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	2.149.052,29

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**1.776.076,27**
SUBTOTAL	**2.149.052,29**
IVA UTILIDAD	**10.123,63**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.159.175,92**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	266.411,44	15,00
Imprevistos	53.282,29	3,00
Utilidad	53.282,29	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2023 22:34:03

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

CUFE: 2ac9359b9a8c3952b9ada0678d812e26201cd75ec403b28aa4b517eccd052ae00baaadefa0d81f4d5d67c55549c1517b--Expedición:24/11/2023 10:52 PM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 97

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE EL RETORNO - GUAVIARE; SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2023	25/11/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE EL RETORNO - GUAVIARE SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	21.338.232,30

Total líneas o ítems: 1

COSTO DIRECTO	**17.634.902,73**
SUBTOTAL	**21.338.232,30**
IVA UTILIDAD	**100.518,95**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**21.438.751,25**

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	2.645.235,41	15,00
Imprevistos	529.047,08	3,00
Utilidad	529.047,08	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2023 23:01:48

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 9ca4ebb91b826b9e8c90ca661ef4ea34cddcdf61d779fb3d9c0c8478aab8e0c8b2d69e0d11b0f1b053c1d53338781289--Expedición:24/11/2023 11:41 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 98

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE; SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2023	25/11/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	2.581.077,72

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**2.133.122,09**
SUBTOTAL	**2.581.077,72**
IVA UTILIDAD	**12.158,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.593.236,52**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	319.968,31	15,00
Imprevistos	63.993,66	3,00
Utilidad	63.993,66	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2023 23:52:40

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

C.C. 17.335.913
Recibido Eddie Orlando Fernandez Gil

CUFE: 5a2cf72fd703a4130b0701359298d9403db6e8ac1d1f15ec023c4b27c05aaf270ddf43ecc9f9611d4ba97b03fcccca05--Expedición:25/11/2023 12:02 AM

GRANVAL INGENIERIA

Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 96

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764049461739 que habilita desde BGV 69 hasta BGV 100. Vence 2023-11-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

CLIENTE	**FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META**
NIT	800187645 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204

POR CONCEPTO DE

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 - SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE; SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/11/2023	25/11/2023	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE URI - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS" #$29-01-01-L23;FGN-RO-0021-2023;orlando.fernandez@fiscalia.gov.co#$	2.581.077,73

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**2.133.122,09**
SUBTOTAL	**2.581.077,73**
IVA UTILIDAD	**12.158,80**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.593.236,52**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	319.968,31	15,00
Imprevistos	63.993,66	3,00
Utilidad	63.993,66	3,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/11/2023 22:55:15

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

CUFE: c86d8c773ed355063d97e9476d2176211e9480a807273d2d1a67082d7e5fdcc68c29df6e504201e6524d443283be68b8--Expedición:24/11/2023 10:59 PM

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

PNCA No. 4

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 - 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META			**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800187645 5			DEVOLUCION FACTURA No BGV 96	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		**Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:**	
CL 34 41 73	Villavicencio	6823204		2. Anulación de factura electrónica	
FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**			**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/11/2023	25/11/2023			BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0060	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 - SEDE URI - SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS"	1	Und.	2.581.078	19%	12.159	2.581.078

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**2.581.078**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.159**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.593.237**
RETEFUENTE	**51.622**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.541.615**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 24/11/2023

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: BGV 96

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 24/11/2023 10:59:44 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
c86d8c773ed355063d97e9476d2176211e9480a807273d2d1a67082d7e5fdcc68c29df6e504201e6524d443283be68b8

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico

bermori@yahoo.com

CUDE: 4331441e7a2febc7ce293e17fbedc39c4b2a05a1975b80dfad45b792960796a1146c21d3cefd7623c329f1978de3556f--Expedición:24/11/2023 11:48 PM

EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA
CONTADOR PÚBLICO
NIT 66.743.601 - 5
CR 80 No. 5 - 40 TEL. 2431840 - 3154932250
BUENAVENTURA

Yo, **EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA**, con la cedula de ciudadanía no. 66.743.601 Exp. Btura, en uso de las facultades conferidas por la Junta Central de Contadores de Colombia.

CERTIFICO

Que el señor **BERMORI GRANADA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.325.377 expedida en Popayán, se encuentra a PAZ y SALVO con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias y modificatorias) en los periodos correspondientes a los últimos seis (6) meses.

Que en constancia de lo anterior se firma el presente documento en la ciudad de Buenaventura a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año 2023.

EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA
Contadora Pública TP 183435-T

BERMORI GRANADA VALENCIA
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



183435-T

EDIS YAMARIS
CANDELO MICOLTA
C.C. 66743601
RES. INSCRIPCION 624 DEL 06/11/2013
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266474 **194796**

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8703450801000008

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66743601 de BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 183435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-24, 09:34:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1059238706

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 23/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERMORI GRANADA VALENCIA		
Documento	CC76325377	**Dirección**	CR 6 #5 B - 70 CENTRO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2420161
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400	$ 900	$ 412.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	75094586	DANIEL LONDOÑO GOMEZ	diagonal 6 sur # 40A-124 T7 Apto502	3153455747	dalogo19@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	20/11/2023	72531326	$570.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	75094586	DANIEL LONDOÑO GOMEZ		diagonal 6 sur # 40A-124 T7 Apto502	3153455747	dalogo19@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	20/11/2023	72531326	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	75094586	Londoño GOMEZ Daniel	3	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	250.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43455805
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA LONDONO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 44 # 90-65	TELÉFONO:	4930191
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7898401539**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		255768098

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 468.400
SUBTOTAL:			1	**$ 468.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 366.000
SUBTOTAL:			1	**$ 366.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 833.500**
VALOR MORA:	**$ 900**
TOTAL PAGADO:	**$ 834.400**

Planilla Pagada

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL X (marque X) **No. Acta** 2 **ACTA FINAL** ( ) (marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 21 - Octubre de 2023 hasta 20 - Noviembre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

CONSOLIDADO TODAS LAS SEDES

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	**PLAZO INICIAL**	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		**FECHA INICIACION**	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	**FECHA TERMINACION**	: 29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 79.299.885,94	**PLAZO TOTAL**	: 120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS **SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 94/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS | **OBRA EJECUTADA**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA						ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						GUATIQUIA	EVIDENCIAS	SAN JOSE	EL RETORNO	TOTAL	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**														
1.4	Desmonte de marcos y puertas	UN	6,00	$ 20.741,00	$ 124.446,00	-1,00	-	-	-	-1,00	-$ 20.741,00	7,00	$ 145.187,00	6,00	$ 124.446,00
1.5	Regata instalación sanitaria	ML	73,23	$ 16.682,00	$ 1.221.622,86	32,83	-	-	-	32,83	$ 547.670,06	22,50	$ 375.345,00	55,33	$ 923.015,06
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	10,10	$ 20.494,00	$ 206.989,40	-6,39	-	-	-	-6,39	-$ 130.956,66	10,09	$ 206.784,46	3,70	$ 75.827,80
1.12	Desmonte de canaleta metalica	ML	3,00	$ 6.776,00	$ 20.328,00	-3,00	-	-	-	-3,00	-$ 20.328,00	6,00	$ 40.656,00	3,00	$ 20.328,00
2.4	Placa en concreto 3500 psi E=0.12 m acabado estriado tipo trasmilenio .	M2	194,40	$ 116.168,00	$ 22.583.366,10	151,19	-	-	-	151,19	$ 17.563.439,92	0,00	$ -	151,19	$ 17.563.439,92
7.1	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	91,73	$ 19.362,00	$ 1.776.076,26	-	91,73	-	-	91,73	$ 1.776.076,26	0,00	$ -	91,73	$ 1.776.076,26
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	1.571,11	$ 32.446,00	$ 50.976.072,83	400,67	-	-	-	400,67	$ 13.000.138,82	584,20	$ 18.954.953,20	984,87	$ 31.955.092,02
9.3	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	ML	83,23	$ 72.987,00	$ 6.074.708,01	8,40	-	-	-	8,40	$ 613.090,80	42,00	$ 3.065.454,00	50,40	$ 3.678.544,80
9.4	Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1"	ML	32,83	$ 48.195,00	$ 1.582.241,85	32,83	-	-	-	32,83	$ 1.582.241,85	0,00	$ -	32,83	$ 1.582.241,85
9.13	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	-	$ 138.745,00	$ -	1,00	-	-	-	1,00	$ 138.745,00	0,00	$ -	1,00	$ 138.745,00
9.22	Cajas de inspeccion de 1*1 mts	UN	4,00	$ 489.923,00	$ 1.959.692,00	2,00	-	-	-	2,00	$ 979.846,00	2,00	$ 979.846,00	4,00	$ 1.959.692,00
11.3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	76,85	$ 495.844,00	$ 38.103.132,18	-	-	18,04	-	18,04	$ 8.945.025,76	31,40	$ 15.569.501,60	49,44	$ 24.514.527,36
11.4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	14,52	$ 590.223,00	$ 8.570.037,96	-	-	-15,25	-	-15,25	-$ 9.000.900,75	31,03	$ 18.314.619,69	15,78	$ 9.313.718,94
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 250.232.138,34**					**SUBTOTAL**	**$ 35.973.348,06**		**$ 123.385.542,21**		**$ 159.358.890,27**
IC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	**0**		**0**					**0**	**Q**	**$**	-			
IC.001	Demolición mecánica andenes	M2	0,30	$ 6.447,00	$ 1.934,10	0,30	-	-	-	0,30	$ 1.934,10	-	$ -	$ - 0,30	$ 1.934,10
IC.003	Teja termoacústica	M2	386,66	$ 92.199,00	$ 35.649.665,34	-	-	-	191,27	191,27	$ 17.634.902,73	-	$ -	$ - 191,27	$ 17.634.902,73
IC.007	Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Tipo Persiana	M2	2,36	$ 761.612,00	$ 1.797.404,32	-	-	1,29	-	1,29	$ 982.479,48	-	$ -	$ - 1,29	$ 982.479,48
IC.011	Demolición concreto reforzado	M3	20,16	$ 326.319,00	$ 6.578.591,04	20,16	-	-	-	20,16	$ 6.578.591,04	-	$ -	$ - 20,16	$ 6.578.591,04
IC.012	Suministro e Instalación de material de relleno compactado para nivelación de pisos	M2	128,55	$ 22.169,00	$ 2.849.824,95	128,65	-	-	-	128,65	$ 2.852.041,85	-	$ -	$ - 128,65	$ 2.852.041,85
IC.014	Puerta metálica Cal. 18, Dimensiones 0,9 X 2,37 MT incluye marco y accesorios	UN	2,00	$ 1.508.147,00	$ 3.016.294,00	-	-	0,80	-	0,80	$ 1.206.517,60	-	$ -	0,80	$ 1.206.517,60
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 165.686.692,57**					**SUBTOTAL**	**$ 29.256.466,80**		**$ -**		**$ 29.256.466,80**
VALOR COSTO DIRECTO OBRA					**$ 415.918.830,91**	43.685.713,78	1.776.076,26	2.133.122,09	17.634.902,73		**$ 65.229.814,86**		**$ 123.385.542,21**		**$ 188.615.357,07**
ADMINISTRACION		**(15,00%)**			**$ 62.387.824,64**	6.552.857,07	266.411,44	319.968,31	2.645.235,41		**$ 9.784.472,23**		**$ 18.507.831,33**		**$ 28.292.303,56**
IMPREVISTOS.		**(3,00%)**			**$ 12.477.564,93**	1.310.571,41	53.282,29	63.993,66	529.047,08		**$ 1.956.894,45**		**$ 3.701.566,27**		**$ 5.658.460,72**
UTILIDAD.		**(3,00%)**		**21,57%**	**$ 12.477.564,93**	1.310.571,41	53.282,29	63.993,66	529.047,08		**$ 1.956.894,45**		**$ 3.701.566,27**		**$ 5.658.460,72**
IVA SOBRE UTILIDAD		**(19,00%)**			**$ 2.370.737,34**	249.008,57	10.123,64	12.158,80	100.518,95		**$ 371.809,95**		**$ 703.297,59**		**$ 1.075.107,54**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 505.632.522,75**	53.108.722,24	2.159.175,92	2.593.236,52	21.438.751,25		**$ 79.299.885,94**		**$ 149.999.803,66**		**$ 229.299.689,60**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA											**19,82%**		**37,50%**		**57,32%**

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	2	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 21 - Octubre de 2023 hasta 20 - Noviembre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	: 29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 53.108.722,24	PLAZO TOTAL	: 120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 24/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
1.4	Desmonte de marcos y puertas	UN	6,00	$ 20.741,00	$ 124.446,00	-1,00	-$ 20.741,00	7,00	$ 145.187,00	6,00	$ 124.446,00
1.5	Regata instalación sanitaria	ML	66,23	$ 16.682,00	$ 1.104.848,86	32,83	$ 547.670,06	22,50	$ 375.345,00	55,33	$ 923.015,06
1.11	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	6,40	$ 20.494,00	$ 131.161,60	-6,39	-$ 130.956,66	6,39	$ 130.956,66	-	$ -
1.12	Desmonte de canaleta metalica	ML	3,00	$ 6.776,00	$ 20.328,00	-3,00	-$ 20.328,00	6,00	$ 40.656,00	3,00	$ 20.328,00
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		-								
2.4	Placa en concreto 3500 psi E=0.12 m acabado estriado tipo trasmilenio .	M2	153,15	$ 116.168,00	$ 17.791.436,10	151,19	$ 17.563.439,92	-	$ -	151,19	$ 17.563.439,92
3	**MAMPOSTERIA**		-								
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**		-								
5	**PISOS**		-								
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**		-								
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**		-								
7.11	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, ademas de todo el material y herramienta requerida para su correcta ejecucion y funcionamiento.	M2	964,87	$ 32.446,00	$ 31.306.172,02	400,67	$ 13.000.138,82	564,20	$ 18.306.033,20	964,87	$ 31.306.172,02
8	**CUBIERTA**		-								
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		-								
9.3	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	ML	83,23	$ 72.987,00	$ 6.074.708,01	8,40	$ 613.090,80	42,00	$ 3.065.454,00	50,40	$ 3.678.544,80
9.4	Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1"	ML	32,83	$ 48.195,00	$ 1.582.241,85	32,83	$ 1.582.241,85	-	$ -	32,83	$ 1.582.241,85
9.13	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	UN	-	$ 138.745,00	$ -	1,00	$ 138.745,00	-	$ -	1,00	$ 138.745,00
9.22	Cajas de inspeccion de 1*1 mts	UN	4,00	$ 489.923,00	$ 1.959.692,00	2,00	$ 979.846,00	2,00	$ 979.846,00	4,00	$ 1.959.692,00
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		-								
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**		-								
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 119.084.319,13**	SUB TOTAL	**$ 34.253.146,79**	SUB TOTAL	**$75.070.521,31**	SUB TOTAL	**$109.323.668,10**
IC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**		-								
IC.001	Demolición mecánica andenes	M2	0,30	$ 6.447,00	$ 1.934,10	0,30	$ 1.934,10	-	$ -	0,30	$ 1.934,10
IC.011	Demolición concreto reforzado	M3	20,16	$ 326.319,00	$ 6.578.591,04	20,16	$ 6.578.591,04	-	$ -	20,16	$ 6.578.591,04
IC.012	Suministro e Instalación de material de relleno compactado para nivelación de pisos	M2	128,55	$ 22.169,00	$ 2.849.824,95	128,65	$ 2.852.041,85	-	$ -	128,65	$ 2.852.041,85
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 12.736.835,21**	SUB TOTAL	**$ 9.432.566,99**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 9.432.566,99**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		**$ 131.821.154,34**	**$ 43.685.713,78**	**$ 75.070.521,31**	**$ 118.756.235,09**
ADMINISTRACION	**(15,00%)**	**$ 19.773.173,15**	**$ 6.552.857,07**	**$ 11.260.578,20**	**$ 17.813.435,27**
IMPREVISTOS.	**(3,00%)**	**$ 3.954.634,63**	**$ 1.310.571,41**	**$ 2.252.115,64**	**$ 3.562.687,05**
UTILIDAD.	**(3,00%)**	**$ 3.954.634,63**	**$ 1.310.571,41**	**$ 2.252.115,64**	**$ 3.562.687,05**
IVA SOBRE UTILIDAD	**(19,00%)**	**$ 751.380,58**	**$ 249.008,57**	**$ 427.901,97**	**$ 676.910,54**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 160.254.977,33**	**$ 53.108.722,24**	**$ 91.263.232,76**	**$ 144.371.955,00**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA			**33,14%**	**56,95%**	**90,09%**

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	1.4	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte de marcos y puertas	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA					-1,00	-1,00
SE DESCUENTA UN ELEMENTO AL SER DOS PUERTAS Y NO TENER INGERENCIA LA ALTURA EN EL ITEM						
TOTAL EJECUTADO						-1,00

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

	1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023		

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES


ITEM Nº	1.5	DESCRIPCION ITEM:	Regata instalación sanitaria	UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





ANTES

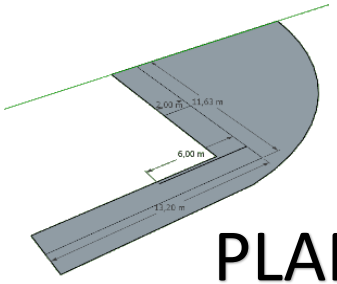

PLANO











DESPUES

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		2,00		2,00	1,00	2,00
VVC GUATIQUIA		6,00		6,00	1,00	6,00
VVC GUATIQUIA		13,20		13,20	1,00	13,20
VVC GUATIQUIA		11,63		11,63	1,00	11,63
TOTAL EJECUTADO						32,83

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	2.4	DESCRIPCION ITEM:	Placa en concreto 3500 psi E=0.12 m acabado estriado tipo trasmilenio .	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA






ANTES



DESPUES



PLANO



LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA	15,00	13,00	3,14	612,61	0,25	153,15
CAJAS	0,70	0,70		0,49	-4,00	-1,96
TOTAL EJECUTADO						151,19

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL					

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META


PRELIMINARES


ITEM Nº	7.2	DESCRIPCION ITEM:	Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos)	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



ANTES





DESPUES

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA	0,10	1,70		0,17	1,00	0,17
VVC GUATIQUIA	0,10	1,70		0,17	1,00	0,17
VVC GUATIQUIA	0,10	1,70		0,17	1,00	0,17
VVC GUATIQUIA	0,10	1,70		0,17	1,00	0,17
VVC GUATIQUIA	0,10	1,70		0,17	1,00	0,17
VVC GUATIQUIA	0,10	1,70		0,17	1,00	0,17
VVC GUATIQUIA	0,30	1,70		0,51	1,00	0,51
VVC GUATIQUIA	0,30	1,70		0,51	1,00	0,51
VVC GUATIQUIA	0,30	1,70		0,51	1,00	0,51
VVC GUATIQUIA	0,30	1,70		0,51	1,00	0,51
VVC GUATIQUIA	0,30	1,70		0,51	1,00	0,51
VVC GUATIQUIA	0,30	1,70		0,51	1,00	0,51
TOTAL EJECUTADO						4,08

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

	1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023		


SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	9.3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalación de Tuberia sanitaria PVC 4"	UND:	ML

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



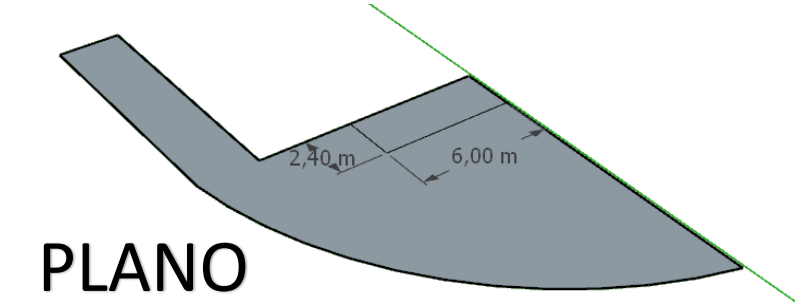

PLANO

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUÍA		2,40		2,40	1,00	2,40
VVC GUATIQUÍA		6,00		6,00	1,00	6,00
TOTAL EJECUTADO						8,40

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

	1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023		

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES


ITEM Nº	9.4	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de tuberia hidraulica pvc de 1"	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




ANTES

PLANO

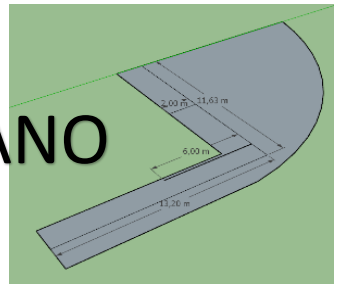







DESPUES

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		2,00		2,00	1,00	2,00
VVC GUATIQUIA		6,00		6,00	1,00	6,00
VVC GUATIQUIA		13,20		13,20	1,00	13,20
VVC GUATIQUIA		11,63		11,63	1,00	11,63
TOTAL EJECUTADO						32,83

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL					

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META


PRELIMINARES

ITEM Nº	9.13	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA



ANTES



DESPUES

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		1,00		1,00	1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO						1,00

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL					

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	9.13	DESCRIPCION ITEM:	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tuberia y de ser necesario cambio en la tuberia hidrosanitaria , además, de todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




ANTES





DESPUES

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA		2,00		2,00	1,00	2,00
TOTAL EJECUTADO						2,00

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL					

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	IC.001	DESCRIPCION ITEM:	Demolición mecánica andenes	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUTIQUIA - MURO	0,30	1,00		0,30	1,00	0,30
TOTAL EJECUTADO						0,30

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	IC.014	DESCRIPCION ITEM:	Demolicion concreto reforzado	UND:	M3

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





ANTES

DESPUES

















LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUTIQUIA - MURO	0,12	4,85	0,95	0,55	1,00	0,55
VVC GUTIQUIA-CIMIENTO	0,40	2,58	0,30	0,31	1,00	0,31
VVC GUATIQUIA - PISO PARQUEO	13,00	12,60	0,15	77,19	0,25	19,30
TOTAL EJECUTADO						**20,16**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó	
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**	
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	

SEDE: GUATIQUIA - VILLAVICENCIO - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	IC,012	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e Instalacion de material de relleno compactado para nivelacion de pisos	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES






LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC GUATIQUIA - PISO PARQUEO	13,00	12,60	3,14	514,59	0,25	128,65
TOTAL EJECUTADO						128,65

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	2	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 21 - Octubre de 2023 hasta 20 - Noviembre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA

CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 2.159.175,92	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 92/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		-								
3	**MAMPOSTERIA**		-								
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**		-								
5	**PISOS**		-								
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**		-								
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**		-								
7.1	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	91,73	$ 19.362,00	$ 1.776.076,26	91,73	$ 1.776.076,26	-	$ -	91,73	$ 1.776.076,26
8	**CUBIERTA**		-								
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		-								
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		-								
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**		-								
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**										
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 11.572.784,87**	SUB TOTAL	**$ 1.776.076,26**	SUB TOTAL	**$ 8.697.779,76**	SUB TOTAL	**$ 10.473.856,02**
IC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**		-								
IC.017	Reforzamiento en estructura de Drywall	KG	-	$ 9.312,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ -**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ -**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA		**$ 11.572.784,87**	**$ 1.776.076,26**	**$ 8.697.779,76**	**$ 10.473.856,02**
ADMINISTRACION	**(15,00%)**	**$ 1.735.917,73**	**$ 266.411,44**	**$ 1.304.666,96**	**$ 1.571.078,40**
IMPREVISTOS.	**(3,00%)**	**$ 347.183,55**	**$ 53.282,29**	**$ 260.933,39**	**$ 314.215,68**
UTILIDAD.	**(3,00%)**	**$ 347.183,55**	**$ 53.282,29**	**$ 260.933,39**	**$ 314.215,68**
IVA SOBRE UTILIDAD	**(19,00%)**	**$ 65.964,87**	**$ 10.123,64**	**$ 49.577,34**	**$ 59.700,98**
VALOR TOTAL OBRA		**$ 14.069.034,57**	**$ 2.159.175,92**	**$ 10.573.890,85**	**$ 12.733.066,77**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA			**15,35%**	**75,16%**	**90,50%**

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	2	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 21 - Octubre de 2023 hasta 20 - Noviembre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA
CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE BODEGA DE EVIDENCIAS - META

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 2.159.175,92	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS — **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 92/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS						OBRA EJECUTADA		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**			
CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**			**1**	**FECHA :**	**NOVIEMBRE DE 2023**
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL**					

SEDE: BODEGA DE EVIDENCIAS - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	**7,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos**	**UND:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA




ANTES



DESPUES



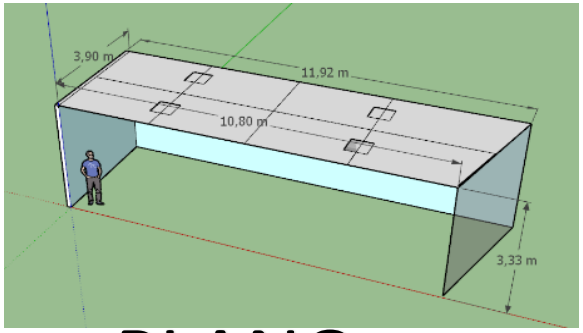

PLANO

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC EVIDENCIA		3,90	2,44	9,52	2,00	19,03
VVC EVIDENCIA		10,80	2,44	26,35	1,00	26,35
VVC EVIDENCIA		11,80	2,44	28,79	2,00	57,58
VVC EVIDENCIA	PUERTA	0,90	2,20	1,98	-2,00	-3,96
VVC EVIDENCIA	PUERTA	0,90	2,20	1,98	-2,00	-3,96
VVC EVIDENCIA	VENTANA	1,22	1,22	1,49	-1,00	-1,49
VVC EVIDENCIA	VENTANA	1,50	1,22	1,83	-1,00	-1,83
TOTAL EJECUTADO						**91,73**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	**CONTRATISTA** BERMORI GRANADA VALENCIA	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO** EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**			
CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**			**1**	**FECHA :**	**NOVIEMBRE DE 2023**
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL**					

SEDE: BODEGA DE EVIDENCIAS - META

PRELIMINARES

ITEM Nº	**7,1**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos**	**UND:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA





ANTES DESPUES

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
VVC EVIDENCIA			184,25	184,25	1,00	184,25
TOTAL EJECUTADO						**184,25**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	2	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** Desde 21 - Octubre de 2023 hasta 20 - Noviembre de 2023

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA

CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE - KR 23 20 123 CENTRO INTERADMINISTRATIVO

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	: 120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	: 30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	: 29/12/2023

VALOR EN LETRAS **DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 52/100**

CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANT.	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		-								
3	**MAMPOSTERIA**		-								
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**		-								
5	**PISOS**		-								
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**		-								
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**		-								
8	**CUBIERTA**		-								
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		-								
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		-								
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**		-								
11,3	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	21,72	$ 495.844,00	$ 10.767.252,46	18,04	$ 8.945.025,76		$ -	18,04	$ 8.945.025,76
11,4	Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	8,58	$ 590.223,00	$ 5.064.113,34	-15,25	-$ 9.000.900,75	23,83	$ 14.065.014,09	8,58	$ 5.064.113,34
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**		**0**								
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 17.356.286,89**	SUB TOTAL	**-$ 55.874,99**	SUB TOTAL	**$ 15.589.935,18**	SUB TOTAL	**$ 15.534.060,19**
IC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	**0**		**0**							
IC.007	Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Tipo Persiana	M2	1,29	$ 761.612,00	$ 982.479,48	1,29	$ 982.479,48	-	$ -	1,29	$ 982.479,48
IC.014	Puerta metálica Cal. 18, Dimensiones 0,9 X 2,37 MT incluye marco y accesorios	UN	1,00	$ 1.508.147,00	$ 1.508.147,00	0,80	$ 1.206.517,60		$ -	0,80	$ 1.206.517,60
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 4.231.171,48**	SUB TOTAL	**$ 2.188.997,08**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 2.188.997,08**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA					**$ 21.587.458,37**		**$ 2.133.122,09**		**$ 15.589.935,18**		**$ 17.723.057,27**
ADMINISTRACION	(15,00%)				**$ 3.238.118,76**		**$ 319.968,31**		**$ 2.338.490,28**		**$ 2.658.458,59**
IMPREVISTOS.	(3,00%)				**$ 97.143,56**		**$ 63.993,66**		**$ 467.698,06**		**$ 531.691,72**
UTILIDAD.	(3,00%)	21,57%			**$ 2.914,31**		**$ 63.993,66**		**$ 467.698,06**		**$ 531.691,72**
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,00%)				**$ 553,72**		**$ 12.158,80**		**$ 88.862,63**		**$ 101.021,43**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 24.926.188,72**		**$ 2.593.236,52**		**$ 18.952.684,21**		**$ 21.545.920,73**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA							**10,40%**		**76,04%**		**86,44%**

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL		

	1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023		

SEDE: SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

PRELIMINARES

ITEM Nº	11,3	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES







DESPUES









LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SAN JOSE	-1,76	2,74	2,63	7,21	2,00	10,89
SAN JOSE	-1,76	2,84	2,63	7,47	1,00	5,71
SAN JOSE	-1,76	1,34	2,39	3,20	1,00	1,44
	PUERTAS					-
TOTAL EJECUTADO						18,04

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	**FGN-RO-0021-2023**	**OBJETO:**	**MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS**				
CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**					
SUPERVISOR:	**EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL**			**1**	**FECHA :**	**NOVIEMBRE DE 2023**

SEDE: SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

PRELIMINARES

ITEM Nº	**11,4**	**DESCRIPCION ITEM:**	**Suministro e instalacion de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo necesario para su correcto funcionamiento**	**UND:**	**M2**

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES






LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SAN JOSE		0,80	2,20	1,76	1,00	1,76
SAN JOSE		0,80	2,20	1,76	1,00	1,76
SAN JOSE		0,80	2,20	1,76	1,00	1,76
SAN JOSE		0,80	2,20	1,76	1,00	1,76
SAN JOSE		0,70	2,20	1,54	1,00	1,54
SAN JOSE ACTA01				23,83	-1,00	-23,83
TOTAL EJECUTADO						**-15,25**

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA	**CONTRATISTA**	**SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO**
ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	BERMORI GRANADA VALENCIA	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	

SEDE: SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

PRELIMINARES

ITEM Nº	IC.007	DESCRIPCION ITEM:	Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Tipo Persiana	UND:	M2

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





DESPUES




LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SAN JOSE		3,22	0,40	1,29	1,00	1,29
TOTAL EJECUTADO						1,29

Elaboró:	Vo/Bo	Revisó
RESIDENTE DE OBRA ING DANIEL LONDOÑO GOMEZ	CONTRATISTA BERMORI GRANADA VALENCIA	SUPERVISOR INTEGRAL DEL CONTRATO EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA		
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL		

		1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023	

SEDE: SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE

PRELIMINARES


ITEM Nº	IC.014	DESCRIPCION ITEM:	Puerta metálica Cal. 18, Dimensiones 0,9 X 2,37 MT incluye marco y accesorios	UND:	UN

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES



DESPUES

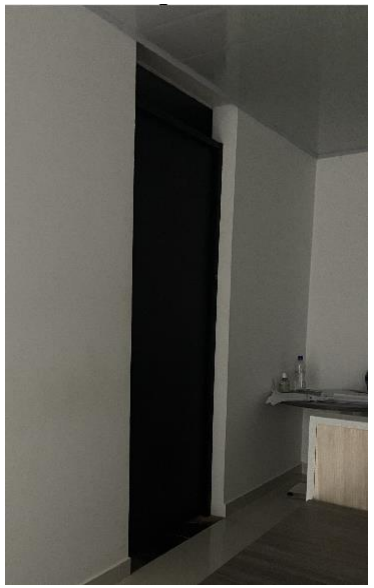

LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
SAN JOSE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA PARCIAL	X (marque X)	No. Acta	1	ACTA FINAL	(marque X)

CONTRATO DE OBRA No. FGN-RO-0021-2023 — **PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 21 - Octubre de 2023 hasta 20 - Noviembre de 2023**

CONTRATISTA : BERMORI GRANADA VALENCIA

CC o NIT 76325377-3

OBJETO: *OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS*

SEDE EL RETORNO - GUAVIARE

SUPERVISOR : EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL

VR. INICIAL	:	$ 400.000.000,00	PLAZO INICIAL	:	120,00 DIAS
VR. MOD. No. 1	:		FECHA INICIACION	:	30/08/2023
VR. FINAL	:	$ 400.000.000,00	FECHA TERMINACION	:	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 21.438.751,25	PLAZO TOTAL	:	120,00 DIAS

VALOR EN LETRAS VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 25/100

CONDICIONES ACTUALIZADAS	OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VR. EJECUTADO
1	**PRELIMINARES**										
2	**CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		-								
3	**MAMPOSTERIA**		-								
4	**PAÑETES, ESTUCOS Y OTROS**		-								
5	**PISOS**		-								
6	**CARPINTERIA METALICA Y MADERA**		-								
7	**IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y ACABADOS**		-								
8	**CUBIERTA**		-								
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**		-								
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		-								
11	**VIDRIO, ALUMINIOS Y OTROS**		-								
12	**ASEO Y Limpieza GENERAL**		0								
IC	**ITEMS COMPLEMENTARIOS**	0		0							
IC.003	Teja termoacústica	M2	191,27	$ 92.199,00	$ 17.633.980,74	191,27	$ 17.634.902,73	-	$ -	191,27	$ 17.634.902,73
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO ITEMS CONTRACTUALES				**$ 26.608.306,24**	SUB TOTAL	**$ 17.634.902,73**	SUB TOTAL	**$ -**	SUB TOTAL	**$ 17.634.902,73**

VALOR COSTO DIRECTO OBRA					**$ 47.269.250,39**		**$ 17.634.902,73**		**$ 15.589.935,18**		**$ 33.224.837,91**
ADMINISTRACION	(15,00%)				**$ 7.090.387,56**		**$ 2.645.235,41**		**$ 2.338.490,28**		**$ 4.983.725,69**
IMPREVISTOS.	(3,00%)				**$ 212.711,63**		**$ 529.047,08**		**$ 467.698,06**		**$ 996.745,14**
UTILIDAD.	(3,00%)	21,57%			**$ 6.381,35**		**$ 529.047,08**		**$ 467.698,06**		**$ 996.745,14**
IVA SOBRE UTILIDAD	(19,00%)				**$ 1.212,46**		**$ 100.518,95**		**$ 88.862,63**		**$ 189.381,58**
VALOR TOTAL OBRA					**$ 54.579.943,39**		**$ 21.438.751,25**		**$ 18.952.684,21**		**$ 40.391.435,46**
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA							**39,28%**		**34,72%**		**74,00%**

BERMORI GRANADA VALENCIA
CONTRATISTA

EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL
SUPERVISOR

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL ORINOQUÍA

MEMORIAS CANTIDADES CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N°:	FGN-RO-0021-2023	OBJETO:	MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES DONDE FUNCIONA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA EN LAS SECCIONALES META, GUAVIARE, GUAINÍA/VAUPÉS Y VICHADA, TIPO BOLSA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS			
CONTRATISTA:	BERMORI GRANADA VALENCIA			1	FECHA :	NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR:	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL					

SEDE: EL RETORNO - GUAVIARE

PRELIMINARES

ITEM Nº	IC.003	DESCRIPCION ITEM:	Suministro e instalacion de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND:	M2


PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

ANTES





PLANOS



DESPUES





LOCALIZACION	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
EL RETORNO	11,33	13,81	1,15	179,94	1,00	191,27
						-

INFORMACIÓN BÁSICA					
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Fecha**	2023	11	02
Lugar	SITIOS DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEDES				
Hora inicio	09:00 horas	**Hora fin**	17:02		
Tema de la reunión	Revisión, Verificación y detalle de sitios a intervenir contrato FGN-RO- 21-2023				
Dependencia que convoca	Supervisión de contrato Sección de bienes, soporte y apoyo administrativo				
Secretario (quien transcribe)	Eddie Orlando Fernandez Gil	Profesional Especializado II (E)			

IMPORTANTE
1. Diligencie digitalmente (evite su impresión, atendiendo políticas de cero papel)*.
2. Si el acta no es aprobada al finalizar la reunión, el secretario la elabora y remite vía correo electrónico a los asistentes, indicando el tiempo estimado para observaciones. Una vez cumplido el plazo, y si no hay pronunciamiento, ésta se entenderá aprobada.
3. El acta aprobada se envía en formato PDF a los asistentes vía correo electrónico.

***** Esta actividad la realiza el Secretario de la reunión.

ASISTENTES**

#	Nombre	Cargo	Dependencia	Correo electrónico
1	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	Supervisor contrato	Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia	orlando.fernandez@fiscalia.gov.co
2	DANIEL LONDOÑO GÓMEZ	Residente de obra	Granval Ingeniería	
3				
4				
5				
6				

**Formato control de asistencia (opcional).

ORDEN DEL DÍA

1	Determinación de sitios a intervenir
2	Visita a sitios y detalle de
3	
4	

DESARROLLO

El ingeniero Eddie Orlando Fernandez Gil, en calidad de supervisor del contrato FGN-RO-0021-2023, y el ingeniero DANIEL LONDOÑO GÓMEZ en representación del contratista se realizan seguimiento a los sitios a intervenir:

No	SEDE	OBERVACIONES
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Detalles de instalación de piso de garaje, revisión de espejos, , se adiciona arreglo de canal bajante dañada.
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Verificación correcta de instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED
3	CAIVAS KR 37 34 108	Revisión de Divisiones en vidrio en piso 2 y 3
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación	Revisión de división DryWall y techo en PVC

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

DESARROLLO

	KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Revisión instalación de recepción de recibo de documentos ventanilla única
6	SEDE SAN JOSÉ DE GUAVAIRE	Revisión de Divisiones en vidrio y puerta en vidrio

Se solicita la evaluación de la necesidades en:
Se Plantea las necesidades de sede Puerto Carreño, Vichada
Se Plantea las necesidades de sede Miraflores, Guaviare

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha de entrega
1	Actualización de presupuesto de sitios	Contratista	2023-11-08
2	Entrega de APU´s actualizados con reformas. Contractuales y necesidades de ítem S complementarios	Contratista	2023-11-08
3	Verificación de cantidades vichada	Contratista – Supervisión	2023-11-12
4	Actualización a la Sede en Inírida Guainía	Contratista –	2023-11-12
5	Verificación de cantidades Miraflores Guaviare	Contratista – Supervisión	2023-11-08
6	Actualización de Memorias cantidades de corte y acta 1	Contratista	2023-11-20

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Buenos días doctora Kelly,
Estamos realizando

Sede Palacio de Justicia




CAIVAS



Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

NUEVA BODEGA DE EVIDENCIAS

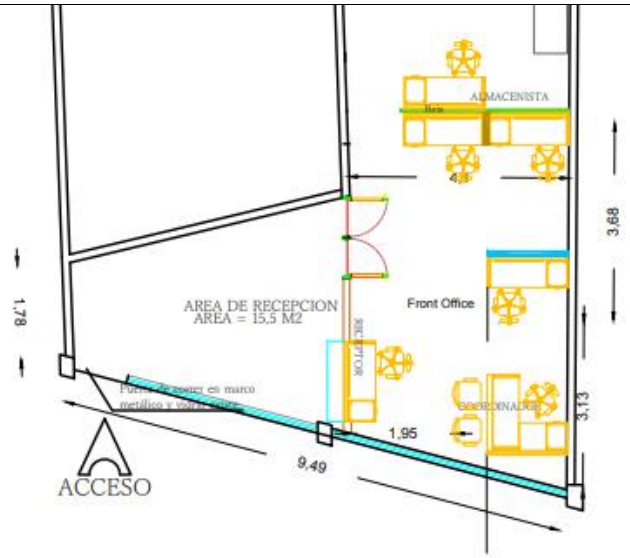

PISO 1

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

INFORMACIÓN BÁSICA					
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Fecha**	2023	11	10
Lugar	SITIOS DE INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE SEDES				
Hora inicio	09:00 horas	**Hora fin**	17:02		
Tema de la reunión	Revisión, Verificación y detalle de sitios a intervenir contrato FGN-RO- 21-2023				
Dependencia que convoca	Supervisión de contrato Sección de bienes, soporte y apoyo administrativo				
Secretario (quien transcribe)	Eddie Orlando Fernandez Gil	Profesional Especializado II (E)			

IMPORTANTE
1. Diligencie digitalmente (evite su impresión, atendiendo políticas de cero papel)*.
2. Si el acta no es aprobada al finalizar la reunión, el secretario la elabora y remite vía correo electrónico a los asistentes, indicando el tiempo estimado para observaciones. Una vez cumplido el plazo, y si no hay pronunciamiento, ésta se entenderá aprobada.
3. El acta aprobada se envía en formato PDF a los asistentes vía correo electrónico.

***** Esta actividad la realiza el Secretario de la reunión.

ASISTENTES**

#	Nombre	Cargo	Dependencia	Correo electrónico
1	EDDIE ORLANDO FERNÁNDEZ GIL	Supervisor contrato	Subdirección Regional de Apoyo Orinoquia	orlando.fernandez@fiscalia.gov.co
2	DANIEL LONDOÑO GÓMEZ	Residente de obra	Granval Ingeniería	
3	MAYRELL CORREA ORTIZ	Gerente Proyecto	Granval Ingeniería	
4				
5				
6				

**Formato control de asistencia (opcional).

ORDEN DEL DÍA

1	Determinación de sitios a intervenir
2	Visita a sitios y detalle de
3	
4	

DESARROLLO

El ingeniero Eddie Orlando Fernandez Gil, en calidad de supervisor del contrato FGN-RO-0021-2023, y el ingeniero DANIEL LONDOÑO GÓMEZ en representación del contratista se realizan seguimiento a los sitios a intervenir.

No	SEDE	OBERVACIONES
1	Guatiquia CL 15 37 L 86	Detalles de instalación de piso de garaje, revisión de espejos, se adiciona arreglo de canal bajante dañada. Se verifica las cantidades y se ajustan para elaboración de acta 2.
2	Sede URI Villavicencio KR 39 26 C 50	Verificación correcta de instalación de puerta en vidrios de acceso a GATED. Se hizo revisión de la instalación y correcto funcionamiento.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

DESARROLLO		
		No hay observaciones.
3	CAIVAS KR 37 34 108	Revisión de Divisiones en vidrio en piso 2 y 3. Se encontró un error en el ítem utilizado para realizar el acta 1, se realiza el ajuste con el ítem complementario de acuerdo a lo revisado y recibido.
4	Bodega de evidencias Nueva ubicación KR 22 8 C 248/260 LCs 1, 2 ED Lain o KR 21 B 8 C 263/275 LC 4	Revisión de división DryWall y techo en PVC. Se revisa iluminación y puerta que este funcional Se hacen observaciones sobre iluminación que serán atendidas y revisadas el miércoles 15/11/2023.
5	Palacio de Justicia. KR 29 33 B 27 Palacio de Justicia	Revisión instalación de recepción de recibo de documentos ventanilla única. Se hace verificación de la correcta funcionalidad de la puerta recibida.
6	SEDE SAN JOSÉ DE GUAVAIRE	Revisión de Divisiones en vidrio y puertas en vidrio. Se identifica error en el ítem 11.4 utilizado para el acta 1. Se deben distribuir en los ítems 11.3 y 11. 4 Se realiza la verificación en sitio de la correcta funcionalidad de lo recibido. Se adiciona la necesidad de una división en vidrio templado en la oficina de Apoyo a la administración. Se requiere la garantía de puerta metálica. Se evidencia la necesidad de persiana en aluminio.
7	Se entregan documento de necesidades en Vichada.	El contratista evaluara las necesidades para presentar una propuesta.

COMPROMISOS			
#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha de entrega
1	Actualización de presupuesto de sitios	Contratista	2023-11-16
2	Entrega de APU´s actualizados con reformas. Contractuales y necesidades de ítem S complementarios.	Contratista	2023-11-15
3	Verificación de cantidades vichada.	Contratista – Supervisión	2023-11-12
4	Actualización presupuesto a la Sede en Inírida Guainía	Contratista	
5	Verificación de cantidades Miraflores Guaviare	Contratista – Supervisión	2023-11-15

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

COMPROMISOS			
#	Compromiso	Responsable(s)	Fecha de entrega
6	Actualización de Memorias cantidades de corte y acta 1	Contratista	2023-11-20

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

Oficio 30940-0723

Villavicencio, 15 de noviembre de 2023

Señor
ALFONSO MELO ERAZO
Responsable Grupo de Seguridad Infraestructuras y Personas
Dirección de Protección y Asistencia – Departamento de Seguridad
Regional Orinoquia.

ASUNTO: **PERMISOS ACCESO A LA SEDES**

Comedidamente solicito su valiosa colaboración en el sentido de autorizar a quien corresponda el acceso a las personas relacionadas a la sede de la Fiscalía General de la Nación de la Regional Orinoquia como aparece a continuación.

EMPRESA	GRAN VAL INGENIERIA
FECHAS	14/11/2023 Hasta 30/11/2023
ACTIVIDADES	OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO DE SEDES
SEDES	Entrerios, URI, Guatiquia, CAIVAS, Archivo en Villavicencio, Inírida, San José de Guaviare y Retorno.

NO	APELLIDOS NOMBRES	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION
1	CARDOZO MADRID ALEXANDER	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	1121890477
2	CASTELLANOS RODRÍGUEZ JOHN FREDY	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	1.124.191.013
3	DOMINGO GARCES JORI GERMAN	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	10559149
4	LÓPEZ GIRALDO HOOVER ANTONIO	MAESTRO CONTRUC	16.114.293
5	ESTRADA BUSTOS MIGUEL	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	17.495.843
6	CUBIDES SANTOS CARLOS ANDRÉS	CARPINTERÍA ALUMINIO	86050461
7	BENITEZ DEL TORO CRISTIAN FABIAN	CARPINTERÍA ALUMINIO	1121911371
8	CORREA ORTIZ EULHYN MAYRELL	DIRECTORA PROYECTOS	31655741
9	FIERRO GUZMÁN BETSY ANDREA	SST	40325117
10	GRANADA VALENCIA BERMORI	REP LEGAL	76325377
11	LAMPREA GÓMEZ AUBIN	CARPINTERÍA ALUMINIO	4.082.932
12	LONDOÑO GÓMEZ DANIEL	RESIDENTE OBRA	75094586
13	LONDOÑO GOMEZ ERIKA	INGENIERO APOYO	43455805
14	VALENCIA RODRÍGUEZ DONALDO	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	18201670

Gracias por su atención
Atentamente,

EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL
Coordinador Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo (e)
Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía
Email: orlando.fernandez@fiscalia.gov.co.
Tel 3219559152

Oficio 30940-0731

Villavicencio, 23 de noviembre de 2023

Señor
ALFONSO MELO ERAZO
Responsable Grupo de Seguridad Infraestructuras y Personas
Dirección de Protección y Asistencia – Departamento de Seguridad
Regional Orinoquia.

ASUNTO: **PERMISOS ACCESO A LA SEDES**

Comedidamente solicito su valiosa colaboración en el sentido de autorizar a quien corresponda el acceso a las personas relacionadas a la sede de la Fiscalía General de la Nación de la Regional Orinoquia como aparece a continuación.

EMPRESA	GRAN VAL INGENIERIA
FECHAS	23/11/2023 Hasta 30/11/2023
ACTIVIDADES	OBRAS CIVILES, MANTENIMIENTO DE SEDES
SEDES	CAIVAS Y URI VILLAVICENCIO Realizan trabajos nocturnos y el fin de semana sábado y domingo de divisiones de vidrios.

NO	APELLIDOS NOMBRES	ACTIVIDAD	IDENTIFICACION
6	CUBIDES SANTOS CARLOS ANDRÉS	CARPINTERÍA ALUMINIO	86050461
7	ARIAS ARIZA PEDRO LUIS	CARPINTERÍA ALUMINIO	17314564

Gracias por su atención
Atentamente,

EDDIE ORLANDO FERNANDEZ GIL
Coordinador Sección de Bienes, Soporte y Apoyo Administrativo (e)
Subdirección Regional de Apoyo – Orinoquía
Email: orlando.fernandez@fiscalia.gov.co.
Tel 3219559152

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	238477856	9458127833	E	2023/10/09	2023/10/25	BANCO DAVIVIENDA	16	$6,095,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EL PARQUE (27 Afiliados)																								$19,449,339	$3,112,800			$19,449,339	$779,000			$19,178,672	$768,100			$19,449,339		$1,336,300		$0	$0		$5,996,200
Centro de Trabajo: ING. DANIEL LONDOÑO (27 Afiliados)																								$19,449,339	$3,112,800			$19,449,339	$779,000			$19,178,672	$768,100			$19,449,339		$1,336,300		$0	$0		$5,996,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (27 Afiliados)																								$19,449,339	$3,112,800			$19,449,339	$779,000			$19,178,672	$768,100			$19,449,339		$1,336,300		$0	$0		$5,996,200
1	CC	17336402	BELTRAN FRANKLIN		X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1006875045	CALDERON FERNANDO		X																	230301	13	$502,667	$80,500	EPS017	13	$502,667	$20,200	CCF34	13	$502,667	$20,200	14-4	13	$502,667	6.960%	$35,000	13	$0	$0	Si	$155,900
3	CC	1006873237	CARDONA PEDRO	X	X																	230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
4	CC	1121890477	CARDOZO ALEXANDER																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1124191013	CASTELLANOS JOHN																	X		230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF34	0	$0	$0	14-4	7	$270,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$54,300
6	CC	1124191013	CASTELLANOS JOHN																			230301	23	$889,334	$142,300	EPS037	23	$889,334	$35,600	CCF34	23	$889,334	$35,600	14-4	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	Si	$275,400
7	CC	1121877162	CEDIEL YAN																			230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	17338717	CHACON EDOVAN	X	X																	25-14	12	$464,000	$74,300	EPS017	12	$464,000	$18,600	CCF34	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
9	CC	1122649129	CORTES DANIEL																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
10	CC	17495843	ESTRADA MIGUEL	X																		230301	11	$425,334	$68,100	EPS005	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
11	CC	10559149	GARCES GERMAN	X																		25-14	12	$464,000	$74,300	EPS041	12	$464,000	$18,600	CCF34	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
12	CC	86059887	GARCIA ROGER																			230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
13	CC	1121831459	GUTIERREZ LIBARDO	X																		25-14	11	$425,334	$68,100	EPS017	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
14	CC	1214747732	GUZMAN JUAN	X																		230201	17	$657,334	$105,200	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF34	17	$657,334	$26,300	14-4	17	$657,334	6.960%	$45,800	17	$0	$0	Si	$203,600
15	CC	86069459	HERNANDEZ ROBINSON	X																		231001	12	$464,000	$74,300	EPS005	12	$464,000	$18,600	CCF34	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
16	CC	17323576	JARAMILLO ARMANDO	X																		25-14	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-4	10	$386,667	6.960%	$27,000	10	$0	$0	Si	$119,900
17	PT	6351610	JIMENEZ JOSE																			230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
18	CC	1056775581	LAVERDE JOHN	X																		230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF34	27	$1,044,000	$41,800	14-4	27	$1,044,000	6.960%	$72,700	27	$0	$0	Si	$323,400
19	PT	938348	LINDARTE JOSE																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
20	CC	16114293	LOPEZ HOOVER																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
21	CC	79480851	LOPEZ JORGE	X	X																	230201	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$179,600
22	CC	6351446	MICHAEL FERNANDEZ		X																	230301	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$14,000	CCF34	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	6.960%	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
23	CC	97611949	NOSSA EVERLINTON	X																		230301	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
24	CC	79832468	PINILLA EDILSON		X																	230301	19	$734,667	$117,600	EPS002	19	$734,667	$29,400	CCF34	19	$734,667	$29,400	14-4	19	$734,667	6.960%	$51,200	19	$0	$0	Si	$227,600
25	CC	1121878171	SANCHEZ ANYELO		X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-4	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	Si	$84,100
26	CC	18201670	VALENCIA DONALDO	X																		230301	12	$464,000	$74,300	EPS017	12	$464,000	$18,600	CCF34	12	$464,000	$18,600	14-4	12	$464,000	6.960%	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
27	CC	17293733	VANEGAS VICTOR	X																		230301	9	$348,000	$55,700	EPS005	9	$348,000	$14,000	CCF34	9	$348,000	$14,000	14-4	9	$348,000	6.960%	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
28	CC	1121969436	VELANDIA CRISTIAN		X																	230201	11	$425,334	$68,100	CCFC55	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,334	$17,100	14-4	11	$425,334	6.960%	$29,700	11	$0	$0	Si	$132,000
Total			**Afiliados(27)**																					$19,449,339	$3,112,800			$19,449,339	$779,000			$19,178,672	$768,100			$19,449,339		$1,336,300		$0	$0		$5,996,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	238477856	9458127833	E	2023/10/09	2023/10/25	BANCO DAVIVIENDA	16	$6,095,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$3,112,800	$51,600	$0	$3,164,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$74,300	$1,300	$0	$75,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$464,200	$7,700	$0	$471,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$2,122,600	$35,100	$0	$2,157,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$451,700	$7,500	$0	$459,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,336,300	$22,100	$0	$1,358,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$1,336,300	$22,100	$0	$1,358,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$768,100	$12,700	$0	$780,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	27	$768,100	$12,700	$0	$780,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$779,000	$13,200	$0	$792,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$109,900	$1,900	$0	$111,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$182,800	$3,100	$0	$185,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$130,100	$2,200	$0	$132,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$82,100	$1,400	$0	$83,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$178,000	$3,000	$0	$181,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$96,100	$1,600	$0	$97,700
TOTAL				**27**	**$5,996,200**	**$99,600**	**$0**	**$6,095,800**

Medellín, 27 de october de 2023

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

CERTIFICA:

Que MIGUEL ANATONIO ESTRADA BUSTOS identificado(a) con cédula de ciudadanía 17495843 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 28/10/2023 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

GRANADA VALENCIA BERMORI C76325377

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000008 - BERMORI GRANADA VILLAVICENCIO

CLASE: 5 **PORCENTAJE:** 6.96% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
5711001 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, INCLUYE ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE ARQUITECTURA: DISEÑO DE EDIFICIOS Y DIBUJO DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANIFICACIÓN URBANA Y ARQUITECTURA PAISAJISTA, DISEÑO DE INGENIERÍA, CONSULTORÍA EN MAQUINARIA, PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES, INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO, PROYECTOS DE ORDENACIÓN HÍDRICA, PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA CON PRESENCIA EN LAS INSTALACIONES DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO (CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN OBRAS); ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA ,INGENIERÍA DE MINAS, INGENIERÍA QUÍMICA, MECÁNICA, INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS, E INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 5711001

CLASE DE RIESGO: 5 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 6.96%

Su pago lo debe realizar con riesgo null (null %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 27/10/2023 11.54 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-24, 09:32:42 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1059237369

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** octubre de 2023

PAGADO 23/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BERMORI GRANADA VALENCIA	**Nombre Sucursal**	VILLAVICENCIO	**Código Sucursal**	03
Documento	CC76325377	**Dirección**	CR 6 #5 B - 70 CENTRO		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2420161		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BUENAVENTURA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	16	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1052572417	YOLVIS RODRIGUEZ PARADA	59	00		R															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700
CC 10559149	GERMAN DOMINGO GARCES JORI	59	00	R																0	0	0	25	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.300
CC 1056775581	JOHN ANDERSON LAVERDE FORERO	59	00		R															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700
CC 1113631738	ALEXANDER CASTRO MUÑOZ	59	00		R															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700
CC 1121831459	LIBARDO GUTIERREZ LADINO	59	00		R															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 386.668	$ 27.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1121890477	ALEXANDER CARDOZO MADRID	59	00	R																0	0	0	24	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 928.000	$ 64.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
CC 1121911371	CRISTIAN FABIAN BENITEZ DEL TORO	59	00		R															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700
CC 1124191013	JOHN FREDY CASTELLANOS RODRIGUEZ	59	00	R																0	0	0	19	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 734.667	$ 51.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.200
CC 16114293	HOOVER ANTONIO LOPEZ GIRALDO	59	00	R																0	0	0	26	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.005.334	$ 70.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000
CC 17495843	MIGUEL ANTONIO ESTRADA BUSTOS	59	00	R																0	0	0	4	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800
CC 18201670	DONALDO VALENCIA RODRIGUEZ	59	00	R																0	0	0	26	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.005.334	$ 70.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000
CC 40325117	BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN	59	00	R																0	0	0	26	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.005.334	$ 70.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000
CC 4082932	AUBIN LAMPREA GOMEZ	59	00		R															0	0	0	1	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700
CC 43455805	ERIKA LONDOÑO GOMEZ	59	00	R																0	0	0	26	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.005.334	$ 70.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000
CC 75094586	DANIEL LONDOÑO GOMEZ	59	00	R																0	0	0	26	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.005.334	$ 70.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.000
CC 86050461	CARLOS ANDRES CUBIDES SANTOS	59	00	R																0	0	0	6	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 464.001	$ 32.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 8.854.675	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.700	$ 1.300	$ 618.000
