Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

INFORME No. 06 – CONTRATO DE OBRA No. 314 - 2022

Ricaurte
NUESTRO COMPROMISO

OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.



Periodo comprendido entre el 18 de junio y el 18 de julio de 2023

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES


INTRODUCCION:


A continuación, se describen las actividades que se realizaron en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas entre el Municipio de Ricaurte e Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 314-2022.

DESCRIPCCION DEL PROYECTO:

- localización:

Ricaurte es un municipio de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la Provincia del Alto Magdalena. Se encuentra a 112 km al suroeste de Bogotá, y a una altitud de 284 m s. n. m. La temperatura media anual es de 27 °C.

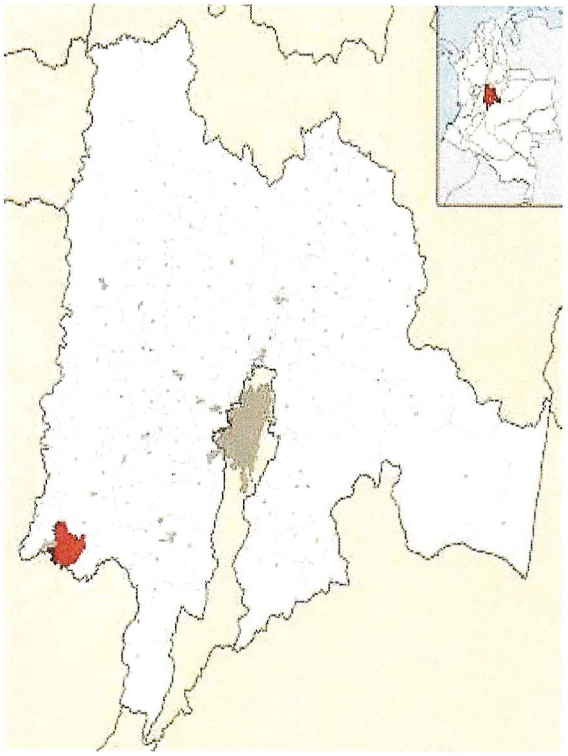

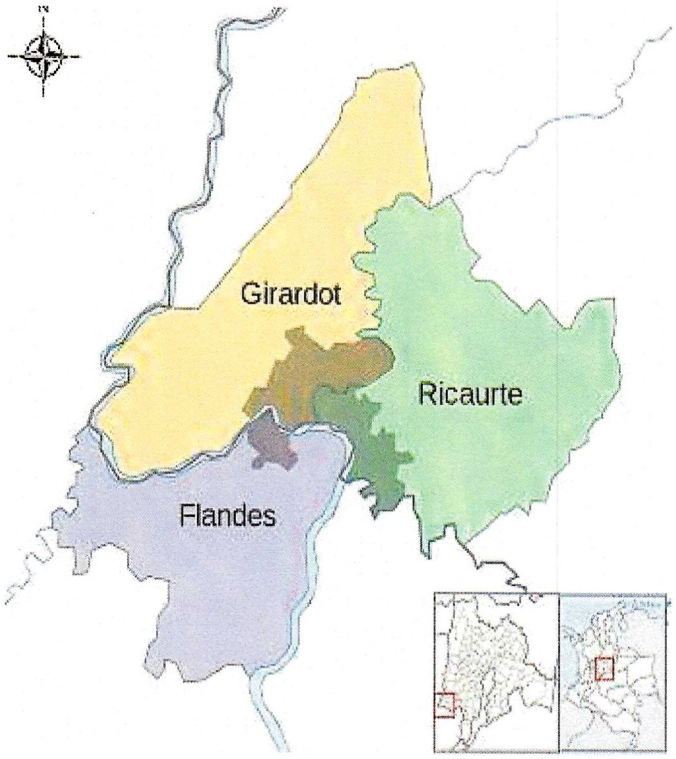

- **Superficie**: 130km2
- **Altitud**: 284msn
- **Temperatura**: 27 C°

Generalidades del Proyecto.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314-2022	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE RICAURTE - CUNDINAMARCA**
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	**INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S**
NIT.	**900.480.705-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO**
CEDULA DE CIUDADANÍA	**5.471.343 expedida en Ocaña.**
DIRECCIÓN	**MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA**
CIUDAD	**Ricaurte, Cundinamarca**
TELÉFONO	**3148468958**
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
VALOR	**CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($156.506.500.00) M/c**
PLAZO	**DOS (2) MESES**
ACTA DE SUSPENSION No. 01	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**
ACTA DE REINICIO No. 01	**10 DE ENERO DE 2023**
PRORROGA No. 01	**10 DE FEBRERO DE 2023 (30 DIAS)**
ACTA DE SUSPENSION No. 02	**24 DE FEBRERO DE 2023**
ACTA DE REINICIO No. 02	**16 DE MARZO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO No. 02	**03 DE ABRIL DE 2023**
PRORROGA No. 02	**31 DE MARZO DE 2023 (UN MES)**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 02	**03 MAYO DE 2023**
PRORROGA No. 03	**03 MAYO DE 2023 (UN MES)**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 03	**03 DE JUNIO DE 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 03	**31 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN SUSPENSION No. 03	**18 DE JUNIO DE 2023**
PRORROGA No. 04	**18 DE JUNIO (UN MES)**
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No. 04	**18 DE JULIO DE 2023**
OBJETO	**OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA**

- ***Condiciones según balance do obra No. 02 del 22 de marzo de 2023***

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA						
BOX-COULVERT (A) 1,00M X 1,00M RELLENO DE 0,60 - 1,00M						
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
1.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	26,15	$ 791.038,00
1.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	18,23	$ 2.214.945,00
		Subtotal				$ 3.005.983,00

020

2	**ESTRUCTURA**							
2.1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$	820.700,00	13,63	$	11.186.141,00
2.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	10.860,00	811,20	$	8.809.632,00
2.3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$	502.650,00	1,24	$	623.286,00
		Subtotal					**$**	**20.619.059,00**
BOX-COULVERT (B) 1,50M X 1,50M RELLENO DE 2,00M - 2,50M								
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
3.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	30.250,00	25,70	$	777.425,00
3.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$	121.500,00	27,45	$	3.335.175,00
		Subtotal					**$**	**4.112.600,00**
4	**ESTRUCTURA**							
4.1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$	820.700,00	19,59	$	16.077.513,00
4.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	10.860,00	1101,02	$	11.957.077,00
4.3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$	502.650,00	1,43	$	718.790,00
		Subtotal					**$**	**28.753.380,00**
5	**ITEMS NO PREVISTOS**							
5,1	NP 1 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	$	131.685,00	14,00	$	1.843.590,00
		Subtotal					**$**	**1.843.590,00**
BADEN (C) 6,00M X 4,50M								
6	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
6.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	30.250,00	21,06	$	637.065,00
6.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$	121.500,00	9,75	$	1.184.625,00
		Subtotal					**$**	**1.821.690,00**
7	**ESTRUCTURA**							
7.1	VIAS 4,6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	$	794.000,00	11,32	$	8.988.080,00
7.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	10.860,00	814,93	$	8.850.140,00
		Subtotal					**$**	**17.838.220,00**
8	**ITEMS NO PREVISTOS**							
8.1	NP 2 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	$	131.685,00	16,25	$	2.139.881,00
		Subtotal					**$**	**2.139.881,00**

BADEN (D) 6,00M X 4,50M							
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
9,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	21,06	$	637.065,00
9,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	9,99	$	1.213.785,00
		Subtotal				**$**	**1.850.850,00**
10	**ESTRUCTURA**						
10,1	VIAS 4,6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	$ 794.000,00	11,32	$	8.988.080,00
10,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	814,93	$	8.850.140,00
		Subtotal				**$**	**17.838.220,00**
SUBTOTAL (A) CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA						**$**	**99.823.473,00**
ÍTEM DE PAGO	**ESPECIFICACIONES GENERAL**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
B. CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA							
ALCANTARILLA DE 36" RELLENO MINIMO DE 0,60M							
11	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**						
11,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	71,34	$	2.158.035,00
11,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	32,50	$	3.948.750,00
		Subtotal				**$**	**6.106.785,00**
12	**ESTRUCTURA**						
12,1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$ 820.700,00	15,73	$	12.909.611,00
12,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	911,93880	$	9.903.655,00
12,3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$ 502.650,00	0,98	$	492.597,00
		Subtotal				**$**	**23.305.863,00**
13	**ITEMS NO PREVISTOS**						
13,1	NP 3 (VIAS 4,48)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	$ 924.847,00	7,00	$	6.473.929,00
13,2	NP 4 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	$ 131.685,00	8,35	$	1.099.570,00
		Subtotal				**$**	**7.573.499,00**
SUBTOTAL (B) CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA						**$**	**36.986.147,00**

101

C. CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO								
BADEN 6.00X4.50								
14	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
14,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$	30.250,00	21,32	$	644.930,00
14,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$	121.500,00	9,99	$	1.213.785,00
		Subtotal					**$**	**1.858.715,00**
15	**ESTRUCTURA**							
15,1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$	820.700,00		$	-
15,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$	10.860,00	814,93	$	8.850.140,00
15,3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$	502.650,00		$	-
		Subtotal					**$**	**8.850.140,00**
16	**ITEMS NO PREVISTOS**							
16,1	NP 5 (VIAS 4,6)	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	$	794.000,00	11,32	$	8.988.080,00
		Subtotal					**$**	**8.988.080,00**
SUBTOTAL (C) CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO							**$**	**19.696.935,00**

SUBTOTAL (A) CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA	$	99.823.473,00
SUBTOTAL (B) CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA	$	36.986.147,00
SUBTOTAL (C) CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO	$	19.696.935,00
AJUSTE AL PESO POR MODIFICACION DE CANTIDADES	$	(55,00)
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**156.506.500,00**
VALOR TOTAL	**$**	**156.506.500,00**

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

POLIZAS:

POLIZAS VIGENTES AL CONTRATO DE OBRA

POLIZA		FECHA DE EXPEDICION	7/12/2022	ANEXO	1
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	EN BLANCO		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	EN BLANCO		
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	EN BLANCO		

POLIZA		FECHA DE EXPEDICION	7/12/2022	ANEXO	2
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	31/05/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	31/01/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	7/12/2022	ANEXO	1
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	EN BLANCO		
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	EN BLANCO		
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	EN BLANCO		

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	7/12/2022	ANEXO	2
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	31/01/2023	$ 200.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	31/01/2023	$ 100.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	31/01/2023	$ 100.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	16/03/2023	ANEXO	5
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	3/08/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	3/04/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DIAS		

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	13/03/2023	ANEXO	6
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	3/04/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	3/04/2023	$ 116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	3/04/2023	$ 116.000.000,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	9/05/2023	ANEXO	7
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	3/10/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	3/06/2023	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	SI AMPARA 5 MESES 0 MESES Y 1 DIA		$ 31.301.300,00

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	9/05/2023	ANEXO	8
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	3/06/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	3/06/2023	$ 116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	3/06/2023	$ 116.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	15/06/2023	ANEXO	8
GARANTIAS	NOMBRE ASEGURADORA	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	15/10/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	15/06/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	SI AMPARA 5 MESES 0 MESES Y 1 DIA		$ 31.301.300,00

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	15/06/2023	ANEXO	9
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	15/06/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	15/06/2023	$ 116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	15/06/2023	$ 116.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	15/06/2023	ANEXO	9
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	1/10/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/06/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	SI AMPARA 5 MESES 0 MESES Y 1 DIA		$ 31.301.300,00

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	15/06/2023	ANEXO	10
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	18/06/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	18/06/2023	$ 116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	18/06/2023	$ 116.000.000,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	16/06/2023	ANEXO	10
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/11/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/07/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	SI AMPARA 5 MESES 0 MESES Y 1 DIA		$ 31.301.300,00

POLIZA (RCE)		FECHA DE EXPEDICION	16/06/2023	ANEXO	11
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	18/07/2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	18/07/2023	$ 116.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS DEL ESTADO	25-40-101046520	1/12/2022	18/07/2023	$ 116.000.000,00

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	19/07/2023	ANEXO	11
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/11/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/07/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	18/07/2023	31/01/2028	$ 31.301.300,00

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

POLIZA CUMPLIMIENTO		FECHA DE EXPEDICION	19/07/2023	ANEXO	12
GARANTIAS	**NOMBRE ASEGURADORA**	**No. POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/11/2023	$ 15.650.650,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	1/12/2022	18/07/2026	$ 7.825.325,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101174629	18/07/2023	18/07/2028	$ 31.301.300,00

***ACTIVIDADES*:**

Durante el periodo comprendido del 18 de junio y el 18 de julio de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

Camellón San Francisco:

- Se realizo corte y figurado de acero para la elaboración del box coulvert de 1.00x1.00m
- Se realizo excavación para la construcción del box de 1.00mx1.00m
- Se fundió piso de box en concreto de 3000psi con refuerzo.
- Se fundieron paredes en concreto de 3000psi con refuerzo
- Se fundieron zarpas y aletas en concreto de 3000psi con refuerzo
- Se fundió placa superior en concreto de 3000psi con refuerzo.
- Se fundió guarda rueda
- Se realizaron rellenos en recebo en los costados y sobre el box de 1.00mx1.00m para el paso vehicular de la vereda.
- Se recogieron sobrantes en todos los frentes de trabajo.
- Se realizo aseo en todos los frentes de trabajo

PERSONAL DE OBRA:

El Contratista, durante el período al cual corresponde el presente Informe ha mantenido el siguiente personal en la Obra:

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

NOMBRE	CARGO
CESAR RINCON	DIRECTOR
JORGE LOZADA	RESIDENTE
JESUS PORTILLO	PROFESIONAL DE SALUD
JUAN TAFUR	ESP. GERENCIA PROYECTOS
ALDEMAR MEJIA MORENO	AYUDANTE
JUAN SEBASTIAN ROMERO	MAESTRO
MIGUEL ANGEL GARRIDO MORALES	AYUDANTE

MAQUINARIA:

- Sin maquinaria

***HERRAMIENTAS*:**

- Herramienta menor
- Trompo a gasolina

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

- Guantes de carnaza
- Cascos
- Gafas
- Tapa oídos

INFORMACIÓN GENERAL

- Clima.

CLIMA

PERIODO:	JULIO		AÑO	2023
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE			
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.			
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ			

CONTRATO DE OBRA No.	314-2022

OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

JULIO

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ESTADO DEL TIEMPO																		
SOLEADO	X	X	X							x	X	X	X	X	X		x	
NUBADO				X	X			X	X									
LLOVISNA																X		X
LLUVIA						X	X											

DIAS LABORADOS	X
DIAS NO LABORADOS	X

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

- Herramientas.

CONTROL MAQUINARIA EN OBRA

PERIODO:	JULIO		AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE				
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.				
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ				

CONTRATO DE OBRA No.	314-2022

OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

JULIO

MAQUINARIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HERRAMIENTA MENOR	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
MEZCLADORA															A	A	A	A
COMPACTADOR TIPO RANA																		

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

- Personal

PERSONAL EN OBRA

PERIODO:	JULIO	AÑO	2023	
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE RICAURTE			
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.			
SUPERVISOR:	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ			

CONTRATO DE OBRA No.	314-2022

OBJETO:	OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA

JULIO

PERSONAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
DIRECTOR DE OBRA																		
RESIDENTE DE OBRA	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A
RESIDENTE SST	A				A				A			A				A	A	
ESP. G. P.																		
UN (1) MAESTRO	A		A		A				A	A	A	A					A	A
UN (1)OFICIALES	A		A		A				A	A	A	A					A	A

ACTIVO	A
REPARACION	R
INACTIVO	I

BALANCE FINANCIERO: CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN BALANCE DE OBRA DEL 22 DE MARZO DE 2023

ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PORCENTAJE DE AVANCE		
							CANT.	VALOR	% AVANCE
A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA									
BOX-COULVERT (A) 1,00M X 1,00M RELLENO DE 0,60 - 1,00M									
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
1.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	26,15	$ 791.038,00	26,15	$ 791.037,50	0,51%
1.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	18,23	$ 2.214.945,00	18,23	$ 2.214.945,00	1,42%
		Subtotal				**$ 3.005.983,00**			
2	ESTRUCTURA								
2.1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$ 820.700,00	13,63	$ 11.186.141,00	13,63	$ 11.186.141,00	7,15%
2.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	811,20	$ 8.809.632,00	811,2	$ 8.809.632,00	5,63%
2.3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$ 502.650,00	1,24	$ 623.286,00	1,24	$ 623.286,00	0,40%
		Subtotal				**$ 20.619.059,00**			
BOX-COULVERT (B) 1,50M X 1,50M RELLENO DE 2,00M - 2,50M									
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
3.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	25,70	$ 777.425,00	25,7	$ 777.425,00	0,50%
3.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	27,45	$ 3.335.175,00	27,45	$ 3.335.175,00	2,13%
		Subtotal				**$ 4.112.600,00**			
4	ESTRUCTURA								
4.1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$ 820.700,00	19,59	$ 16.077.513,00	19,59	$ 16.077.513,00	10,27%
4.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	1101,02	$ 11.957.077,00	1101,01998	$ 11.957.076,98	7,64%
4.3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$ 502.650,00	1,43	$ 718.790,00	1,43	$ 718.789,50	0,46%
		Subtotal				**$ 28.753.380,00**			
5	ITEMS NO PREVISTOS								
5,1	NP 1 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	$ 131.685,00	14,00	$ 1.843.590,00	14	$ 1.843.590,00	1,18%
		Subtotal				**$ 1.843.590,00**			
BADEN (C) 6,00M X 4,50M									
6	EXCAVACIONES Y RELLENOS								
6.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	21,06	$ 637.065,00	21,06	$ 637.065,00	0,41%
6.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	9,75	$ 1.184.625,00	9,75	$ 1.184.625,00	0,76%
		Subtotal				**$ 1.821.690,00**			
7	ESTRUCTURA								
7.1	VIAS 4,6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	$ 794.000,00	11,32	$ 8.988.080,00	11,32	$ 8.988.080,00	5,74%
7.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	814,93	$ 8.850.140,00	814,93	$ 8.850.139,80	5,65%
		Subtotal				**$ 17.838.220,00**			
8	ITEMS NO PREVISTOS								
8.1	NP 2 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	$ 131.685,00	16,25	$ 2.139.881,00	16,25	$ 2.139.880,99	1,37%
		Subtotal				**$ 2.139.881,00**			

1037

BADEN (D) 6,00M X 4,50M										
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
9,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	21,06	$ 637.065,00	21,06	$ 637.065,00	0,41%
9,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	9,99	$ 1.213.785,00	9,99	$ 1.213.785,00	0,78%
		Subtotal				**$ 1.850.850,00**			
10	**ESTRUCTURA**								
10,1	VIAS 4,6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	$ 794.000,00	11,32	$ 8.988.080,00	11,32	$ 8.988.080,00	5,74%
10,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	814,93	$ 8.850.140,00	814,93	$ 8.850.139,80	5,65%
		Subtotal				**$ 17.838.220,00**			
SUBTOTAL (A) CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA						**$ 99.823.473,00**			
B. CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA									
ALCANTARILLA DE 36" RELLENO MINIMO DE 0,60M									
11	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
11,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	71,34	$ 2.158.035,00	71,34	$ 2.158.035,00	1,38%
11,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	32,50	$ 3.948.750,00	32,5	$ 3.948.750,00	2,52%
		Subtotal				**$ 6.106.785,00**			0,00%
12	**ESTRUCTURA**								
12,1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$ 820.700,00	15,73	$ 12.909.611,00	15,73	$ 12.909.611,00	8,25%
12,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	911,93880	$ 9.903.655,00	911,92	$ 9.903.451,20	6,33%
12,3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$ 502.650,00	0,98	$ 492.597,00	0,97	$ 487.570,50	0,31%
		Subtotal				**$ 23.305.863,00**			
13	**ITEMS NO PREVISTOS**								
13,1	NP 3 (VIAS 4,48)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	$ 924.847,00	7,00	$ 6.473.929,00	7	$ 6.473.929,00	4,14%
13,2	NP 4 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	$ 131.685,00	8,35	$ 1.099.570,00	8,34	$ 1.098.252,90	0,70%
		Subtotal				**$ 7.573.499,00**			
SUBTOTAL (B) CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA						**$ 36.986.147,00**			
C. CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO									
BADEN 6.00X4.50M									
14	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**								
14,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 30.250,00	21,32	$ 644.930,00	21,32	$ 644.930,00	0,41%
14,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	$ 121.500,00	9,99	$ 1.213.785,00	9,98	$ 1.212.570,00	0,77%
		Subtotal				**$ 1.858.715,00**			
15	**ESTRUCTURA**								
15,1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	$ 820.700,00		$ -		$ -	0,00%
15,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 10.860,00	814,93	$ 8.850.140,00	814,92	$ 8.850.031,20	5,65%
15,3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	$ 502.650,00		$ -		$ -	0,00%
		Subtotal				**$ 8.850.140,00**			

1053

16	ITEMS NO PREVISTOS									
16,1	NP 5 (VIAS 4,6)	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	M3	$ 794.000,00	11,32	$ 8.988.080,00	11,32	$ 8.988.080,00	5,74%
		Subtotal				**$ 8.988.080,00**		$ -	
SUBTOTAL (C) CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO						**$ 19.696.935,00**			
							TOTAL	$ 156.495.357,50	99,99%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 156.506.500.00**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 01	**$0**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 02	**$57.415.055.25**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 03	**$18.034.521.50**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 04	**$46.023.212,55**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 05	**$22.474.704.90**
VALOR EJECUTADO PERIODO No. 06	**$ 12.547.863,30**
TOTAL, EJECUTADO (A)	**$ 156.495.357,50**
SALDO POR EJECUTAR (B)	**$ 11.142,50**
SUMAS IGUALES (A)+(B)	**$ 156.506.500.00**

PORCENTAJE DE EJECUCION:

Durante el periodo del 18 de junio al 18 de julio de 2023 se realizaron actividades que representaron el 99.99% de avance de obra.

1054


Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



excavación y solados

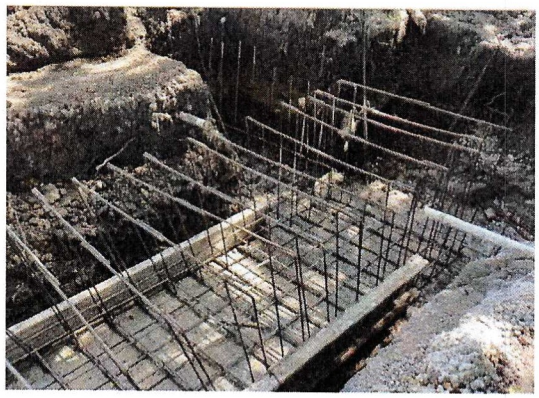

acero de refuerzo



Acero de refuerzo



fundida de muros y aletas



Box finalizado y rellenos

RICAURTE (CUNDI), MZ 8 CASA 2 CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA
Celular:314 84689 Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

Conclusiones:

- **Todas las actividades se realizaron de acuerdo a especificaciones técnicas en la buena fe de procesos constructivos con personal auxiliar y administrativo idóneo para la supervisión de cada una de las obras**
- **Todas las actividades fueron constantemente supervisadas por el delegado profesional de la alcaldía de Ricaurte.**
- **Todos los frentes de obra fueron organizados y dejados libre de escombros sin alterar el paisaje circundante.**

Documentos generados en el periodo:

- **Reinicio No. 03: 18 de junio de 2023**
- **Prorroga No. 04: 18 de junio de 2023 (UN MES)**
- **Fecha de finalización del contrato: 18 de julio de 2023**

Ingeniería y Construcciones A&G S.A.S.
Nit. 900.480.705-7
R.L. Ing. Hernán Darío Giraldo Romero
C.C. 5.471.343 de Ocaña.

1041

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11229634
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CESAR ARNOBY RINCON DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CONJ. MANGOS 1 CASA A11	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7887201284**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:	AÑO: 2023		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	49730527		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 186.300
SUBTOTAL:			1	**$ 186.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 145.500
SUBTOTAL:			1	**$ 145.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 81.100
SUBTOTAL:			1	**$ 81.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 411.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 411.400**

1042

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-04, 10:37:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	JORGE ELIECER LOZADA DIAZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 11227298
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056612003
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	84953180
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 411.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 80.800	$ 0
		SubTotales:		$ 411.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 411.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79243755		DELPORTILLO GOENAGA OSCAR JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 15 A bis N0 43 A 68	MONTERIA-CORDOBA	8333333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	85086187	9454667249	I	2023/08/14	2023/08/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$411,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	79243755	DEL PORTILLO OSCAR	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$411,400	$0	$0	$411,400

2023/08/04 10:42 AM

1047

1044

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-08-02, 11:52:49 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	JUAN CAMILO TAFUR SAENZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1110461919
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1056125903
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	45998472
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 411.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 145.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 80.800	$ 0
		SubTotales:		$ 411.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 411.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-08-02, 11:59:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1055921139

Periodo Cotización: julio de 2023 **Periodo Servicio:** agosto de 2023

PAGADO 02/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS		
Documento	NI900480705	**Dirección**	CL 11 #24 - 120 CONJUNTO LA FONTANA C38
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3148468958
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	GIRARDOT	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal	GIRALDO ROMERO HERNAN DARIO	**Identificación**	CC 5471343
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80493425	ALDEMAR MEJIA MORENO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 515.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 145.000	$ 80.800	$ 46.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.800	$ 0	$ 515.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070598922		ROMERO CORONADO JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 8A - 31 BARRIO GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3105603861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	80760713	9454577250	I	2023/08/08	2023/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
1	CC	1070598922	ROMERO JUAN			X														230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF22	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070598922		ROMERO CORONADO JUAN SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 No. 8A - 31 BARRIO GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3105603861	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	80760713	9454577250	I	2023/08/08	2023/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$434,600	$0	$0	$434,600

196

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121917353		GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 #18-76	CUBARRAL-META	6755876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	80603355	9454128279	I	2023/08/14	2023/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
Ciudad: CUBARRAL Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600
1	CC	1121917353	GIRALDO MIGUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$145,000	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	No	$434,600
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$434,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1121917353		GIRALDO MORALES MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 #18-76	CUBARRAL-META	6755876	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	80603355	9454128279	I	2023/08/14	2023/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$434,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$434,600	$0	$0	$434,600

2023/08/02 11:03 AM

1 of 1

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO DE OBRA No 314-2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 156.506.500,00
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		FECHA DEL CONTRATO	22 DE NOVIEMBRE 2022
MUNICIPIO RICAURTE	OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	ANTICIPO	N.A.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		PLAZO INICIAL	2 MESES
	Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.	FECHA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE ENERO 2023 FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE REINICIO N° 01: 10 DE ENERO DE 2023 FECHA DE PRÓRROGA N° 001: 10 DE FEBRERO DE 2023 POR TREINTA (30) DIAS CALENDARIO FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02: 24 DE FEBRERO DE 2023 FECHA DE REINICIO N° 02: 16 DE MARZO DE 2023 FECHA PRORROGA No. 02: 31 DE MARZO DE 2023 POR UN (01) MES FECHA DE PRORROGA No. 03: 03 MAYO 2023 POR UN (01) MES FECHA DE SUSPENSION No. 03: 31 DE MAYO DE 2023 FECHA DE REINICIO N° 03: 15 DE JUNIO 2023 FECHA DE PRORROGA No. 04: 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN (01) MES FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE JULIO 2023
Ricaurte NUESTRO COMPROMISO	Nit. 900 480 705-7		
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.		
	R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO		
	CONTRATO No. 314 - 2022 — FEHCA DE LA PRESENTE ACTA: 18 DE JULIO DE 2023		
ACTA FINAL	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas SUPERVISORA		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 02

CAPITULO 1.		PRILIMINARES					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA FINAL		TOTAL	
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT. ACUMULADAS	VITOTAL
No.	ICCU											
A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA												
BOX-COULVERT (A) 1,00M X 1,00M RELLENO DE 0,60 - 1,00M												
1	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
1.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	26,15	$ 30.250,00	$ 791.038,00		$ -	26,15	$ 791.037,50	26,15	$ 791.037,50
1.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	18,23	$ 121.500,00	$ 2.214.945,00		$ -	18,23	$ 2.214.945,00	18,23	$ 2.214.945,00
		Subtotal				$ 3.005.983,00		$ -		$ 3.005.982,50		$ 3.005.982,50
2	ESTRUCTURA											
2.1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	13,63	$ 820.700,00	$ 11.186.141,00	5,43	$ 4.456.401,00	8,2	$ 6.729.740,00	13,63	$ 11.186.141,00
2.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	811,20	$ 10.860,00	$ 8.809.632,00	811,20	$ 8.809.632,00			811,20	$ 8.809.632,00
2.3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,10	$ 502.650,00	$ 552.915,00	1,10	$ 552.915,00			1,10	$ 552.915,00
		Subtotal				$ 20.548.688,00		$ 13.818.948,00		$ 6.729.740,00		$ 20.548.688,00
BOX-COULVERT (B) 1,50M X 1,50M RELLENO DE 2,00M - 2,50M												
3	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
3.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	25,70	$ 30.250,00	$ 777.425,00	25,70	$ 777.425,00			25,70	$ 777.425,00
3.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	47,90	$ 121.500,00	$ 5.819.734,00		$ -	47,82	$ 5.810.130,00	47,82	$ 5.810.130,00
		Subtotal				$ 6.597.159,00		$ 777.425,00		$ 5.810.130,00		$ 6.587.555,00
4	ESTRUCTURA											
4.1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	19,59	$ 820.700,00	$ 16.077.513,00	19,59	$ 16.077.513,00			19,59	$ 16.077.513,00
4.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1101,02	$ 10.860,00	$ 11.957.077,00	1101,02	$ 11.957.077,00			1101,02	$ 11.957.077,00
4.3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	1,62	$ 502.650,00	$ 814.293,00	1,62	$ 814.293,00			1,62	$ 814.293,00
		Subtotal				$ 28.848.883,00		$ 28.848.883,00				$ 28.848.883,00
5	ITEMS NO PREVISTOS											
5,1	NP 1 (VIAS 1,5)	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	14,00	$ 131.685,00	$ 1.843.590,00	14,00	$ 1.843.590,00			14,00	$ 1.843.590,00
		Subtotal				$ 1.843.590,00		$ 1.843.590,00				$ 1.843.590,00
BADEN (C) 6,00M X 4,50M												
6	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
6.1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,06	$ 30.250,00	$ 637.065,00	21,06	$ 637.065,00			21,06	$ 637.065,00
6.2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	9,75	$ 121.500,00	$ 1.184.625,00	9,75	$ 1.184.625,00			9,75	$ 1.184.625,00
		Subtotal				$ 1.821.690,00		$ 1.821.690,00				$ 1.821.690,00
7	ESTRUCTURA											
7.1	VIAS 4,6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	M3	11,32	$ 794.000,00	$ 8.988.080,00	11,32	$ 8.988.080,00			11,32	$ 8.988.080,00
7.2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	814,93	$ 10.860,00	$ 8.850.140,00	814,93	$ 8.850.140,00			814,93	$ 8.850.140,00
		Subtotal				$ 17.838.220,00		$ 17.838.220,00				$ 17.838.220,00
8	ITEMS NO PREVISTOS											
8.1	NP 2 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	16,25	$ 131.685,00	$ 2.139.881,00	16,25	$ 2.139.881,00			16,25	$ 2.139.881,00
		Subtotal				$ 2.139.881,00		$ 2.139.881,00				$ 2.139.881,00
BADEN (D) 6,00M X 4,50M												
9	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
9,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,06	$ 30.250,00	$ 637.065,00	21,06	$ 637.065,00			21,06	$ 637.065,00
9,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	9,99	$ 121.500,00	$ 1.213.785,00	9,99	$ 1.213.785,00			9,99	$ 1.213.785,00
		Subtotal				$ 1.850.850,00		$ 1.850.850,00				$ 1.850.850,00
10	ESTRUCTURA											
10,1	VIAS 4,6	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	M3	11,32	$ 794.000,00	$ 8.988.080,00	11,32	$ 8.988.080,00			11,32	$ 8.988.080,00
10,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	814,93	$ 10.860,00	$ 8.850.140,00	814,93	$ 8.850.109,00			814,93	$ 8.850.109,00
		Subtotal				$ 17.838.220,00		$ 17.838.189,00			0,00	$ 17.838.189,00
SUBTOTAL (A) CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA						$ 102.333.164,00		$ 86.777.676,00				$ 102.323.528,50

1062

REPUBLICA DE COLOMBIA	CONTRATO DE OBRA No 314-2022	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 156.506.500,00
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		FECHA DEL CONTRATO	
MUNICIPIO RICAURTE	OBJETO: OBRAS DE ARTE PAR EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA	ANTICIPO	0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS		PLAZO	2 MESES
	Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.	FECHA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 DE ENERO 2023 FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE REINICIO N° 01: 10 DE ENERO DE 2023 FECHA DE PRÓRROGA N° 001: 10 DE FEBRERO DE 2023 POR TREINTA (30) DIAS CALENDARIO FECHA DE SUSPENSIÓN N° 02: 24 DE FEBRERO DE 2023 FECHA DE REINICIO N° 02: 16 DE MARZO DE 2023 FECHA PRORROGA No. 02: 31 DE MARZO DE 2023 POR UN (01) MES FECHA DE PRORROGA No. 03: 03 MAYO 2023 POR UN (01) MES FECHA DE SUSPENSION No. 03: 31 DE MAYO DE 2023 FECHA DE REINICIO N° 03: 15 DE JUNIO 2023 FECHA DE PRORROGA No. 04: 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN (01) MES FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE JULIO 2023
Ricaurte NUESTRO COMPROMISO	Nit. 900 480 705-7		
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S.		
	R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO		
	CONTRATO No. 314 - 2022 / FEHCA DE LA PRESENTE ACTA: 18 DE JULIO DE 2023		
ACTA FINAL	ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ Secretaria de Infraestructura y Obras Publicas SUPERVISORA		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No. 02							ACTA PARCIAL No. 01		ACTA FINAL			
	ITEM	PRILIMINARES										
No.	ICCU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT. ACUMULADAS	VITOTAL
B. CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA												
ALCANTARILLA DE 36" RELLENO MINIMO DE 0,60M												
11	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
11,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	71,34	$ 30.250,00	$ 2.158.035,00	71,34	$ 2.158.035,00			71,34	$ 2.158.035,00
11,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	34,96240	$ 121.500,00	$ 4.247.932,00	34,17	$ 4.151.655,00	0,78	$ 94.770,00	34,95	$ 4.246.425,00
		Subtotal				$ 6.405.967,00		$ 6.309.690,00		$ 94.770,00		$ 6.404.460,00
12	ESTRUCTURA											
12,1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3	12,73	$ 820.700,00	$ 10.447.511,00	12,73	$ 10.447.511,00		$ -	12,73	$ 10.447.511,00
12,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	911,9388	$ 10.860,00	$ 9.903.655,00	911,9388	$ 9.903.655,00			911,94	$ 9.903.655,00
12,3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,29	$ 502.650,00	$ 145.769,00	0,29	$ 145.769,00			0,29	$ 145.769,00
		Subtotal				$ 20.496.935,00		$ 20.496.935,00		$ -		$ 20.496.935,00
13	ITEMS NO PREVISTOS											
13,1	NP 3 (VIAS 4,48)	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	7,00	$ 924.847,00	$ 6.473.929,00	7,00	$ 6.473.929,00			7,00	$ 6.473.929,00
13,2	NP 4 (VIAS 1,5)	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	8,35	$ 131.685,00	$ 1.099.570,00	8,35	$ 1.099.570,00			8,35	$ 1.099.570,00
		Subtotal				$ 7.573.499,00		$ 7.573.499,00				$ 7.573.499,00
SUBTOTAL (B) CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA						$ 34.476.401,00		$ 34.380.124,00				$ 34.474.894,00
C. CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO												
BADEN 6,00M X 4,50M												
14	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
14,1	VIAS 2,9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	21,32	$ 30.250,00	$ 644.930,00	21,32	$ 644.930,00			21,32	$ 644.930,00
14,2	VIAS 4,23	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	9,99	$ 121.500,00	$ 1.213.785,00	9,99	$ 1.213.785,00			9,99	$ 1.213.785,00
		Subtotal				$ 1.858.715,00		$ 1.858.715,00				$ 1.858.715,00
15	ESTRUCTURA											
15,1	VIAS 4,9	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BOX-COULVERT)	M3		$ 820.700,00	$ -		$ -				$ -
15,2	VIAS 4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	814,93	$ 10.860,00	$ 8.850.140,00	814,93	$ 8.850.140,00			814,93	$ 8.850.140,00
15,3	VIAS 4,24	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3		$ 502.650,00	$ -		$ -				$ -
		Subtotal				$ 8.850.140,00		$ 8.850.140,00				$ 8.850.140,00
16	ITEMS NO PREVISTOS											
16,1	NP 5 (VIAS 4,6)	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 PSI (BASES)	M3	11,32	$ 794.000,00	$ 8.988.080,00	11,32	$ 8.988.080,00			11,32	$ 8.988.080,00
		Subtotal				$ 8.988.080,00		$ 8.988.080,00				$ 8.988.080,00
SUBTOTAL (C) CAMELLON LAS ESTRELLAS VEREDA LLANO DEL POZO						$ 19.696.935,00		$ 19.696.935,00				$ 19.696.935,00
					SUB TOTAL	$ 156.506.500,00	TOTAL	$ 140.854.735,00		$ 15.640.622,50		$ 156.495.357,50
					AJUSTE AL PESO							
					TOTAL	$ 156.506.500,00						

VALOR CONTRATO	$ 156.506.500,00
ACTA PARCIAL No. 01 (A)	$ 140.854.735,00
ACTA FINAL (B)	$ 15.640.622,50
TOTAL EJECUTADO	$ 156.495.357,50
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (C)	$ 11.142,50
% DE EJECUCION	99,99%
TOTAL A + B + C	$ 156.506.500,00
VALOR TOTAL	$ 156.506.500,00

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas
Supervisor – Obra Civil

1090

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO			Ricaurte CON EQUIDAD, SEGURIDAD, Y COMPROMISO SOCIAL
NIT. 890.680.059-1							
FECHA	DD	18	MM	7	AA	2023	
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA						
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA					CONTRATO N°	314-2022
CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.						

A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA

BOX-COULVERT (A) 1,00M X 1,00M RELLENO DE 0,60 - 1,00M	CAPITULO 1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM 1.1

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)



DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
excavacion para caja de box	2,20	6,20	1,80	1,00	24,55
excavacion zarpa de aletas	0,25	2,00	0,80	4,00	1,60

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	26,15
TOTAL	26,15

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MÓNICA A. MALAGÓN C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	18	MM	7	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			CONTRATO N°		314-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.					

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD
Y COMPROMISO SOCIAL

A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA

BOX-COULVERT (A) 1,00M X 1,00M RELLENO DE 0,60 - 1,00M	CAPITULO 1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM 1.2

RELLENO PARA ESTRUCTURAS



DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
conformacion de rampas	5,00	3,00	0,25	2,00	7,50
relleno de caja	0,70	6,20	1,55	1,00	6,73
atraque de aletas en recebo	0,50	2,00	1,00	4,00	4,00

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	18,23
	TOTAL	18,23

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MÓNICA A. MALAGÓN C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	18	MM	7	AA	2023

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA		
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA	CONTRATO N°	314-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.		

A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA

BOX-COULVERT (A) 1,00M X 1,00M RELLENO DE 0,60 - 1,00M	CAPITULO 2	ESTRUCTURA	ITEM 2,1

CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BOX-COULVERT)



DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
PLACA SUPERIOR	1,5000	6,2000	0,3000	1,0000	2,7900
GUARDAS RUEDA	0,2500	1,5000	0,3000	2,0000	0,2250
ALETAS	0,2500	2,0000	1,2500	4,0000	2,5000
ZARPA	0,8000	2,0000	0,2500	4,0000	1,6000
PLACA PISO (m2)	2,1700		0,2500	2,0000	1,0850

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	8,20
	TOTAL	8,20

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MÓNICA A. MALAGÓN C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	18	MM	7	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA			CONTRATO N°		314-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.					
A. CAMELLON LOS INCORADOS QUE COMUNICA LA VEREDA SAN FRANCISCO CON LA VEREDA LA CARRERA						
BOX-COULVERT (B) 1,50M X 1,50M RELLENO DE 2,00M - 2,50M			CAPITULO 3	EXCAVACIONES Y RELLENOS		ITEM 3,2
RELLENO PARA ESTRUCTURAS						



DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
relleno de caja	0,50	7,00	2,00	2,00	14,00
atraque de aletas en recebo	0,50	2,00	1,00	4,00	4,00
relleno hasta rasante	2,84	7,00	1,50	1,00	29,82
				SUBTOTAL	47,82
				TOTAL	47,82

OBSERVACIONES:

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MÓNICA A. MALAGÓN C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIOP

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA				MEMORIAS DE CALCULO		
NIT. 890.680.059-1						
FECHA	DD	18	MM	7	AA	2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE ARTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA					
CONTRATANTE	ALCALDIA DE RICAURTE, CUNDINAMARCA				CONTRATO N°	314-2022
CONTRATISTA	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.					

Ricaurte
CON EQUIDAD, SEGURIDAD Y COMPROMISO SOCIAL

B. CAMELLON PRINCIPAL VEREDA CUMACA

ALCANTARILLA DE 36" RELLENO MINIMO DE 0,60M	CAPITULO 11	EXCAVACIONES Y RELLENOS	ITEM 11,2

RELLENO PARA ESTRUCTURAS



DESCRIPCION	DIMENSIONES			Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LONG	ALTURA		
relleno para atraque de aletas	0,100	2,000	0,975	4,00	0,78
				SUBTOTAL	0,78

OBSERVACIONES:

TOTAL	0,78

Elaboro:

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G SAS
NIT. 900.480.705-7
R.L. ING. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343 DE OCAÑA

ING. MÓNICA A. MALAGÓN C.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIOP

1073
530

Ingeniería y Construcciones
A & G S.A.S
NIT. 900 480 705 – 7

A&G S.A.S.
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

YO HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía número 5.471.343 expedida en Ocaña, en mi calidad de Representante Legal de INGENIERA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS

C E R T I F I C O:

Que la empresa INGENIERA Y CONSTRUCCIONES AYG SAS identificada con el NIT 900480705-7, se encuentra totalmente al día con sus liquidaciones y pagos de prestaciones sociales, de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales del personal activo y que ya no se encuentran vinculado a la empresa durante los últimos 6 meses. Se expide en la ciudad de Girardot, para efectos Legales, a los veinticinco (25) días del mes de JULIO del 2023

Cordialmente

R.L. Ing HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AYG S.A.S
CC 5.471.343 expedida en Ocaña

RICAURTE (CUNDI), CIUDADELA JOSE MARIA CORDOBA MANZADA 8 CASA 2
Celular: 311 2871600 – 314 8468958
Email: ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97182956	180212445	25/09/2023

074

Número de Identificación
900480705

Primer Nombre ó Razón Social
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
7

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
MANZANA 19 CASA 18 ESMERALDA

Ciudad de Domicilio
GIRARDOT

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 2871600

Correo electrónico
ingenieriayconstruccionesayg@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Cundinamarca

Regional Centros SIIF
36-02-00-025-000000

Número Licencia de Obra
314-2022

Número Contrato de Obra
314-2022

Nombre Obra
OBRAS VIAS TERCIARIAS RICAURTE

Fecha Inicio Obra
01/12/2022

Fecha Terminación Obra
23/07/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
900480705

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
156495358.00

Costo Total Mano de Obra
23500000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
5

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
391238.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
391238.00

ecollect
Seguro para ti

COMPROBANTE

1075

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	97182956	180212445	25/09/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900480705**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.84.89.182**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 391,238.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 391,238.00	COP$ 391,238.00

ecollect
Seguro para ti
