XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA
	FORMATO COMITÉ	

LUGAR DE REUNIÓN: Cra 7 # 20-49 Soacha ofi. Contratista.	HORA DE INICIO: 7:30 am
FECHA: 17/08/2022	HORA DE TERMINACIÓN:
ELABORADO POR:	NUMERO DE COMITE: 2
TIPO DE COMITÉ TÉCNICO [X]	GERENCIA [ ]

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN	
	Verificación del avance y estado actual del contrato de obra N° 024 de 2022, "Rehabilitacion de las vias y obras de urbanismo en diferentes Sectores del municipio de Soacha Cundinamarca.

AGENDA PROPUESTA	
1.	Verificación del estado actual y avance de las obras.
2.	Solicitud de la entrega de diseños de las vias.
3.	
4.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inicia la reunión a las 7:30 am, en compañia del Supervisor de Epuxua el Ing. Juan Pablo Cañon, el directo de obra Ing Milton Rivera y la residente de interventoria Ing. Lorena Cifuentes. el primer punto a tratar es la verificación de los APUs para la Solicitud de modificatorio y actualizacion de precios ICCU 2022. Por parte del Contratista de Obra. Se da claridad que para los concretos de las huellas sera de 3000 PSI. (Diseño placa - huella.)

las intervensiones de las vias del barrio Santo Domingo se tiene programado la terminación de las mismas al 20 de Septiembre, para a partir de dicha fecha iniciar labores en el barrio luis Carlos Galan. I,


El Contratista de obra solicita verificar el diseño de la via porque el espesor de la Sub base es de 0,15 y la calidad de la Sub rasante es mala, y para tener la tranquilidad de que el diseño establecido cumpla en casos futuros de garantias.

Se establecen la longitud de las muestras cada 5mts. (placa-huella).

la instalación del mortero va a estar a cargo del contratista de Obra coordinando con la comunidad la instalación del adoquin.

la interventoria solicita la toma de laboratorios.

XUÁ Empresa Pública de Soacha	**EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** **FORMATO COMITÉ**	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

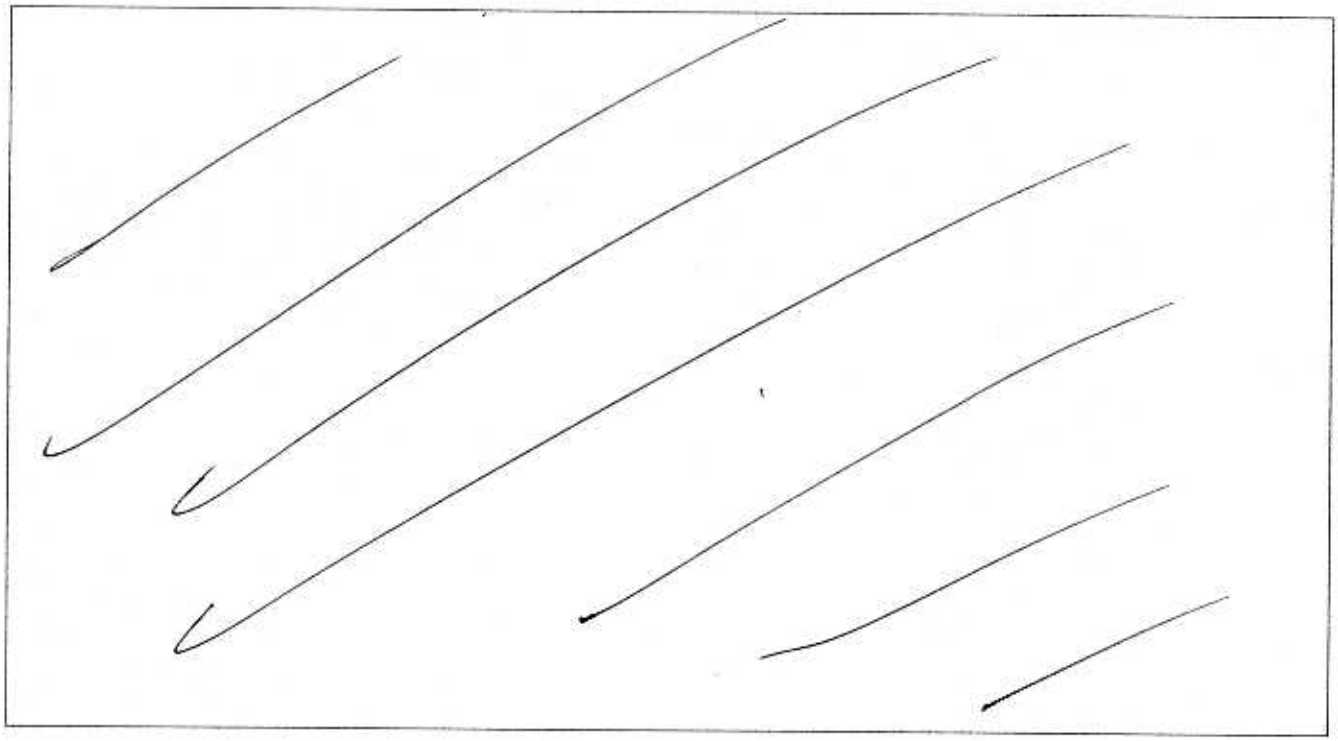

ACUERDOS Y COMPROMISOS		
ACTIVIDAD:	**RESPONSABLE:**	**FECHA:**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. FORMATO COMITÉ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

PARTICIPANTES			
NOMBRE	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
Milton E. Rivera	Contratista Gamer.	3113467636	
Juan Pablo Cañón	Epuxua	3124821154	
Nubia Rivera	Contratista Gamer	3102935197	
Javier Cifuentes	Residente de Interventoria.	3105709035	
[illegible]	INTERVENTORIAS & CONSULTING	3108032525	
