
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**OBRA BARRANQUILLA MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - CONSORCIO TECALINAS**	**54,56 días**	**mié 20/12/23**	**jue 29/02/24**	
2		INICIO DE OBRA	0 días	mié 20/12/23	mié 20/12/23	
3		**PRELIMINARES**	**30 días**	**mié 20/12/23**	**mar 30/01/24**	**2**
4		CUADRILLA BB (INSTALACIONES) X 2	30 días	mié 20/12/23	mar 30/01/24	2
5		CUADRILLA DE 2 AYUDANTES X 6	30 días	mié 20/12/23	mar 30/01/24	4CC
6		CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) X 9	30 días	mié 20/12/23	mar 30/01/24	5CC
7		**MAMPOSTERIA**	**3,56 días**	**vie 26/01/24**	**mar 30/01/24**	**2**
8		CUADRILLA BB (INSTALACIONES) X 1	3,56 días	vie 26/01/24	mar 30/01/24	2
9		CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) X 1	3,56 días	vie 26/01/24	mar 30/01/24	8CC
10		**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**2,56 días**	**jue 28/12/23**	**sáb 30/12/23**	**2**
11		CUADRILLA ELECTRICA (INSTALACIONE X 3	2,56 días	jue 28/12/23	sáb 30/12/23	2
12		CUADRILLA X 1	2,56 días	jue 28/12/23	sáb 30/12/23	11CC
13		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**9,11 días**	**sáb 30/12/23**	**vie 12/01/24**	**2**
14		CUADRILLA BB (INSTALACIONES) X 5	9,11 días	sáb 30/12/23	vie 12/01/24	2
15		**PAÑETES Y ENCHAPES**	**22,22 días**	**vie 12/01/24**	**jue 8/02/24**	**2**
16		CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) X 5	22,22 días	vie 12/01/24	jue 8/02/24	2
17		**BASES Y PISOS**	**40,44 días**	**sáb 23/12/23**	**jue 15/02/24**	**2**
18		CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) X 3	40,44 días	sáb 23/12/23	jue 15/02/24	2
19		**CIELORRASOS**	**5,56 días**	**mié 27/12/23**	**mié 3/01/24**	**2**
20		CUADRILLA BB (INSTALACIONES) X 1	5,56 días	mié 27/12/23	mié 3/01/24	2
21		CUADRILLA DRYWALL X 1	5,56 días	mié 27/12/23	mié 3/01/24	20CC
22		**IMPERMEABILIZACIÓN**	**6,56 días**	**mié 3/01/24**	**jue 11/01/24**	**2**
23		CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) X 1	6,56 días	mié 3/01/24	jue 11/01/24	2
24		**ESTUCO Y PINTURA**	**43,44 días**	**vie 29/12/23**	**vie 23/02/24**	**2**
25		CUADRILLA CC (PINTURA) X 11	43,44 días	vie 29/12/23	vie 23/02/24	
26		CUADRILLA DD (CARPINTERIAS) X 3	43,44 días	vie 29/12/23	vie 23/02/24	25CC
27		**CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y PVC**	**6,56 días**	**jue 22/02/24**	**jue 29/02/24**	**2**
28		CUADRILLA CC (PINTURA) X 1	6,56 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	2
29		CUADRILLA BB (INSTALACIONES) X 3	6,56 días	jue 22/02/24	jue 29/02/24	28CC
30		**CUBIERTA**	**13,11 días**	**mié 3/01/24**	**vie 19/01/24**	**2**
31		CUADRILLA BB (INSTALACIONES) X 1	13,11 días	mié 3/01/24	vie 19/01/24	2
32		CUADRILLA AA (ALBAÑILERIA) X 4	13,11 días	mié 3/01/24	vie 19/01/24	31CC
33		**MOBILIARIO**	**4,56 días**	**vie 22/12/23**	**jue 28/12/23**	**2**
34		CUADRILLA DE 2 AYUDANTES X 1	4,56 días	vie 22/12/23	jue 28/12/23	2
35		CUADRILLA DD (CARPINTERIAS) X 1	4,56 días	vie 22/12/23	jue 28/12/23	34CC
36		FIN DE OBRA	0 días	jue 29/02/24	jue 29/02/24	2;3;7;10;13;15;17

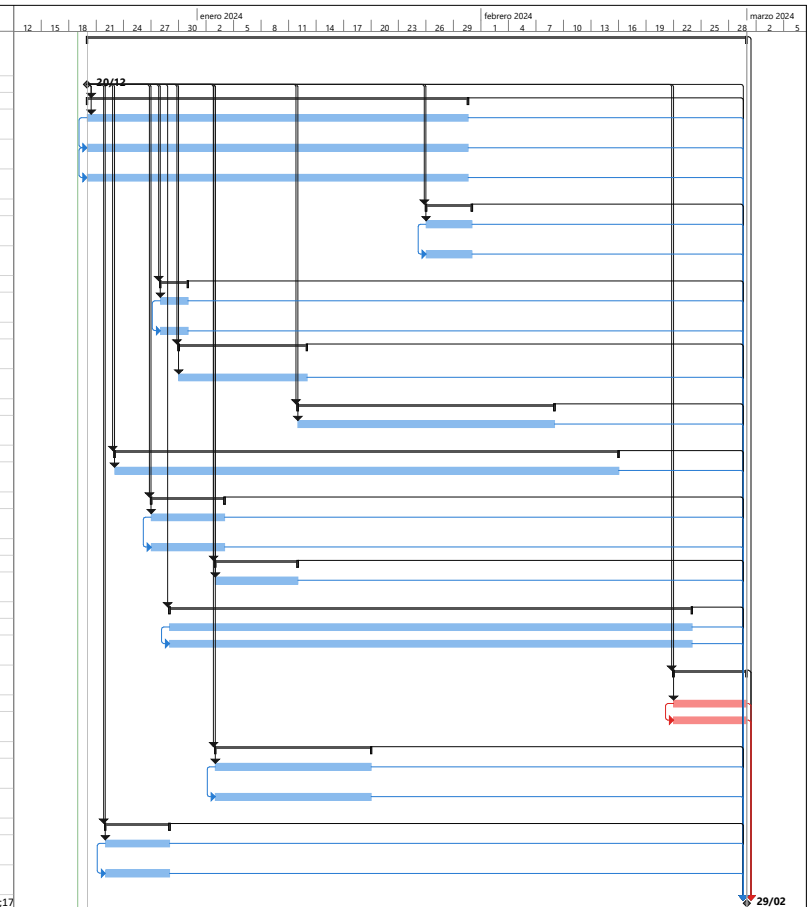

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TECALINAS
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
INGENIERO CIVIL C.C. 17.344.965 DE VILLAVICENCIO, META

Proyecto: PROGRAMACION BA
Fecha: mar 19/12/23

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual				
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas					
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica					
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso					
