ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado material y herramienta	Sobreesfuerzo, caida mismo nivel, golpes, machucones.	ayudas mecanicas, eleven locativo, autocuidado, uso EPP, uso overol.
Insp- retroexcavadora.	estres, fatiga.	pausas laborales, autocuidado charlas SST.
Inicio excavacion mecanica	fatiga, dolores lumbares, estres, posturas inadecuadas.	pausas laborales, higiene postural, uso tapa-oidos, cabina-antiruido.
Inicio excavacion manual	golpes, machucones, cortes, fatiga, caida, mismo nivel, dolores lumbares	autocuidado, higiene postural, uso EPP, uso overol, eleven locativo, hidratacion.
nivelacion piso.	dolores lumbares, fatiga, golpes, cortes leves.	higiene postural, retencion personal, retencion actividades. uso EPP, uso overol.
Compactacion Receba	ubicacion, golpe caller, machucones-cortes	pausas laborales, hidratacion, uso EPP, uso overol, autocuidado.
cierre y aseo.	virus, hongos, bacterias, cortes.	autocuidado, uso EPP, uso overol.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Orley Cardona 1654947633	Orley Cardona
Jhon Jairo Lamoto 1056709572	Jhon Jairo
YAIR ANDRES USGAME 80807876	
Cuenton Buitrago 1012356138	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Deiby Dayanny Castro D. 4023021403.	

ELABORADO POR:
CEDULA: 80807876

APROBADO POR
CEDULA: 4023021403

Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS...

CAMPO:	C. Jue-Felix Restrepo sede C.	**NÚMERO DEL ATS:**	CV3	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Raul Castro	**NOMBRE:** 1028021403	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones mecanicas, nivelacion piso, compactacion piso manual y mecanicci.					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	04-11-23. 8:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	Inicio SST. Visualizar PAT CV3.			**N° DE REVISIÓN:**	CV3	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	13-11-23. 5:00pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☒
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☒
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☒	LINEA DE VIDA	☒
ALTURA APROXIMADA	☒	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☒	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☒	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, llaves, alicates, cincel, marcetes, pala, carretilla
Eléctricas	✓	y Retomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Aseo, traslado material y herramienta	Sobreesfuerzo, caida mismo nivel, golpes, machucones	ayudas mecanicas, orden locativo, uso EPP uso cuarto, autocuidado.
Uso, demolicion manual y mecanica (ladrillo)	Ambiguos, sobreesfuerzos, Fatiga, golpe roce, vibraciones, ruido.	higiene postural, pausas laborales, hidratacion, uso topicados, rotacion personal, actividades
Nivelacion piso y compactacion manual/mecanica	Atrapo, cortes, golpes, machucones.	pausas laborales, rotacion personal, autocuidado uso EPP, uso cuarto.
Cargue y descargue recibo / reciclo.	Ambiguos, sobreesfuerzos, machucon cortes, atrapones.	higiene postural, ayudas mecanicas, uso EPP, uso cuarto, autocuidado, orden locativo
Orden y aseo	Virus, hongos, bacterias.	autocuidado uso EPP, uso cuarto.
//	//	// //
//	//	// //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☒ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☒ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhonny Hernando Torres	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Deibar Dayanny castro p. 1023021403.	

ELABORADO POR: Jhonny Hernando
CEDULA: 1.016.118794

APROBADO POR
CEDULA: 1023021403.

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. Jose Felix Restrepo Sect C.	**NÚMERO DEL ATS:**	004	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Oscar Castro	**CEDULA:** 1023021403	
TIPO DE TRABAJO:	excavacion manual / compactacion piso / excavacion mecanica. tuberia. red.					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/23. 8:00am.
EQUIPO DE TRABAJO:	minicargador Vinculado pay 003.	**Nº DE REVISIÓN:**	004			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	05/11/23. 5:00 PM

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☐	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Picas, palas, cincel, maceta, carretilla.
Eléctricas	✓	Rotomartillo, Pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO



Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jefersson Espinoza : 5672271	Jefersson E.
Cruz Alcides Espinoza 2283840	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Arbey Davonny Castro P. 1023021403.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 2283840

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403.

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio José Felix. Este C.	NÚMERO DEL ATS:	CU2.	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	Dubal castro	NOMBRE: CEDULA	1023021403.
TIPO DE TRABAJO:	Remates pintura, trapiego, limpieza, lijado, estuco, Remates.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	17-10-23 8:00am.
EQUIPO DE TRABAJO:	Carlos Gutierrez. Visualizar pag 003			N° DE REVISIÓN:	CU2.	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	22-10-23 5:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pinzas, espatulas, cincel, maceta, rotillo, brochas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Página 2 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Traslado materia y herramienta	Sobreesfuerzo, tropezones, caidas mismo nivel, golpes, machucones	ejercicios mecanicos, orden preventivo de trabajo, uso epp, uso overol,
Mezcla estuco, cemento pintura.	dolor lumbar, dolores, palmaciones fatiga, cefalea.	higiene postural, uso tapabocas, uso overol. pausas laborales, autocuidado.
Aplicacion, estuco, cemento pintura.	dolores lumbares, palmaciones, fatiga, cefalea, golpes	Higiene postural, uso tapabocas, autocuidado, pausas laborales, retencion actividades.
Aseo, orden y limpieza general.	virus, hongos, bacterias, cortes dolores lumbares	Autocuidado, uso epp, uso overol, higiene postural.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
- ☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☑ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jovanny Maldonado Porras 1.016118794	
Yomaicol Peña 1082479243	Yomaicol
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Oscar Oviamny castro p. 4023021403.	

ELABORADO POR: Jovanny Maldonado
CEDULA: 1.016.118794

APROBADO POR
CEDULA: 4023021403.

Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	COLEGIO MODELO SEDE C.	NÚMERO DEL ATS:	003	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sadi	CEDULA: 1023522782	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (DEMOLICIÓN DE VIGAS Y PLACA DE CONCRETO CUBIERTA)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	16/10/2023 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	OFICIALES Y AYUDANTES (VER PÁGINA 5).	N° DE REVISIÓN:	003		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	27/10/2023 5:00 P.M	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR.
Eléctricas	✓	TALADRO (DEMOLEDOR).
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, LUXACIONES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN
2. Demolición vigas y losa	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES	USO EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN
3. Descenso.	RESBALONES, CAIDAS MISMO Y/O DIFERENTE NIVEL, GOLPES, DESGUINCES.	USO EPP Y EPCC, CHARLAS, CAPACITACIÓN

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ *Si, proceda con la tarea.*

☐ *No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.*

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhonatan Castellanos 1023022991	
Cristian Camilo Arias 1024974038	
Hector Docuera 80437753	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jessica Rodriguez 1031752036	

ELABORADO POR: Jessica Rodriguez
CEDULA: 1031752036

APROBADO POR
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión. 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Moralbac	NÚMERO DEL ATS:	029	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: [illegible]	CEDULA: 1024522713	
TIPO DE TRABAJO:	Remates en general				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Oct 27 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes/oficiales	N° DE REVISIÓN:	029		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Oct. 31	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	N/A ☐	EXTINGUIDORES	N/A ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	N/A ☐	ESLINGA	N/A ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/A ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐ N/A	LINEA DE VIDA	N/A ☐
ALTURA APROXIMADA	N/A ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/A ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con contra/esguince/, Torceduras/caida a mismo nivel/	Orden y Aseo/inspecciones preoperacionales/ Uso calzado de seguridad/
Remates en general	Golpes con contra/caida de objetos/Lesiones en los esguinces y torceduras	inspecciones preoperacionales/ Uso de guantes de vaqueta/monogafas protecciones para el cuerpo./Ropa de trabajo adecuado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Hardba	NÚMERO DEL ATS:	028	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Daiv	CEDULA: 1024522702
TIPO DE TRABAJO:	Alturas				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	24/10/23 7:00 am
EQUIPO DE TRABAJO:	• Jhonatan Castellanos • Cristian Arias. • Abel Oviedo • Pablo Cordillo	N° DE REVISIÓN:	028		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/23 6:00 pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 6.0 m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑	—	—

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	/	Herramienta menor
Eléctricas	/	Demoledor, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Postural, golpes, caídas mismo y/o diferente nivel	Uso de EPP y EPCC, charlas informativas y capacitaciones del personal.
2. Demolición ingreso y Alza	Posturales, golpes, caídas mismo y/o diferente nivel,	Uso de EPP y EPCC, charlas informativas y capacitación del personal.
3. Corte de acero de ingreso	Golpes, cortes, caídas de mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPCC, charlas informativas y capacitación del personal.
4. Descanso	Posturales, golpes, caídas mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPCC, charlas informativas y capacitación del personal.

OBSERVACIONES:

EVALUACIÓN DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma:
Hector Duvera	80437757	
Cristian Camilo Arias	1024474088	
Jhonatan Castellanos	1023022997	
Pablo Gordillo	58373477	
Abel Galvano	1021199707	
Diego Londoño	1030633590	Diego Londoño
Juan P. Garcia O.	1010246899	Juan P. Garcia O
Nombre	Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Pablo Garcia Ortiz.	1010246899	Juan P. Garcia O.

ELABORADO POR: Juan P. Garcia O.
CEDULA: 1010246899

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	MORALBA SEDE C.	NÚMERO DEL ATS:	18	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Said	CEDULA: 1024522713	
TIPO DE TRABAJO:	ALTURAS (DEMOLICIÓN PLACA Y VIGAS CUBIERTA AULAS)				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	30/10/2023 7:00 A.M	
EQUIPO DE TRABAJO:	AYUDANTES Y OFICIALES (VER PÁGINA 3).	N° DE REVISIÓN:	18		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	05/11/2023 5:00 P.M.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	HERRAMIENTA MENOR
Eléctricas	✓	EQUIPO DEMOLEDOR
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Resbalones, caida mismo y/o diferente nivel, golpes, desguinces	(30) Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informativas, capacitacion personal
2. Demolición concreto	Resbalones, caida mismo y/o diferente nivel, golpes, desguinces.	Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informativas, capacitación personal
3. Disceuso.	Resbalones, caida mismo y/o diferente nivel, golpes desguinces.	Uso adecuado de EPP y EPCC, charlas informativas, capacitación personal.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Abel Otalvaro - Madrigal	1024499702	
Cristian Arias. Madrigal.	1024474038	
Pablo Emilio Gordillo	S.837.347.	
Jhonatan Castellanos	1023022997	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		**Firma**
Jessica Rodriguez	1037752036	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1037752036.

APROBADO POR _____
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Moralba C	NÚMERO DEL ATS:	030	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saidllo	CEDULA: 1024522732	
TIPO DE TRABAJO:	Remates en muros				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Oct 30 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales		N° DE REVISIÓN:	030	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Nov 5 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES 10lbs	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	3M ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Demoledor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/esguinces torceduras/caida a mismo nivel	Inspecciones preoperacionales/Pausas activas/ Uso de calzado de seguridad.
Remates en muros	Proyeccion de particulas/lesiones en los ojos/posturas inadecuadas	Uso de proteccion respiratoria-Uso de monogafas/intervalos de descanso.
Limpieza de muros	Proyeccion de particulas/lesiones en los ojos/lesiones lumbares/ lesiones osteomusculares	Uso de monogafas/Ropa de trabajo adecuada/intervalos de descansos

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Oscar Perdomo 1193219359	
Carlos Sevillano 87949807	
Gabriel Betancur 9993089	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Said Julio 1024522932	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Moralba C	**NÚMERO DEL ATS:**	046	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Said Julio	**CEDULA:**	1024522732
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones en piso/excavacion zapatas/Fabricacion shut				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Nov 7 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	**N° DE REVISIÓN:**	040		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Nov 12 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	n/a	EXTINGUIDORES	10lbs
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	BARRERAS	n/a	ESLINGA	n/a
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	n/a	LINEA DE VIDA	n/a
ALTURA APROXIMADA	n/a	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	n/a	ESPACIO CONFINADO	n/a	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	n/a	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Picas/Palas/barra.
Eléctricas	X	Taladro Demoledor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra/Lesiones lumbares/	Pausas activas / uso de calzado de seguridad inspecciones visuales
Cortes con pulidora	Proyeccion de particulas/Lesiones en los ojos/quemaduras/inhalacion/de gases	Uso de ropa adecuada de trabajo uso de careta/uso de peto/inspecciones preoperacionales.
Soldadura de perfiles y estructura	Proyeccion de particulas/Lesiones en los ojos/quemadura/inhalacion de gases	Uso de ropa adecuada de trabajo uso de careta/uso de peto/inspecciones preoperacionales

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S.

CAMPO:	Moralba C	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Saul Villa Ruiz	**CEDULA:** 1024522282	
TIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	Nov 7 7am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Trasiegos de Material / Demoliciones	**N° DE REVISIÓN:**	001		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	Nov 12 12m	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	N/a	EXTINGUIDORES	N/a ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	N/a	ESLINGA	N/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	N/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	N/a ☐	LINEA DE VIDA	N/a ☐
ALTURA APROXIMADA	N/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	N/a	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☒		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?	N/a		

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Palas Picas Carretillas
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ersión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con contra/esguinces/Heridas	Pausas activas/ uso calzado de seguridad
Traseos material	Sobreesfuerzos/esguinces/Heridas	Pausas activas/uso de calzado de seguridad/inspecciones preoperacionales/ intervalos de descanso/levantamiento adecuado de las cargas.
Demoliciones Zapatas		

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☒ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	Colegio Mobile.	NÚMERO DEL ATS:	30	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Sandy.	CEDULA: 1024582738	
TIPO DE TRABAJO:	Alturas.				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	7-11-2023 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Oficiales, Soldadores, Auxiliar.		N° DE REVISIÓN:	30	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	12-11-2023 5:00 pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 3.00m 8.00 m	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑	—	

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☑	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☑	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Herramienta Menor.
Eléctricas	✓	Equipo de soldar, taladro, dremel, Pulidora
Neumáticas	—	—
Hidráulicas	—	—
Mecánicas	—	—
Otras	—	—

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1. Acceso	Resbalones, golpes, caidas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPCC, charlas informativas y capacitación del personal
2. Donación	Resbalones, golpes, caidas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP y EPCC, charlas informativas y capacitación del personal
3. Instalación.	Resbalones, cortes, quemaduras, caidas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP EPCC, charlas informativas y capacitación del personal.
4. Descanso.	Resbalones, golpes, caidas a mismo y/o diferente nivel.	Uso de EPP, EPCC, charlas informativas y capacitación del personal.

OBSERVACIONES: En caso de lluvia fuerte, detener (temporalmente) la actividad.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PROFESIONALES ASOCIADOS

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jhonatan Castellanos 1023922917	
Cristian Camilo Arenas 1024474038	
Abel Olaguaro 1024499707	
Jaime Barragán 80088P1	JAIME BARRAGAN
Pablo Sandino 5837347	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Pablo García Ortiz.	Juan P. García O.

ELABORADO POR: Juan P. García O.
CEDULA: 1016246899.

APROBADO POR
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio Moralba	NÚMERO DEL ATS:	020	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul Mio	CEDULA: 1024522702	
TIPO DE TRABAJO:	instalacion de abierta.					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Nov 10 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes y oficiales	N° DE REVISIÓN:	020			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Nov 12m

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☒	GUANTES	☒	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☒	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☒	ARNÉS DE SEGURIDAD	☒	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☐	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	2/8	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Herramienta menor
Eléctricas	X	Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión 2
Código: PAGFOR063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de areas	Golpes con martal/ Lesiones lumbares/esguinces y torceduras	Orden y Aseo/ Higiene postural/ Uso calzado de seguridad.
Corte de teja	Proyeccion de particulas/ lesiones lumbares/ osteomusculares/golpes/laceraciones	Inspecciones preoperacionales/uso ropa adecuada para la labor/ uso de monogafas/
instalacion cubierta	Proyeccion de particulas/lesiones lumbares/ osteomosculares	uso preoperacionales/ uso de ropa adecuada para la labor/ uso de monogafas

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Henry BOBADILLA Ortiz CC 80178747	
JOHN BOBADILLA ORTIZ CC 73573151	
Jhon Paramo 1.024531590	
Jorge Scarpetta 1023160254	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Jorge Scarpetta 1023160254	

ELABORADO POR:
CEDULA: 1024522782

APROBADO POR Said Julio Ruiz
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	Colegio Moralba C	NUMERO DEL ATS	025	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Saul Julio	CEDULA: 1024522932	
TIPO DE TRABAJO:	Fabricacion Shot					FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	Nov 15 7am
EQUIPO DE TRABAJO:	Ayudantes / Soldador	N° DE REVISIÓN:	025			FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	Nov 18 12am

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	n/a ☐	EXTINGUIDORES	10/55 ☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCION RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	n/a ☐	ESLINGA	n/a ☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	n/a ☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	n/a ☐
ALTURA APROXIMADA	n/a ☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	n/a ☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales	x	Herramienta menor
Eléctricas	x	equipo soldadura y polidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Preparacion de las areas	Golpes con contra lesiones lumbares/esguinces y torceduras	inspecciones pieoperacionales Pausas activas/intervalos de descanso
Corte perfiles	Proyeccion de particulas lesiones oculares/quemaduras/	Uso de proteccion facial/uso de careta de soldar
Soldadura perfiles	Proyeccion de particulas/ lesiones oculares/quemaduras	Uso de proteccion facial/uso de careta desoldar

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Jean Pier Diaz Fernandez 1097214296	Jean Pier Diaz
JAVIER Banamon	JAVIER B.
Juan Carlos Gonzalez	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Jessica Rodriguez Gonzalez. 1031152036	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 1024522732

APROBADO POR Said Julio
CEDULA: 1024522732

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	Pantaleón	**NÚMERO DEL ATS:**	028	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	trabajo en Alturas.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-2023. 7:00 Am.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina #3.	**N° DE REVISIÓN:**	028		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	11-11-2023 5:00 Pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	N/A
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA 4mt	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maseta, Puntero, Barro
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro, rotomartillo, compresor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda. INGENIERÍA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1) Traslado de materiales y Herramientas al Puesto de trabajo 2). Armar anclamio e instalar lineas de vida horizontal. 3) desmonte de cobierta, demolición de vigas, instalar Perfilería y teja en cubierta, pintura perfiles 4). Descender a nivel de paso, retirar materiales y herramienta	1) locativo = tropezones, resbalones, golpes 1.2) Biomecanico = fatiga muscular al trasladar Carga. 2). Biomecanico = sobre esfuerzo muscular 2.2) Alturas = caidas, distinto nivel, fracturas 2.3). Fisico: Ruido. inhalación material Particulado 2.4) locativo = tropezones golpes 3) Alturas = caidas, fracturas, muerte 3.2) Biomecanico: fatiga muscular 3.3). mecanico = Contusiones, golpes, fracturas 4). caidas, golpes, fracturas 4.2). fatiga muscular.	1) Orden y aseo de Pasillos, vectores de seguridad 1.1) Higiene Postural trabajo en equipos 2) Pausas Activas. higiene. Postura 2.2). Permiso de trabajo, Uso del EPEC 2.3) Uso del EPP. (tapa oidos. tapa bocas 2.4). Orden y aseo 3) Hacer uso de EPEC (Arnes, eslingo, linea de vida mantenerse anclado 3.2) firma de Permiso de trabajo ATS. 3.3) Higiene Postural. trabajo en equipo 4) Regla 3. Puntos de apoyo. uso del EPP. Pausas Activas. ; orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA • SERVICIO • MANTENIMIENTO

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Mauricio Florez 1918066623	
Francisco Avila 15618185	Francisco
NAPOLEON OJEDA V.081026488	NAPOLEON
Yosvel Cadiz 73556473	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Cirro antonio melo 80176087	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 73556473.

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	PANTALEON.	**NÚMERO DEL ATS:**	029.	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Rath	**CEDULA:** 1033[illegible]	
TIPO DE TRABAJO:	Remate de obra aula instalacion de canaleta, trasego. escombro.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-2023 7am - 5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	029		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	12-11-2023 7am - 12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 3mts.	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	martillo, puntero, maseta
Eléctricas	X	taladro, polidora,
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Remate de obra civil.	Fisico, locativo, biomecanico.	Pausas activas, autocuidado laboral uso epp
Instalacion canaleta.	mecanico, Altua, fisico, biomecanico	Insp. epps, autocuidado laboral, Pausa. permisos. orden y aseo
Regatas bateros sanitarios	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Insp. herramientas, uso de epp autocuidado.
Riasego de escombro.	fisico, locativo, biomecanica	Sendero peatonal, autocuidado laboral. orden y aseo de areas
Actividad de parete.	fisico, locativo, biomecanico	Uso de protección visual, orden y aseo, autocuidado

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

VERSION: 4
CODIGO

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
CRISTIAN GONZALEZ 1023930367	CRISTIAN G.
JULIO JIMENEZ 1023870143	JULIO JD
OMAR JIMENEZ 1023870141	OMAR JD
KEVIN JIMENEZ 1021672140	KEVIN JP
EDWARD Solaque. 79393547	
James Gonzalez 79919406	
Steven Luna 1001482051	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Ciro antonio melo 80716087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033797061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033797061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

CAMPO:	Puntaleon	NÚMERO DEL ATS:	025	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Valentina Patiño	CEDULA: 1033720062	
TIPO DE TRABAJO:	Trabajo en alturas				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23/10/2023 7:00am	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver Pagina #3.			Nº DE REVISIÓN:	025	FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28/10/2023 5:00pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☑
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Maseta, Puntero, Pavo
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro, rotomartillo
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.C.
INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
1). traslado de materiales y	1). locativo: tropezones, resbalones golpes	1). orden y aseo de pasillos, vectores de seguridad
Herramientas de trabajo	1.2). Biometrico: fatiga muscular al trasladar carga	1.2). Higiene Postural. trabajo en alturos: equipo
2). Armar Andamio e instalar	2.1). Biomecanico: Sobre esfuerzo muscular 2.2). Alturos: caidas distinto nivel fractura	2) Pausas. Activas, Higiene, postura 2.2) Permiso de trabajo uso del EPCC
linea de vida Horizontal	2.3) fisicos, Ruido Instalacion material Punticolado	2.3). Uso de EPP, tapa oidos, tapa bocas 2.4). Orden y aseo.
3). desmonte de cubierta demolicion de ugos	2.4) locativo: tropezones, golpes 3). Alturas. Caidas, fracturas, muerte,	3). Hacer uso del EPP. (arnes eslinga linea de vida mantenerse anclado
instalacion de Perfileria y teja en cubierta	3.2) mecanico, Contusiones, golpes fractura 3.3). Biomecanico: fatiga muscular	3.2). Firma de trabajo APTS. 3.3). Higiene Postural, trabajo en equipo
4) Descender a nivel de piso retirar materiales y Herramienta	4). caidas, golpes, fracturas 4.2). fatiga muscular	4). Regla: 3. puntos de apoya. uso de EPP. Pausas activas y orden y aseo

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☒ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☒ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

CAMPO:	CARBONI PANTALEON	**NÚMERO DEL ATS:**	025	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033744061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, pintura estructura metalica. Actividad Alturas.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am - (12) 5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	025		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	28-10-2023 7am-	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 5mts.	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	herramienta de uso.
Eléctricas	X	pulidora, compresor, equipo soldadora, taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad soldadura.	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Uso de epcc, uso de epp insp herramientas oiden y aseo.
Actividad Alturas.	Altura, fisico, mecanico, locativo.	Insp equipos uso de epp y dotacion. oiden y aseo
Pintura estructura metalica	mecanico, fisico, biomecanico.	Insp epp compresor, Pima permisos, uso de y dotacion.
Armado de estructura	Altura, mecanico, fisico, biomecanico	Uso de epp y dotacion, autocuidado labaral., y inspeccion epcc.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Raul Cadena		
Francisco Avila	15618185	Francisco
Mauricio Florez	A1800662251	
NAOIR OJEDA	1.081026 486	NAOIR

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
Julio C Lasso	4895032	Julio C Lasso

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	PANTALEÓN	NÚMERO DEL ATS:	024	PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:	NOMBRE: Valentina Portilla	CEDULA: 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, parrete mismo nivel., Fundida. sobrepiso, regatas. instalación cobertz,				FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:	23-10-2023 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	N° DE REVISIÓN:	024		FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:	28-10-2023 7am-5pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pico, puntero, maseta.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad mamposteria	Fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral.
Actividad pañete y pisos	Fisico, locativo, biomecanico	Orden y aseo de areas, autocuidado, pausa activa.
Regatas en muro y piso	Fisico, mecanico, locativo, biomecanico	Insp. areas, orden y aseo firma documentacion con SST.
Instalacion de cubierta	Alturas, fisico, mecanico, biomecanico	Uso de epcc, uso de epp autocuidado laboral

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
EDWARD Solorzano. 79393517	
James González V - 79919406.	
omar Jimenez D 1023870141	omar J
CRISTIAN Gonzalez 1023931367	CRISTIAN G.
JULIO JIMENEZ 1023870143	JULIO J.
KEVIN JimenEZ D 1021667210	KEVIN JD
LEANDRO SOLORZANO. 1024148375.	LEANDRO SOLORZANO.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
CARLOS RIVILLO 79387044	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

CAMPO:	PANTALEÓN	**NÚMERO DEL ATS:**	022	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P.	**CEDULA:**	1083792061
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, filos, pañete mismo y diferente. nivel, regatas, picado de muros				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**		17-10-23 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	**N° DE REVISIÓN:**	022		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**		21-10-23 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala, palustre, pomo, puntero, maceta.
Eléctricas	X	pulidora taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS S.A.S. INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

CAMPO:	PANTALEÓN	**NÚMERO DEL ATS:**	020	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**		**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792051
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de perforacion de perfiles., actividad de soldadura.					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-10-23 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	020			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	14-10-23 7am -12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pinzas.
Eléctricas	X	taladro., Polibrio equipo soldadur
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
INGENIERIA · SERVICIO · MANTENIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Perforación de perfiles	Mecanico, fisico, locativo, Alturas.	Inspección de herramienta, orden y aseo uso de epoc, autocuidado.
Actividad de soldadura	Mecanico, fisico, biomecanico, Altura	Uso de epp y dotacion autocuidado, uso careta
Pintura de perfiles	fisica biomecanico, natural, locativo	Orden y aseo de areas, autocuidado laboral.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NASIR OJEDA 1.081026488	NACIR

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Ciro antonio melo 80116087	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	PANTALEON	**NÚMERO DEL ATS:**	021	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Patiño	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Amarre. de hierro para arme de vigas, remate mamposteria Regatas excavacion manual.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-10-23 7am - 5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	021		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	14-10-23 7am-12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO

CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 3 mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, palustre.,
Eléctricas	X	pulidora, taladro, rotomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Firma permisos, charla SST.	Físico, locativo	Uso de epp y dotación autocuidado laboral.
Amarre de hierro.	biomecanico, Físico, locativo	Pausas activas, orden y aseo de areas uso epp
Corte de hierro con pulidora.	Mecanico, biomecanico, Físico, locativo	Inspeccion polidora. permisos, uso de epp y dotacion, autocuidado.
Actividad mampostería.	Físico, locativo, biomecanico.	Uso de epp, orden y aseo autocuidado laboral.
Fundida de viga.	Físico, biomecanico. Alturas. locativo	Inspeccion epp, autocuidado laboral., inspeccion de andamio autocuidado.
Regatas en pared	Mecanico. físico, biomecanico, locativo	Insp. herramienta. uso de epp y dotacion.
.		

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO
DOCUMENTO CONTROLADO	

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Omar Jimenez D	1023870141	Omar J D
Kevin Jimenez D	1021672140	Kevin JD
Cristian Gonzalez	1023931367	Cristian G.
EDWARD Sologue	79393547	
JULIO Jimenez	1023870143	
James González	79919406	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)		Firma
CIO antonio melo	80176091	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez B.	**NÚMERO DEL ATS:**	019	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentino Portillo	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Trasiego material, excavacion manual, Demolicion sobrepiso.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	7-11-23 7am - 5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	019		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	12-11-23 7am

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala, carretilla, pica, pono.
Eléctricas	X	Polidora, rotomartillo.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Trasiego de material	Fisico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, orden y aseo de areas.
Demolición de sobrepiso	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Insp. herramienta. Firma permisos, pausas activas
Actividad de excavación	Fisico, locativo, biomecanico.	Autocuidado, pausa activa uso de epp y dotación

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Diego Mesa 1016226279	Diego Mesa.
Jeison Ramos 80773604	Jeison Ramos
Henry Villar	Henry Villar

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fdo. Pedreros Díaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	018	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Patiño	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, corte estructura metalica, trabajo en caliente.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	6 - 10 - 2023 7am - 5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	018		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	12 - 11 - 2023 7am - 12pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala, carretilla, pico, puntero, maseta
Eléctricas	X	poliolora equipo soldadura
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura.	Fisico, mecanico, locativo, biomecanico	Uso de epp y epcc, autocuidado laboral. autocuidado.
Corte de estructura metalica	mecanico. fisico. locativo, biomecanico	Insp. herramienta Firma de documentos. uso de epp.
Trabajo en caliente soldadura	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Autocuidado laboral, orden y aseo de areas.

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Henry Bobadilla Ortiz 80117847 Bta	
John Bobadilla Ortiz 73573151	
Manuel Cantra Pena 1.051656 775	
Jorge Scarpetta 1031160954	
William Martinez 79920219	
Libario Cardenas Lopez 79920810	
Alejandro Pariano 1024537590	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedrevos Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

CAMPO:	Rafael Nuñez B.	**NÚMERO DEL ATS:**	017	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033749061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, corte estructura metalica. trabajo en caliente.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30-10-2023 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	017		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	5-11-2023 7am-5pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pimpos. extensiones
Eléctricas	X	equipo soldadura, puliolora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad soldadura	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp, autocuidado insp. epcc. orden y aseo
Corte estructura metalica	mecanico, fisico, locativo, biomeca. Altura	Pausas activas, insp. herramenta epp y dotación
Amarre de correas	mecanico, fisico, Altura, biomecanico	Firma permisos, autocuidado laboral, orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Liborio Cardenas López 79970810	
David Mora Calderon 80051419	
Jorge Scarpetta 1031160954	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pastrana Díaz cc. 12. 198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Compactacion recebo, trasiego material, actividad mamposteria. corte estructura metalica.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/2023 7am- 5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	016	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	4-11-2023 7am- 12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	polidora.
Eléctricas	X	polidora, compactador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mamposteria	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado laboral
Compactacion de recebo.	locativo, fisico, mecanico, biomecanico	Inspección de equipo, uso de epp y dotacion pausa activa
Trasiego de material	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado. pausas activas
Corte de estructura metalica.	fisico, mecanico, biomecanico, locativa	Insp. herramientas autocuidado laboral uso de epp

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
ALEXIS PENTEADO 1087129471	
Carlos Lopez Torres 1067032281	
Jeison Ramos 3077364	
Henry Villar 1082471048	
Diego Mesa 1010226279	Diego Mesa.
Jefersson Espinoza 5672277	Jefersson E.
CRUZ Alcides ESPINOZA 2283840	
Jhonatan Nieto 1007772977	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fdo. Pedreros Díaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	RAFAEL NUNEZ SEDE B.	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mamposteria, poniete, fundida sobrepiso.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am-5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3	**N° DE REVISIÓN:**	016.	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	29-10-2023 7am-5pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pala, palustre, plaq.
Eléctricas	X	trompo, saltarin, pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de manipostería	Fisico locativo, biomecanico	Uso de epp y dotacion, autocuidado laboral
Pañete de muros.	fisico, biomecanico, locativo	Uso protección visual, uso de epp y dotación
Compactacion recebo.	biomecanico, mecanico, fisico, locativo	Insp maquinaria, uso de epp autocuidado.

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☑ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NORBEY CASTRO 79768812	NORBEY CASTRO
Carlos Jose Tonez 1067037281	
Jefferson Espinoza 5692277	Jefferson
Cruz Aleides Espinoza 2283840	
Deison Tomas	
Yonatan Nieto 1007772977	Yonatan
Henry Velbor 1082471048	Henry V

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedroza Diaz CC.12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portillo
CEDULA: 1033749061

APROBADO POR Valentina Portillo
CEDULA: 1033749061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUÑEZ SPCE B.	**NÚMERO DEL ATS:**	015	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad soldadura, pintura de estructura y corte perfiles metalicos				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	23-10-2023 7am-5pm	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3		**N° DE REVISIÓN:**	015.	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	24-10-2023 7am-5pm.	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☑	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora, compresor.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura.	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Inspeccion equipo, autocuidado laboral, uso de epp
Pintura de perfiles.	biomecanico, fisico, quimico, locativo	Uso proteccion visual y respiratoria, orden y aseo
Corte de perfiles metalicos	Mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Insp pulidora, autocuidado laboral orden y aseo de area uso de epp
Instalacion de perfiles.	Alturas, mecanico, fisico, biomecanico	Autocuidado uso de epp, permisos de trabajo

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
JAXMITH PEREZ 77 132 858	
JORGE CARRETTA 1031160254	
Carlos Eduardo Pinto 1002275956	
Manuel Castro Ramos 1.057656775	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedrenos Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

VERSION: 4	
CODIGO. HSEQ-F-044	
DOCUMENTO CONTROLADO	

PERMISO DE TRABAJO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Fecha de expedición	Validez				Permiso de trabajo No.
06 / 11 / 23	Desde 6-11 Hasta 11-11	☑ Trabajo en ALTURAS	☐ ESPACIOS CONFINADOS	☑ Trabajo en CALIENTE	018
		☐ Trabajo en EXCAVACIÓN	☐ Trabajo con riesgo ELÉCTRICO	☐ Otro	

Solicitante: Diego Acevedo Cargo: Insp. encargado Empresa (contratista): INERTIA

Proyecto/Obra: Rafael Nuñez. primer piso

Área especifica:

Descripción y procedimiento de la tarea: Actividad de soldadura, corte con polidora.

Marque ✓ ó X — Una X simboliza NO AUTORIZADO PARA TRABAJAR

#	Nombres y apellidos del trabajador que realiza la actividad	Identificación	1	2	3	4	5	6	7	Firma del trabajador que realiza la actividad	Nota
1	Henry Bobadilla Ortiz	80117847	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Este permiso de trabajo es válido solamente hasta finalizar el turno de trabajo y para las condiciones existentes al momento de su expedición. El trabajo se suspende en cualquier momento si hay presencia de lluvia, fuertes vientos o tormentas, por cambios drásticos en la operación, desacato de normas de seguridad.
2	John Acosta Ortiz	9257361	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	Manuel Quintero Pena	1.051656775	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Manuel Quintero	
4	Jorge Sarpetta	1031160254	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	[illegible]	79920278	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Lhorio Calderas Lopez	79970916	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
7	Alejandro Parada	1067381570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8											
9											
10											

1- **Seguridad social vigente**: pago al día de EPS, AFP, ARL, parafiscales. ✓

2- **Competencias**: ✓ **Conoce procedimiento en caso de emergencia?**. ✓ **Conoce/participó en la elaboración del ATS**

3- **Condiciones físicas.** Apto médicamente para alturas o actividades de alto riesgo, Libre de alguna patología que limite su actividad física actual. Libre de alteraciones visuales y/o auditivas. Libre de fatiga, dolor, molestia actual que limite su labor, libre de alguna calamidad doméstica, libre de efectos de drogas/sustancias alucinógenas. ✓

4- EPP. ✓ Casco ✓ Barbuquejo, ___Protección visual, ___Protección auditiva, ___Protección respiratoria, ✓ Guantes de cabra ✓ Peto, ✓ Botas de seguridad

5- **Medidas activas de Protección:** ___Arnés cuerpo completo, ✓ Eslinga, ___Mosquetón, ____Freno, ___Línea de vida, ___Punto/dispositivo de anclaje. para los trabajos en suspensión, ___silla de suspensión, ___sistema de descenso, ___línea de vida vertical en cuerda, ___freno (todos estos equipos deben ser certificados) ✓

6- **Requerimiento de aptitud**: El personal cuenta con el certificado de formacion para trabajo en alturas nivel avanzado ✓

7- **Ayudante de segurdad**: Trabajador designado por el empleador para verificar las condiciones de seguridad y controlar el acceso a las areas de riesgo de caida SI

Sistemas de acceso a utilizar	Herramientas y/o equipos a utilizar:
	eporpo soldador. Dolbora.

Medidas de seguridad verificadas en sitio (Marque con ✓ o N/A, según corresponda)

ALTURAS	EXCAVACION	ESPACIOS CONFINADOS	CALIENTE	ELECTRICO
✓ Área demarcada y señalizada? Advierte el peligro de caída de objetos y personas.	Bordes de la excavación, señalizados y demarcados?	Área de trabajo cerrada, demarcada y aislada completamente?	✓ Área de trabajo cerrada, demarcada?	Área de trabajo aislada y demarcada?
✓ Se cuenta con listas preoperacionales diarias? (según corresponda, andamios, escaleras, etc).	Se cuenta con listas preoperacionales diarias (según corresponda, escaleras, equipos, etc.)	Se han instalado barreras o guardas para restringir el paso de vehiculos y personas?	✓ Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda, escaleras, equipos, etc)	Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda, escaleras, equipos, etc)
✓ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	Se cuenta con listas de verificación preoperacionales diarias? (según corresponda) Escaleras, equipos, etc.	✓ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?
✓ Los trabajadores conocen el ATS y lo han firmado en señal de conocimiento?	Ingreso seguro y rutas de salida (min. 2 escaleras). Fosas > a 1.2 m de profundidad como mínimo cada 7.5 m distancia?	✓ Se realizó el ATS y se verificó el cumplimiento de los controles?	✓ Se encuentra disponible el equipo contra incendios, Extintor. Esta operativo?	Los equipos eléctricos y herramientas tienen buenas condiciones de aislamiento eléctrico?
✓ Se garantiza distancias de seguridad (5m) respecto a partes energizadas?	Las paredes están entibadas, si el terreno es inestable y la profundidad es mayor a 1.2 m?	✓ Se ha realizado medición de gases dentro del área?	✓ Equipo de corte y/o soldadura a ser usado esta en buenas condiciones de funcionamiento?	Se tienen señalizados los equipos intervenidos y no intervenidos?
✓ Se han definido y tomado todas las medidas de seguridad para garantizar el trabajo?	Los escombros están acomodados mínimo a 2 m del borde de la excavación?	✓ Se cuenta con personal capacitado y entrenado en rescate y disponible durante la tarea?	✓ Se cuenta con mamparas o barreras de protección?	Se ha instalado la conexión a tierra del sistema y/o equipos electrónicos utilizados?
✓ El sistema de acceso es estable y seguro? Escaleras, andamios, plataformas.	Se cuenta en el sitio con avisos, barreras, luces y cintas adecuadas para el aislamiento y demarcación diurna y nocturna?	✓ Reunión de seguridad de pre-ingreso realizada. personal informado en procedimiento de rescate, asegurada rutas de escape - Ancho mínimo 60cm antes/entrar.	✓ El área está libre de materiales y químicos combustibles o inflamable?	Se ha(n) desconectado el (los) circuito(s) o alimentador(es) principal(es) que energiza(n) la zona de trabajo para evitar cualquier tipo de reconexión?
✓ Los puntos de anclaje son seguros? Resistencia mínima de 5000 lb.	Se ha identificado el procedimiento para evitar daños a las tuberías y cables?	Fuentes de energías peligrosas están controladas o eliminadas?	✓ Los equipos y alrededores están limpios, libres de aceite y/o químicos?	Se ha verificado la ausencia de tensión con el detector de voltaje?
✓ En trabajos de acenso y descenso, se cuenta con una línea de vida vertical por trabajador?	Está identificado el método de prevención de derrumbes para trabajar dentro, según la profundidad y tipo de	Se tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓ Se aterrizó adecuadamente el equipo de soldadura?	La(s) persona(s) encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir durante la tarea?
✓ Todas las herramientas se encuentran aseguradas para evitar caídas x accidente?	Se tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	Se encuentra disponible un extintor contra incendio?	✓ Se aterrizó el equipo que genera electricidad estática?	Se requiere la presencia de una persona de SST o un brigadista durante la ejecución de la labor?
✓ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?	Se han verificado los requerimientos de apuntalaje?	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros equipos requeridos?	✓ El equipo de oxicorte cuenta con las válvulas de chequeo y atrapa-llamas?	Se tienen los elementos de protección personal apropiados para realizar el trabajo?
✓ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	Se cuenta con motobombas disponibles?	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?.	✓ Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?
✓ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	Se han consultado otros permisos y se cumple con los requisitos de éstos?.	Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	✓ Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?
✓ Altura aproximada: Arlrs	Condiciones climáticas adecuadas, libre de lluvias fuertes, tormentas eléctricas, etc.?	El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	✓ El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para la tarea?	Se implementATSn medidas de etiquetado y bloqueo?
	El personal cuenta con los EPP, equipos y herramientas apropiadas para			Se siguen las 5 reglas de oro de seguridad eléctrica?

Documentos adjuntos que soportan el presente permiso: (Marque con ✓ o N/A, según corresponda)

✓ ATS

✓ Preoperacionales para: ✓ Andamio multidireccional ___Andamio Colgante, ✓ Pulidora ___Escaleras, ✓ Silla Colgante, ___Trípode, ___Pluma, ___Torre Grúa, ___Otro: _____

Firmas de emisión y revalidación

Se firma el presente permiso como constancia de haber verificado en el sitio la aplicación de los controles requeridos para minimizar los riegos asociados a este trabajo, considerando que es seguro proceder con la ejecución del trabajo.

TERMINACIÓN / CIERRE: (Coloque ✓ o X en cada casilla) como Inspector de SST. Personalmente declATS que:

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (Hora-Hora)	FIRMA DEL COORDINADOR DE ALTURAS	FIRMA DEL INSPECTOR SST	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA/CONTRATISTA O ENCARGADO DE OBRA	___El trabajo ha sido terminado ___El sitio y equipos quedan en condiciones de seguridad ___Area en perfecto Orden y Aseo
6-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentino		
7-11-23	7am - 5pm.	Diego Acevedo	Valentino		
8-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentino		FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA O DEL CONTRATISTA
9-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentino		
10-11-23	7am - 5pm	Diego Acevedo	Valentino		SI EL TRABAJO HA SIDO TERMINADO, SE DEBEN NORMALIZAR LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD (CORTE, BLOQUEOS, ETC.)
11-11-23	7am - 5pm.	Diego Acevedo	Valentino		

Nombre de quien cancela el Permiso	Firma	Fecha	Hora	Observación:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA.

CAMPO:	Rafael Nuñez B.	**NÚMERO DEL ATS:**	017	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:** 1033749061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, corte estructura metalica. trabajo en caliente.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30-10-2023 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	017		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	5-11-2023 7am-5pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pimpos. extensiones
Eléctricas	X	equipo soldadura, puliolora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad soldadura	mecanico, fisico, locativo, biomecanico	Uso de epp, autocuidado insp. epcc. orden y aseo
Corte estructura metalica	mecanico, fisico, locativo, biomeca. Altura	Pausas activas, insp. herramenta epp y dotación
Amarre de correas	mecanico, fisico, Altura, biomecanico	Firma permisos, autocuidado laboral, orden y aseo

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Liborio Cardenas López 79970810	
David Mora Calderon 80051419	
Jorge Scarpetta 1031160954	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pastrana Díaz cc. 12. 198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA:

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	
Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	Rafael Nuñez sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	016	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla **CEDULA:** 1033792061
TIPO DE TRABAJO:	Compactacion recebo, trasiego material, actividad mamposteria. corte estructura metalica.			**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/2023 7am- 5pm
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	016	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	4-11-2023 7am- 12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	polidora.
Eléctricas	X	polidora, compactador.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mamposteria	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado laboral
Compactacion de recebo.	locativo, fisico, mecanico, biomecanico	Inspección de equipo, uso de epp y dotacion pausa activa
Trasiego de material	locativo, fisico, biomecanico.	Uso de epp y dotacion autocuidado. pausas activas
Corte de estructura metalica.	fisico, mecanico, biomecanico, locativa	Insp. herramientas autocuidado laboral uso de epp

OBSERVACIONES: Ninguna.

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
ALEXIS PENTEADO 1087129471	
Carlos Lopez Torres 1067032281	
Jeison Ramos 3077364	
Henry Villar 1082471048	
Diego Mesa 1010226279	Diego Mesa.
Jefersson Espinoza 5672277	Jefersson E.
CRUZ Alcides ESPINOZA 2283840	
Jhonatan Nieto 1007772977	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fdo. Pedreros Díaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUÑEZ SEDE B	**NÚMERO DEL ATS:**	014	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, pintura estructura y corte de perfiles metalicos.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.		**N° DE REVISIÓN:**	014	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22-10-23 7am-12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas.
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora, compresor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura	Mecanico, fisico, Altura, biomecanico.	Uso de epp y epcc. Insp. herramientas, autocuidado
Excavacion manual.	Mecanico, fisico, biomecanico, locativo	Orden y aseo de areas autocuidado uso epp.
Pintura de estructura metalica	fisico, locativo, Altura, biomecanico.	Insp. equipos, autocuidado laboral orden y aseo, inspeccion herramientas

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jorge Peñuela	79799867	
Jaxuxtll perez	77132878	
Oscar Pestr	78026026	
Carlos Suarez	1002275956	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedreros Diaz cc. 12. 198. 058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	RAFAEL NUNEZ SEDE-B	**NÚMERO DEL ATS:**	013	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, fundida de sobrepiso.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	013		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-23 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	pala, palustre carretilla
Eléctricas	x	trompo, saltarin, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mampostería	Físico, locativo, biomecánico.	Pausas activas. uso de epp y dotación.
Actividad fundida sobrepiso	Físico. biomecánico, locativo.	Autocuidado laboral pausas activas uso de epp
Fundida de sobrepiso. marcha	Mecánico, físico, biomecánico, locativo.	Inspección epp, orden y aseo de áreas autocuidado laboral

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NORBEY castro 79768842	NORBEY
carlos Lopez Torres	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Federer Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.
Versión: 2		
Código: HSEQ-F-063		
DOCUMENTO CONTROLADO		

CAMPO:	RAFAEL NUÑEZ SEDE B	**NÚMERO DEL ATS:**	014	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina P	**CEDULA:** 1033792061	
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de soldadura, pintura estructura y corte de perfiles metalicos.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.	
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.		**N° DE REVISIÓN:**	014	**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	22-10-23 7am-12pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	☑
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☑	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA 4mts	☑	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☐		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☑	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	pinzas.
Eléctricas	X	equipo soldadura, pulidora, compresor
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

Página 2 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de soldadura	Mecanico, fisico, Altura, biomecanico.	Uso de epp y epcc. Insp. herramientas, autocuidado
Excavacion manual.	Mecanico, fisico, biomecanico, locativo	Orden y aseo de areas autocuidado uso epp.
Pintura de estructura metalica	fisico, locativo, Altura, biomecanico.	Insp. equipos, autocuidado laboral orden y aseo, inspeccion herramientas

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Página 3 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)		Firma
Jorge Peñuela	79799867	
Jaxuxtll perez	77132878	
Oscar Pestr	78026026	
Carlos Suarez	1002275956	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Pedreros Diaz cc. 12. 198. 058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033790061.

Powered by CamScanner

Página 1 de 3
Versión: 2
Código: HSEQ-F-063
DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

CAMPO:	RAFAEL NUNEZ SEDE-B	**NÚMERO DEL ATS:**	013	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	**NOMBRE:** Valentina Portilla	**CEDULA:**
TIPO DE TRABAJO:	Actividad de mampostería, fundida de sobrepiso.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	16-10-23 7am-5pm.
EQUIPO DE TRABAJO:	Ver pag 3.	**N° DE REVISIÓN:**	013		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	21-10-23 7am-12pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☐	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☐	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☑
ENERGIA PELIGROSAS	☐	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	x	pala, palustre carretilla
Eléctricas	x	trompo, saltarin, pulidora.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Powered by CamScanner

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Actividad de mampostería	Físico, locativo, biomecánico.	Pausas activas. uso de epp y dotación.
Actividad fundida sobrepiso	Físico. biomecánico, locativo.	Autocuidado laboral pausas activas uso de epp
Fundida de sobrepiso. marcha	Mecánico, físico, biomecánico, locativo.	Inspección epp, orden y aseo de áreas autocuidado laboral

OBSERVACIONES: Ninguna

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Powered by CamScanner

Versión: 2	
Código: HSEQ-F-063	
DOCUMENTO CONTROLADO	

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

PROFESIONALES ASOCIADOS Ltda.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
NORBEY castro 79768842	NORBEY
carlos Lopez Torres	

Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	Firma
Juan Fernando Federer Diaz CC. 12.198.058	

ELABORADO POR: Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

APROBADO POR Valentina Portilla
CEDULA: 1033792061

Powered by CamScanner

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 **DOCUMENTO CONTROLADO**	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	Colegio el Rocío Sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	001	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:** Abdi Cayuc	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	1023021403.
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones manuales trasteo RCD.				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**		23-10-23 7:00am
EQUIPO DE TRABAJO:	P.A. Vidalizar Pay cv3.	**N° DE REVISIÓN:**	004		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**		29-10-23 9:00pm

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☐
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☐	BARRERAS	☑	ESLINGA	☐
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	☐	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	☐
ALTURA APROXIMADA	☐	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	☐	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☒	ESPACIO CONFINADO	☒	CALIENTE	☒
ENERGIA PELIGROSAS	☒	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pulo, cincel, maceta, pinza, palos, palustre.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio trabajo material y herramienta.	Sobreesfuerzos, golpes, machucones caidas mismo nivel.	ayudas mecanicas, uso epp, uso overol, autocuidado, orden locativo
Inicio demolicion manual.	Sobreesfuerzos, fatiga, golpes. machucones, cortes leves.	ayudas mecanicas, rotacion personal, rotacion personal, pausas laborales uso epp.
Inicio trabajo ecd.	lumbalgias, sobreesfuerzo, golpes machucones, caidas mismo nivel.	ayudas mecanicas, higiene postural, uso epp, uso overol, autocuidado.
orden locativo	cortes, golpes, machucones, caidas mismo nivel.	uso epp, uso overol, autocuidado, orden locativo.
orden y aseo general	virus, hongos, bacterias,	uso epp, uso overol, autocuidado.

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO
¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?
☑ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.
☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.
¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?
☑ Si, proceda con la tarea.
☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Rodriguez 17389906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Ybon Jairo Larrota 1086709572	
Cristian Bautista 1012356138	
Carlos M Barajas 79544687	
YAIR A. USGAME 80807876	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Deivi Davonny Cotto P. 1023021403.	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: 80 807 876

APROBADO POR _____
CEDULA: 1023021403.

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

CAMPO:	C. el Roble Sede B.	**NÚMERO DEL ATS:**	002	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:**	Wbon Castro.	**NOMBRE:** **CEDULA**	1023021403
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones manuales trasteo material, mamposteria y remate					**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	30/10/23 9 am.
EQUIPO DE TRABAJO:	PEA / Herramientas Visualizar Epp's.	**N° DE REVISIÓN:**	002			**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	05/11/23. 5:00pm.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	☑	GUANTES	☑	MASCARA FACIAL	☑	EXTINGUIDORES	☑
BOTAS DE SEGURIDAD	☑	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	☑	BARRERAS	☑	ESLINGA	⊟
GAFAS DE SEGURIDAD	☑	ARNÉS DE SEGURIDAD	⊟	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	☑	LINEA DE VIDA	⊟
ALTURA APROXIMADA	⊟	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	⊟	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	☑		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	⊟	ESPACIO CONFINADO	⊟	CALIENTE	⊟
ENERGIA PELIGROSAS	⊟	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Pinzas, llaves, cincel, maceta, pomo, pala, picd.
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Versión: 2

Código: HSEQ-F-063

DOCUMENTO CONTROLADO

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio trabajo, material y herramientas.	Caidas mismo nivel, tropezones, sobreesfuerzo, golpes, machucones	Orden locativo, autocuidado, ajustes mecanicos, uso EPP, uso cuerda
Inicio Demolicion manual	golpes, machucones, fatiga, cortes	autocuidado, uso EPP, uso cuerda, rotacion postural, distancias, hidratacion
entrega y traslado RCD	lumbalgias, sobreesfuerzos, caidas mismo nivel, machucones	higiene postural, ajustes mecanicos, orden locativo, uso EPP, uso cuerda
Orden y aseo.	infeccion heridas, cortes, virus, hongos, bacterias.	uso tapabocas, uso EPP, uso cuerda, autocuidado
Picado de muro	Proyeccion particulas, cortes, golpes, machucones	uso monogafas, autocuidado, uso cuerda, distancias distancias
Inicio mampostería y picado "mezcla cemento	sobreesfuerzos, lumbalgias, tropezones, machucones, golpes.	ajustes mecanicos, higiene postural, autocuidado, uso EPP, uso cuerda, autocuidado
Orden y aseo general	lumbalgias, cortes, virus, bacterias	uso EPP, uso cuerda, autocuidado,

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continue con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea

☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	**Firma**
Luis Rodriguez 1758906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Yormen Corolobo 1040491755	
Bertulfo Ruiz CC7702906	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Obar Davianny Castro P. 1023021403	

ELABORADO POR: Davianny C
CEDULA: Obar 1023021403

APROBADO POR Davianny C
CEDULA: 1023021403

Página 1 de 3 Versión: 2 Código: HSEQ-F-063 DOCUMENTO CONTROLADO	**ANALISIS DE TRABAJO SEGURO**	PROFESIONALES ASOCIADOS

CAMPO:	C. el Rodeo.	**NÚMERO DEL ATS:**	003	**PERSONA QUE APRUEBA EL ATS:** Dubar Castro	**NOMBRE:**	**CEDULA:**	1023021403.
TIPO DE TRABAJO:	Demoliciones, enlonaje y hastiego Rcd, mamposteria y panete				**FECHA Y HORA DE INICIO DE TAREA:**	07-11-23 7:00 am	
EQUIPO DE TRABAJO:	P.A. Kolliera 6cls. visualizar pay 003.	**N° DE REVISIÓN:**	003.		**FECHA Y HORA DE TERMINACION DE LA TAREA:**	13-11-23 5:00 Pm	

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ESTE TRABAJO							
CASCO CON BARBUQUEO	X	GUANTES	X	MASCARA FACIAL	X	EXTINGUIDORES	NA
BOTAS DE SEGURIDAD	X	PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NA	BARRERAS	X	ESLINGA	NA
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ARNÉS DE SEGURIDAD	NA	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	X	LINEA DE VIDA	NA
ALTURA APROXIMADA	NA	VERIFICACION PUNTOS DE ANCLAJE	NO	VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL	X		

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	X	CALIENTE	
ENERGIA PELIGROSAS	X	¿OTRO, CUAL?			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Picas, palas, pulustre, cegueta, cincel, mazeto
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

SECUENCIA DE ETAPAS BÁSICAS	RIESGOS O ACCIDENTES POTENCIALES	RECOMENDACIONES PARA ELIMINAR O REDUCIR RIESGOS POTENCIALES
Inicio traslado material y herramienta.	sobreesfuerzo, golpes, machucones. cortes, tropezones caidas mismo nivel	ayudas mecanicas, orden locativo, uso epp uso overol, autocuidado.
Inicio mezcla cemento	lumbalgias, sobreesfuerzos, golpes,	higiene postural, ayudas mecanicas, pausas laborales, uso tapabocas.
Inicio demoliciones manuales	fatiga, sobreesfuerzos, golpes, machucones.	rotacion personal, rotacion actividades pausas laborales, autocuidado.
Inicio entregue y traslado RCD.	lumbalgias, sobreesfuerzos, golpes. machucones, cortes	higiene postural, ayudas mecanicas, autocuidado, uso epp, uso overol.
orden y aseo.	virus, hongos, bacterias, cortes.	Autocuidado, uso epp, uso overol.
//	//	// //
//	//	// //

OBSERVACIONES:

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

☒ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la siguiente pregunta.

☑ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

☑ Si, proceda con la tarea.

☒ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de los trabajadores (Ejecutor)	Firma
Luis Rodrigues 1758906	
Gerardo Rodriguez 4936652	
Yormaw eorolobo 1040191755	
Bertulfo Ruiz cc7702906	
Nombre y Cedula de la persona (Emisor)	**Firma**
Obar Davianny castro P. 4023021403	

ELABORADO POR: _____
CEDULA: Dau 4023021403

APROBADO POR _____
CEDULA: 4023021403

SEGUROS BOLÍVAR

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
PA COLOMBIA S.A.S
Identificada con NIT No. 813008120

Durante el período comprendido entre el 1 de Octubre de 2023 y el 31 de Octubre de 2023 presentó la siguiente siniestralidad. Certificación generada por fecha de siniestro.

1 - ADMINISTRATIVO 1 DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2023
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	0
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Accidentes	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Accidentes	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Retirados	0
Numero de Accidentes Pendientes por Definir el Origen	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolucion 1401 de 2007	0
Numero de Enfermedades Calificadas de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Enfermedades	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Enfermedades	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Retirados	0
Numero de Enfermedades Pendientes por Definir el Origen	0
Total Eventos con IPP	0
Total Eventos Fatales	0
Total Eventos con Invalidez	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Cerrado	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Cerrado	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajo	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades Laborales	0
Numero de Accidentes Laborales con IPP	0
Numero de Enfermedades Laborales con IPP	0
Numero de Accidentes Laborales Fatales	0
Numero de Enfermedades Laborales Fatales	0
Numero de Accidentes Laborales con Invalidez	0

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

1 - ADMINISTRATIVO 1 DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2023
Numero de Enfermedades Laborales con Invalidez	0
Numero de Accidentes que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0

4 - OPERATIVO 2 DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2023
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	0
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Accidentes	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Accidentes	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Retirados	0
Numero de Accidentes Pendientes por Definir el Origen	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolucion 1401 de 2007	0
Numero de Enfermedades Calificadas de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Enfermedades	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Enfermedades	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Retirados	0
Numero de Enfermedades Pendientes por Definir el Origen	0
Total Eventos con IPP	0
Total Eventos Fatales	0
Total Eventos con Invalidez	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Cerrado	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Cerrado	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajo	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades Laborales	0
Numero de Accidentes Laborales con IPP	0
Numero de Enfermedades Laborales con IPP	0
Numero de Accidentes Laborales Fatales	0
Numero de Enfermedades Laborales Fatales	0
Numero de Accidentes Laborales con Invalidez	0
Numero de Enfermedades Laborales con Invalidez	0
Numero de Accidentes que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0

VIGILADO

Se expide a solicitud del interesado el 17 de Noviembre del año 2023.



Firma Representante Legal

** Informaci?n suministrada por la empresa.

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

PA COLOMBIA S.A.S.
NIT. 813.008.120-1

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con el resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, certifico que **PA COLOMBIA S.A.S**, ha cumplido en forma adecuada y oportuna con el pago de los aportes de sus trabajadores a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al mes de octubre de la presente vigencia.

2. **PA COLOMBIA S.A.S.** a partir del 01 de mayo de 2013 se beneficia de la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013.

3. De acuerdo con la información suministrada, **PA COLOMBIA S.A.S**. se encuentra afiliada a ARL SEGUROS BOLIVAR SAS

4. Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterado de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente mencionada.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2023 con una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión de la misma.

EDGAR ALFONSO CASTELLANOS BERRIO
Revisor Fiscal de **PA COLOMBIA S.A.S**
TP 259.625 - T
Por delegación de **L&Q Auditores Externos S.A.S**
Bogotá D.C.08 de noviembre de 2023
CER-7623-23
L&Q Auditores Externos S.A.S.
Consultores, Auditores, Asesores
UC&CS América - Colombia
Miembro de UC&CS Global International

Bogotá 1 de noviembre 2023

Señores,
PA COLOMBIA


REFERENCIA CONTRATO DE OBRA CO1PCCNTR.4077644-2 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA

Es de mencionar que los trabajadores que se encuentran en esta tabla aún continúan laborando para la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS**, atendiendo la emergencia del Colegio JOSE JOAQUIN, pero a la fecha se encuentran en paz y salvo con los temas de seguridad social y pago de salarios y honorarios según corresponde

TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
Jose Alejandro Perez Florez	1.024.517.223	Director de Obra
Wilmer Erney Acevedo Arias	1.073.723.863	Ayudante de Construcción
Luis Carlos Perez Rodriguez	19.107.699	Maestro de Obra
Sergio Navarrete Bolivar	1.000.778.186	Ayudante de construcción
Wilson Ignacio Salamanca Gonzalez	1.014.178.330	Oficial de construcción
Yudy Paola Barajas Farfan	1.022.990.645	Auxiliar administrativo de obra
Jose Estevens Quintero Ramirez	1.000.126.107	Ayudante de construcción
Francisco Miguel Hernández	PT 6131179	Oficial de construcción

SOLUCIONES INTEGRALES

Cordialmente



Representante legal
Jose Alejandro Perez

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **DIEGO ALONSO ROJAS ROMERO** identificado con **CC 1013589644** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 27 días del mes de octubre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

Diego Rojas

DIEGO ALONSO ROJAS ROMERO
CC 1013589644

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo DIEGO ALONSO ROJAS ROMERO identificado con numero de C C 1013589644 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
27 días del mes de OCTUBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

Diego Rojas

DIEGO ALONSO ROJAS ROMERO
1013589644

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **JOSE ALFREDO RUIZ MUÑOZ** identificado con **CC 1022981813** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al dia con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 26 dias del mes de agosto 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

Eduard Florez

EDUARD FABIAN FLOREZ REYES
CC 1022981813

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo EDUARD FABIAN FLOREZ REYES identificado con numero de C.C 1022981813 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realizacion del mismo a los
26 días del mes de AGOSTO del 2023, para efectos de liquidación del contrato

FIRMA:

Eduard Florez

EDUARD FABIAN FLOREZ REYES
1022981813

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **ALBENIS ENRIQUE PACHECO MORRILLO** identificado con **CC 1148149996** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 15 días del mes de septiembre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

Albenis Pacheco

ALBENIS ENRIQUE PACHECO MORRILLO
CC 1148149996

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo ALBENIS ENRIQUE PACHECO MORILLO identificado con numero de C.C 1148149996 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901 561 860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construccion

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
15 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato

FIRMA

Albenis Pacheco

ALBENIS ENRIQUE PACHECO MORILLO
1148149996

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **HENRY PANQUEBA MUNAR** identificado con **CC 1094897088** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 27 días del mes de octubre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

HENRY PANQUEBA M

HENRY PANQUEBA MUNAR
CC 1094897088

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo HENRY PANQUEBA MUNAR identificado con numero de C.C 1094897088 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realizacion del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
27 días del mes de OCTUBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

HENRY PANQUEBA M

HENRY PANQUEBA MUNAR
1094897088

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **LUIS ANGEL GARCIA LLORENTE** identificado con **CC 1067406527** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 22 días del mes de octubre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

Luis Angel

LUIS ANGEL GARCIA LLORENTE
CC 1067406527

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo LUIS ANGEL GARCIA LLORENTE identificado con numero de C.C 1067406527 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
22 días del mes de OCTUBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

LUIS ANGEL GARCIA LLORENTE
1067406527

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **OSCAR JULIAN GIL VALBUENA** identificado con **CC 1015993872** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 21 días del mes de octubre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

oscar Gil

OSCAR JULIAN GIL VALBUENA
CC 1015993872

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo OSCAR JULIAN GIL VALBUENA identificado con numero de C.C 1015993872 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
21 días del mes de OCTUBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

oscar Gil

OSCAR JULIAN GIL VALBUENA
1015993872

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **VICTOR MANUEL DAZA TORRES** identificado con **CC 1001273602** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 6 días del mes de septiembre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

Victor manuel Daza

VICTOR MANUEL DAZA TORRES
CC 1001273602

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo VICTOR MANUEL DAZA TORRES identificado con numero de C.C 1001273602 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
6 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

Victor manuel Daza

VICTOR MANUEL DAZA TORRES
1001273602

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **EVERTO JOSE RODRIGUEZ PEREZ** identificado con **CC 1143138389** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 26 días del mes de septiembre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

EVERTO JOSE RODRIGUEZ PEREZ
CC 1143138389

Soluciones.integralesmetro2@gmail.com DIRECCIÓN: CALLE 68 G SUR - 49D-52 BOGOTÁ,
CELULAR 3228767366 o 3045506060 NIT: 901-561-860-2

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo EVERTO JOSE RODRIGUEZ PEREZ identificado con numero de C C 1143138389 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit. 901 561 860 2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
26 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato

FIRMA

EVERTO JOSE RODRIGUEZ PEREZ
1143138389

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **RUBEN DARIO CHAVERRA PEDROZO** identificado con **CC 189190068** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 11 días del mes de septiembre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

RUBEN DARIO CHAVERRA PEDROZO
CC 189190068

Soluciones.Integralesmetro2@gmail.com DIRECCIÓN: CALLE 68 G SUR · 49D-52 BOGOTÁ,
CELULAR 3228767366 o 3045506060 NIT: 901-561-860-2

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M'

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo RUBEN DARIO CHAVERRA PEDROZO identificado con numero de C C 189190068 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
11 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

RUBEN DARIO CHAVERRA PEDROZO
189190068

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M²

PAZ Y SALVO

El suscrito señor **JOSE ALFREDO RUIZ MUÑOZ** identificado con **CC 1033750096** de Bogotá se permite certificar bajo la gravedad de juramento que la empresa **SOLUCIONES INTEGRALES M2 SAS** identificada con **NIT 901561860-2** se encuentra al día con todos los pagos a su relacionados con la ejecución del proyecto contrato ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL COLEGIO ENTRE NUBES SEDE D – SANTA RITA, Incluyendo salarios, prestaciones sociales, aportes a salud, pensión y parafiscales

Se expide a los 12 días del mes de septiembre 2023, para efectos de liquidación del contrato

Firma

Jose Ruiz

JOSE ALFREDO RUIZ MUÑOZ
CC 1033750096

Powered by CamScanner

SOLUCIONES INTEGRALES M^2

CARTA DE DESISTIMIENTO AL EXAMEN MÉDICO DE EGRESO

Yo JOSE ALFREDO RUIZ MUÑOZ identificado con numero de C.C 1033750096 trabajador de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES SAS identificada con Nit, 901.561.860-2, desarrollando funciones en el cargo de ayudante de construcción

Hago constar que, habiendo sido informado sobre la realización del Examen Médico Ocupacional de egreso, desisto en forma expresa a la realización del mismo a los
12 días del mes de SEPTIEMBRE del 2023, para efectos de liquidación del contrato.

FIRMA:

Jose Ruiz

JOSE ALFREDO RUIZ MUÑOZ
1033750096

Powered by CamScanner

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS

LA MEJOR ALTERNATIVA

PAZ Y SALVO DE TRABAJADOR

CERTIFICO QUE:

La empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S**, con NIT: 900.334.403-3 se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha con YURI OMAIRA CUELLAR MARTINEZ , mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.073.607.133 de Pacho Cundinamarca : en el pago de las Entidades Promotoras de Salud EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Que durante la ejecución y terminación del proyecto de suministro e instalación de divisiones acero inoxidable.
Contrato # CO1.PCCNTR.4077644-12.

Declaro que la empresa quedo a **PAZ Y SALVO** conmigo en todo concepto de:

Salario	_X_	Dotaciones	_X_
Auxilio de transporte	_X_	Prima de servicios	_X_
Horas extras	_X_	Cesantías	_X_
Recargos nocturnos	_X_	Vacaciones	_X_
Festivos	_X_	Riesgos laborales	_X_
Dominicales	_X_		

Cotización a Seguridad– EPS Y PENSION_X_

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier acción judicial contra él o contra la empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S a** causa del contrato laboral a término fijo que hemos ejercido durante la ejecución o terminación del proyecto o funciones asignadas.

CAUSA DEL RETIRO:	Renuncia voluntaria	_____
	Terminación obra	_____
	Terminación del contrato	___X___

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los 20 días del mes de 10 del año 2022

Huella

YURI OMAIRA CUELLAR MARTINEZ
C.C. 1.073.607.133
INSPECTORA SST

YURI OAMIRA CUELLAR MARTINEZ
C.C 1.073.607.133

Powered by CamScanner

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS

LA MEJOR ALTERNATIVA

PAZ Y SALVO DE TRABAJADOR

CERTIFICO QUE:

La empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S**, con NIT: 900.334.403-3 se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha con LUIS MIGUEL NOVOA ALBARRACIN , mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.024.536.049 de Bogota D.C : en el pago de las Entidades Promotoras de Salud EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Que durante la ejecución y terminación del proyecto de suministro e instalación de divisiones acero inoxidable.
Contrato # CO1.PCCNTR.4077644-12.

Declaro que la empresa quedo a **PAZ Y SALVO** conmigo en todo concepto de:

Salario	_X_	Dotaciones	_X_
Auxilio de transporte	_X_	Prima de servicios	_X_
Horas extras	_X_	Cesantías	_X_
Recargos nocturnos	_X_	Vacaciones	_X_
Festivos	_X_	Riesgos laborales	_X_
Dominicales	_X_		

Cotización a Seguridad– EPS Y PENSION_X_

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier acción judicial contra él o contra la empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S a** causa del contrato laboral a término fijo que hemos ejercido durante la ejecución o terminación del proyecto o funciones asignadas.

CAUSA DEL RETIRO:

Renuncia voluntaria	_____
Terminación obra	_____
Terminación del contrato	___X___

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los 20 días del mes de 10 del año 2022

Huella

YURI OMAIRA CUELLAR MARTINEZ
C.C 1.073.607.133
INSPECTORA SST

Luis Miguel Novoa A.

LUIS MIGUEL NOVOA ALBARRACIN
C.C 1.024.536.049

Powered by CamScanner

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS

LA MEJOR ALTERNATIVA

PAZ Y SALVO DE TRABAJADOR

CERTIFICO QUE:

La empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S**, con NIT: 900.334.403-3 se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha con LUIS FERNANDO SANABRIA ROCHA , mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 79.647.479 de la Palma Cundinamarca : en el pago de las Entidades Promotoras de Salud EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Que durante la ejecución y terminación del proyecto de suministro e instalación de divisiones acero inoxidable.
Contrato # CO1.PCCNTR.4077644-12.

Declaro que la empresa quedo a **PAZ Y SALVO** conmigo en todo concepto de:

Salario	_X_	Dotaciones	_X_
Auxilio de transporte	_X_	Prima de servicios	_X_
Horas extras	_X_	Cesantías	_X_
Recargos nocturnos	_X_	Vacaciones	_X_
Festivos	_X_	Riesgos laborales	_X_
Dominicales	_X_		
Cotización a Seguridad– EPS Y PENSION	_X_		

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier acción judicial contra él o contra la empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S a** causa del contrato laboral a término fijo que hemos ejercido durante la ejecución o terminación del proyecto o funciones asignadas.

CAUSA DEL RETIRO:	Renuncia voluntaria	_____
	Terminación obra	_____
	Terminación del contrato	___X___

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los 20 días del mes de 10 del año 2022

Huella

YURI OMAIRA CUELLAR MARTINEZ
C.C. 1.073.607.133
INSPECTORA SST

Luis Fernando Sanabria Rocha.

LUIIS FERNANDO SANABRIA ROCHA
C.C 1.073.607.133

Powered by CamScanner

ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR SAS

LA MEJOR ALTERNATIVA

PAZ Y SALVO DE TRABAJADOR

CERTIFICO QUE:

La empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S**, con NIT: 900.334.403-3 se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha con ANDRES DAVID DORADO DIAZ, mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.019.152.865 de Bogotá D.C : en el pago de las Entidades Promotoras de Salud EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales ARL, Cajas de Compensación Familiar.

Que durante la ejecución y terminación del proyecto de suministro e instalación de divisiones acero inoxidable.
Contrato # CO1.PCCNTR.4077644-12.

Declaro que la empresa quedo a **PAZ Y SALVO** conmigo en todo concepto de:

Salario	_X_	Dotaciones	_X_
Auxilio de transporte	_X_	Prima de servicios	_X_
Horas extras	_X_	Cesantías	_X_
Recargos nocturnos	_X_	Vacaciones	_X_
Festivos	_X_	Riesgos laborales	_X_
Dominicales	_X_		

Cotización a Seguridad– EPS Y PENSION_X_

Por lo tanto, renuncio expresamente a cualquier acción judicial contra él o contra la empresa **ARQUITECTURA Y DISEÑO MODULAR S.A.S a** causa del contrato laboral a término fijo que hemos ejercido durante la ejecución o terminación del proyecto o funciones asignadas.

CAUSA DEL RETIRO:

Renuncia voluntaria	_____
Terminación obra	_____
Terminación del contrato	___X___

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá a los 20 días del mes de 10 del año 2023

YURI OMAIRA CUELLAR MARTINEZ
C.C. 1.073.607.133
INSPECTORA SST

Andres Dorado D.

ANDRES DAVID DORADO DIAZ
C.C 1.019.152.865

Huella


Powered by CamScanner

CONTROL DE RE

REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	

VISIONES Y ACTUALIZACIONES

DESCRIPCIÓN



Página 1 de 1	
Versión: 2	
Código: RH-F-006	
DOCUMENTO CONTROLADO	

Elaboro: Coordinador HSEQ	Aprobo: Directora HSEQ	

JUSTIFICACIÓN	**PROFESIONALES ASOCIADO** de origen laboral, o daños a la HSEQ.
ALCANCE	El presente programa cubre to carrera. Se asegurará que toda
OBJETIVO	
Garantizar que todo el personal **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA**. cuente con la formación en Seguridad industrial, Salud en el trabajo y Medio Ambiente, requerida para el desarrollo de sus actividades, reduciendo así la probabilidad que ocurran incidentes, accidentes, enfermedades laborales o daños a la propiedad o impactos ambientales; estableceiendo un plan carrera para Fomentar gestión HSEQ donde se proyecte la intervención de las partes interesadas a corto, mediano y largo plazo.	M1: Dar cubrimiento al 100% dentro del Programa de capacit
	M2: Realizar el 100% de las ca
	M_3**:** Lograr que el 100 % de satisfactorio (80%)

	ACTIVIDAD	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL	
		P	E	P	E	P	E	P	E
P	Definir necesidades de capacitación	X	X						
	Definir necesidades de capacitación por cargo	X	X						
	Definir la frecuencia de realización de las capacitaciones	X	X						
	Definir responsables	X	X						
	Buscar personal competente para realizar las capacitaciones	X	X						
	Definir periodos de evaluación del programa	X	X						

POLITICA P.A	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL	
Divulgación de politicas y objetivos organizacionales Profesionales Asociados Ltda	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizacion examenes medicos de Ingreso /periódicos	X	X	X	X	X	X	X	X
PVE CONSERVACION AUDITIVA	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
Verificación de audiometrías en los exámenes médicos de Ingreso /periódicos	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitación Aplicación de buenas prácticas de autocuidado.			X	X				
Tip´s con recomendaciones adecuadas para el manejo de elementos externos tales como: Audífonos, diademas, equipos y herramientas entre otros.					X	X		
Capacitación de prevención enfermedades de origen auditivo								
Capacitación Conmemoración del día mundial de la salud							X	X
Plegable autocuidado e higiene auditiva								
Charlas de Identificación de alertas para la prevención auditiva.								
Entregables para evitar contaminación Auditiva el lugares cerrados.								
Capacitación de uso adecuado de elementos de protección auditiva.								
PVE CONSERVACION VISUAL	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
PVE BIOMECANICO	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	

	Verificación exámenes médicos de Ingreso /periódicos	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	**X**	**X**
	Revisión Diagnostico de condiciones de salud año DIC-2023 BOGOTA								
	Actualización base de datos según concepto de aptitud laboral/Entrega de carta al colaborador	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	**X**	**X**
	Actualización matriz de identificación de peligros			**X**	**X**				
	Capacitación en beneficios del ejercicio físico para el sistema musculoesquelético.			**X**	**X**				
	capacitación de higiene postural y manejo de cargas					X	X	**X**	**X**
	Conmemoración día mundial de la salud 7 de abril (ACTIVIDAD CON EL PERSONAL)							**X**	**X**
	capacitación en manipulación de cargas								
	Plegable normas de higiene y videoterminales.								
	Taller prevención de alteraciones de la columna vertebral y ejercicios de fortalecimiento.								
	Inspección ergonómica a puestos de trabajo								
	Pausas activas (Ejercicios de fortalecimiento y relajación de miembros superiores, ejercicios de fortalecimiento y relajación de miembros inferiores, ejercicios de fortalecimiento abdominal, ejercicios de propiocepción y equilibrio, ejercicios de coordinación viso manual, ejercicios de relajación del globo ocular, ejercicios de fortalecimiento de flexo-extensores de muñeca, masaje de relajación, ejercicios de fortalecimiento de columna vertebral y ejercicios de contracción relajación para columna cervical)	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	**X**	**X**
	Invitación Pausas Activas	**X**	**X**	**X**	**X**	X	X	**X**	**X**
	Capacitación Ergonómica								

	Capacitación riesgo biomecánico								
	Divulgación del Programa de Vigilancia en Riesgo Biomecánico 2023			X	X				
	Entregable Buenas Practicas de Ergonomía en el trabajo.								
	Folleto prevención en desordenes musculoesqueléticos								
	Capacitación seguridad basada en el comportamiento.								
	PVE PSICOSOCIAL	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
	Capacitación en Ley 1010 acoso laboral			X	X				
	Gimnasia laboral y Pausas Activas Mentales					X	X		
	Capacitación de Manejo adecuado del tiempo							X	X
	Capacitación manejo del estrés								
	Capacitación de trabajo en equipo y comunicación asertiva.								
	Capacitación estilos de vida saludable								
	Fomentos de bienestar celebración día de mujer y hombre								
	Actividades de sano esparcimiento zumba.								
	PG RIESGO MECANICO	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
	Divulgación de programa de gestión			X	X				
	Elaboración de listado de herramientas criticas. Según proyecto.			X					
H	Revisión de hojas de vida de los equipos y herramientas criticas, según proyecto.			X					
	capacitaciones en uso, cuidado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal.					X	X		

Capacitación y Boletín manejo de herramientas manuales de trabajo							X	X
Realizacion de estudios higienicos								
Capacitación manejo de cargas								
Capacitación ASEGURAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO								
Inspección de herramientas menores y equipos.	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar inspección de elementos de protección personal (EPP)	X	X	X	X	X	X	X	X
PG SEGURIDAD VIAL	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
Divulgacion del programa de riesgo vial			X	X				
Realizar inspeccion preoperacional a los vehiculos			X	X	X	X	X	X
Divulgacion de los programas de gestion							X	X
Socialización del Plan Estrategico de Seguridad Vial - PESV			X	X				
Divulgación de la política de seguridad vial					X	X		
Actores viales peatones y pasajeros								
Actores viales motociclistas, conductor							X	X
Capacitacion normas de seguridad vial								
Capacitacion actuación en caso de accidente de transito							X	X
PG TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
Divulgación de programa de prevención y protección contra caídas			X	X				
Inventario de equipos que se tienen para la ejecución de actividades de trabajo en altura			X	X				
Revisión de instructivo para trabajo seguro en alturas			X					
Revisión de formatos de permisos de trabajo en alturas y formato de análisis de trabajo seguro.	X		X	X	X	X	X	X
Revisión de hojas de vida de los equipos de trabajo en aturas.			X	X			X	X

Capacitación sobre mantenimiento preventivo para equipos de protección contra caídas								
Capacitación sobre medidas de prevención y protección contra caídas y responsabilidades de los trabajadores			X	X				
Socialización sobre diligenciamiento de permiso de trabajo en altura.	X		X	X	X	X	X	X
Revisión de formatos de inspección de equipos para trabajo en alturas.			X	X				
Divulgación de formato de análisis de trabajo seguro.	X		X	X	X	X	X	X
Enviar al personal pre seleccionado al realizar exámenes con énfasis en trabajo en alturas.	X		X	X	X	X	X	X
Capacitación y entrenamiento al personal que realice actividades de trabajo en altura de acuerdo a la resolución 4272 de 2021.	X		X	X	X	X	X	X
Divulgación procedimientos de trabajo en alturas y plan de emergencias	X		X	X	X	X	X	X
Realizar inspecciones de los equipos de trabajo en alturas. (Cuando aplique)			X	X				
PG PROGRAMA DE INSPECCIONES	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
Realizar inspección Gerencial					X	X		
Realizar inspección de botiquín	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar inspección de extintores	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar inspección de elementos de protección personal (EPP)	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección ambiental								
Inspección de áreas de trabajo	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección de herramientas	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección de vehículos	X	X	X	X	X	X	X	X

Inspección trabajo en alturas	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspección de kit ambiental								
Realizar y ejecutar planes de acción de las inspecciones realizadas	X	X	X	X	X	X	X	X
AMBIENTAL 6	**ENERO**		**FEBRERO**		**MARZO**		**ABRIL**	
Divulgar el programa de gestión ambiental	X	X						
Elaborar inventario de sustancias quimicas acorde a las actividades	X				X			
Charla ahorro y uso eficiente del papel								
Charla en Clasificacion de residuos							X	
Charla ahorro y uso eficiente del agua y energia	X							
Capacitacion proteccion de la biodiversidad y los ecosistemas								
Capacitacion control de derrames								
Capacitacion en Clasificacion de residuos								
Capacitacion ahorro y uso eficiente del agua							X	
Capacitacion ahorro y uso eficiente de la energía - Tips para reducir el consumo			X	X				
Capacitacion Huella de carbono - GEI					X			
Simulacro Ambiental								
Clasificacion, acopio y disposicon de los residuos generados								

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2023

Fecha de actualización:31/01/2023

OS LTDA, busca que el personal cuenta con las competencias y formación que requiere, en los cargos, se re
propiedad; buscando orientar y facilitar mecanismos de control que permitan el seguimiento de los grupos de

odos los trabajadores de **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA**, tanto de la sede administrativa como de l
s las capacitaciones o instrucciones sean coherentes con las habilidades de comunicación y escolaridad de lo

METAS	
de los trabajadores vinculados a PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, taciones durante cada trimestre.	(Nº de trabajadores ca
pacitaciones programadas durante cada trimestre para el periodo 2021.	(Nº de capacitaciones ej
las evaluaciones de eficiencia de las capacitaciones tengan un resultado	(Evaluaciones de capacitación

2023													
MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X												
		X	X										
						X	X						
								X	X				
												X	

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	

x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
												x	
x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				x	x								
								x	x				
				x	x								
						x	x						
x					x								
x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
x	x	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				x	x								

												X	
												X	
										X	X		
								X	X				

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
X	X												
		X	X										
				X	X								
X													
						X	X						

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
				X	X								
				X	X								

X	X												
X	X									X	X		
		X	X										
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						X	X						
		X	X									X	
										X	X		

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
X	X					X	X			X	X		
				X	X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				X	X					X	X		

				X	X								
		X	X									X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X	X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
		X	X					X	X				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
		X	X					X	X				
				X	X								
						X	X						
		X	X										
X	X												
X	X									X	X		
X	X									X	X		



duce la probabilidad que ocurran incidentes, accidentes o enfermadades
interes y fomentando el desarrrollo del plan carrera dentro de la gestión

os diferentes proyectos, grupos de interes y establecimiento de un plan
s trabajadores.

INDICADORES
pacitados / Total de trabajadores vinculados en el trimestre)*100
ecutadas / Nº de capacitaciones programadas en el trimestre)*100
con calificación superior al 80 % / Total de evaluaciones realizadas en el trimestre)*100

DICIEMBRE		RESPONSABLE	RECURSOS	AREA
P	E			
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa

DICIEMBRE		RESPONSABLE	RECURSOS	AREA
X		Directora HSEQ/Directora RRHH / Coordinador HSEQ	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH / Coordinador HSEQ	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora	Locativos Tecnológicos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**

X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa

		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa


		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa

X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa


X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
DICIEMBRE		**RESPONSABLE**	**RECURSOS**	**AREA**
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
X		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa
		Directora HSEQ/Directora RRHH	Locativos Tecnológicos Humanos	Administrativa

VERIFICACIÓN DEL P

		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL	
		P	E	P	E	P	E	P	E
META 1	Nº de Trabajadores vinculados	25		38		60		74	
	Nº de trabajadores capacitados		23		30		40		69
	Trabajadores vinculados en el trimestre	41							
	Trabajadores capacitados en el trimestre	31							
	(No. Trabajadores Capacitados / No. Trabajadores vinculados)*100	**76%**							
META 2	Nº de capacitaciones programadas	23		20		12		10	
	Nº de capacitaciones ejecutadas	23		20		12		10	
	Capacitaciones programadas en el trimestre	55							
	Capacitaciones ejecutadas en el trimestre	55							
	(No. Capacitaciones Ejecutadas / No. Capacitaciones Programadas)*100	**100%**							
META 3	Nº de evaluaciones de capacitación con calificación superior al 80 %	40							
	Nº total de evaluaciones realizadas	40							
	(Evaluaciones de capacitación con calificación superior al 80 % / Total de evaluaciones realizadas en el	**100%**							

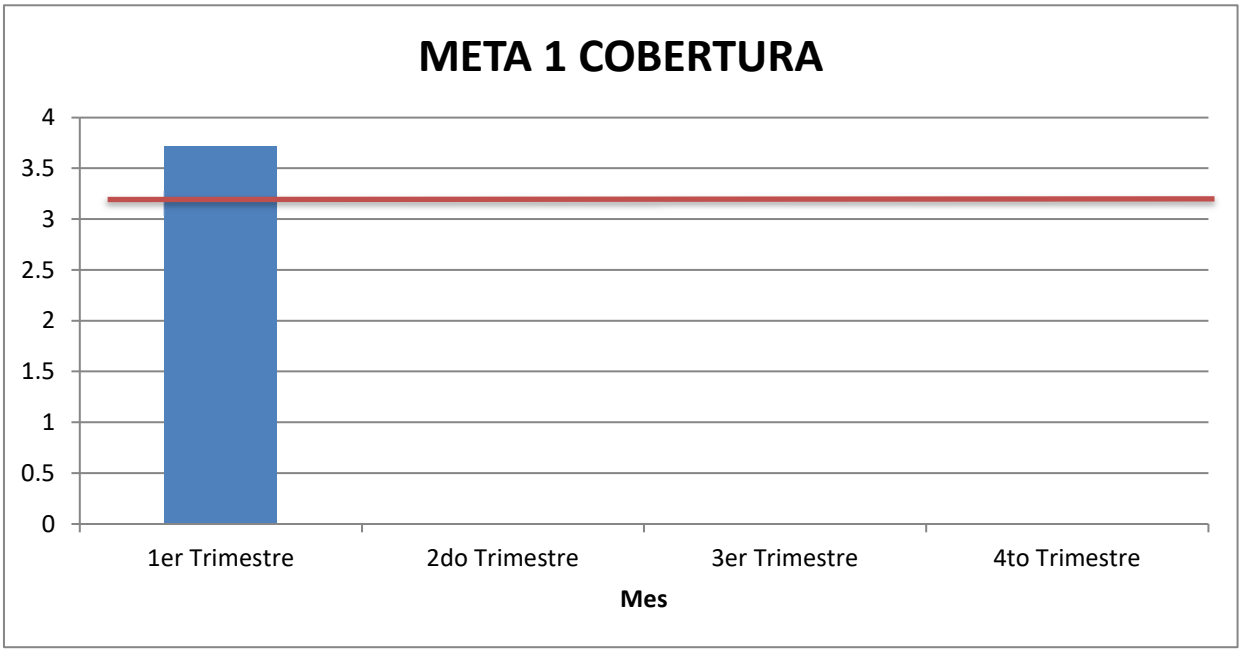


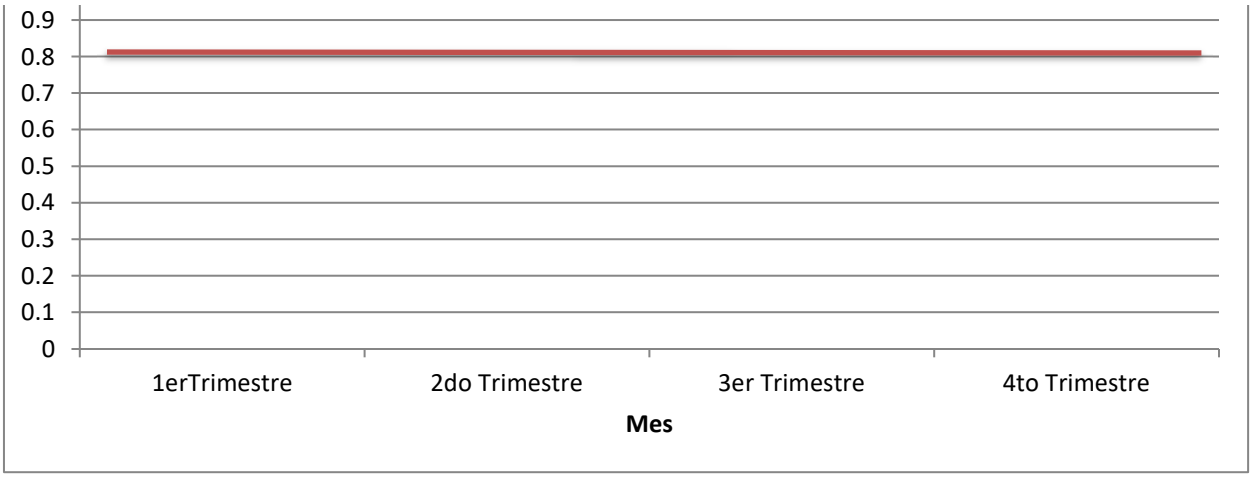


0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1erTrimestre
2do Trimestre
3er Trimestre
4to Trimestre
Mes

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2023

MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
124		0		167		171		192		0		0	
	120		0		95		150		170		0		0
66				177						0			
63				138						0			
95%				**78%**						**#¡DIV/0!**			
12	12			10	10			0		0		0	
12	12			10	10			0		0		0	
34				20						0			
34				20						0			
100%				**100%**						**#¡DIV/0!**			
0				0						0			
0				0						0			
#¡DIV/0!				**#¡DIV/0!**						**#¡DIV/0!**			

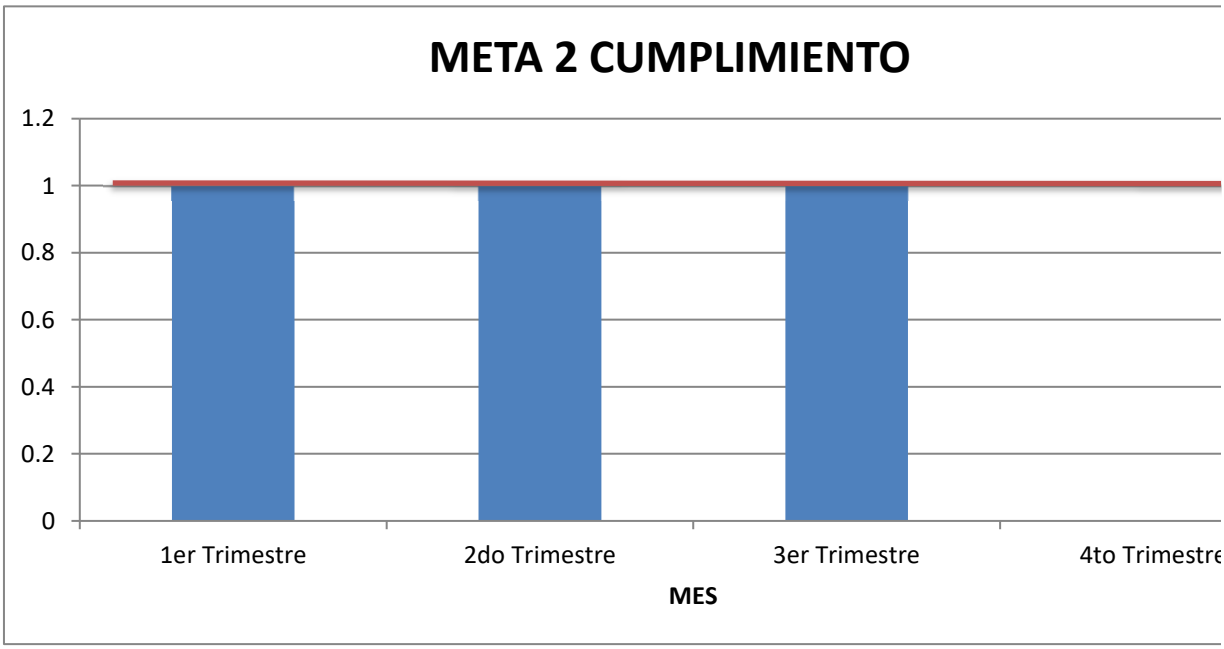

DICIEMBRE	
P	E
0	
	0
0	
0	




PERIODO	AN
PRIMER TRIMESTRE 2023	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SI CAPACITACION DE TODOS LOS TRA OTRO 20% PERTENECE A TRABAJA AUTORIZADOS AUN NO INGRESAN A CONTRATO
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
TERCER TRIMESTRE 2023	


CUARTO TRIMESTRE 2023	

PLAN DE ACCION 2023

NALISIS	ACCION
E HA ALCANZADO MAS DEL 80 % DE LA BAJADORES QUE INGRESAN A OBRA, EL ADORES QUE AUNQUE SE ENCUENTREN NINGUNO DE LOS FRENTES DE OBRA DEL	EN CUANTO INGRESEN LOS TRABAJADORES REALIZAR LA GESTION CORRESPONDIENTE EN CAPACITACION



RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA LIMITE	SEGUIMIENTO
TECNICOS SST	COMPUTADOR MATERIAL DIDACTICO REGISTRO DE ASISTENCIA		



Capacitadores

INFORME AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL No 10

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CO1.PCCNTR.4077644

AREA HSEQ.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ, D.C

PERIODO: DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE

INDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN No.	FECHA	SECCIÓN MODIFICADA	OBSERVACIONES
01	15/11/2023	-	Presentación inicial
02	8/12/2023	Informe	Observaciones realizadas por interventoria


	NOMBRE	FIRMA
ELABORO:	JULIANA PAOLA RUBIO D **PROFESIONAL AMBIENTAL**	
REVISO:	MARTHA ESTRADA NIETO **GERENTE HSEQ**	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 9
4. ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL PERIODO 18

4.1 COLEGIO ENTRE NUBES – SEDE SANTA RITA SUR ORIENTAL 18
4.2 COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO SEDE A 20
4.3 COLEGIO JOSÉ MARÍA CARBONELL 21
4.4 COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL – SEDE C FUNDACIÓN EL CONSUELO 21
4.5 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS SEDE A 22
4.6 COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO – SEDE C 23
4.7 COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR SEDE B 24
4.8 COLEGIO PANTALEÓN GAITÁN PÉREZ 25
4.9 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS SEDE B 26
4.10 COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A 27
4.11 COLEGIO RAFAEL NÚÑEZ – SEDE ANDRÉS ROSILLO 28
4.12 COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE A 29
4.13 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B 29
4.14 COLEGIO ENTRE NUBES SEDE B 30
4.15 COLEGIO EL RODEO SEDE B 31
4.16 COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE C 32
4.17 COLEGIO VEINTE DE JULIO 32
4.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – EMERGENCIAS 33
4.18.1 COLEGIO LOS ALPES SEDE A – ADECUACIÓN DE CUBIERTA Y LEVANTAMIENTO AULAS PREFABRICADAS 33
4.18.2 COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO SEDE B – ADECUACIÓN DE CUBIERTA. 34

5.1 PROGRAMA DE TRAMITES Y/O PERMISOS AMBIENTALES 35
5.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 41

5.3PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 46
5.4 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 51
5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 52
5.6 PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 54
5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 61
5.8 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ESPECIES VEGETALES 63
5.9 PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 67
6. CONCLUSIONES 68
7. RECURSOS UTILIZADOS 69
7.1 HUMANO-COMPETENCIAS 69
7.2 FÍSICOS 69
7.3 SOFTWARE 69
8. REGISTROS. 70

LISTADO DE IMÁGENES

Ilustración 1 Distribución espacial de los colegios de la SED, en donde se realizarán actividades de mantenimiento y remodelación. 7
Ilustración 2 Ubicación y fachada Colegio Entre Nubes Sede B 17
Ilustración 3 Ubicación y fachada Colegio José Joaquín Castro 18
Ilustración 4 Ubicación y fachada Colegio José María Carbonell 19
Ilustración 5 Ubicación y fachada Colegio Moralba Sur Oriental Sede C 20
Ilustración 6 Ubicación y fachada Colegio Tomás Rueda Vargas Sede A 21
Ilustración 7 Ubicación y fachada Colegio José Félix Restrepo Sede C 22
Ilustración 8 Ubicación y fachada Colegio San Cristóbal Sur Sede B 22
Ilustración 9 Ubicación y fachada Colegio Pantaleón Gaitán Pérez 23
Ilustración 10 Ubicación y fachada Colegio Tomás Rueda Vargas Sede B 24
Ilustración 11 Ubicación y fachada Colegio Francisco Javier Matiz Sede A 25
Ilustración 12 Ubicación y fachada Colegio Rafael Núñez Sede B 26
Ilustración 13 Ubicación y fachada Colegio José Félix Restrepo Sede A 27
Ilustración 14 Ubicación y fachada Colegio Alemania Unificada Sede B 28
Ilustración 15 – Ubicación y fachada Colegio Entre Nubes Sede B ubicacion y fachada colegio Entre Nubes Sede B 29
lustración 16 ubicación y fachada Colegio El Rodeo Sede B 29
Ilustración 17 Ubicación y fachada Colegio Altamira sede C 30
Ilustración 18 Ubicación y fachada Colegio Veinte de Julio 31
Ilustración 19 - Ubicación y fachada Colegio Los Alpes Sede A 32
Ilustración 20 Ubicación y fachada Colegio Jose Joaquín Castro Sede B 33

1. INTRODUCCIÓN

El contrato CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a ***"ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7"*** tiene como propósito la intervención de 28 establecimientos educativos de la localidad de San Cristóbal Sur.

El presente Informe reporta las actividades de carácter ambiental desarrolladas por Profesionales Asociados Ltda, con el fin de prevenir, mitigar y/o corregir los impactos producidos por las actividades que se desarrollan entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre del 2023 correspondientes al décimo mes de ejecución del contrato.

Durante este periodo se ejecutaron actividades en 14 establecimientos educativos los cuales son: Colegio Entre Nubes – Sede D, Colegio José Joaquín Castro – Sede A, Colegio José María Carbonell – Sede A, Colegio San Cristóbal Sur – Sede B, Colegio José Joaquín Castro – Sede B, Colegio Moralba Sur Oriental – Sede C, Colegio Entre Nubes - Sede A, Colegio Tomas Rueda – Sede A, Colegio José Félix Restrepo – Sede C, Colegio Pantaleón Gaitán Cortes - Sede A, Francisco Javier Matiz – Sede A, Tomas Rueda – Sede B, José Acevedo y Gómez – Sede B y Rafael Núñez – Sede B.

Atendiendo los lineamientos establecidos "Obligaciones ambientales" de las condiciones y términos del Contrato de obra, el Informe Mensual presenta la descripción del Proyecto, localización, datos del Contrato de Obra, así como las medidas de gestión implementadas, de conformidad al Plan de Manejo Ambiental alineado al PIGA de la entidad, para el control de los posibles impactos y/o afectaciones que se puedan

presentar, debido al desarrollo de actividades constructivas y/o de mantenimiento propias del Contrato.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito adelantar las actividades de mantenimiento y remodelación de la infraestructura de las aulas escolares que se encuentran en la localidad de San Cristóbal Sur, en donde se distribuyen los 28 colegios a intervenir por parte de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, bajo el contrato de obra pública No. CO1.PCCNTR.4077644.

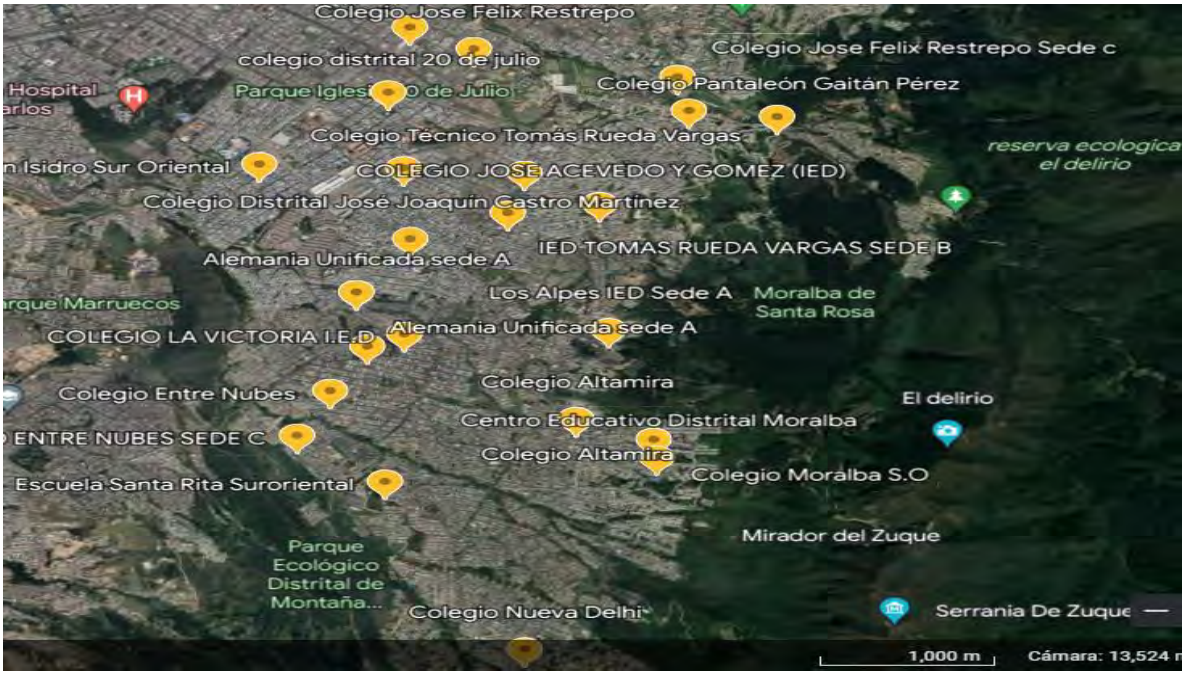


Ilustración 1 Distribución espacial de los colegios de la SED, en donde se realizarán actividades de mantenimiento y remodelación.

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

FORMATO FICHA TÉCNICA RESUMEN DE OBRA	
Datos del generador (Entidad a cargo de la obra)	
Nombre o Razón Social:	*SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN*

NIT:		899.999.061-9	
Dirección:		Av. El Dorado #66-63	
Teléfono:		3241000	
Correo electrónico:			
Responsable del proyecto (Constructor)			
Nombre del Constructor:	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA	**Naturaleza jurídica:**	JURÍDICA
Tipo de documento:	NIT	**Número de documento:**	813008120 -1
Dirección de correspondencia:	Bogotá D.C., Calle 104 No. 14 A – 45 Oficina 401, Edificio Centro Empresarial 104 PH.		
Teléfono:	(57-1) 2150482 - 6371065	**Correo electrónico empresa:**	directorproyecto.sed@profesionalesasociadosltda.com
Datos del proyecto			
Registro de la obra ante la SDA o PIN:		22476	
Número de contrato		CO1.PCCNTR.4077644	
Nombre de la Obra:		ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7	
Modalidad de la obra:		MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:		SAN CRISTOBAL	
Área a construir:		N/A	
Tipo de uso:		INSTITUCIONAL	
Licencia de construcción o urbanismo:		N/A	
Tiempo estimado de ejecución de la obra:		12 meses	
Fecha de inicio de la obra:		12/01/2023	

Fecha estimada de finalización de la obra:	11/01/2024	
Presupuesto para la gestión de RCD:	$244.400.000	
Presupuesto total de la obra:	$13.074.041.772	
1. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cra 6 # 18 sur 20	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	2400 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	6 metros
2. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cll 37 a bis sur # 1 – 14	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	7506 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	7
3. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO EL RODEO - SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Calle 40 a sur # 2 -56 este	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	2533.82 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	1
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	3.5 m
4.Datos de la obra		

Nombre de la Obra:	COLEGIO ENTRE NUBES - SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Call 48 sur # 2 este 27	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	1963.45 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	7.5 m
5. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO ENTRE NUBES - SEDE D	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Call 48 sur # 2 este 23	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	2533.82 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	4
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	12.3 m
6. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ - SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 3 b # 30 a – 42	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	4246 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	9 m
7. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Tv 6 este # 33 sur – 98	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto**	9458 m2

	(m²):	
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	1
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	3
8. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO JOSÉ MARIA CARBONEL – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cra 4 # 0 sur 45	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m²):**	4600 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	10.5
9.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO LA VICTORIA - SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 3 a este # 35 - 47 sur	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m²):**	2533.82 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	9
10.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL - SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 16 a este # 42 c 80	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m²):**	895 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	10 m
11.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL - SEDE C	

Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 16 a este # 42 c 80	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	1372.66 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	10 m
12.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO NUEVA DELHI - SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Transversal 14 este calle 61 a sur	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	7506 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	6m
13.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ – SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 9 a # 18 - 74 sur	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	800 m2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	6m
14.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 10 d este # 17 b 46 sur	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	1266.5 M2

Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	3
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	9 m
15.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS – SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 5 este # 26 - 91	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	1266.50 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	4
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	12 m
16.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO SAN CRISTOBAL – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cra. 10 D Este # 14 17B-46Sur	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	120 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	6 m
17.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO JOSE FELIX RETREPO SEDE C	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cra. 6 Este #49 # 11	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	3
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	110 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	4
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	14 m
18.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO TOMAS RUEDA SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	

Dirección de la obra:	Cra. 5 Este #26-91	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	180 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	4
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	16 m
19.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO ENTRE NUBES SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cra. 5 Este #26-91	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	120 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	7 m
20.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO ALTAMIRA SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Dg. 47 Sur #11 Este12	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	83 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	8 m
21.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO PANTALEON GAITAN CORTES – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Carrera 13S, San Cristóbal,	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	105 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2

Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	8 m
22.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	JARDIN INFANTIL LOS ALPES – SEDE C	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Tv. 12 Este #33 A 80, Bogotá	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	84 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	1
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	5 m
23.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ – SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cl. 30a Sur #10a Este-1 a 10a Este-99, Bogotá	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	84 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	7 m
24.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO 20 DE JULIO – SEDE A	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	01, Cra. 7 #24, San Cristóbal, Bogotá	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	84 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	7 m
25.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO EL RODEO - SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cl. 40a Sur #2-56 Este, San Cristóbal, Bogotá, Cundinamarca	

Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	103 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	4
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	12 m
26.Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cl. 38a Sur #2n9, Bogotá	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	143 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	1
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	6 m
27. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO ALTAMIRA SEDE C	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cl. 44 Sur #9 Este31	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	168 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	2
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	13 m
28. Datos de la obra		
Nombre de la Obra:	COLEGIO SAN CRISTOBAL SEDE B	
Modalidad de la obra:	MANTENIMIENTO LOCATIVO	
Localidad:	SAN CRISTOBAL SUR	
Dirección de la obra:	Cl. 19 Sur #6a Este22	
Chip catastral: N/A	**Estrato**	2
Área a construir: N/A	**Área del lote del proyecto (m^2):**	168 M2
Tipo de uso: INSTITUCIONAL	**Número de pisos:**	1
Número de sótanos: N/A	**Altura total:**	7 m


4. ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN EL PERIODO

A continuación, se mencionan las actividades realizadas en cada frente intervenido durante el periodo del presente informe.

4.1 COLEGIO ENTRE NUBES – SEDE SANTA RITA SUR ORIENTAL

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la carrera 4 b Este #48 b sur, en la localidad de San Cristóbal.

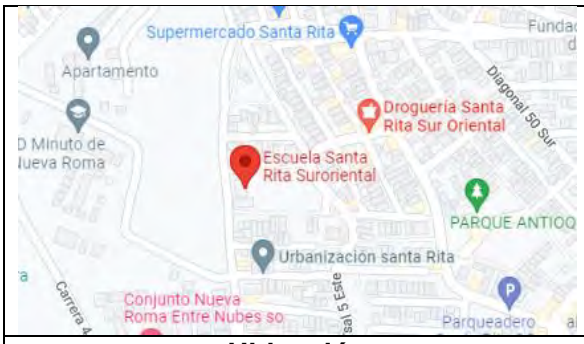

Ubicación



Fachada

Ilustración 2 Ubicación y fachada Colegio Entre Nubes Sede B

- **Actividades ejecutadas**

En el marco del proyecto de mejoras y renovación de nuestras instalaciones, se llevan a cabo diversas actividades en diferentes áreas del colegio. En el bloque administrativo y en el bloque de aulas, se están realizando los filos para garantizar un acabado preciso y duradero. Asimismo, estas labores se extienden al muro principal de la escalera para asegurar una uniformidad estética en todo el recinto. En la infraestructura hidráulica, se ha llevado a cabo el corte con pulidora en la acometida en dirección hacia las bombas, y se han realizado regatas en la placa para la tubería hidráulica. Además, se ha efectuado una excavación manual en la zona de parques y tanques, asegurando así una base sólida para las futuras instalaciones.

En lo que respecta a las adecuaciones, se ha completado la fundida de placa en la zona de bombas, con un espesor aproximado de 16 cm, y se ha realizado la fundida del cárcamo lateral del parque. Además, se ha llevado a cabo la instalación de una estructura

metálica de cubierta en la coordinación del colegio, brindando así una solución duradera y resistente. En el ámbito sanitario, se ha instalado la tubería necesaria para el cárcamo, así como los bajantes correspondientes. La instalación de la tubería hidráulica desde la zona de bombas hasta los baños, y desde la acometida principal hasta la zona de bombas, garantiza un funcionamiento eficiente de todo el sistema.

En cuanto a las mejoras en la infraestructura de aulas, se han instalado ventanas en el primer y segundo piso del bloque correspondiente. Además, se ha llevado a cabo la instalación de tapaluces para mejorar la iluminación natural en espacios específicos. En lo que respecta a la estética y el mantenimiento, se ha aplicado pintura epoxica en zonas húmedas, pintura korasa en fachadas y pintura vinilo y esmaltes en áreas internas, asegurando un ambiente limpio y agradable.

En el ámbito eléctrico, se ha completado la instalación de luminarias tipo LED con sus respectivas salidas en tubería EMT. También se han instalado tableros eléctricos, tomas corrientes e interruptores para garantizar un suministro eléctrico seguro y eficiente en todas las áreas del colegio. Estas mejoras contribuyen al bienestar y confort de toda la comunidad educativa.

4.2 COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO SEDE A

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Calle 31 D Bis Sur No. 2 - 24 Este, en la localidad de San Cristóbal.

	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 3 Ubicación y fachada Colegio José Joaquín Castro

- **Actividades ejecutadas**

En el marco del proyecto de mejoras infraestructurales, se llevaron a cabo diversas actividades en las instalaciones educativas. En primer lugar, se procedió al desmonte de

la cubierta en las aulas 5-6 y en el espacio destinado a los profesores, con el objetivo de preparar el terreno para las futuras mejoras.

Posteriormente, se llevó a cabo la instalación y pintura de una nueva estructura metálica para las cubiertas de las aulas 5-6 y del área destinada a los profesores. Esta fase del proyecto no solo buscó garantizar la solidez y durabilidad de las cubiertas, sino también realzar la estética del entorno educativo.

Finalmente, se procedió a la instalación de tejas en las cubiertas de las aulas 5-6 y en el espacio designado para los profesores. Esta medida no solo tiene como objetivo proporcionar una cobertura efectiva, sino también mejorar la eficiencia energética y el confort térmico de dichas áreas.

4.3 COLEGIO JOSÉ MARÍA CARBONELL

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 4 # 0 sur - 45, en la localidad de San Cristóbal.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ubicación</td>
<td>Fachada</td>
</tr>
</table>

Ilustración 4 Ubicación y fachada Colegio José María Carbonell

- **Actividades ejecutadas**


Durante el proceso de mejora y optimización en el colegio, se realizaron diversas acciones para el mantenimiento de sus instalaciones. Estas incluyen el emboquillado de la fachada del edificio administrativo, la instalación de tubería eléctrica y luminarias en los pisos 1,2, 3 y 4 del bloque principal, la colocación de ventanas en el domo del edificio de preescolar, la instalación de rejillas de cárcamo en la zona de parqueadero, el levantamiento de muros en mampostería seca en el aula 29 al aula 29A, la aplicación de pintura Korasa en las fachadas del bloque administrativo, la instalación de luminarias adicionales en los corredores, la colocación de salidas de tomacorrientes, la instalación de ventanas en baños en el piso 3 y en la zona norte de la fachada, la instalación de puertas

entamboradas en zonas de baños del piso 3 y salones del piso 2, la instalación de cielo rasos, la pintura de arcos en la cancha principal. Es de mencionar que, se realiza la entrega de 10 salones según la solicitud del rector del colegio.

4.4 COLEGIO MORALBA SUR ORIENTAL – SEDE C FUNDACIÓN EL CONSUELO

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 15 Este # 46-60 Sur, en la localidad de San Cristóbal.

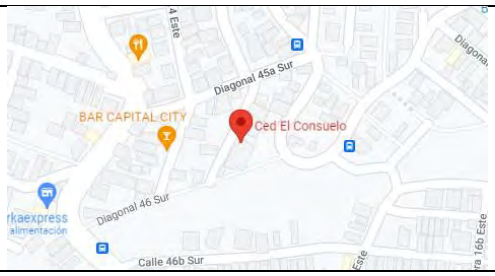

Ubicación



Fachada

Ilustración 5 Ubicación y fachada Colegio Moralba Sur Oriental Sede C

- **Actividades ejecutadas**

Durante el período de corte, que abarcó del 12 de octubre al 12 de noviembre, se llevaron a cabo diversas actividades en la sede C del colegio Moralba Sur Oriental. Entre las acciones ejecutadas se incluyen el retiro del alistado de la placa cubierta del edificio, así como la aplicación de pañete en los muros de los baños.


Además, se realizaron trabajos de aplicación de pintura esmalte en la estructura de los baños, desmonte de estructuras y vigas en concreto, así como el retiro de placa maciza y muros de mampostería con acabados. Se llevó a cabo el desmonte de ventanas, y se realizaron excavaciones manuales para las cimentaciones necesarias.

En términos de instalaciones, se procedió a la instalación de estructuras metálicas, la colocación de platinas y la aplicación de pintura esmalte sobre la estructura metálica. Además, se llevó a cabo la instalación de teja tipo sándwich en los baños. Estas acciones han contribuido significativamente al desarrollo y avance de las labores programadas durante este período específico.

4.5 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS SEDE A

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 5 Este #26-91, en la localidad de San Cristóbal.

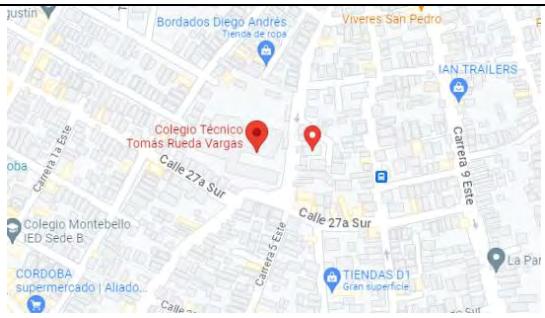

Ubicación



Fachada

Ilustración 6 Ubicación y fachada Colegio Tomás Rueda Vargas Sede A

- **Actividades ejecutadas**

En el marco de las actividades programadas para el proyecto, se llevaron a cabo diversas tareas de adecuación del sendero peatonal. En primer lugar, se procedió al desmonte de la placa matera, seguido de una excavación en la zona destinada para materas. Posteriormente, se efectuó la extensión y compactación del recebo B-200, asegurando una base sólida para las futuras instalaciones.

Una fase crucial del proyecto incluyó la fundición de la placa destinada a la pista de atletismo, garantizando así un pavimento de calidad para actividades deportivas. Además, se llevaron a cabo labores de instalación de bordillo, proporcionando límites definidos y estéticos para las áreas designadas. En última instancia, se completó la instalación de bancas, contribuyendo a la creación de un espacio funcional y cómodo para los usuarios.

Estas acciones fueron ejecutadas con precisión y conforme a los estándares establecidos, avanzando de manera efectiva en la materialización del proyecto planificado.

4.6 COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO – SEDE C

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Calle 11 Sur # 4 – 79 Este, en la localidad de San Cristóbal.

	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 7 Ubicación y fachada Colegio José Félix Restrepo Sede C

- **Actividades ejecutadas**

En la zona de la cancha se realiza excavación en roca y retiro de placa maciza de 30 cm, paso seguido se realiza armado de acero y fundida de escaleras y gradas. A su vez fueron suministradas las estructuras deportivas de microfutbol-baloncesto y volleyball. Por último, se realiza la extensión y compactación de recebo reciclado (base granular con recebo tipo C).

4.7 COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR SEDE B

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Calle 19 Sur # 6a Este - 22, en la localidad de San Cristóbal.

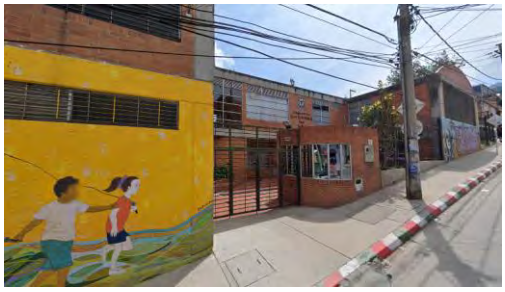
	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 8 Ubicación y fachada Colegio San Cristóbal Sur Sede B

- **Actividades ejecutadas**

Se ejecuta la aplicación de recubrimiento de pintura en los muros del primer piso, se lleva a cabo la instalación de una ventana en la fachada, se realiza la colocación de superficie de granito pulido, se procede con la instalación de persianas tipo shut y reja para refrigerios, se efectúa la aplicación de pintura en el cuarto con tarima, y se ejecuta la instalación de elementos de dilatación plástica en el pavimento.

4.8 COLEGIO PANTALEÓN GAITÁN PÉREZ

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 18 Este #13 sur 17, en la localidad de San Cristóbal.



Ubicación



Fachada

Ilustración 9 Ubicación y fachada Colegio Pantaleón Gaitán Pérez

- **Actividades ejecutadas**

Durante el proceso de mejoras en nuestras instalaciones educativas, se realizaron diversas intervenciones para fortalecer la infraestructura y garantizar un entorno funcional y seguro. Entre las actividades destacadas se encuentran la instalación de teja tipo sándwich en el bloque sur del bloque Alianza, acompañada de la colocación de una estructura metálica en el pasillo, seguida de la aplicación de un tratamiento anticorrosivo. Además, se llevó a cabo el levantamiento de muros en mampostería en la zona de baños, contribuyendo a la reorganización del espacio. La red sanitaria fue objeto de mejoras significativas, incluyendo la re-nivelación de las cajas de inspección existentes y la implementación de nuevas cajas para optimizar su funcionamiento. En paralelo, se realizó el desmonte de la estructura metálica y la cubierta en aulas auxiliares como parte de las labores de renovación.

Para fortalecer la estructura de los baños, se llevó a cabo un proceso de encofrado y fundición de vigas de coronamiento y columnetas. Asimismo, se procedió a la fundición de tapas para las cajas de inspección, ofreciendo una solución integral al sistema sanitario. En el bloque Alianza, se inició la instalación de la estructura de cubierta en el costado norte, extendiéndose hasta el parque central y las aulas auxiliares. Este proceso fue seguido por la aplicación de anticorrosivo y esmalte sobre la misma. Además, se realizó la fundición de una placa de contrapiso con un espesor de 12 cm para la pista, garantizando resistencia y durabilidad. También se llevaron a cabo trabajos de excavación y corte con pulidora para embeber tubería sanitaria en la zona de servicios. La implementación de vigas canales en mampostería con un pendiente superior al 15% contribuyó a una adecuada evacuación de aguas pluviales. Finalmente, se realizaron trabajos de pañeteado en los baños y en las vigas canales, proporcionando un acabado estético y protector.

4.9 COLEGIO TOMÁS RUEDA VARGAS SEDE B

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Calle 34 S # 7 A - 88, en la localidad de San Cristóbal.

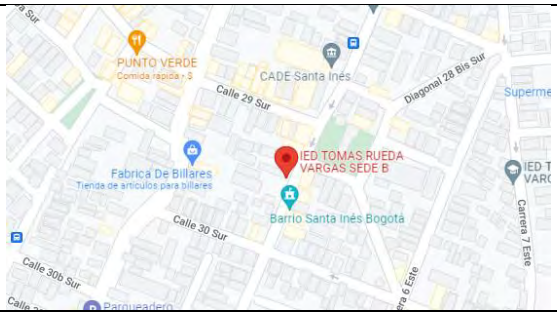
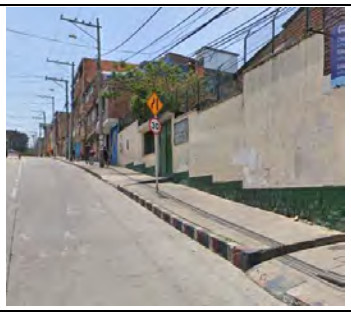
	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 10 Ubicación y fachada Colegio Tomás Rueda Vargas Sede B

- **Actividades ejecutadas**

Se realiza instalación de pintura en la estructura de cubierta en los bloques A y C, paso seguido se realiza la instalación de teja tipo ecoroof en los bloques A y C. En las aulas, fueron desmontados los paneles de los muros en superboard, paralelamente se realiza instalación de enchape de muros en los baños del bloque A y B.

Se funden las vigas y columnetas en los baños del bloque A, así también, fueron fundidos estos elementos en el aula 1.

Dentro del bloque A y bloque B, se realizan desmontes de encorozados y por último, se retiran los cielos rasos. A su vez, se instala la tubería de red hidráulica en los baños del bloque A.

4.10 COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ SEDE A

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 2 A # 29 A – 29 S, en la localidad de San Cristóbal.

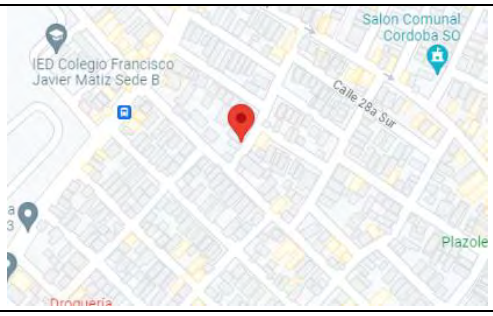
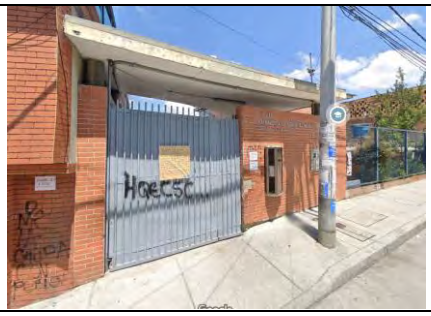
	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 11 Ubicación y fachada Colegio Francisco Javier Matiz Sede A

- **Actividades ejecutadas**

Se lleva a cabo el montaje de cubiertas en las aulas 1, 2 y 3, así como en la coordinación y en el aula SENA. Se procede con el desmonte de muros de mampostería en las mencionadas aulas, seguido de la aplicación de pañete en los muros de las aulas 1, 2, 3, coordinación y SENA. Se efectúa la instalación de paneles Superboard para la hermetización de áreas. Además, se ejecuta la colocación de una estructura metálica utilizando perfiles tipo C para las cubiertas en las aulas 1, 2, 3, coordinación y SENA. Se realiza la aplicación de pintura en dicha estructura metálica, y se llevan a cabo las instalaciones de mampostería y columnetas en la viga canal del costado occidental. Finalmente, se concluyen las actividades correspondientes al bloque 1, que incluyen trabajos de pintura y la instalación de redes eléctricas con sus respectivos dispositivos.

4.11 COLEGIO RAFAEL NÚÑEZ – SEDE ANDRÉS ROSILLO

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 9 # 18 - 74, en la localidad de San Cristóbal.

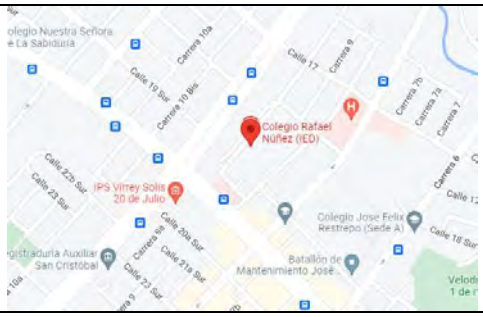
	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 12 Ubicación y fachada Colegio Rafael Núñez Sede B

- **Actividades ejecutadas**

Se realizan actividades de levantamiento de muros en mampostería en el área de coordinación, realizando la fundida de vigas de cimentación para el cuarto de servicios generales y mampostería en bloque prensado, así mismo, se realiza la instalación de estructura metálica de cubiertas.

En las aulas de prescolar, se culminan las actividades de instalación de estructura metálica, incluyendo templetes y se realiza la instalación de la teja tipo sándwich.

Se inicia con la instalación de la tubería hidrosanitaria en los baños de prescolar y en los baños de servicios generales, se realizaron excavaciones para la implementación de cajas de inspección en este espacio.

Para finalizar el periodo, se avanza con la pintura de la estructura de la cubierta en el bloque Alianza en el costado sur, a su vez, en la parte central, se realiza fundida de columnetas de acuerdo con el esquema de cubiertas entregado y aprobado.

En la zona de la cancha fue instalado recebo en la zona de la cancha y se procedieron a compactar las capas con canguro y fueron verificadas las densidades.

4.12 COLEGIO JOSÉ FÉLIX RESTREPO SEDE A

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la carrera 6 # 18 sur – 20, en la localidad de San Cristóbal.

	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 13 Ubicación y fachada Colegio José Félix Restrepo Sede A

- **Actividades ejecutadas**

Se realiza la instalación de estructura metálica para cubierta, incluyendo columnetas y correas, seguido a esto se realiza el retiro de encorozado en el aula 207, dentro de este espacio se realiza instalación de columnetas y correas.

Es de mencionar que, por temas de votaciones en la institución educativa, fue necesario realizar cerramientos con polisombra adicionales con el fin de delimitar aún más las zonas que se encuentran en intervención.

4.13 COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA SEDE B

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la calle 38 A sur # 2N - 09, en la localidad de San Cristóbal.

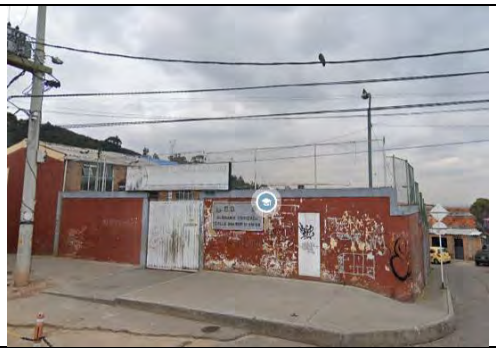
	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 14 Ubicación y fachada Colegio Alemania Unificada Sede B

- **Actividades ejecutadas**

Se realizan actividades relacionadas con el retiro de aparatos sanitarios y enchape en baños infantiles, así mismo fue retirada la mampostería de divisiones de baterías sanitarias, una vez retirado el enchape de piso, se realizo el retiro de alistado de piso y se excavaron zanjas para la instalación de la tubería hidrosanitaria. Se realiza la caja de inspección en este espacio y, por último, se realiza el pañete de muros. En el acceso a este espacio, se levantaron muros en mampostería estructural, implementando dovelas ancladas a piso y techo.

En el cuarto de basuras, se realiza el retiro de enchape de muros y se procedió a pañetar los muros divisorios, a su vez, se realiza la fundida de alistado de pisos.

4.14 COLEGIO ENTRE NUBES SEDE B

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la calle 48 sur #2 Este - 27, en la localidad de San Cristóbal.

	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 15 – Ubicación y fachada Colegio Entre Nubes Sede B ubicacion y fachada colegio Entre Nubes Sede B

- **Actividades ejecutadas**

Se da inicio con la ejecución de actividades en el frente de obra, donde se realiza el desmonte de la cubierta en el cuarto de deportes y simultáneamente se realiza el desmonte de la estructura en madera y puerta de este espacio.

4.15 COLEGIO EL RODEO SEDE B

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Diagonal 44 sur # 6 Este - 30, en la localidad de San Cristóbal.

	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 16 ubicación y fachada Colegio El Rodeo Sede B

- **Actividades ejecutadas**


Se da inicio con la ejecución de actividades en el frente de obra, donde se realiza el desmonte de muros con su respectivo enchape en los baños de niños de primera infancia, así como los muros con enchape en los pasillos que acceden a este espacio, se realizó el desmonte de los muros divisorios en la sala de profesores y en el baño de profesores. Por otro lado, se realiza los desmontes de puertas y espejos en estos espacios.

Dentro del cuarto de refrigerios se realiza el desmonte de ventanas, así como el pañete y alistado de pisos. Y, por último, se realiza el retiro de pisos en mal estado en los baños de niños de primera infancia.

4.16 COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL SEDE C

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Calle 44 sur #9-23 Este, en la localidad de San Cristóbal.

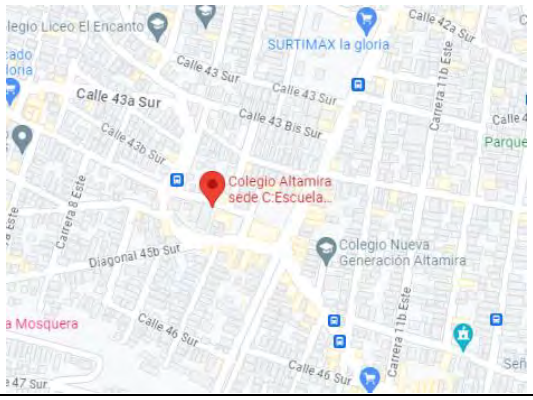



Ubicación	Fachada

Ilustración 17 Ubicación y fachada Colegio Altamira sede C

- **Actividades ejecutadas**

Durante el periodo de corte, del 12 de octubre al 12 de noviembre, se llevaron a cabo diversas actividades en la sede C del colegio Altamira Sur Oriental. Estas incluyeron el desmonte de la placa de contrapiso, el retiro de la placa maciza, así como el retiro y alistado del piso. También se realizaron trabajos de desmonte en muros de mampostería con acabados, así como el retiro de enchapes en muros.

Adicionalmente, se llevaron a cabo labores de desmonte, que abarcaron la retirada de puertas existentes, la desinstalación de aparatos sanitarios y equipos, como lavamanos y sanitarios, así como la eliminación de tuberías hidrosanitarias existentes. Además, se procedió al desmonte de lámparas y espejos en las instalaciones de la sede C. Estas acciones contribuyeron significativamente al avance y progreso de las labores programadas durante este período específico.

4.17 COLEGIO VEINTE DE JULIO

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 7 # 24-01 Sur, en la localidad de San Cristóbal.

	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 18 Ubicación y fachada Colegio Veinte de Julio

- **Actividades ejecutadas**

Durante el proceso de mejora y adecuación de nuestras instalaciones, se llevaron a cabo diversas actividades para optimizar los espacios y garantizar un entorno seguro y funcional. Estas incluyeron:

Se realizó el cerramiento con polisombra en las aulas 1, 2 y en el cuarto de refrigerios, proporcionando una solución efectiva para controlar la luminosidad y mejorar el ambiente interior. Además, se llevó a cabo el desmonte de rejas con cimentación y mampostería, redefiniendo las áreas y permitiendo una renovación estructural en los espacios designados. En el proceso de excavación manual, se trabajó en la preparación y adecuación del terreno, asegurando una base sólida para futuras intervenciones. La poda de raíces se llevó a cabo para mantener la salud y estabilidad de la vegetación circundante, contribuyendo al cuidado del entorno natural. Asimismo, se procedió al desmonte de juegos infantiles, permitiendo una reorganización y posible renovación de estas áreas recreativas.

En la zona de la huerta, se ejecutó el desmonte de estructura metálica y cubierta, marcando el inicio de un proceso de revitalización y adaptación de ese espacio específico.

Es de mencionar que, no han sido entregados los 5 salones por parte de la institución educativa, lo cual afecta

4.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – EMERGENCIAS

4.18.1 COLEGIO LOS ALPES SEDE A – ADECUACIÓN DE CUBIERTA Y LEVANTAMIENTO AULAS PREFABRICADAS

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Carrera 11 Este # 33A- 62, en la localidad de San Cristóbal.

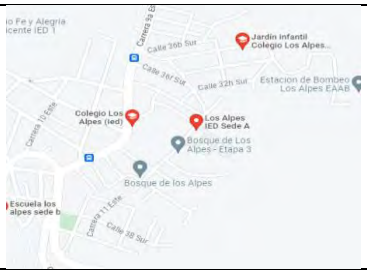
	
Ubicación	**Fachada**

Ilustración 19 - Ubicación y fachada Colegio Los Alpes Sede A

- **Actividades ejecutadas**

Se presenta reporte por parte de la SED en la institución educativa donde un salón el cual cuenta con varias aguas en su cubierta presenta filtraciones en esta, por lo tanto, se presentó el esquema de cubiertas por parte de PA Colombia y una vez se contó con el aval de la interventoría, se dio inicio con el desmonte de cubierta y estructura metálica existente, una vez se culminan los desmontes de estos elementos, se procede a realizar la instalación de la estructura metálica de cubierta. Así mismo, se da inicio con la instalación de la perfilería metálica para muros y cubiertas en las nuevas aulas a implementar junto a la cancha.

4.18.2 COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO SEDE B – ADECUACIÓN DE CUBIERTA.

- **Localización**

Esta institución educativa se encuentra localizada en la Transversal 6 Este # 33 – 30 sur, en la localidad de San Cristóbal.

Ubicación	Fachada

Ilustración 19 Ubicación y fachada Colegio Jose Joaquín Castro Sede B

- **Actividades ejecutadas**

Se presenta el reporte por parte de la SED en el colegio donde se pudo identificar que las cerchas que soportaban la cubierta se encontraban pandeadas, atendiendo a la emergencia se procedió a retirar la cubierta y la estructura en mal estado, seguido a esto se realiza la instalación de una nueva estructura debidamente pintada con anticorrosivo y esmalte con los colores seleccionados por parte de la entidad y se procede a realizar la instalación de teja tipo ecoroof y caballetes.

5. INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA.

La gestión ambiental de la presente obra se rige por las indicaciones que da la Secretaría de Educación del Distrito, con el fin de cumplir con todas sus necesidades y así ser ambientalmente responsable de acuerdo con la actividad que se lleva a cabo.

Dando alcance a las actividades desarrolladas por PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, durante el periodo comprendido desde el 12 de septiembre al 11 de octubre del 2023, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales generados por la ejecución de la obra, se presentan a continuación las actividades realizadas en marco de los programas establecidos en el PMA alineado al PIGA de la entidad:

5.1 PROGRAMA DE TRAMITES Y/O PERMISOS AMBIENTALES

PROGRAMA DE TRAMITES Y/O PERMISOS AMBIENTALES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Durante el periodo del presente informe se adelantaron las siguientes actividades

Se realizan acciones correctivas del oficio M202211091COLEGIOSSED_142

- **Radicado de comunicados entre contratista e interventoría** (Ver anexo 2)

RELACION DE COMUNICADOS

No	No RADICADO	ASUNTO
1	M202211091COLEGIOSSED_163	SOLICITUD REPORTE TRIMESTRAL
2	M202211091COLEGIOSSED_169	Revisión de hoja de vida asesor ambiental - Contrato de obra
3	M202211091COLEGIOSSED_171	OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE DOCUMENTACION AMBIENTAL
4	M202211091COLEGIOSSED_173	Aprobación de hoja de vida asesor ambiental - contrato de obra
5	M202211091COLEGIOSSED_175	OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL
6	SED-G7-PA-172	RESPUESTA OFICIO M202211091COLEGIOSSED_132

OBSERVACIONES

Comunicaciones generadas

Durante el periodo del presente informe se generaron 4 radicados desde el área ambiental. (*Ver anexo 2).*

La interventoría remitió oficios con observaciones de los frentes de obra por falta de separación de residuos en la fuente, acopios en mal estado, orden y aseo. Y por otro lado remitió la aprobación de vehículos de carga y de un gestor ambiental
Se presenta a continuación la gestión realizada y el oficio de respuesta se relacionará en el siguiente informe.

Se realizan acciones correctivas del oficio M202211091COLEGIOSSED_142

Observación 1 se realiza retiro de RCD de las zonas verdes, se realiza jornadas de orden y aseo

ANTES	DESPUES









Observación 2 se realiza retiro de RCD y jornada de aseo entre nubes sede D









Observación 3 se realiza jornada de orden y aseo, Altamira









Observación 4 se realiza jornada de orden, aseo y separación de residuos Francisco Javier Matiz





Se realizan acciones correctivas del oficio M202211091COLEGIOSSED_147

Observación 1 Se realiza retiro de RCD y limpieza del área Tomas rueda sede A









Observación 2 se realiza retiro de RCD del frente Rafael Núñez,





Observación 3

Se realizarán las medias de manejo ambiental para las actividades de obra el Frente José Joaquín Castro en la segunda semana del mes de diciembre.

Observación 4 se hace retiro de RCD y limpieza del frente





Observación 5
Se envía respuesta de los oficios 132 y 142 el día 14 de noviembre bajo el oficio de respuesta SED-G7-PA-172 y SED-G7-PA-173 respectivamente.

INDICADOR

CANTIDAD DE COMUNICADOS = # comunicados generados en periodo

CANTIDAD DE COMUNICADOS = 6

5.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PUNTOS ECOLOGICOS

Durante el periodo del presente informe se contó con 14 puntos ecológicos instalados en los diferentes frentes de obra de los cuales 3 es propiedad del colegio y los 11 restantes fueron suministrados por la compañía.

FRENTE DE OBRA	PUNTO ECOLÓGICO INSTALADO	PUNTO ECOLÓGICO PENDIENTE
FRANCISCO JAVIER MATIZ	X	
RAFAEL NUÑEZ		X
JOSE MARIA CARBONELL	X	
ENTRE NUBES SEDE A	YA SE ENTREGO COLEGIO	
ENTRE NUBES SEDE B		X
ENTRE NUBES SEDE D	X	
VEINTE DE JULIO	X	
ALEMANIA UNIFICADA SEDE B	X	
JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE A	X	
JOSE JOAQUIN CASTRO SEDE B		X
MORALBA SEDE C	X	
MORALBA SEDE B		X
JOSE FELIX SEDE A	X	
JOSE FELIX SEDE C	X	
TOMAS RUEDA A	X	
TOMAS RUEDA B	X	
SAN CRISTOBAL B	X	
PANTALEON	X	
ALTAMIRA C		X
EL RODEO B	X	

Se está gestionando la compra de 6 puntos ecológicos para completar los frentes que actualmente tenemos en ejecución dado que se abrieron más frentes de obra como lo son el colegio 20 de julio, el colegio entre nubes -B, colegio Altamira C y el colegio el Rodeo.


Se realiza capacitaciones y charlas continuas a los trabajadores sobre la importancia de la separación en la fuente con ejemplos en sitio para su correcta separación como se evidencia en el programa de sensibilización ambiental.

UNIDADES SANITARIAS

Durante el periodo de este informe se realiza el aseo y mantenimiento de la unidad sanitaria ubicadas en San Cristóbal – Sede B por la empresa SEPTICLEAN - VEOLIA. Una vez por semana se realiza el aseo teniendo en cuenta que la cantidad de trabajadores es de aproximadamente 3, como respaldo de lo mencionado se anexa los soportes. Ver anexo 11

Adicional se anexa la certificación BOG-01432 de disposición del mes de octubre de la empresa que presta el servicio SEPTICLEAN BY VEOLIA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

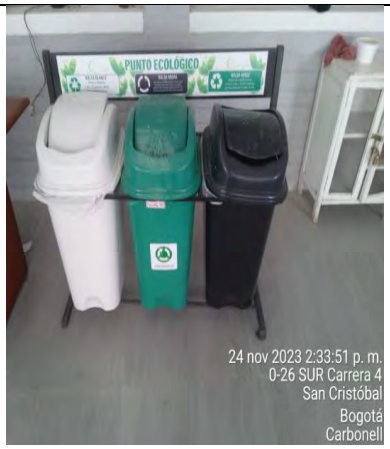

C. Jose María Carbonell



C.Moralba Sur Oriental – Sede C



C. Jose Joaquín Castro - A




Tomas Rueda sede B



Jose Félix sede C



C. Pantaleon

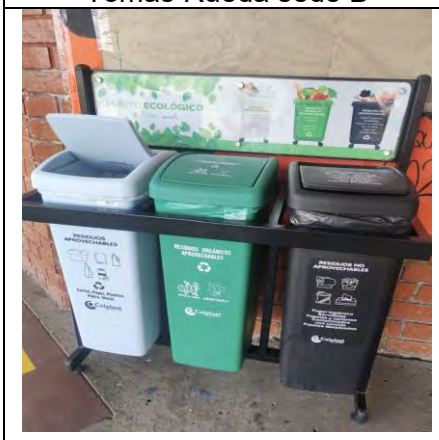

C. Jose Joaquin Castro - B



C.Francisco Javier Matiz



C. Entre Nubes – Sede D





C. Los Alpes

Ilustración 21 puntos ecológicos en los frentes de obra


Se realizan actividades de orden y aseo en los frentes de obra intervenidos una vez a la semana.

.

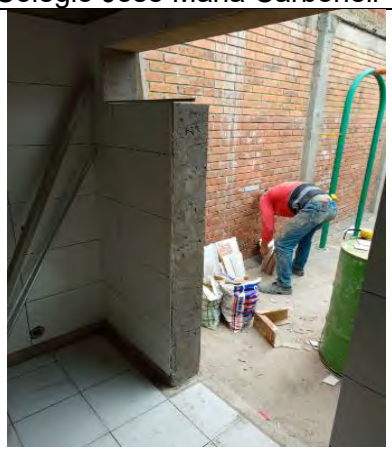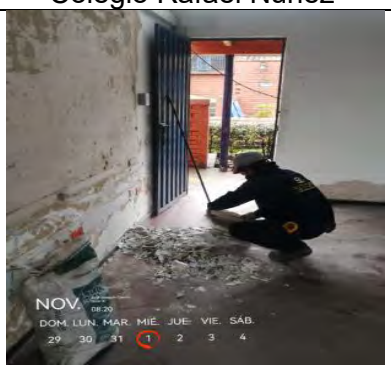
 Colegio Jose Maria Carbonell	 Colegio Tomas Rueda B
 Colegio Rafael Nuñez B	 Colegio Rafael Nuñez
 Colegio Jose Joaquin Castro	 Colegio Jose Joaquin Castro sede A



Colegio Pantaleon

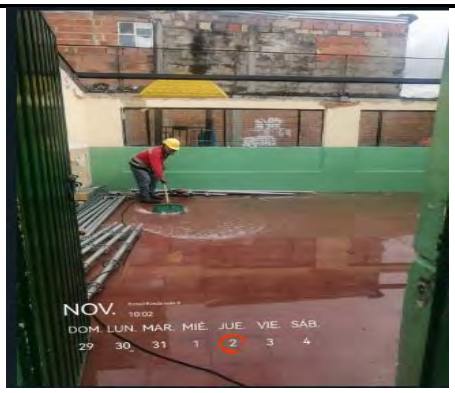

Colegio Tomas Rueda – Sede B



C. San Cristóbal – Sede B



Colegio Alpes

Ilustración 22 Jornadas de orden y aseo

OBSEVACIONES

Durante el periodo del presente informe se contó con 12 puntos ecológicos en los frentes de obra Teniendo en cuenta que se cuenta que se han ido entregando colegios se hace el trasteo de estos puntos ecológicos a otros frentes de obra que están en ejecución de igual manera se hace la adquisición de dos puntos ecológicos más para así mejorar el indicador.

Se reitera el proceso de compra que se viene realizando en la empresa para la compra de los puntos ecológicos dado que aún faltan por poner en otros frentes de obra, se tiene programado tener instalados todos los puntos ecológicos antes de finalizar el año.

DATOS DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN CRISTOBAL – SEDE B

MES	# ASEOS	RESIDUOS RETIRADOS
SEPTIEMBRE	9	178.34 gal

INDICADOR
Puntos Ecológicos: $\frac{\#\ de\ puntos\ ecologicos\ instalados}{\#\ de\ frentres\ activos}\ x\ 100$ $\frac{14}{20}\ x\ 100$**= 70%**
Jornadas de orden y aseo: *# de jornadas de aseo* **=** 16 Jornadas de aseo

5.3PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo del presente informe, se adelantaron actividades programadas en 20 frentes de obra ejecutando las siguientes actividades generales que generaron RCD:

- Cerramiento y señalización
- Demolición de muros, mesones, enchapes de paredes y pisos.
- Desmonte e instalación de cubierta
- Trasiego de materiales
- Enchape, estuco y pañete

Como actividades del programa se realizó durante el periodo del presente informe:

- Señalización de acopios de RCD
- Revisión de documentos de vehículos transportadores de residuos
- Certificación de los retiros realizados con sus respectivos tratamientos según corresponda
- Sensibilización ambiental en reciclaje y disposición de residuos (VER ANEXO 6)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



C. Altamira



C. Jose Javier Matiz



C. Pantaleon




C. Moralba



C. Jose Maria Carbonell



C. Tomas rueda B

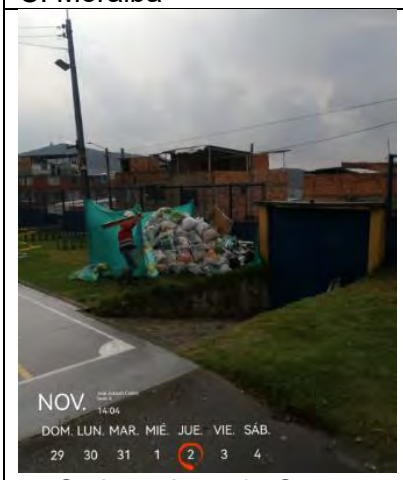

C. Jose Joaquin Castro

Ilustración 23 Acopios señalizados




C. Tomas Rueda – Sede B



C. Jose Javier Matiz



C. Pantaleon

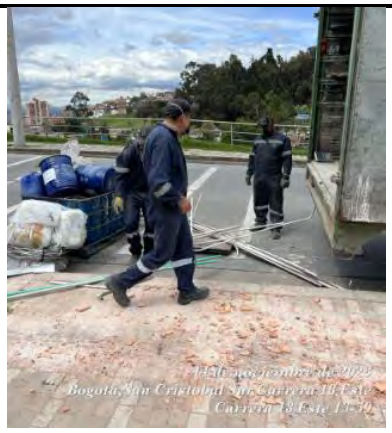

C. Pantaleon

lustración 24 Transporte de residuos



C. Jose Joaquin sede A



C. Tomas Rueda A

Ilustración 25 Capacitaciones de separación de residuos

OBSEVACIONES

AVANCE DE REPORTE TRIMESTRAL

El proyecto cuenta con PIN ambiental No 22476 bajo el cual se certifica la disposición y/o aprovechamiento de los residuos generados durante las intervenciones; las certificaciones y reportes de manejo de RCD se generan mes vencido, por lo anterior en el presente informe se relacionan los certificados de septiembre con relación a lo reportado en el informe anterior (Ver Anexo 1 PMRCD).

CAPACITACIONES

Se adelantaron capacitaciones sobre la separación de residuos de construcción y convencionales como se evidencia en el programa de Sensibilización ambiental.

CONTROL DE RESIDUOS RETIRADOS

Con el fin de llevar el control de los RCD en cada uno de los frentes de obra se cuenta con una planilla de registro de retiro de RCD en la cual se relacionan las cantidades retiradas y especificación del tipo de residuo. *Ver anexo 3*. Se debe tener en cuenta que se vienen realizando actividades de aprovechamiento de RCD en el colegio Pantaleon Gaitan pero a la fecha del presente informe no se han culminado estas actividades, el reporte de esta actividad será presentado en el siguiente informe.
Para el mes de octubre, se retiró residuos de los frentes de trabajo en las siguientes cantidades:

COLEGIO	CANTIDAD	TIPO DE RESIDUO	GESTOR
TOMAS RUEDA B	285kg 53 kg 14.40kg 35.80 kg 1573 kg 61 kg 1kg 165kg 2312 kg 230 kg 680 kg 410 kg	Super Board PVC Carcasas plásticas Madera Teja Asbesto Solidos Contaminados Manto Asfaltico Chatarra Teja Asbesto Chatarra Drywall Madera	D3A D3A D3A D3A D3A D3A D3A D3A Green World Green World Green World
JOSE MARIA CARBONEL	20 kg 21 kg 441 kg 7 m3	Solidos Contaminados Carcasas Plásticas Vidrio Petreo	D3A D3A D3A
JOSE JOAQUIN CASTRO – A	1.357 7 m3	Teja Asbesto Pétreo	D3A Cemex
PANTALEON	1241 Kg	Piso Caucho	D3A

	462 Kg 58 Kg 2478 Kg 7 m3	Teja Asbesto Teja Asbesto Teja Asbesto Petreo	D3A D3A D3A
ALEMANIA UNIFICADA B	50 Kg 24 Kg	Chatarra Madera	Green World
ENTRE NUBES - D	0	N/A	N/A
MORALBA	0	N/A	N/A
JOSE FELIX C	3.8Kg 65 Kg 150 Kg 85 Kg 270 Kg 7 M3	Carcasas Plásticas Super Board Chatarra Madera Petreo Petreo	 D3A D3A Green World Green World
ENTRE NUBES - A	160 Kg 89 Kg 7 m3	Madera Solidos contaminados Petreo	D3A D3A
RAFAEL NUÑEZ	0	N/A	
FRANCISCO JAVIER MATIZ	1561 kg 2480 Kg 7 m3	Teja Asbesto Teja Asbesto Petreo	D3A
JOSE JOAQUIN CASTRO - B	2092kg 130 kg 7m3	Teja Asbesto Chatarra Petre	D3A Green World
LOS ALPES	674kg 15 Kg 22 Kg 10kg	Teja Asbesto Chatarra Petreo Pvc	D3A Green World Green World Green World
MANUELITA SAENZ	0	N/A	N/A

Se reportan 41 unidades sanitarias o luminarias desmontadas

FRENTE	SANITARIOS DESMONTADOS	LUMINARIAS DESMONTADAS
Colegio el Rodeo	17	0
Colegio Altamira Sede A	24	0

Los residuos generados durante el periodo son entregados para el manejo y/o disposición a los gestores aprobados por la interventoría previamente. A la fecha contamos con los siguientes gestores

aprobados: *Ver anexo 4*

GESTOR AMBIENTAL	AAC
CHATARRERIA AMBIENTAL	Secretaria Distrital de Ambiente
VEOLIA	CAR
D3A	CAR
MAQUINAS AMARILLAS	Secretaria Distrital de Ambiente
CEMEX	Secretaria Distrital de Ambiente
EKOBOJACA	CAR
GRECO	Secretaria Distrital de Ambiente
CENTRO DE GESTIÓN SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.	CAR
GREEN WORLD	Secretaria Distrital de Ambiente
CONTROL AMBIENTAL	CAR
TRACOL	CAR

INDICADOR

Socializaciones $= \frac{\#\ de\ capacitaciones, charlas\ programadas\ en\ el\ periodo}{\#\ de\ capacitaciones, charlas\ programadas\ en\ el\ periodo} x\ 100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$

5.4 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se ha adelantado el seguimiento a los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y los cuales se enfocan en el PIGA de la entidad. Con base en lo anterior se llevó las siguientes capacitaciones conforme el cronograma de actividades:(Ver anexo 5)

- Capacitación Productos Químicos
- Capacitación en toma de Conciencia en el uso eficiente de agua y energía
- Capacitación en disposición de residuos
- Capacitación reciclaje, clasificación y disposición de residuos

El simulacro ambiental se presentará en el siguiente informe
En el anexo 6 se adjuntan las listas de asistencia a las capacitaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



C. JOSE MARIA CARBONELL



C. Entre Nubes – Sede D

Ilustración 26 Capacitaciones Ambientales

OBSEVACIONES

En el periodo del presente informe se adelantaron actividades de sensibilización ambiental en los frentes de obra que se evidencian en la ilustración 25 en los cuales se realizaron las socializaciones programadas en el cronograma ambiental (anexo 5) Como evidencia de las actividades desarrolladas, se anexan las listas de asistencia (anexo 6)

INDICADOR

SOCIALIZACIONES $= \frac{\#\ de\ capacitaciones, charlas\ programadas\ en\ el\ periodo}{\#\ de\ capacitaciones, charlas\ programadas\ en\ el\ periodo} x\ 100$ $\frac{4}{5} x 100 = 80\%$

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS


Durante el periodo del presente informe, se adelantan actividades de obra que demandan diferentes tipos de materiales tales como: arena, cemento, base, enchape, pintura, estuco, teja, entre otras

.

Para lo anterior se adecuaron espacios temporales para el almacenamiento de estos, tomando las siguientes recomendaciones:

- Señalización de acopio de materiales
- Verificación de acopios para que no se presente obstrucción del flujo personal y vehicular.
- Protección de acopio de materiales (arena de rio, cemento, base)

Por otro lado se generó la compra de material pétreo en esta cantera con licencia expedida por la agencia nacional de minería de la cual se ha prestado el servicio de compra de material pétreo se anexan soportes de adquisición de material (anexo 1). Previamente aprobadas por la interventoría Esta es:

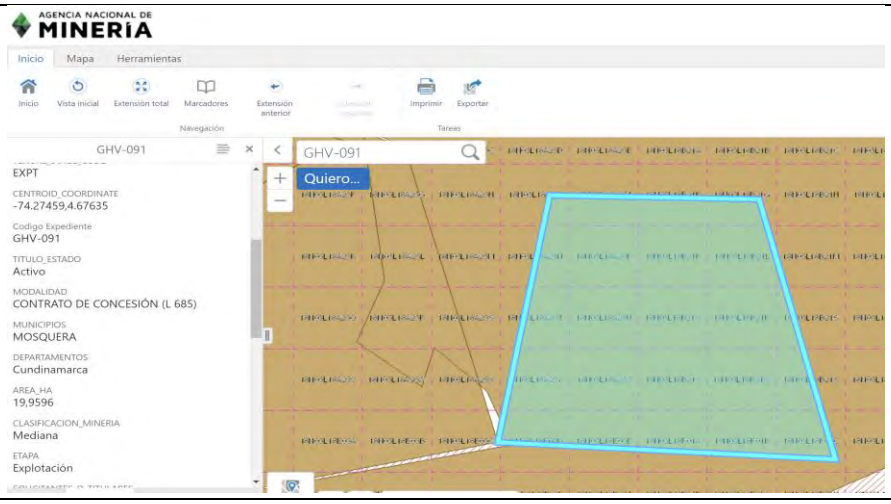INGENIEROS GF TITULO N° GHV-091 ESTADO: ACTIVO ETAPA: EXPLOTACIÓN MINERAL: GRAVAS	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



C. Jose Joaquín Castro



C. Altamira

 *C. Moralba*	 *C. Pantaleon*

OBSEVACIONES

Es importante mencionar que como medida inmediata se realizó la impresión de señalización para los acopios de materiales de los frentes de obra. Lo anterior teniendo en cuenta las actividades que se van a realizar y la cantidad de material necesario a usar para adelantar las obras civiles.

Adicionalmente el material pétreo es cubierto con plástico para protegerlo de precipitaciones y corrientes de vientos

INDICADOR

ACOPIOS DE MATERIALES $= \frac{\#\ Acopios\ señalizados}{\#\ de\ acopios\ actuales}\ x\ 100$ $\frac{6}{14} x100 = 42\%$

Teniendo en cuenta el porcentaje de este indicador, el periodo anterior se realizó una reunión con el área técnica y HSEQ en la cual se establecieron unos compromisos entre los cuales están:

- Verificación de la señalización del punto de acopios para materiales
- Definir puntos de acopio con anterioridad
- Informar irregularidades con el punto de acopio

Se ve un avance en la gestión de los compromisos, pero se seguirán adelantando acciones para mejorar el indicador.

5.6 PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA

PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo del presente informe se adelantó una socialización de los programas de manejo ambiental contemplados en el PMA del proyecto, entre ellos los de uso y ahorro eficiente del agua y la energía. Ver anexo 6 de listas de asistencia

Además, se realizó el inventario de los sumideros afectados por el proyecto para definir las medidas de manejo y protecciones requeridas por el inicio de actividades. Ver anexo 8

Por último, se informa que durante el periodo del presente informe se están adelantando obras para la instalación de unidades sanitarias en el colegio entre nubes sede D hasta el momento se han instalado 10 unidades sanitarias entre ellas 9 normales y 1 de movilidad reducida.

DATOS	SANITARIOS	LUMINARIAS
N/A	10	N/A

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 27 Sumidero de Moralba



Ilustración 28 Sumideros Jose Javier Matiz

OBSEVACIONES

Los sumideros inventariados fueron protegidos con malla azul y/o poli sombra para evitar que se afecten por los residuos generados por la obra, adicionalmente permitirá en caso de que se requiera una fácil limpieza de estos.

Para el sumidero del colegio José María Carbonell no se realizará la protección del sumidero externo teniendo en cuenta que su desgaste es contante por el alto flujo vehicular.
Como medidas frente al tema se tendrá en cuenta la salida de los vehículos de carga carpado y cabe aclarar que por culminación de actividades no se generará una mayor cantidad de residuos y la distancia al sumidero no genera riesgo de afectación

Se llevo a cabo la socialización y dinámica para concientizar a los colaboradores con el uso y ahorro de agua y energía. Entre el tema socializado se revisaron los tips de ahorro para tener en cuenta el área de trabajo y en los hogares.

Por otro lado, tras el inventario de sumideros realizados, se tiene el siguiente resumen: Ver anexo 9

FRENTE	SUMIDEROS IDENTIFICADOS
COLEGIO ENTRE NUBES – SEDE D	1
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA – SEDE A	0
COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL SEDE – A	2
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - SEDE A	0
COLEGIO SAN CRISTOBAL- SEDE A	0
COLEGIO MORALBA – SEDE C	1
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO – SEDE C	0
COLEGIO TOMAS RUEDA – SEDE A	1
COLEGIO ALTAMIRA – SEDE B	0
COLEGIO ENTRE NUBES – SEDE A	1
COLEGIO SAN CRISTOBAL – SEDE B	1
JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	0
COLEGIO JOSE JAVIER MATIZ	1


Conforme a lo anterior las obras desarrolladas generan afectación sobre 7 sumideros, sobre los cuales de desarrollaran de manera recurrente limpieza y mantenimiento de los sistemas de protección.




C. Moralba


Registro de consumo de Agua y Energía

Se realiza el seguimiento al consumo de agua y energía en cada frente de trabajo.
Como es de conocimiento entre las partes, existen frentes de obra donde no es posible verificar el consumo ya sea de energía o agua potable, por lo tanto, una vez se tenga claro el manejo con la interventoría y la entidad, con relación al método de medición de estos servicios se registrará en el informe de acuerdo con lo que será pactado entre las partes. Ver anexo 9

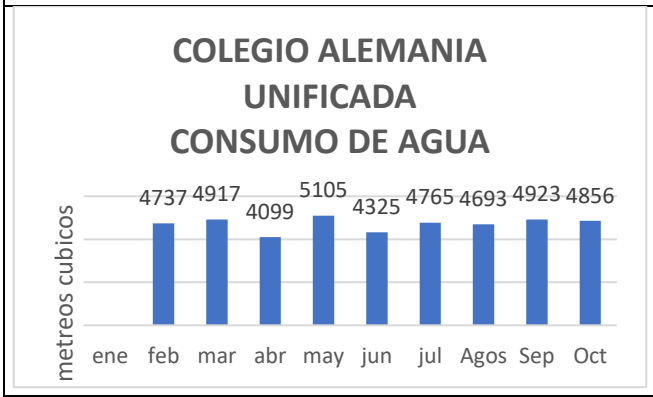
CONSUMO DE AGUA	CONSUMO DE ENERGIA
	**NO ES POSIBLE VER EL MEDIDOR**


Como se puede evidenciar en la grafica, se presenta un aumento de consumo de agua en el C. Alemania Unificada – Sede A para el mes julio. Esto se debe al regreso de los estudiantes y las actividades ejecutadas en el periodo como el inicio de la intervencion del bloque 4 y 7.

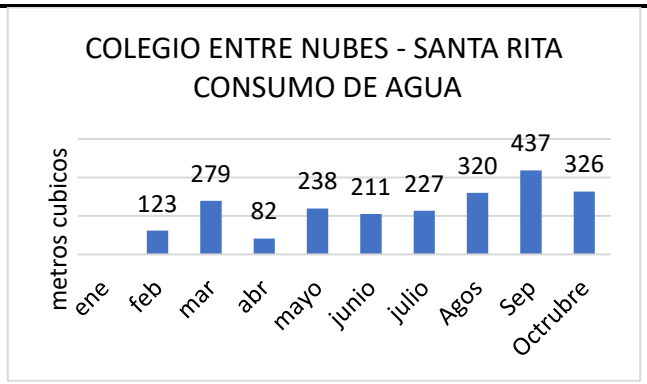

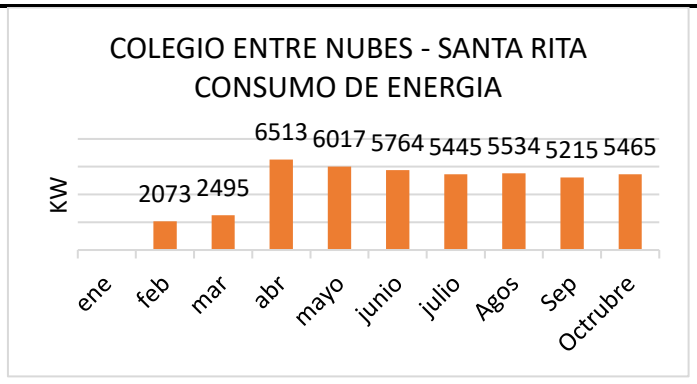

Con el seguimiento a los consumos registrados mensualmente se puede evidenciar una disminución en el consumo de agua y energía, esto se debe a que la obra se encuentra en etapa de pintura, remate de enchape y excavaciones manuales. Por cuanto son actividades que no requieren un mayor consumo de estos servicios.

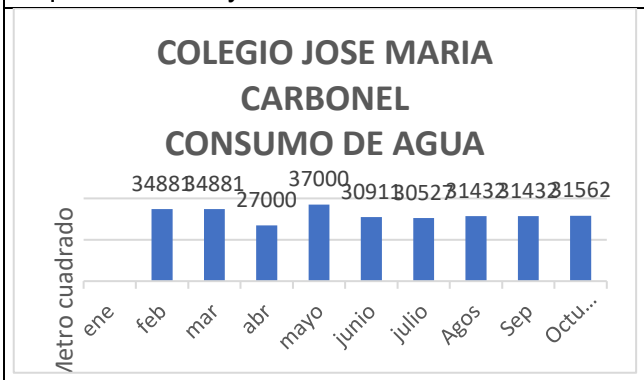

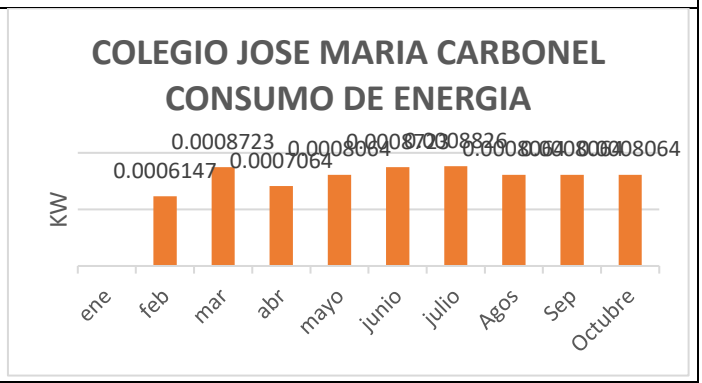

Una ves revisados los consumos de agua y energia del colegio carbonell se puede evidenciar una disminucion que se debe a:

- Las actividades realizadas no requieren un consumo representativo de los servicios mencionados
- Se realiza la recoleccion de agua lluvia en canecas ubicadas en las bajantes de la institución. Este recurso es utilizado para limpieza de herramientas y en ocaciones para los servicios en el baño.






Con el seguimiento de los consumos en este colegio se puede evidenciar un aumento en el consumo, aunque la variación no es representativa. Es importante mencionar que a pesar de que la mayoría de los colegios entro en etapa de receso estudiantil. las actividades de obra se aumentaron para conseguir un avance significativo en la obra.


NO ES POSIBLE VER EL MEDIDOR

El consumo fue tomado hasta el mes de julio teniendo en cuenta que no se adelantan actividades en el frente de obra

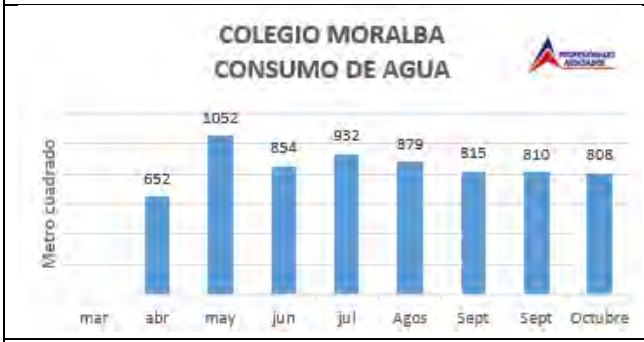

NO ES POSIBLE VER EL MEDIDOR


Como se puede evidenciar en la grafica, se presenta un aumento de consumo de agua para el mes julio. Esto se debe a las actividades ejecutadas en el periodo fueron demolicion y retiro de cubierta por cuanto no demandaba consumo de electricidad.

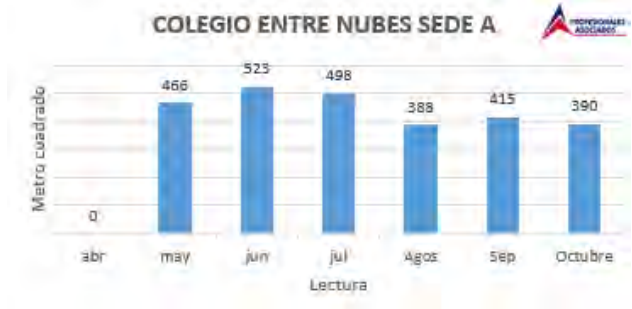


NO ES POSIBLE VER EL MEDIDOR


Se evidencia un aumento en el consumo de agua a pesar de que la mayoría de los colegios entro en regreso de estudiantil. las actividades de obra se aumentaron para conseguir un avance significativo

en la obra.

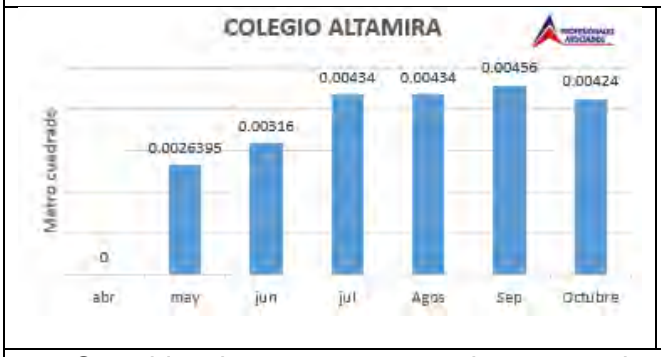

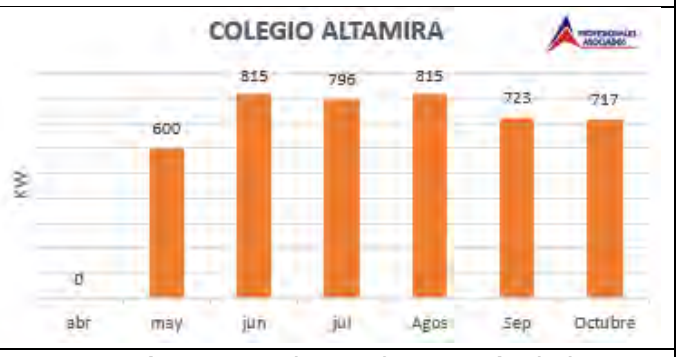


Se evidencia un aumento en el consumo de agua y energía a pesar de que la mayoría de los colegios entro en regreso estudiantil. las actividades de obra se aumentaron para conseguir un avance significativo en la obra

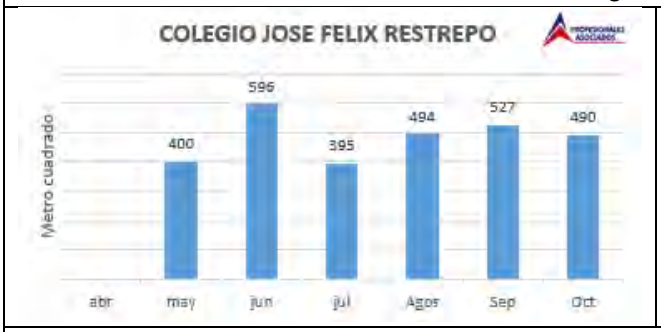

NO ES POSIBLE VER EL MEDIDOR

Se evidencia un aumento en el consumo de agua a pesar de que la mayoría de los colegios entro en regreso estudiantil. las actividades de obra se aumentaron para conseguir un avance significativo en la obra

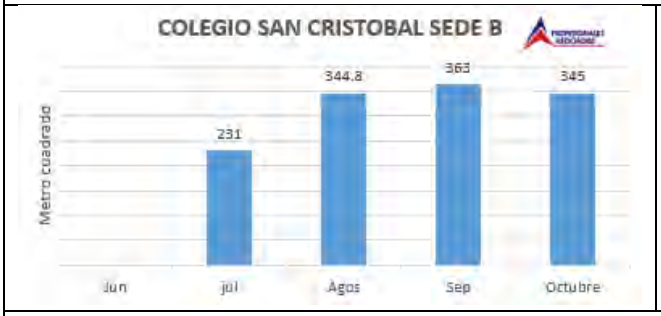

NO ES POSIBLE VER EL MEDIDOR

Se evidencia un aumento durante el mes de ejecucion de obra en el frente de obra, de esta manera se ira reportando y analizando los consumos reportados por el medidor

INDICADOR

AHORRADORES DE AGUA INSTALADOS = # Cantidad de sistemas ahorradores de agua = 0 unidades

AHORRADORES DE ENERGÍA INSTALADOS = # Cantidad de sistemas ahorradores de energía= 0 unidades

SUMIDEROS PROTEGIDOS = $\frac{\#\ de\ sumideros\ protegidos}{\#\ de\ sumideros\ inventariados}\ x\ 100$ $\frac{9}{10}x100 = 90\%$

SOCIALIZACIONES = $\frac{\#\ de\ capacitaciones,charlas\ programadas\ en\ el\ periodo}{\#\ de\ capacitaciones,charlas\ programadas\ en\ el\ periodo}\ x\ 100$ $\frac{1}{1}x100 = 100\%$

Este indicador se expresa con la sumatoria de los consumos por frente relacionadas en el anexo 9. Allí se evidencian las mediciones y consumos de agua

M3 de agua consumido = $\mathrm{m3\ consumido\ en\ el\ mes\ 2} - \mathrm{m3\ consumido\ en\ el\ mes\ 1}$ = -249 m3

5.7 PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

PROGRAMA DE MANEJO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
El proyecto sigue realizando actividades de desmonte y demoliciones en algunos frentes de obra, por lo cual es necesario el uso de vehículos previamente aprobados por la interventoría para el retiro de RCD.(residuos Pétreos, no pétreos) Por lo anterior se toman como medidas: - Control documental de los vehículos y/o maquinaria del proyecto - Control en las obras para evitar actividades de lavado y manteniendo. - Se verifica previamente que los vehículos de carga tipo volqueta cuenten con carpa para la protección de la carga.
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 29 Vehículos recogiendo RCD en los frentes de obra

OBSEVACIONES

A la fecha se cuenta con 16 vehículos autorizados por la interventoría.

Los documentos revisados desde la parte ambiental para cada vehículo son:

- Tarjeta de propiedad SOAT
- Revisión Tecno mecánica
- Número de PIN verificado en la lista de vehículos autorizada por la secretaria de Ambiente

En el anexo 11 se adjuntan los documentos de los vehículos.

PLACA	PIN	SOAT		RTM	
		VENCIMIENTO	No	No	VENCIMIENTO
GMJ 618	126	2/19/2024	85125875	164759770	2/17/2024
SZK769	8767	5/11/2024	15651500522260	164931249	2/26/2024
SRM 395	3439	1/23/2024	3308005322725000	162016464	10/11/2023
SZQ301	9580	2/2/2024	84554902600268700	164476052	2/4/2024
LQO762	22674	11/22/2023	15651500052940	N/A	N/A
SKG366	500	10/6/2023	84168573-606004419	162462678	11/4/2023
SOI879	21859	5/2/2024	3600007830	166409665	6/10/2024
VSC216	8027	6/3/2024	15651500595360	160023358	7/2/2024
AJB 925	4839	5/21/2024	85685861	163890980	1/9/2024
LCN533	21966	4/10/2024	33222615	N/A	N/A

EQR 478	22193	7/21/2024	9201123203840	161721978	9/27/2023
WFT696	22648	5/12/2024	3100006708	167852028	8/18/2024
JAJ907	236	3/10/2024	13665500087740	61730795	9/27/2023
SCG827	8621	3/8/2024	85286010	162094801	10/14/2023
SKJ883	7428	8/24/2024	86326837	167401038	7/26/2024
FTS841	23171	07/07/2024	34687871	166988449	07/07/2024

INDICADOR

SOAT = $\frac{\#\text{ vehiculos con Soat al dia}}{\#\text{ Vehiculos aprobados}} x\ 100$ $\quad \frac{16}{16} x\ 100 = 100\%$

Simulacro = $\frac{\#\text{ Simulacros ejecutadosen el mes}}{\#\text{ Simulacro programados en el mes}} x\ 100$ $\quad \frac{0}{0} x\ 100 = N/A$

5.8 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE ESPECIES VEGETALES

PROGRAMA DE MANEJO DE ESPECIES VEGETALES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Como medidas de protección (cerramiento en malla azul) se realiza la verificación del estado de los cerramientos realizados a los individuos arbóreos protegidos para evitar alguna afectación.
REGISTRO FOTOGRÁFICO

 *Colegio Entre Nubes*	 *Colegio Entre Nubes*
 *Colegio Jose Maria Carbonell*	 *Colegio Jose Maria Carbonell*



Colegio José Joaquín Castro

CERRAMIENTO DE ZONAS VERDES

Se adelanta la señalización de las zonas verdes como medida de protección tras la ejecución de las actividades

C. Moralba





C. Jose Felix C









OBSEVACIONES

Durante el proceso de identificación de individuos arbóreos con posible afectación, se tiene:

IDENTIFICACIÓN DE INDIVIDUOS ARBOREOS POR FRENTE		
SEDE	**CANTIDAD DE INDIVIDUOS ARBOREOS**	**MEDIDA**
COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA	0	N/A
COLEGIO ENTRE NUBES	3	PODA
COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO	1	PROTECCION
COLEGIO JOSE MARIA CARBONEL	2	PROTECCIÓN
COLEGIO SAN CRISTOBAL	0	N/A
COLEGIO NUEVA DELHI	0	N/A
COLEGIO MORALBA SEDE C	0	N/A
COLEGIO ENTRE NUBES – A	0	N/A
COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO	0	N/A
COLEGIO TOMAS RUEDA	0	N/A
COLEGIO ALTAMIRA	0	N/A
COLEGIO MANUELITA SAENZ	10	PODA – TALA

Adicionalmente, se realizó una capacitación de enfocada al cuidado de los recursos naturales mediante el ahorro de agua y energía al personal la cual tenía como propósito sensibilizar a los trabajadores con la importancia de tomar medidas de reducción de recursos naturales en las diferentes actividades

diarias.

INDICADOR

INVENTARIO FORESTAL: # de individuos forestales en el inventario = 16 Individuos Arbóreos

SOCIALIZACIONES $= \frac{\#\ de\ capacitaciones, charlas\ programadas\ en\ el\ periodo}{\#\ de\ capacitaciones, charlas\ programadas\ en\ el\ periodo} x\ 100$ $\frac{1}{1} x100 = 100\%$

5.9 PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el periodo del presente informe se adelantaron actividades con vehículos de carga a los cuales previamente se les verifico que tuvieran al día la Revisión Técnico-Mecánica y demás documentos mencionados en el 5.7 programa de manejo de maquinaria y vehículos



Adicionalmente se verifico en obra que los vehículos se retiraran carpados para evitar la dispersión de material particulado durante el traslado al gestor ambiental.

OBSEVACIONES
Todos los vehículos de carga son aprobados previamente por la interventoría a quienes se les remite la documentación. Para profesionales es de gran importancia velar por todo el componente ambiental por cuanto se están gestionando la señalización correspondiente para cada frente que prohíbe pitar en la zona, uso obligatorio de carpas en los vehículos esto con el fin único de no afectar la población aledaña y no generar contaminación auditiva ni por material particulado. Se hace necesario aclara que para el indicador de RTM se generó un cumplimiento del 84.6% por que para el vehículo de placas LCN533 y LQO762 no aplica la realización de esta revisión porque su fecha de matrícula registra en el año 2022 y 2023.
INDICADOR
RTM $= \frac{\#\ de\ vehiculos\ con\ RTM}{\#\ total\ de\ vehiculo\ en\ el\ proyecto}\ x\ 100$ $\frac{14}{16} x100 = 86.6\%$

6. CONCLUSIONES

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, desarrolló durante el periodo de evaluación y presentación del informe, las acciones pertinentes a la gestión ambiental del proyecto, de conformidad con el Plan de Adaptación del Plan Institucional de Gestión Ambiental la SED, con el propósito de prevenir, controlar y/o mitigar, posibles afectaciones al ambiente, derivadas del desarrollo de actividades.

En adición, durante el periodo de evaluación, se desarrollaron actividades que generaron residuos de construcción y demolición, los cuales fueron acopiados temporalmente en el lugar de intervención, como medida temporal, para su posterior recolección y disposición a sitios autorizados por la autoridad competente.

Se efectuó la apertura del pin ambiental en el mes de enero mediante el cual se reportará mes a

mes la generación de RCD´s siendo este el número 22476. Durante la ejecución de actividades del mes se realizó retiro de materiales de construcción y demolición RCD´s en los puntos de obra.

El reporte de avance al PG-RCD se reportará mes vencido y se entregará el radicado.

7. RECURSOS UTILIZADOS

7.1 HUMANO-COMPETENCIAS

- Gerente HSEQ.
- Gerente.
- Profesional Ambiental.
- Director de Proyecto.
- Personal de PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

7.2 FÍSICOS

- Computador.
- Servidores.
- Rack.
- Elementos de oficina.
- Impresoras.
- Teléfonos.
- Planta telefónica.

7.3 SOFTWARE

- Sistema operativo, procesador de palabras.
- Correo electrónico.
- Acceso a Internet.
- Antivirus.

8. REGISTROS.

- ANEXO 1 – PMA
- ANEXO 2 – COMUNICACIONES
- ANEXO 3 – REGISTRO DE RESIDUOS
- ANEXO 4 – GESTORES AMBIENTALES
- ANEXO 5 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
- ANEXO 6 – LISTAS DE ASISTENCIA
- ANEXO 7 – INVENTARIO DE SUMIDEROS
- ANEXO 8 – CONSUMO DE SERVICIOS
- ANEXO 9 –VEHICULOS
- ANEXO 10 – INVENTARIO DE INDIVIDUOS ARBOREOS
- ANEXO 11 – REGISTRO LIMPIEZA UNIDADES SANITARIAS

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 39449

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
5826	**2023-07-10**	Retal teja Asbesto	**523,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **julio** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 39828

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
5783	**2023-07-06**	Retal teja Asbesto	**1.450,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **06** días del mes **julio** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 39451

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
5826	**2023-07-10**	Retal teja Asbesto	**2.074,20**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **julio** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41119

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio Jose Felix Restrepo Sede C - PIN 22476** identificado con el NIT **813008120** ubicado en **Cra. 4 Este #11Sur-16**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6027	**2023-08-01**	Retal teja Asbesto	**1.640,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

"Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia

VEOLIA | Renovando el mundo

CERTIFICACIÓN No. 1176878

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, Identificada con NIT 813008120, localizada en la ciudad de Bogotá-CL 104 # 14 A 45 OF 401, Tel: 2150482, por intermedio de la empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS, identificación: 900434796 - CALLE 25 F NO 85 C -76 PISO 2 BARRIO SANTA CECILIA-BOGOTÁ D C, Tel: 3861182, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / PR	TOTAL	INF
19-07-2023	778547 / 8149336	ASBESTO	Retal teja de Asbesto	Y36 - A2050	Disposición Directa	Celda 25-07-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio San Cristóbal B - PIN 22476	1492.00 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: D3A SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución No 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA. Que autoriza el tratamiento térmico, disposición final en celda, PTAR y aprovechamiento de RESPEL.

2 Resolución No. 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA. Que autoriza el tratamiento térmico y disposición final en celda de seguridad.

La presente certificación se expide a los 27 día(s) del mes 7 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Luisana Socha García
Jefe de Control Operacional

VEOLIA | Renovando el mundo

CERTIFICACIÓN No. 1184104

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, Identificada con NIT 813008120, localizada en la ciudad de Bogotá-CL 104 # 14 A 45 OF 401, Tel: 2150482, por intermedio de la empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS, identificación: 900434796 - CALLE 25 F NO 85 C -76 PISO 2 BARRIO SANTA CECILIA-BOGOTÁ D C, Tel: 3861182, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / PR	TOTAL	INF
17-07-2023	777193 / 8145413	ASBESTO	Retal teja de Asbesto	Y36 - A2050	Disposición Directa	Celda 25-07-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio San Cristóbal B - PIN 22476	1988.50 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: D3A SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución No 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA. Que autoriza el tratamiento térmico, disposición final en celda, PTAR y aprovechamiento de RESPEL.

2 Resolución No. 462 del 26 de agosto de 2009 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – CRA. Que autoriza el tratamiento térmico y disposición final en celda de seguridad.

La presente certificación se expide a los 14 día(s) del mes 8 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Luisana Socha García
Jefe de Control Operacional

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 39849

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
5826	**2023-07-10**	Retal de drywall	**60,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **julio** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 39450

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
5826	**2023-07-10**	Residuos sólidos no aprovechables contaminados con cemento	**116,80**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **julio** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 39850

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
5826	**2023-07-10**	Retal de PVC	**6,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **julio** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Código de verificación	000000646

Bogotá D.C
Fecha: 2023/09/18

Referencia: Certificación de aprovechamiento y/o disposición final

Señores
EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1

Nosotros **GREEN WORLD J.E SAS,** identificado con **NIT: 901407316-9** bajo autorización como recuperadores específicos N°2021IE204274.

CERTIFICA

Que el proyecto **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".-** bajo el número **PIN 22476,** realizó la gestión de los siguientes RCD:

Se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de Septiembre del 2023.

Fecha	Tipo de Material recolectado	Cantidad	Unidad(kg/m3)	Destino
14/07/2023	CHATARRA	320	KG	ROBERMAR SAS
14/09/2023	MADERA	240	KG	EKO BOJACA SAS ESP

Transportado por el vehículo:

Placa del vehículo de transporte	PIN del vehículo Transportador.
LCN533	21966

Certificamos la recolección, transporte, disposición y comercialización final de la cantidad de residuos mencionados, la cual será destinada para reutilizarse/reciclarse, disponerse, mediante el proceso de fundición, transformación, incineración, manejo de celda entre otros con los diferentes sitios autorizados **ROBERMAR SAS, ORA MARIANIS SAS,** por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR según permiso ambiental Resolución 0472 del 28 Feb 2017.

Cordialmente;

KATHERINE CORTES
Gerente General

Teléfonos: 319 479 86 36- 313 617 45 12 * Dirección: Calle 20 # 16-65 –Bogotá
E-mail: worldgreen718@gmail.com

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRÉS BONILLA SABOGAL
CENTRO DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418

CERTIFICA QUE:

La empresa PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con Nit No. 8130081201, hizo entrega de 7 M3 de Material Aprovechable proveniente de MEJORAMIENTO 2022 GRUPO 7, durante el periodo comprendido del mes de 07 de 2023, un total de 1 viajes expresados en: 7 M3 y su equivalente en 10.84 toneladas volqueta sencilla y/o volqueta doble troque, clasificado según tipo de material de la siguiente manera:

Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador**	
	Total m3	Total tn
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	0	0
1.3 Pétreos.	7	10.84

Tabla de densidades, tomadas en campo a los materiales dispuestos:

DENSIDADES AÑO 2023			
Material	**Densidad**	**Vol.- 7m³ a Tn**	**Vol.-15m³ a Tn**
Excavación	1.465	10.26	21.98
Demolición	1.548	10.84	23.22

El material aprovechable será debidamente almacenado, transformado y posteriormente reciclado a través de la CTA TUNJUELO quien lo utilizará como materia prima dentro de su proceso productivo.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 21 días del mes de septiembre de 2023, para presentar a la obra MEJORAMIENTO 2022 GRUPO 7 con PIN 22476

Datos básicos del generador:
Razón social del generador SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, nit 8999990619, nombre del representante legal NO REGISTRA, número de contacto del generador es NO REGISTRA, su dirección domicilio NO REGISTRA, su correo de contacto es NO REGISTRA y su dirección TV 14 ESTE No. 61 A - 00 SUR.

En constancia se firma:

Salome Fique.

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Copia archivo
0103/2023
BOGOTÁ D.C

***La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de CEMEX COLOMBIA S.A.**
****Cemex entregará copia de la certificación emitida por la empresa que realizó el uso y aprovechamiento de material aprovechable como materia prima en su proceso productivo.**

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con identificación 8130081201 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA, durante el mes 07 del año 2023, un total de 11 viajes expresados en: 77 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes 09 del año 2023, para presentar a la obra MEJORAMIENTO 2022 GRUPO 7 con PIN: 22476.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección TV 14 ESTE No. 61 A - 00 SUR.

En constancia se firma:

Salome Fique.

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: 9sndVJ//-34770, generado en: 2023-09-28

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001620-0038-2023

Generado el : 2023-09-28

Granulados Reciclados de Colombia Greco

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-07-01 al 2023-07-31 para la obra CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644 / GRUPO 7, cuyo objeto es : ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07". con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	Cant. Viajes	Volumen (m3)	Peso (Tn)
Heterogéneo	2	12	15.36
Totales	2	12	15.36

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-09-28, Cota Cundinamarca

En constancia se firma

JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

Cambiar en el ANEXO 2 FORMATO SEGUIMIENTO Y APROVECHAMIENTO

TRACOL

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1042664993462988035801

La empresa **PA COMBIA SAS** identificado con NIT No. **813008120 - 1** de la sede CED EL CONSUELO PIN AMBIENTAL 22476, por intermedio de **INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS** quien realizo la recolección y transporte, identificado con NIT No. **901376483 - 6**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA36919	TEJAS DE ASBESTO	21/07/2023	3.760,00	TEJAS DE ASBESTO	No Aplica	Y36 Asbesto (polvo y fibras)	

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamiento, tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS ESP Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Septiembre) de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACOL SAS ESP.

Cordialmente,

onathan Rodríguez
ERENTE

Escaneado con CamScanner

TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP
NIT: 900.962.813-3

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO NO. 1162797353403829858721

La empresa **PA COLOMBIA SAS** identificado con NIT No. **813008120 - 1** de la sedeCED EL CONSUELO PIN AMBIENTAL 22476, por intermedio de **INGREEN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SAS** quien realizo la recolección y transporte. identificado con NIT No. **901376483 - 6**, entrego a TRACOL S.A.S ESP los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad de acuerdo a los siguientes datos:

Solicitud No.	Nombre Tecnico	Fecha Disposición	Peso Kg	Nombre Declarado	Pretratamiento	Corriente Y	Corriente A
TRA36834	TEJAS DE ASBESTO	18/07/2023	2.640,00	TEJAS DE ASBESTO	No Aplica	Y36 Asbesto (polvo y fibras)	

El material se trató de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por la CAR:

1. Resolución 989 de 26 de mayo de 2015 Otorgada a VALCO CONSTRUCTORES LTDA. para: Almacenamien tratamiento y disposición final celda de desechos peligrosos.
2. Licencia Ambiental Cedida totalmente por medio de la Resolución 1821 de Julio 2017 a TRACOL SAS E Nit.900962813-3.

La presente certificación se expide a los (27) días del mes (Septiembre) de 2023. Cualquier información adi relacionada con este certificado se encuentra disponible para su consulta en las instalaciones de TRACO ESP.

Cordialmente,

Jonathan Rodríguez
GERENTE

Escaneado con CamScanner

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003367-0001-2023

Generado el : 2023-11-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-08-01 al 2023-08-31 para la obra , cuyo objeto es : CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7 con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	5	35	44.8
Totales	5	35	44.8

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-11-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	900767473-7
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín
Teléfono	3046847774
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca
Gestor	Punto limpio: Planta de aprovechamiento: x Disposición final:
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22476
Nombre o razón social	PROFESIONALES ASOCIADOS
Documento de identificación o NIT	813008120-1
Representante Legal	PASCUAL NEIRA
Dirección domicilio	
Teléfono	3144709795
Correo electrónico	ambiental.sdis@consorcioinfra.com
Dirección de generación de RCD	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	35 m3 en Toneladas 44.8
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	35 m3 en Toneladas 44.8
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003367-0001-2023

Generado el : 2023-11-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-08-01 al 2023-08-31 para la obra , cuyo objeto es : CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7 con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	5	35	44.8
Totales	5	35	44.8

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-11-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	900767473-7
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín
Teléfono	3046847774
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca
Gestor	Punto limpio: Planta de aprovechamiento: x Disposición final:
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22476
Nombre o razón social	PROFESIONALES ASOCIADOS
Documento de identificación o NIT	813008120-1
Representante Legal	PASCUAL NEIRA
Dirección domicilio	
Teléfono	3144709795
Correo electrónico	ambiental.sdis@consorcioinfra.com
Dirección de generación de RCD	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	35 m3 en Toneladas 44.8
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	35 m3 en Toneladas 44.8
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001620-0041-2023

Generado el : 2023-11-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-08-01 al 2023-08-31 para la obra , cuyo objeto es : CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7 con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	1	6	7.68
Totales	1	6	7.68

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-11-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	900767473-7	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046847774	
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22476	
Nombre o razón social	PROFESIONALES ASOCIADOS	
Documento de identificación o NIT	813008120-1	
Representante Legal	PASCUAL NEIRA	
Dirección domicilio		
Teléfono		
Correo electrónico		
Dirección de generación de RCD		
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**-**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	6 m3 en Toneladas 7.68
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	6 m3 en Toneladas 7.68
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A001620-0041-2023

Generado el : 2023-11-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-08-01 al 2023-08-31 para la obra , cuyo objeto es : CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7 con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	1	6	7.68
Totales	1	6	7.68

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-11-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-	
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS	
Documento de identificación o NIT	900767473-7	
Representante Legal	900767473-7	
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín	
Teléfono	3046847774	
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com	
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	x
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22476	
Nombre o razón social	PROFESIONALES ASOCIADOS	
Documento de identificación o NIT	813008120-1	
Representante Legal	PASCUAL NEIRA	
Dirección domicilio		
Teléfono		
Correo electrónico		
Dirección de generación de RCD		
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO		

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	**-**
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	**-**
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	**-**
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	6 m3 en Toneladas 7.68
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	**-**
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	**-**
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	**-**
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	**-**
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	**-**
Total RCD recibidos (t)	6 m3 en Toneladas 7.68
Fecha de recepción de los RCD	01 de agosto al 31 de agosto de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 75142

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - FRENTE ENTRE NUBES - PIN 22476** identificado con el NIT **813008120** ubicado en **Cra. 4b Este #48 Sur-42 a 48 Sur-2**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6316	**2023-08-30**	Retamo Espinoso	**1.030,00**	**kg**	Oxido-reducción de residuos y disposición en celda de seguridad	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 75142

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - FRENTE ENTRE NUBES - PIN 22476** identificado con el NIT **813008120** ubicado en **Cra. 4b Este #48 Sur-42 a 48 Sur-2**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6316	**2023-08-30**	Retamo Espinoso	**1.030,00**	**kg**	Oxido-reducción de residuos y disposición en celda de seguridad	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **10** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:


CEMEX COPIA

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con identificación 8130081201 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA, durante el mes 08 del año 2023, un total de 8 viajes expresados en: 56.00 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes 09 del año 2023, para presentar a la obra MEJORAMIENTO 2022 GRUPO 7 con PIN: 22476.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección TV 14 ESTE No. 61 A - 00 SUR.

En constancia se firma:



SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: dhD/oqFb-34609, generado en: 2023-09-14

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Celular: 3112209197, correo certificacionesrcd@cemex.com Bogota, D.C. Colombia.

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:


CEMEX COPIA

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con identificación 8130081201 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA, durante el mes 08 del año 2023, un total de 8 viajes expresados en: 56.00 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes 09 del año 2023, para presentar a la obra MEJORAMIENTO 2022 GRUPO 7 con PIN: 22476.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección TV 14 ESTE No. 61 A - 00 SUR.

En constancia se firma:



SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL CENTRO DE CIRCULARIDAD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: dhD/oqFb-34609, generado en: 2023-09-14

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Celular: 3112209197, correo certificacionesrcd@cemex.com Bogota, D.C. Colombia.

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41475

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Javier Matiz - PIN 22476** identificado con el NIT **813008120** ubicado en **/ Cra. 2a #29A-29Sur**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6113	**2023-08-09**	Retal teja Asbesto	**3.650,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **09** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41475

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Javier Matiz - PIN 22476** identificado con el NIT **813008120** ubicado en **/ Cra. 2a #29A-29Sur**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6113	**2023-08-09**	Retal teja Asbesto	**3.650,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **09** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41665

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	**2023-08-14**	Retal teja Asbesto	**1.115,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41665

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	**2023-08-14**	Retal teja Asbesto	**1.115,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41666

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	**2023-08-14**	Fibra de vidrio	**18,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41666

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	**2023-08-14**	Fibra de vidrio	**18,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICACIÓN No. 1196659

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, Identificada con NIT 813008120, localizada en la ciudad de Bogotá-CL 104 # 14 A 45 OF 401, Tel: 2150482, por intermedio de la empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS, identificación: 900434796 - CALLE 25 F NO 85 C -76 PISO 2 BARRIO SANTA CECILIA-BOGOTÁ D C, Tel: 3861182, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / PR	TOTAL	INF
22-08-2023	791204 / 8237737	ASBESTO	Retal teja de Asbesto	Y36 - A2050	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476	873.00 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: D3A SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución No. 141 del 4 de febrero del 2013 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. Que autoriza disposición final en celda de seguridad y planta de tratamiento de aguas residuales.

La presente certificación se expide a los 1 día(s) del mes 9 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Luisana Socha García
Jefe de Control Operacional

CERTIFICACIÓN No. 1196659

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, Identificada con NIT 813008120, localizada en la ciudad de Bogotá-CL 104 # 14 A 45 OF 401, Tel: 2150482, por intermedio de la empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS, identificación: 900434796 - CALLE 25 F NO 85 C -76 PISO 2 BARRIO SANTA CECILIA-BOGOTÁ D C, Tel: 3861182, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ÍTEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / PR	TOTAL	INF
22-08-2023	791204 / 8237737	ASBESTO	Retal teja de Asbesto	Y36 - A2050	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476	873.00 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: D3A SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución No. 141 del 4 de febrero del 2013 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. Que autoriza disposición final en celda de seguridad y planta de tratamiento de aguas residuales.

La presente certificación se expide a los 1 día(s) del mes 9 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con este certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Luisana Socha García
Jefe de Control Operacional

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41473

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6089	**2023-08-08**	Retal teja Asbesto	**1.562,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **08** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41473

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6089	**2023-08-08**	Retal teja Asbesto	**1.562,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **08** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VEOLIA | Renovando el mundo

CERTIFICACIÓN No. 1196657

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, Identificada con NIT 813008120, localizada en la ciudad de Bogotá-CL 104 # 14 A 45 OF 401, Tel: 2150482, por intermedio de la empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS, identificación: 900434796 - CALLE 25 F NO 85 C -76 PISO 2 BARRIO SANTA CECILIA-BOGOTÁ D C, Tel: 3861182, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ITEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / FR	TOTAL	INF
22-08-2023	791204 / 8237728	LAMINAS DE DRYWALL	Retal de drywall	NA - NA	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio Pantaleón Gaitán Peréz	1438.40 / KG	
22-08-2023	791204 / 8237730	RESIDUOS ORDINARIOS NO CONTAMINADO	Retal de teja Plástica	NA - NA	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio Pantaleón Gaitán Peréz	81.00 / KG	
22-08-2023	791204 / 8237733	FIBRA DE VIDRIO	FIBRA DE VIDRIO	NA - A4140	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio Pantaleón Gaitán Peréz	14.00 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: D3A SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución No. 141 del 4 de febrero del 2013 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. Que autoriza disposición final en celda de seguridad y planta de tratamiento de aguas residuales.

La presente certificación se expide a los 1 día(s) del mes 9 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con esta certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41666

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el **NIT 8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Fibra de vidrio	18,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41665

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal teja Asbesto	1.115,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3102255817

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41661

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio José María carbonel - PIN 22476** identificado con el **NIT 8130081201** ubicado en **Cra 4 #0 Sur45, Bogotá**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal de madera	532,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Derly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Escaneado con CamScanner

Ver pdf plus

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41664

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio José María carbonel - PIN 22476** identificado con el **NIT 8130081201** ubicado en **Cra 4 #0 Sur45, Bogotá**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Residuos sólidos no aprovechables contaminados con cemento	76,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41662

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal de madera	103,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Escaneado con CamScanner

verpdf.php

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41663

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal de drywall	241,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41667

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – **CAR**, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Residuos sólidos no aprovechables contaminados con cemento	34,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia
TEL: 3193255817

Escaneado con CamScanner

verpdf.php

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41668

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal teja Asbesto	587,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3193255817

Escaneado con CamScanner

VEOLIA | Renovando el mundo

CERTIFICACIÓN No. 1196657

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

CERTIFICA QUE:

La empresa: PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA, Identificada con NIT 813008120, localizada en la ciudad de Bogotá-CL 104 # 14 A 45 OF 401, Tel: 2150482, por intermedio de la empresa DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS, identificación: 900434796 - CALLE 25 F NO 85 C -76 PISO 2 BARRIO SANTA CECILIA-BOGOTÁ D C, Tel: 3861182, entregó el material que fue recibido de acuerdo con las siguientes especificaciones:

FECHA RECOLECCIÓN / RECEPCIÓN	SOLICITUD / ITEM	NOMBRE TÉCNICO	NOMBRE DECLARADO	CORRIENTE Y - A	MANEJO	TRATAMIENTO / FECHA / PTA	SEDE / FR	TOTAL	INF
22-08-2023	791204 / 8237728	LAMINAS DE DRYWALL	Retal de drywall	NA - NA	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio Pantaleón Gaitán Peréz	1438.40 / KG	
22-08-2023	791204 / 8237730	RESIDUOS ORDINARIOS NO CONTAMINADO	Retal de teja Plástica	NA - NA	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio Pantaleón Gaitán Peréz	81.00 / KG	
22-08-2023	791204 / 8237733	FIBRA DE VIDRIO	FIBRA DE VIDRIO	NA - A4140	Disposición Directa	Celda 27-08-2023 PARQUE TECNOLÓGICO AMBIENTAL LA SABANA	Colegio Pantaleón Gaitán Peréz	14.00 / KG	

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL TRANSPORTE: D3A SAS

El material que se certifica, fue tratado de acuerdo con las licencias ambientales aprobadas para VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P 805.001.538-5

1 Resolución No. 141 del 4 de febrero del 2013 con sus modificaciones, expedida por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR. Que autoriza disposición final en celda de seguridad y planta de tratamiento de aguas residuales.

La presente certificación se expide a los 1 día(s) del mes 9 de 2023. Cualquier información adicional relacionada con esta certificado, se encuentra disponible para consulta en las instalaciones de VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.A.S E.S.P NIT. 805.001.538-5

Cordialmente,

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41666

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el **NIT 8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Fibra de vidrio	18,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41665

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal teja Asbesto	1.115,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3102255817

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41661

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio José María carbonel - PIN 22476** identificado con el **NIT 8130081201** ubicado en **Cra 4 #0 Sur45, Bogotá**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal de madera	532,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Derly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Escaneado con CamScanner

Ver pdf plus

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41664

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio José María carbonel - PIN 22476** identificado con el **NIT 8130081201** ubicado en **Cra 4 #0 Sur45, Bogotá**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Residuos sólidos no aprovechables contaminados con cemento	76,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41662

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal de madera	103,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

Escaneado con CamScanner

verpdf.php

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41663

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal de drywall	241,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

Escaneado con CamScanner

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41667

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – **CAR**, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Residuos sólidos no aprovechables contaminados con cemento	34,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA - Colombia
TEL: 3193255817

Escaneado con CamScanner

verpdf.php

Ciudad Limpia

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41668

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.** con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Alemania Unificada - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio Alemania Unificada**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6162	2023-08-14	Retal teja Asbesto	587,00	kg	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con **NIT/ID 900434796-1**

El presente documento se expide a los **13** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3193255817

Escaneado con CamScanner

Código de verificación	000000671

Bogotá D.C
Fecha: 2023/10/24

Referencia: Certificación de aprovechamiento y/o disposición final

Señores
EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1

Nosotros **GREEN WORLD J.E SAS,** identificado con **NIT: 901407316-9** bajo autorización como recuperadores específicos N°2021IE204274.

CERTIFICA

Que el proyecto **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".-** bajo el número **PIN 22476,** realizó la gestión de los siguientes RCD:

Se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de Octubre del 2023.

Fecha	Tipo de Material recolectado	Cantidad	Unidad(kg/m3)	Destino
24/08/2023	**CHATARRA**	**180**	**KG**	**ROBERMAR SAS**

Transportado por el vehículo:

Placa del vehículo de transporte	PIN del vehículo Transportador.
LCN533	**21966**

Certificamos la recolección, transporte, disposición y comercialización final de la cantidad de residuos mencionados, la cual será destinada para reutilizarse/reciclarse, disponerse, mediante el proceso de fundición, transformación, incineración, manejo de celda entre otros con los diferentes sitios autorizados **ROBERMAR SAS, ORA MARIANIS SAS,** por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR según permiso ambiental Resolución 0472 del 28 Feb 2017.

Cordialmente;



KATHERINE CORTES
Gerente General

Teléfonos: 319 479 86 36- 313 617 45 12 * Dirección: Calle 20 # 16-65 –Bogotá
E-mail: worldgreen718@gmail.com

Código de verificación	000000671

Bogotá D.C
Fecha: 2023/10/24

Referencia: Certificación de aprovechamiento y/o disposición final

Señores
EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1

Nosotros **GREEN WORLD J.E SAS,** identificado con **NIT: 901407316-9** bajo autorización como recuperadores específicos N°2021IE204274.

CERTIFICA

Que el proyecto **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".-** bajo el número **PIN 22476,** realizó la gestión de los siguientes RCD:

Se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de Octubre del 2023.

Fecha	Tipo de Material recolectado	Cantidad	Unidad(kg/m3)	Destino
24/08/2023	**CHATARRA**	**180**	**KG**	**ROBERMAR SAS**

Transportado por el vehículo:

Placa del vehículo de transporte	PIN del vehículo Transportador.
LCN533	**21966**

Certificamos la recolección, transporte, disposición y comercialización final de la cantidad de residuos mencionados, la cual será destinada para reutilizarse/reciclarse, disponerse, mediante el proceso de fundición, transformación, incineración, manejo de celda entre otros con los diferentes sitios autorizados **ROBERMAR SAS, ORA MARIANIS SAS,** por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR según permiso ambiental Resolución 0472 del 28 Feb 2017.

Cordialmente;



KATHERINE CORTES
Gerente General

Teléfonos: 319 479 86 36- 313 617 45 12 * Dirección: Calle 20 # 16-65 –Bogotá
E-mail: worldgreen718@gmail.com

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41471

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio Rafael Nuñez - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **ambiental.sdis@consorcioinfra.com**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6089	**2023-08-08**	Retal de teja plástica	**72,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **08** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 41471

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio Rafael Nuñez - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **ambiental.sdis@consorcioinfra.com**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6089	**2023-08-08**	Retal de teja plástica	**72,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **08** días del mes **agosto** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Código de verificación	000000671

Bogotá D.C
Fecha: 2023/10/24

Referencia: Certificación de aprovechamiento y/o disposición final

Señores
EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1

Nosotros **GREEN WORLD J.E SAS,** identificado con **NIT: 901407316-9** bajo autorización como recuperadores específicos N°2021IE204274.

CERTIFICA

Que el proyecto **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".-** bajo el número **PIN 22476,** realizó la gestión de los siguientes RCD:

Se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de Octubre del 2023.

Fecha	Tipo de Material recolectado	Cantidad	Unidad(kg/m3)	Destino
27/09/2023	CHATARRA	20	KG	ROBERMAR SAS
27/09/2023	CHATARRA	40	KG	ROBERMAR SAS
27/09/2023	PVC	10	KG	ORA MARIANIS SAS ESP
27/09/2023	DRYWALL	650	KG	ORA MARIANIS SAS ESP

Transportado por el vehículo:

Placa del vehículo de transporte	PIN del vehículo Transportador.
LCN533	21966

Certificamos la recolección, transporte, disposición y comercialización final de la cantidad de residuos mencionados, la cual será destinada para reutilizarse/reciclarse, disponerse, mediante el proceso de fundición, transformación, incineración, manejo de celda entre otros con los diferentes sitios autorizados **ROBERMAR SAS, ORA MARIANIS SAS,** por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR según permiso ambiental Resolución 0472 del 28 Feb 2017.

Cordialmente;

KATHERINE CORTES
Gerente General

Teléfonos: 319 479 86 36- 313 617 45 12 * Dirección: Calle 20 # 16-65 –Bogotá
E-mail: worldgreen718@gmail.com

Código de verificación	000000671

Bogotá D.C
Fecha: 2023/10/24

Referencia: Certificación de aprovechamiento y/o disposición final

Señores
EMPRESA PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA
NIT. 813.008.120-1

Nosotros **GREEN WORLD J.E SAS,** identificado con **NIT: 901407316-9** bajo autorización como recuperadores específicos N°2021IE204274.

CERTIFICA

Que el proyecto **"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".-** bajo el número **PIN 22476,** realizó la gestión de los siguientes RCD:

Se expide a solicitud del interesado a los 24 días del mes de Octubre del 2023.

Fecha	Tipo de Material recolectado	Cantidad	Unidad(kg/m3)	Destino
27/09/2023	CHATARRA	20	KG	ROBERMAR SAS
27/09/2023	CHATARRA	40	KG	ROBERMAR SAS
27/09/2023	PVC	10	KG	ORA MARIANIS SAS ESP
27/09/2023	DRYWALL	650	KG	ORA MARIANIS SAS ESP

Transportado por el vehículo:

Placa del vehículo de transporte	PIN del vehículo Transportador.
LCN533	21966

Certificamos la recolección, transporte, disposición y comercialización final de la cantidad de residuos mencionados, la cual será destinada para reutilizarse/reciclarse, disponerse, mediante el proceso de fundición, transformación, incineración, manejo de celda entre otros con los diferentes sitios autorizados **ROBERMAR SAS, ORA MARIANIS SAS,** por la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR según permiso ambiental Resolución 0472 del 28 Feb 2017.

Cordialmente;

KATHERINE CORTES
Gerente General

Teléfonos: 319 479 86 36- 313 617 45 12 * Dirección: Calle 20 # 16-65 –Bogotá
E-mail: worldgreen718@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1701/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que, en septiembre de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: PROFESIONALES ASOCIADOS
NIT: 813008120
DIRECCION: COLEGIO LOS ALPES - Pin 22476 - Tv. 12 Este #33 A 80

TRANSPORTADOR: DISTRIBUIDORES AMBIENTALES S.A.S
NIT: 900434796-1
DIRECCIÓN: CL 25 F # 85 C - 76 P 2

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL (KG)	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUOS VERDES (MATERIAL DE PODA)	1.250	15 SEPTIEMBRE

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los nueve (09) días de noviembre del 2023.

Cordialmente

FEDERICO LUNA RODRIGUEZ

Representante Legal

Celular: 318 811 289

Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

CV 1701/2023

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74410

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Altamira - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **CALLE 48 B SUR # 11 - 33 E**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6588	**2023-09-18**	Retal de madera	**549,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **18** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74410

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Altamira - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **CALLE 48 B SUR # 11 - 33 E**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6588	**2023-09-18**	Retal de madera	**549,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **18** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74398

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Altamira - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **CALLE 48 B SUR # 11 - 33 E**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6588	**2023-09-18**	Manto asfáltico	**352,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3200

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **18** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74398

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Altamira - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **CALLE 48 B SUR # 11 - 33 E**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6588	**2023-09-18**	Manto asfáltico	**352,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3200

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **18** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74399

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Altamira - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **CALLE 48 B SUR # 11 - 33 E**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6588	**2023-09-18**	Sólidos contaminados con cemento	**103,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **18** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74399

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Altamira - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **CALLE 48 B SUR # 11 - 33 E**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6588	**2023-09-18**	Sólidos contaminados con cemento	**103,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y18

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **18** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43783

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal teja Asbesto	**916,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43783

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Calle 31 D Bis Sur N° 2-24 Este**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal teja Asbesto	**916,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74280

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio Pantaleón Gaitán Peréz - Pin 22476** identificado con el NIT **81300812019** ubicado en **Carrera 13S**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6672	**2023-09-22**	Retal teja Asbesto	**1.884,80**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **22** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74280

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio Pantaleón Gaitán Peréz - Pin 22476** identificado con el NIT **81300812019** ubicado en **Carrera 13S**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6672	**2023-09-22**	Retal teja Asbesto	**1.884,80**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **22** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74385

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Rafael Nuñez - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **ambiental.sdis@consorcioinfra.com**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6723	**2023-09-27**	Retal teja Asbesto	**1.600,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **27** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 74385

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - Colegio Rafael Nuñez - Pin 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **ambiental.sdis@consorcioinfra.com**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6723	**2023-09-27**	Retal teja Asbesto	**1.600,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **27** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43782

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Carcasas plásticas de luminarias	**19,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43782

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Carcasas plásticas de luminarias	**19,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 054-1849

INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT **900489338** ubicada en la **Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca**, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR

Generador	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - 22476	**Dirección**	BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., CL 104 # 14 A 45 OF 401 ED CENTRO EMPRESARIAL
Nit	813008120	**Teléfono**	2150482
Gestor Logístico	DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS	**Dirección Gestor Logistico**	CALLE 25F # 85C - 76 - BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D. C.
Nit	900434796-1	**Teléfono y correo electronico**	2150482 / tecnico@d3a.com.co
No. Remisión	054	**Fecha de recepción**	2023-09-28

INFORMACIÓN RESIDUO

Nombre	Cantidad	Unidad	Tipo de operación	Tipo de manejo	Corriente	Programa Posconsumo
Equipos de iluminación LED	6.80	Kg	Aprovechamiento	Reciclaje	A1180	POR ASIGNAR

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los **12** días del mes **octubre** del año **2023**

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL

Tel:(2) 3816685
Nit: 900489338-8
Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca
posconsumo@innovaambiental.com.co
Valle del Cauca

Si tienes solicitudes de recolección o PQRF visita nuestra página web www.innovaambiental.com.co

Queremos que seas parte del cambio, que tu compromiso con el medio ambiente, deje Huellas Verdes
www.huellasinnova.com

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS
No. 054-1849

INNOVACIÓN AMBIENTAL - INNOVA S.A.S E.S.P, NIT **900489338** ubicada en la **Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca**, con Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca – CVC mediante Resolución 0100 No. 0150 - 1045 de 2011, modificada por medio de Resolución 0100 No. 0150 - 00342 de 2013, Resolución 0100 No. 0150 - 0347 de 2015, Resolución 0100 No. 0150 - 0864 de 2017 y por la Resolución 0100 No. 0150 - 0991 de 2020; para el desarrollo de actividades de TRATAMIENTO QUÍMICO DE RESIDUOS, DESMERCURIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS A PARTIR DE RESIDUOS DE PILAS Y BATERIAS DE LITIO, NIQUEL Y PILAS BOTON,

INFORMACIÓN GENERADOR

Generador	PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA - 22476	**Dirección**	BOGOTA, D.C. / BOGOTA, D. C., CL 104 # 14 A 45 OF 401 ED CENTRO EMPRESARIAL
Nit	813008120	**Teléfono**	2150482
Gestor Logístico	DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS	**Dirección Gestor Logistico**	CALLE 25F # 85C - 76 - BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D. C.
Nit	900434796-1	**Teléfono y correo electronico**	2150482 / tecnico@d3a.com.co
No. Remisión	054	**Fecha de recepción**	2023-09-28

INFORMACIÓN RESIDUO

Nombre	Cantidad	Unidad	Tipo de operación	Tipo de manejo	Corriente	Programa Posconsumo
Equipos de iluminación LED	6.80	Kg	Aprovechamiento	Reciclaje	A1180	POR ASIGNAR

El presente documento se expide en el municipio de Yumbo, a los **12** días del mes **octubre** del año **2023**

Elena Gavrilova
REPRESENTANTE LEGAL

Tel:(2) 3816685
Nit: 900489338-8
Carrera 39 # 13-32, Acopi-Yumbo, Valle del Cauca
posconsumo@innovaambiental.com.co
Valle del Cauca

Si tienes solicitudes de recolección o PQRF visita nuestra página web www.innovaambiental.com.co

Queremos que seas parte del cambio, que tu compromiso con el medio ambiente, deje Huellas Verdes
www.huellasinnova.com

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43780

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal de madera	**354,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43780

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal de madera	**354,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43785

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Manto asfáltico	**15,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3200

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43785

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Manto asfáltico	**15,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	A3200

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente

Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43784

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal teja Asbesto	**661,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43784

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal teja Asbesto	**661,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad-Peligrosos	Y36

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43781

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal de vidrio	**557,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL

Emitido por:
CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
Nit: 901483038-1

CERTIFICADO N° 43781

En las instalaciones de la planta de disposición final de residuos del **CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P**, con Licencia Ambiental **N° 20217000362 de 26 de agosto de 2021**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, ubicada en el **KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS** ,se recibieron del generador **PROFESIONALES ASOCIADOS - Colegio San Cristóbal Sede B - PIN 22476** identificado con el NIT **8130081201** ubicado en **Colegio San Cristóbal Sede B**, los residuos relacionados a continuación:

N° Manifiesto	Fecha de recepción	Residuo	Cantidad	Unidad	Tipo de manejo	Corriente
6373	**2023-09-02**	Retal de vidrio	**557,00**	**kg**	Disposición directa en celda de seguridad- No peligrosos	N/A

Los residuos anteriormente relacionados, fueron transportados por **DISTRIBUIDORES AMBIENTALES SAS**, identificado con NIT/ID **900434796-1**

El presente documento se expide a los **01** días del mes **septiembre** del año **2023**, para certificar la disposición final de los residuos anteriormente relacionados. Cualquier duda o información adicional relacionada con este certificado, podrá ser consultada a través de nuestra línea de servicio al cliente.

Cordialmente



Darly Torres
Coordinador Operativo

VERIFICA AUTENTICIDAD DEL ACTA

CENTRO DE GESTION SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P
NIT 901483038-1
KM 4 VIA MOSQUERA - LA MESA LT 7 VDA BALSILLAS
MOSQUERA, CUNDINAMARCA – Colombia
TEL: 3103255817

***Centro de Gestión Sostenible S.A.S E.S.P es una empresa relacionada con Ciudad Limpia**

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003367-0003-2023

Generado el : 2023-11-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-09-01 al 2023-09-30 para la obra , cuyo objeto es : CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7 con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-11-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	900767473-7
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín
Teléfono	3046847774
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca
Gestor	Punto limpio: Planta de aprovechamiento: x Disposición final:
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22476
Nombre o razón social	PROFESIONALES ASOCIADOS
Documento de identificación o NIT	813008120-1
Representante Legal	PASCUAL NEIRA
Dirección domicilio	
Teléfono	3144709795
Correo electrónico	ambiental.sdis@consorcioinfra.com
Dirección de generación de RCD	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	21 m3 en Toneladas 26.88
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	21 m3 en Toneladas 26.88
Fecha de recepción de los RCD	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Consecutivo para la verificación del certificado: GRE VD A003367-0003-2023

Generado el : 2023-11-10

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO S.A.S
NIT. 900767473-7

PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD

MEDIANTE OFICIO EMITIDO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR NRO. 9162109219 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016 Y LA SECRETARÍA AGROPECUARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO (SAMADE) DEL MUNICIPIO DE COTA RI NRO. C015712 DEL 12 DE JUNIO DE 2017
MEDIANTE EL INFORME TECNICO 01939 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE EXPEDIDO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON PIN AMBIENTAL 19309

CERTIFICA QUE:

La firma PROFESIONALES ASOCIADOS ,identificada con NIT 813008120-1 , realizó la dispoción de material RCD en el periodo de tiempo comprendido entre 2023-09-01 al 2023-09-30 para la obra , cuyo objeto es : CO1.PCCNTR.4077644, cuyo objeto corresponde a “ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS – GRUPO 7 con pin de obra No 22476, quién aplicando la Resolución 01115 del 26 de septiembre de 2012 de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, realizó la reutilización, tratamiento y reciclaje de RDC, para transformarlos en materia prima o insumos para la produccion de nuevos materiales de construccion y asi reincorporarlos al ciclo económico. De acuerdo con la siguiente relación.

Cantidades a certificar:

Material/RCD (*)	**Cant. Viajes**	**Volumen (m3)**	**Peso (Tn)**
Heterogéneo	3	21	26.88
Totales	3	21	26.88

El presente certificado se expide a solicitud del interesado el 2023-11-10, Cota Cundinamarca

En constancia se firma



JAVIER CASTILLO GONZALEZ

Director Comercial

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

Cel. 3046383774

E-Mail:dircomercial@recicladosgreco.com

La presente certificación tendrá 30 días calendario a partir de la fecha de expedición para solicitud de cambios

“Por la cual se modifica la Resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones”

ANEXO II. FORMATO CONSTANCIA GESTORES

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	-
Nombre o razón social	GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS
Documento de identificación o NIT	900767473-7
Representante Legal	900767473-7
Dirección	KM 1.5 Puente de Guadua Vía Bogotá – Medellín
Teléfono	3046847774
Correo electrónico	Dircomercialecicladosgreco.com
Municipio o Distrito	Cota -Cundinamarca
Gestor	Punto limpio: Planta de aprovechamiento: x Disposición final:
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental competente por proyecto	22476
Nombre o razón social	PROFESIONALES ASOCIADOS
Documento de identificación o NIT	813008120-1
Representante Legal	PASCUAL NEIRA
Dirección domicilio	
Teléfono	3144709795
Correo electrónico	ambiental.sdis@consorcioinfra.com
Dirección de generación de RCD	
CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	

Tipo de Residuo	Cantidad de RCD recibidos del generador (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	-
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	-
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	-
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	21 m3 en Toneladas 26.88
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	-
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	-
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	-
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	-
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	-
Total RCD recibidos (t)	21 m3 en Toneladas 26.88
Fecha de recepción de los RCD	01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023



Firma

GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA GRECO SAS

NIT - 900767473

Certificado
disposición final de residuos

CONTROL AMBIENTAL COLOMBIA

20 Experiencia
Tratamiento de residuos orgánicos.

ACTA No. **1152**

FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS GENERALES

Empresa solicitante:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa generadora:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa responsable:	CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	NIT: 830.012.028-9

2. ORIGEN DEL RESIDUO

Mantenimiento de zonas verdes provenientes de las actividades de la compañía BOSQUE Y CIUDAD SAS
Proyecto - Objeto: Tala de árboles, en propiedad privada COLEGIO MANUELITA SAENZ

3. CANTIDAD DE RESIDUOS Y/0 SUBPRODUCTOS

ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (m3)	PLACA VEHICULO	ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (KG)	PLACA VEHICULO
1	792493	5/09/2023	4,5	FST912	5				
2					6				
3					7				
4					8				

CERTIFICADO No. 1152

CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA CERTIFICA:

Que los restos del Mantenimiento de zonas verdes proveniente de la producción de la compañía BOSQUE Y CIUDAD., son utilizados para el aprovechamiento por métodos biológicos en el proceso productivo de la enmienda orgánica. De esta forma se le garantiza a la Empresa solicitante un adecuado manejo de residuos, incorporándolos a una cadena productiva, sin generar afectaciones al medio ambiente, ya que nuestro proceso controlado de tratamiento por acción de microorganismos, transforma los residuos en enmiendas orgánicas útiles a los suelos y a las plantas.

4. OBSERVACIONES:

Cordialmente,

Yesenia Cala
Auxiliar Contable / Control Ambiental de Colombia S.A.S

AUXILIAR CONTABLE	GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

Certificado
disposición final de residuos

CONTROL AMBIENTAL COLOMBIA

20 Experiencia
Tratamiento de residuos orgánicos.

ACTA No. **1152**

FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS GENERALES

Empresa solicitante:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa generadora:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa responsable:	CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	NIT: 830.012.028-9

2. ORIGEN DEL RESIDUO

Mantenimiento de zonas verdes provenientes de las actividades de la compañía BOSQUE Y CIUDAD SAS
Proyecto - Objeto: Tala de árboles, en propiedad privada COLEGIO MANUELITA SAENZ

3. CANTIDAD DE RESIDUOS Y/0 SUBPRODUCTOS

ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (m3)	PLACA VEHICULO	ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (KG)	PLACA VEHICULO
1	792493	5/09/2023	4,5	FST912	5				
2					6				
3					7				
4					8				

CERTIFICADO No. 1152

CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA CERTIFICA:

Que los restos del Mantenimiento de zonas verdes proveniente de la producción de la compañía BOSQUE Y CIUDAD., son utilizados para el aprovechamiento por métodos biológicos en el proceso productivo de la enmienda orgánica. De esta forma se le garantiza a la Empresa solicitante un adecuado manejo de residuos, incorporándolos a una cadena productiva, sin generar afectaciones al medio ambiente, ya que nuestro proceso controlado de tratamiento por acción de microorganismos, transforma los residuos en enmiendas orgánicas útiles a los suelos y a las plantas.

4. OBSERVACIONES:

Cordialmente,

Yesenia Cala
Auxiliar Contable / Control Ambiental de Colombia S.A.S

AUXILIAR CONTABLE	GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

Certificado
disposición final de residuos

CONTROL AMBIENTAL COLOMBIA

20 Experiencia
Tratamiento de residuos orgánicos.

ACTA No. **1151**

FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS GENERALES

Empresa solicitante:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa generadora:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa responsable:	CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	NIT: 830.012.028-9

2. ORIGEN DEL RESIDUO

Mantenimiento de zonas verdes provenientes de las actividades de la compañía BOSQUE Y CIUDAD SAS
Proyecto - Objeto: Tala de árboles, en propiedad privada COLEGIO MANUELITA SAENZ

3. CANTIDAD DE RESIDUOS Y/0 SUBPRODUCTOS

ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (m3)	PLACA VEHICULO	ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (KG)	PLACA VEHICULO
1	792492	5/09/2023	19	FST912	5				
2					6				
3					7				
4					8				

TOTAL m3 19

CERTIFICADO No. 1151

CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA CERTIFICA:

Que los restos del Mantenimiento de zonas verdes proveniente de la producción de la compañía BOSQUE Y CIUDAD., son utilizados para el aprovechamiento por métodos biológicos en el proceso productivo de la enmienda orgánica. De esta forma se le garantiza a la Empresa solicitante un adecuado manejo de residuos, incorporándolos a una cadena productiva, sin generar afectaciones al medio ambiente, ya que nuestro proceso controlado de tratamiento por acción de microorganismos, transforma los residuos en enmiendas orgánicas útiles a los suelos y a las plantas.

4. OBSERVACIONES:

Cordialmente,

Yesenia Cala
Auxiliar Contable / Control Ambiental de Colombia S.A.S

AUXILIAR CONTABLE	GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

Certificado
disposición final de residuos

CONTROL AMBIENTAL COLOMBIA

20 Experiencia
Tratamiento de residuos orgánicos.

ACTA No. **1151**

FECHA:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1. DATOS GENERALES

Empresa solicitante:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa generadora:	BOSQUE Y CIUDAD	
Empresa responsable:	CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS	NIT: 830.012.028-9

2. ORIGEN DEL RESIDUO

Mantenimiento de zonas verdes provenientes de las actividades de la compañía BOSQUE Y CIUDAD SAS
Proyecto - Objeto: Tala de árboles, en propiedad privada COLEGIO MANUELITA SAENZ

3. CANTIDAD DE RESIDUOS Y/0 SUBPRODUCTOS

ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (m3)	PLACA VEHICULO	ITEM	N° MANIFIEST.	FECHA RECOLECCIÓN	CANT (KG)	PLACA VEHICULO
1	792492	5/09/2023	19	FST912	5				
2					6				
3					7				
4					8				

TOTAL m3 19

CERTIFICADO No. 1151

CONTROL AMBIENTAL DE COLOMBIA CERTIFICA:

Que los restos del Mantenimiento de zonas verdes proveniente de la producción de la compañía BOSQUE Y CIUDAD., son utilizados para el aprovechamiento por métodos biológicos en el proceso productivo de la enmienda orgánica. De esta forma se le garantiza a la Empresa solicitante un adecuado manejo de residuos, incorporándolos a una cadena productiva, sin generar afectaciones al medio ambiente, ya que nuestro proceso controlado de tratamiento por acción de microorganismos, transforma los residuos en enmiendas orgánicas útiles a los suelos y a las plantas.

4. OBSERVACIONES:

Cordialmente,

Yesenia Cala
Auxiliar Contable / Control Ambiental de Colombia S.A.S

AUXILIAR CONTABLE	GERENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2023.

SED-G7-PA-172

ING. CINDY LORENA RODRÍGUEZ
Directora de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios
Bogotá D.C.

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4077644: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÌ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO- GRUPO 07".

Asunto: Respuesta oficio M202211091COLEGIOSSED_132

Cordial saludo,

Por medio del presente correo presento la evidencia de la gestión realizada en atención a las observaciones presentadas por la profesional ambiental de esta interventoría:

Observación 1 Se programa jornada de orden y aseo en el colegio Alemania Unificada – Sede A y se realiza separación y retiro de los residuos especiales, se realiza capacitación al personal sobre disposición de residuos.


ANTES	DESPUES
	






Observación 2 Se programa retiro de residuos del Colegio entre nubes sede D dejando el área libre de residuos



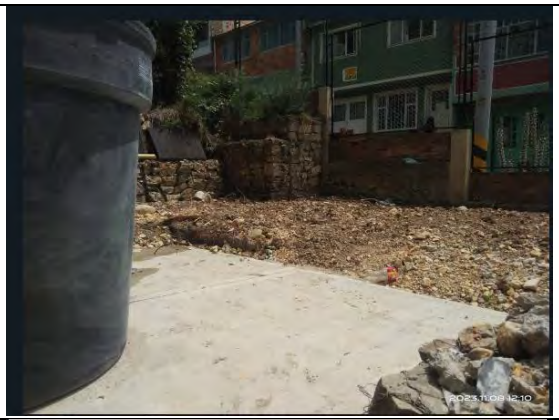

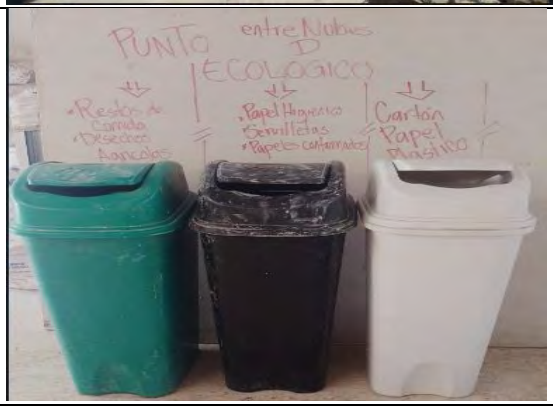Observación 3 se realiza recolección de residuos del colegio Altamira





Observación 4 se realiza jornadas de orden y aseo en el colegio Moralba





Observación 5 se retiran residuos que se encontraban sobre el cespd y se realizan jornadas de orden y aseo del colegio José Joaquín Castro





Observación 6 se realiza disposición de residuos petreos del colegio José Javier Matiz





No siendo otro el motivo, agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Nota: Se anexa listado de asistencia a capacitación “Disposición de Residuos”

No siendo otro el motivo, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Saludos,

ARQ. SANDRA M. HORMAZA.
DIRECTORA DE OBRA
Elaborado por: Juliana Rubio.
Copia: Ingeniera Julieta Mercado – SED.
Anexo: Un (1) archivo PDF.

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_175

Bogotá D.C., 14 de noviembre del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL

Reciba un cordial saludo,

Con el presente me permito remitir observaciones generadas desde el componente ambiental conforme a los recorridos de obra de esta semana, para que sean subsanadas y se remitan los respectivos soportes en un plazo máximo de 15 días, así mismo dichas subsanaciones deberán estar reportadas dentro de las gestiones realizadas por PA en el informe mensual ambiental correspondiente.

1. En el frente Francisco Javier Matiz, se encontró acumulación de RCD, mezclados con residuos ordinarios y especiales incumplido las medidas de manejo establecidas en el PMA del proyecto. Así mismo no se encontró ningún punto ecológico para la clasificación de los residuos ordinarios, por lo cual se solicita delimitar los acopios de RCD, capacitar al personal de obra en manejo, clasificación y disposición de residuos e instalar el punto ecológico.

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co









2. Se reitera las solicitudes ambientales realizadas para le Frente Rafael Núñez, mediante el oficio M202211091COLEGIOSSED_147 del 27/09/2023, ya que a la fecha no se evidencia ningún tipo de gestión ambiental por parte del PA. Lo acopios de RCD no se encuentran señalizados y delimitados por consiguiente no se tiene almacenamiento diferencial en obra, no se tiene punto ecológico para los residuos ordinarios, los materiales con contenido de finos no se mantienen cubiertos para reducir el aporte las emisiones de material particulado, así mismo el personal manifiesta no haber recibido capacitaciones en temas ambientales. Por consiguiente, se solicita realizar jornada de clasificación de residuos, instalar el punto ecológico y capacitar al personal de obra en manejo y clasificación de RCD. Remitir soportes.







3. No se evidencian medias de manejo ambiental para los Residuos del Frente Tomas Rueda B; durante el recorrido de obra no se encontró delimitación y señalización de acopios, no se hace está haciendo uso del punto ecológico los residuos ordinarios se encuentran dispersos y acopiados fuera del punto, adicional se encontraron residuos aprovechables como el cartón húmedos y mezclados con elementos impregnados de pintura lo que hace que PA incurra en gastos innecesarios por el manejo y disposición final del cartón, teniendo en cuenta que es un residuo aprovechable con valor comercial en el mercado. Por loa interior se solicita delimitar los acopios de RCD, capacitar al personal el uso del punto ecológico y definir medias para el manejo de residuos aprovechables.






4. En el frente José Joaquín Castro, no se aplicaron las medias de manejo definidas en el PMA para la protección de zonas verdes e individuos arbóreos; ya que se está realizando la pintura de la perfilería sin protección del suelo, se afectaron las plantas de la zona verde por el acopio de perfiles, así mismo se está realizado el acopio de RCD. Por lo anterior se deben tomar las medidas de manejo correspondientes para la protección del suelo en la zona de pintura, se debe realizar el cerramiento perimetral del individuo arbóreo y del jardín, y se deberá reubicar el acopio de residuos metálicos.



Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co



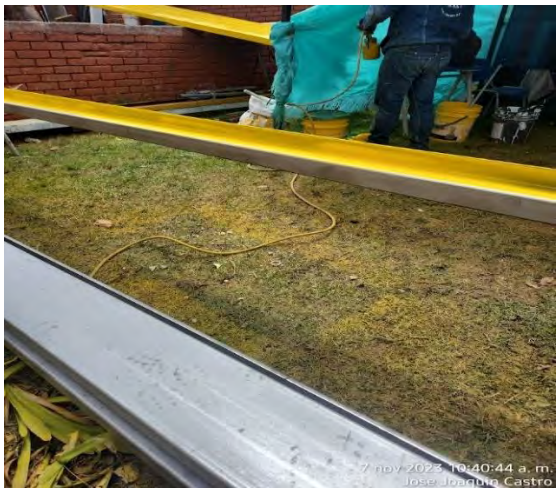





5. No se están cumpliendo las medias de almacenamiento diferencial de residuos en el Frente San Cristóbal Sur, generado problemas de contaminación cruzada y olores. Así miso como se mencionó anteriormente debido a la falta de medias de manejo ambiental se disminuye la posibilidad de aprovechamiento de residuos con valor comercial incurriendo en gastos por manejo y disposición innecesarios.

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co



Agradezco la atención brindada y quedo atenta a la respectiva subsanación.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_171

Bogotá D.C., 02 de noviembre del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: OBSERVACIONES Y PENDIENTES DE DOCUMENTACION AMBIENTAL

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo con nuestros compromisos de vigilancia y control adquiridos como interventoría en virtud del contrato en referencia, nos permitimos solicitar la siguiente documentación ambiental y así mismo presentamos las siguientes observaciones para tener en cuenta y así sean subsanadas cuanto antes, con el fin de cumplir con los compromisos ambientales adquiridos por ustedes.

1. No se menciona la gestión realizada por PA respecto a los oficios con observaciones ambientales que ha generado la interventoría, se tiene pendiente la respuesta del oficio M202211091COLEGIOSSED_132 del 31/08/2023, así como del oficio M202211091COLEGIOSSED_142 y M202211091COLEGIOSSED_147.
2. Desde el informe 7 se viene hablando de la gestión a realizar para la instalación de los puntos ecológicos en todos los frentes de obra. Se sigue repitiendo la información sin evidencia de gestión en el informe 9.
3. En el informe 8 se mencionó que para el siguiente informe se haría entrega de los soportes de retiro de las unidades sanitarias portátiles de los frentes Tomas Rueda Sede A, José feliz restrepo sede C y Entre nubes sede A, ítem que no fue subsanado en el informe 9.

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

4. No se realiza entrega de los soportes de mantenimiento del mes de septiembre de la unidad sanitaria del frente San Cristóbal sur.
5. En el programa de manejo de RCD se tiene un ítem que habla del avance del reporte trimestral sin embargo no se menciona nada al respecto. Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la resolución 1257 de 2021, el reporte debía ser remitido a la autoridad ambiental dentro de los 15 día calendario siguientes el cierre del trimestre; es decir que debía ser radicado por parte de Profesionales Asociados en la plataforma de la SDA a más tardar el día 15 de octubre. Así mismo y conforme a las obligaciones contractuales el reporte debe ser avalado por la interventoría previo a la radicación final, sin embargo, a la fecha no se ha recibido por parte de ustedes el reporte para revisión y así mismo no se relaciona la gestión y la justificación de los atrasos en el informe ambiental 9. Teniendo en cuenta lo anterior se recuerda que este fue solicitado el 23/10/2023 mediante oficio M202211091COLEGIOSSED_163.
6. En la relación de retiros de RCD del mes de septiembre falta mencionar los residuos retirados en Tomas Rueda B, Rafael Núñez, entre otros. Así mismo en el Frente Pantaleón Gaitán se realizó el aprovechamiento de RCD de demolición para relleno, dicha actividad no está relaciona en el informe, por lo cual se debe ajustar y entregar los soportes de las cantidades y evidencias fotografías de la actividad en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1257 de 2021 para aprovechamiento RCD en obra.
7. Las certificaciones de RCD del mes de agosto estas incompletas, por ejemplo, no se entregaron los certificados de manejo RCD pétreos y el certificado de retiro de material de poda de Manuelita Sáenz.
8. En el informe 8 PA indica: *(…) Es importante tener en cuenta que se tiene pendiente la entrega de las certificaciones correspondientes a la teja retirada en el frente de Moralba, pero las cuales serán radicada a la interventoría a más tardar el 4 de octubre;* sin embargo, las certificaciones no fueron radicadas en la fecha estipulada y tampoco se entregan en el informe 9.
9. En el informe relacionan un anexo 12 que no existe.
10. El anexo 6- listas de asistencia y anexo 11- registro unidades sanitarias están vacíos.

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

11. En el Anexo 9- vehículos se adjuntan documentos de vehículos que no están aprobados por la interventoría, así mismo hace falta relacionar vehículos. Se debe ajustar y actualizar el anexo conforme al último listado de vehículos aprobados.
12. Se debe verificar el cronograma ambiental del proyecto con las capacitaciones desarrolladas en el periodo.
13. No se realiza reporte claro de los sistemas ahorradores de energía y agua instalados para el periodo.

Sin otro particular agradezco la atención brindada y pronta respuesta y subsanación.

Cordialmente



ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_169

Bogotá D.C., 01 de noviembre del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PA COLOMBIA SAS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: **REVISIÓN DE HOJA DE VIDA ASESOR AMBIENTAL - CONTRATO DE OBRA**

Reciban un cordial saludo,

En atención a nuestras obligaciones contractuales, nos permitimos remitir la no aprobación de la hoja de vida remitida por ustedes mediante correo electrónico, para el cambio del asesor ambiental, la cual se verificó con lo establecido en las condiciones y términos que abarcan el contrato en referencia y, por tanto, no cumple con el perfil requeridos para el cargo, toda vez que no cumple con la experiencia especifica solicitada. A continuación, se detalla el personal revisado.

CARGO	NOMBRE	ESTADO
ASESOR AMBIENTAL	LUIS ALEJANDRO PRECIADO ARIAS	NO APROBADO

Agradecemos la atención al presente, nos suscribimos de usted.

Cordialmente

ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Consorcio Interventoría Colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

CONSORCIO INTERV COLEGIOS

M202211091COLEGIOSSED_163

Bogotá D.C., 23 de octubre del 2023

ARQ. SANDRA M. HORMAZA
DIRECTOR DE OBRA
PROFESIONALES ASOCIADOS
Bogotá D.C.

OBJETO: **CONTRATO CO1.PCCNTR.4077644 CUYO OBJETO ES: "**ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES NE TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO – GRUPO 07".

ASUNTO: SOLICITUD REPORTE TRIMESTRAL DE RCD PARA REVISON Y AVAL

Reciban un cordial saludo,


Por medio del presente, solicito se remita para revisión y aval el reporte trimestral de manejo de RCD correspondiente al periodo Julio-septiembre del año en curso, el cual conforme a lo establecido en el artículo 13 de la resolución 1257 de 2021 debía ser remitido a la autoridad ambiental dentro de los 15 día calendario siguientes el cierre del trimestre; es decir que este debía ser radicado por parte de Profesionales Asociados en la plataforma de la SDA a más tardar el día 15 de octubre. Así mismo y conforme a las obligaciones contractuales el reporte debe ser avalado por la interventoría previo a la radicación final, sin embargo, a la fecha no se ha recibido por parte de ustedes el reporte para revisión.

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

Por consiguiente, solicito se remita de manera urgente el reporte para la respectiva revisión y dar así continuidad a los tramites respectivo en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Agradezco la atención brindada y quedo atenta al envió de la información

Cordialmente



ING. CINDY LORENA RODRIGUEZ
Director de interventoría
Consorcio interventoría colegios

Copia: Apoyo a la Supervisión DCCEE-SED – Ing. Julieta Mercado

Carrera 11 No. 71-40 Ofc. 1001 Edificio Valparaíso
(57+1) 236 7919 / (310) 558 2857
csuarez@master.net.co

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Tomas Rueda B octubre

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
23/10/23		X							Superboard	285 ug	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		x							PVC	53 ug	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		x							carcasa plastica	14.40	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		x							Madera	35,80	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		X							teja asbesto	1.573	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		x							solidos contamin	6 ug	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		X							manto asfaltico	1	Fst 841	D3A	Jeferson
23/10/23		X				X				165	Fst 841	D3A	Jeferson
09/10/23		X							teja asbesto	2.312 ug	Fst 841	D3A	Jeferson
02/10/23		X				X				2 30	Lcn533	Greenworld	Jeferson
02/10/23		X							Drywall	680	Lcn533	Greenworld	Jeferson
02/10/23		X							madera	410	Lcn533	Greenworld	Jeferson

Juliana Rubio

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Jose felix C Octubre

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
26/10/23		x							Cartones plasticos	3.8kg	WFT696		Julio
26/10/23		x							Super board	65kg	WFT696		Julio
10/10/23		x				x				150kg	LCNS33		Julio
10/10/23		x							Madera	85	LCNS33		Julio
10/10/23		x		x						270	LCNS33		Julio
26/10/23		x		x					—	7m³	EQR478		Julio

Juliana Ribio
FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Alpes

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
11/10/23		X							teja asbesto	674 kg	WFT696	D3A	Vanesa
12/10/23		X				X				15 kg	Cns33	GreenWorld	Vanessa
12/10/23		X		X						22kg	Cns33	GreenWorld	Vanessa
10/10/23		X							RUC	10 kg	Cns33	GreenWorld	Vanessa

Juliana Rubio

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Francisco Javier Matiz Octubre

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
19/10/23		x							Teja asbesto	1561kg	WFT69E		Juan K
27/10/23		x							Teja asbesto	2480kg	FST541		Juan K
27/10/23		x		x					—	7m³	JAJ907		Juan K

Juliana Ortiz

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Pantaleon Octubre

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
26/10/23		x							Piso concreto	1.241 kg	WFT69[illegible]	D3A	Vanessa
26/10/23		x							Teja asbesto	462 kg	WFT696	D3A	Vanessa
09/10/23		x							Teja asbesto	58 kg	FST841	D3A	Vanessa
09/10/23		x							Teja asbesto	2.178 kg	FST841	D3A	Vanessa
26/10/23		x		x					—	7m³	EQR24[illegible]	—	Vanessa

Juliana Rios

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Entre nubes sede A

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
23/10/23		X							Madera	160kg	Fst841	D3A	leidy
23/10/23		X							Solidos contaminados	89kg	Fst841	D3A	leidy
19/10/23		X		X					—	7m³	UCS216	—	leidy

Juliana Rubio

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Jose Joaqun B

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
04/10/23		X							Teja asbesto	2.092	FST841	D3A	Brayan
14/10/23		X				X				130	LCN533	Greenworld	Brayan
15/10/23		X		X					—	7 m³	EQ2478	—	Brayan

Juliana Rubio

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Jose Joaquin A Octubre

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
19/10/23		X							Teja asbesto	1.357	WFT696	D3A	leidy
19/10/23		X		X					—	7m³	FQR478	—	leidy

Juliana Rubio

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Carbone II Octubre

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
19/10/23		X							Solidos Contaminados	20	WKT696	D3A	Ciro
19/10/23		x							Bolsas plasticas	21kg	WKT696	D3A	Ciro
19/10/23		x	x							44kg	WKT696	D3A	Ciro
19/10/23		x		x					—	7m³	JAJ903	—	Ciro

Juliana Rubio
FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

PÁGINA 1 DE 1 VERSIÓN: 1 CÓDIGO: HSEQ-F-181 DOCUMENTO CONTROLADO	CONTROL DE MATERIAL Y RCD	PROFESIONALES ASOCIADOS

FRENTE: Alemania Unificada B

FECHA	MARCAR CON X		PLASTICO VIDRIO	PETREO	MATERIAL ELECTRICO	RESIDUOS METALICOS	PUERTAS	LUMINARIAS	OTROS	CANTIDAD	PLACA VEHICULO	OBSERVACION	NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE RECIBE
	INGRESO	RETIRO											
18/10/23		X				X				50	LCN533	Greenworld	Juan P
18/10/23		X								24	LCN533	GreenWorld	Juan P

Juliana Rubio

FIRMA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE **Folios**: 2 **Anexos**: No.
Radicación: 2018EE266302 **Proc** 4197616 **Fecha**: 2018-11-15 08:38
Tercero: 901037300-3 - CHATARRERIA AMBIENTAL FM S.A.S
Dep Radicadora: SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO (E)
Clase Doc: Salida **Tipo Doc**: Oficio de Salida

Bogotá DC

Señores
CHATARRERÍA AMBIENTAL FM S.A.S.
Atn. Carlos Fredy Mora Figueredo
Representante Legal
Carrera 79 No. 69B - 35
Teléfono: 3138030169
Ciudad

Referencia: Respuesta a los radicados SDA No. **2018ER207784**, **2018ER240944** y **2018ER251754** – Solicitud de Inscripción como Recuperador Específico.

Cordial saludo:

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público –SCASP de la Secretaría Distrital de Ambiente –SDA, como autoridad ambiental del perímetro urbano del Distrito Capital, en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de 2009 *"Por el cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones"* y el Decreto 175 de 2009 *"Por el cual se modifica el Decreto 109 de marzo 16 de 2009"* recibe los comunicados de la referencia, mediante los cuales la empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S., remite la documentación necesaria para el trámite de inscripción y aprobación como Recuperador Específico de RCD en el Distrito capital.

Para dar atención a lo manifestado y contribuir con el control de la calidad del medio ambiente urbano, la SCASP informa que el día **31 de octubre de 2018** un profesional perteneciente a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público -SCASP realizó visita técnica al predio ubicado en la **Calle 79 No. 69 B – 35**, con chip catastral AAA0243DFEP, donde funciona la empresa **Chatarrería Ambiental FM S.A.S.,** con NIT. **901037300-3** en el barrio **LAS FERIAS**, de la Localidad de **ENGATIVÁ.**

En cumplimiento del seguimiento y control que ejerce esta subdirección, se verifica la documentación allegada mediante radicados **2018ER207784**, **2018ER240944** y **2018ER251754**, incluyendo el formato para la inscripción de la empresa **Chatarrería Ambiental FM S.A.S.,** como recuperador específico avalado por la SDA.

1. **Ubicación del Predio**

La bodega de almacenamiento de la empresa **Chatarrería Ambiental FM S.A.S.,** funciona en la **Calle 79 No. 69 B – 35** del barrio **LAS FERIAS**, de la Localidad de **ENGATIVÁ.**

Imagen 1. Ubicación del predio Calle 79 No. 69 B – 35, empresa CHATARRERÍA AMBIENTAL FM S.A.S.



Fuente: Sinupot 2018

2. Situación encontrada

La visita fue realizada el día **31 de octubre de 2018** por profesionales de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en esta se encontró que, la empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S., dentro de sus actividades económicas realiza recolección, transporte almacenamiento y comercialización de residuos aprovechables dentro de los que se puede mencionar: Chatarra y otros metales, aluminio, Cartón, PVC, Madera, Drywall.



Fotografía No. 1. Almacenamiento de cartón, PVC y drywall.



Fotografía No. 2. Almacenamiento de varilla y madera.



Fotografía No. 3. Oficina.



Fotografía No. 4. Fachada de la empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S.

Al hacer la verificación de la documentación enviada a la SCASP se evidencia que el certificado de uso del suelo expedido por la Secretaría Distrital de Planeación emite concepto de uso del suelo para la actividad de reciclaje, según lo establecido en el Decreto 456 de 2010 y el Decreto 113 de marzo 20 de 2013 en el cual indica: *"se estableció que por las características del sector donde se localiza el predio objeto de la consulta se puede desarrollar la actividad de reciclaje en bodegas de menor área – centros de acopio básico (tipo 3)"*

El predio objeto de consulta tiene un área de 600 m² aproximadamente, razón por la cual en la visita de verificación se evidencia que la bodega se encuentra divida en dos actividades económicas y el almacenamiento de la empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S., usa una parte del predio para realizar sus actividades comerciales, por tal razón se tomó la medida del área de la bodega que se tiene destinado para realizar la actividad, determinando un área de 149 m².

Por otro lado, durante el recorrido no se evidencia olores ofensivos, vectores o demás factores ambientales negativos que puedan impactar negativamente el área de influencia; adicionalmente se verificó que la empresa Chatarrería Ambiental FM S.A.S., cuenta con el certificado de control de plagas. En cuanto al Plan de Emergencias la empresa cuenta con el documento, no obstante, está pendiente de la visita por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos para verificar las condiciones internas de la empresa y emitir su concepto.


TECNICOS EN FUMIGACION
Y SERVICIOS GENERALES

CERTIFICA QUE

- MOSCAS
- CUCARACHAS
- ZANCUDOS
- HORMIGAS
- RATONES

El servicio tiene una vigencia de seis (06) meses a partir de la fecha.

TECNICOS EN FUMIGACION

JAVIER ALEJANDRO BUENHOMBRE CANDIL

Imagen No. 1 Certificado de control de plagas.



Imagen No. 2 Radicado de solicitud de revisión técnica al Cuerpo Oficial de Bomberos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, soportado con acta de visita técnica, con la información que entregó el solicitante al momento de la visita y complementada con la información radicada en la SDA, se **APRUEBA** a la empresa **Chatarrería Ambiental FM S.A.S** identificada con NIT. **901037300-3,** ubicada en la **Calle 79 No. 69 B – 35** del barrio **LAS FERIAS**, de la Localidad de **ENGATIVÁ** como **Recuperador Específico** aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.

La anterior aprobación se mantiene para el predio ubicado Calle 79 No. 69 B – 35 siempre y cuando no se cambien las características descritas anteriormente y no se desarrollen actividades diferentes a las de recolección, transporte almacenamiento y comercialización de los materiales aprovechables que fueron descritos con anterioridad. En el caso en que existan modificaciones en las actividades y/o se implementen otros sitios de acopio u otras actividades se deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente para tramitar un nuevo concepto.

Por último, se solicita a la **Chatarrería Ambiental FM S.A.S,** informar dentro de los 8 días hábiles a partir del recibo de este comunicado, la destinación final de los materiales acopiados por su empresa, con los soportes correspondientes de dichos gestores, para realizar el control adecuado por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente.

Por otra parte, la empresa debe tener en cuenta que la aprobación no contempla ninguna actividad de tratamiento, transformación y aprovechamiento de los Residuos de

Construcción y Demolición - RCD recolectados; adicionalmente la actividad de acopio debe realizarse teniendo en cuenta las medidas de manejo ambiental que minimicen los impactos negativos producidos al ambiente por el desarrollo de las actividades. Así mismo, la empresa debe garantizar la correcta entrega de certificados de recolección a las obras de construcción, con el fin de avalar la adecuada disposición final de los RCD aprovechables que se generan en el Distrito Capital.

Se debe tener en cuenta que el presente concepto técnico en ningún momento se asimila a un permiso de carácter ambiental.

Atentamente,

CARMEN LUCIA SANCHEZ AVELLANEDA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO (E)

Revisó y aprobó: Sergio Alonso Izquierdo – Natalia Trujillo Angulo
Proyectó: LINA MARCELA JIMENEZ JIMENEZ

CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR
Dirección General
República de Colombia

RESOLUCIÓN No. 0141 DE 04 FEB. 2013

Por medio de la cual se autoriza la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada con Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24 de mayo de 2010 y se adoptan otras determinaciones

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR, en uso de las facultades legales que le confiere el numeral 9° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y especificamente en lo dispuesto en los Decretos 1220 de 2005, modificado por el Decreto 500 de 2006, Decreto 2820 de 2010, Resolución 1937 del 26 de julio de 2012 y,

CONSIDERANDO:

ANTECEDENTES

Que mediante Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004 (fl. 171- Tomo 1), la Corporación otorgó licencia ambiental a favor de la sociedad RELLENOS DE COLOMBIA LTDA., identificada con NIT. 830.104.997-6, para el proyecto "Relleno Sanitario de Seguridad para el Manejo de Lodos con caracteristicas Domésticas y Especiales" a desarrollarse en el predio de su propiedad, identificado con cédula catastral No. 00-00-0006-0057-000, ubicado en la vereda Balsillas, del municipio de Mosquera, Cundinamarca, con vigencia durante la vida útil del proyecto, cobijando las fases de construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono.

Que la mencionada resolución fue notificada personalmente al representante legal de la sociedad, el 10 de septiembre de 2004, quedando ejecutoriada el día 17 del mismo mes y año (fl. 172 vuelto)

Que con Resolución No. 2966 del 20 de octubre de 2006 (fl. 712, Tomo 4), la Corporación modificó la Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, en el siguiente sentido:

"...Modificar la Licencia Ambiental otorgada a favor de la sociedad Rellenos de Colombia S.A. E.S.P., identificada con NIT 830104997-6, por medio de la Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, en el sentido de autorizar se adelante en el Relleno Sanitario de seguridad ubicado en la zona industrial Balsillas, del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca además del manejo de lodos con caracteristicas doméstica especiales, la disposición en celdas de seguridad de los residuos que se relacionan a continuación:

No.	Descripción	Procedencia	Pretratamiento
1	Residuos de la producción de aceites vegetales	Fábricas de aceites, mercados. Aunque no es un residuos peligroso, ex putrescible y requiere manejo especial	Estabilización
2	Residuos de ácidos grasos	Producción de grasas y jabones. Aunque este residuo no se considera	Estabilización

determinaciones

		requiere un manejo especial	
3	Emulsiones de aceites y grasas	Fábrica de aceites, producción de jabones. Aunque estos residuos no se consideran peligrosos, es putrescible y requiere un manejo especial	Desecado
4	Lodos de proceso reproducción de cuero	Curtiembres	Desecado
5	Aserrines empapados de aceites u otros residuos nocivos	Industria y comercio del aceite; industria en general	No aplica
6	Filtros de papel empapados con residuos nocivos	Industria en general	No Aplica
7	Material de embalaje contaminado con restos de contenido nocivo	Industria en general	No aplica
8	Grasas empapadas con residuos nocivos	Industria en general	No aplica
9	Residuos con sustancias peligrosas provenientes de hornos	Industria metalúrgica	No aplica
10	Escorias de Fundición de metales no ferrosos	Industria metalúrgica	No aplica
11	Escorias salinas de la producción de metales no ferrosos	Fundiciones	No aplica
12	Cenizas de metales no ferrosos	Industria metalúrgica. Puede contener metales pesados como plomo, estaño, etc.	Solidificación
13	Polvo de filtro de metales no ferrosos	Industria metalúrgica. Puede contener metales con plomo, zinc, etc.	Solidificación
14	Cenizas volátiles de filtros de incineradores	Incineradores	Solidificación
15	Residuos de lavadores de gas de incineradores (v.g.yeso)	Incineradores	No aplica
16	Suelos contaminados	Accidentes, industria en general	No aplica
17	Escombros contaminados	Industria en general	No aplica
18	Arenas de fundición	Fundición	No aplica
19	Materiales de filtros usados con contenido nocivo	Industria química, tintorerías y tratamiento de efluentes	No aplica
20	Polvos de asbesto	Industria de asbesto y asbesto-cemento	El residuos debe estar empacado
21	Lodos minerales con residuos peligrosos	Industria metalúrgica y química, talleres de temple.	Desecado o solidificación

RESOLUCIÓN No. 141 DE 04 FEB. 2013

Por medio de la cual se autoriza la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada con Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24 de mayo de 2010 y se adoptan otras determinaciones

		Residuos que pueden contener nitrato, nitrito, sulfito, etc.	
22	*Lodos con cianuros de la metalurgia*	*Acabado de acero, talleres de temple. Contiene cianuro*	*Si no hay tratamiento F/q solidificación*
23	*Filtros de aceite*	*Industria, vehículos y maquinaria en general*	*No aplica*
24	*Residuos con metales pesados no ferrosos*	*Minas e industria metalúrgica. Puede contener Pb, Be, Al y otros metales pesados*	*No aplica*
25	*Acumuladores (baterías) de níquel-cadmio*	*Comercio, acumuladores gastados*	*Solidificación o encapsulamiento*
26	*Baterías con mercurio*	*Baterías gastadas*	*Solidificación o encapsulamiento*
27*	*Residuos con mercurio*	*Industria en general*	*Si no hay tratamiento F/Q, solidificación o encapsulamiento*
28	*Lodos de zinc, plomo, estaño*	*Minas e industria metalúrgica*	*Solidificación o encapsulamiento*
29*	*Lodos galvánicos con cianuro, cromo VI*	*Industria galvanoplástica. Residuos altamente tóxicos*	*Cianuro, oxidación, cromo: reducción*
30	*Lodos galvánicos con cromo III, cobre, zinc, cadmio, níquel, cobalto, plomo, estaño*	*Industria galanoplástica*	*Solidificación o desecado*
31	*Otros lodos de hidróxidos metálicos*	*Industria química y tratamiento de efluentes industriales*	*Si no hay tratamiento F/q, desecado o solidificación*
32	*Óxidos de hidróxidos de zinc, manganeso, cromo III, cobre y otros metales pesados*	*Industria química y metalúrgica*	*Desecado o solidificación*
33	*Sales y sustancias químicas del proceso de curtido de pieles*	*Preparación de pieles y curtiembres*	*Solidificación o encapsulamiento*
34	*Sales de impregnado de la madera*	*Industria de la madera, contiene creosota o pentaclorofenol*	*Solidificación o encpasulamiento*
35	*Sales para endurecimiento del acero*	*Acabado de acero. Puede contener Pb, Bay otros metales pesados*	*Solidificación o encapsulamento*
36	*Cloruros y sulfuros con metales pesados*	*Acabado de acero e industria química*	*Solidificación o encapsulamiento*
37	*Sales con contenido nocivo como cianuro nitrito*	*Industria química*	*Oxidación, solidificación previa disposición*
38	*Cal con contenido de arsénico*	*Industria química, de la cerámica y del vidrio*	*Solidificación o encapsulamiento*
39	*Hidrofluoruro de amonio*	*Tratamiento de superficies*	*Solidificación o*

determinaciones

40	Residuos de plaguicidas	Producción, comercio y uso de plaguicidas	Solidificación o encapsulamiento
41	Residuos desinfectantes	Industria química, farmacoútica e instalaciones de salud	Solidificación o encapsulamaiento
42	Residuos de la industria farmaceútica	Industria farmaceútica	Solidificación o encapsulamiento
43	Productos farmacéuticos caducados	Instalaciones de salud	Solidificación o encapsulamiento
44	Detergentes	Industria, comercio y uso de detergentes	No aplica
45	Tensoactivos	Industria química, producción de detergentes	No aplica
46	Residuos químicos de laboratorios	Industrias e instituciones académicas	Depende del residuo
47	Grasas y ceras	Industrias petroquímica y general	No aplica
48	Residuos sólidos empapados de aceite y grasa	Industria petroquímica y general	No aplica
49	Emulsiones bituminosas	Industria química y de la construcción. Contiene sustancias alifáticas y aromáticas	No aplica
50	Lodos con combustible	Industria en general	No aplica
51	Lodos con lubricantes	Industria en general	No aplica
52	Residuos de la refinación de aceites usados	Industria de refinación (reciclado). Puede contoner ácidos, lejías, azufre, etc.	No aplica
53	Residuos de alquitrán	Industria química	No aplica
54	Lodos con solventes orgánicos halogenados	Industria química y general	Encapsulamiento
55	Lodos con solventes orgánicos no halogenados	Industria química y general	Encapsulamiento
56	Pinturas y barnices residuales	Industria y utilización de pinturas, imprentas	No aplica
57	Lodos de pinturas y barnices	Industria de pinturas y procesos de pintado	Encapsulamiento
58	Residuos plásticos no endurecidos	Industria química y plástica	Encapsulamiento
59	Ablandadores halogenados	Industria química y plástica	Encapsulamiento
60	Ablandadores no halogenados	Industria química y plástica	Encapsulamiento
61	Lodos de plástico o caucho con solvente	Industria química y plástica	Encapsulamiento
62	Lodos y emulsiones látex	Industria textil, de alfombras y de pinturas	Encapsulamiento
63	Lodos y emulsiones de caucho	Producción de materiales de caucho	No aplica
64	Lodos de teñido de	Industria textil	Encapsulamiento

RESOLUCIÓN No. 0141 **DE** 04 FEB. 2013

Por medio de la cual se autoriza la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada con Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24 de mayo de 2010 y se adoptan otras determinaciones

	textiles		
65	*Lodos de lavanderia*	*Industria textil, lavanderia y tintorerias*	*Encapsulamiento*
66	*Filtros textiles con sustancias peligrosas*	*Industria textil en general*	*No aplica*
67	*Paños textiles con sustancias peligrosas*	*Industria en general*	*No aplica*
68	*Catalizadores*	*Industria química y petroquímica*	*Solidificación o encapsulamiento*
69	*Lodos de tratamiento de efluentes industriales no especificados anteriormente*	*Industria en general*	*desecado*
70	*Residuos no peligrosos*	*Industria en general*	*No aplica*

Que en el artículo segundo de la mencionada resolución, la Corporación aprobó el Plan de Contingencia formulado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la Sociedad Rellenos de Colombia S.A. E.S.P., para prevenir y controlar eventuales derrames o emisiones contaminantes en el predio denominado Balsillas del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca.

Que en el artículo tercero de la Resolución No. 2966 del 20 de octubre de 2006, quedó contemplado que la sociedad no podría realizar ninguna de las acciones señaladas a continuación:

1. Disponer residuos hospitalarios y/o de riesgo infeccioso o biológico en el Relleno de Seguridad.
2. Recibir residuos sin conocer su procedencia e información técnica necesaria para la disposición final.
3. Causar derrames o residuos por fuera del perímetro de las geomembranas instaladas en las celdas.
4. Disponer en el Relleno de Seguridad según criterio del Centro de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente Panamericano –CEPIS- residuos altamente tóxicos, explosivos, inflamables o reactivos.
5. Disponer en el Relleno de Seguridad, residuos con algunas de las siguientes características: que posean líquidos libres, que generen derrames a temperatura ambiente, que posean sustancias que puedan traspasar las barreras previstas en el relleno, que posean contaminantes fácilmente transportables en el aire, que posean alta solubilidad en agua, en concentraciones que dependerá del tipo y peligrosidad de la sustancia, sustancia que puedan generar autocombustión en la situación local, sustancias con características de peligrosidad análogas a las del grupo de las tetra, penta, hexa cloro dibenzoparadioxinas, tetra, penta, hexa cloro dibenzofuranos, tri, tetra y penta clorofenoles y sus derivados clorofenóxidos; compuestos orgánicos halogenados y todos sus derivados.

determinaciones

6. Disponer en el Relleno de Seguridad en la misma celda, residuos peligrosos que puedan producir reacciones diversas tales como: generación de calor presión, explosión o reacciones violentas; emanaciones tóxicas o inflamables de cualquier naturaleza; daños a la estructura del relleno.

Que en el artículo quinto de la Resolución 2966 del 20 de octubre de 2006, la Corporación determinó que la sociedad Rellenos de Colombia S.A. E.S.P., deberá dar cumplimiento a los requisitos que condicionaron la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución 869 del 9 de septiembre de 2004; al Estudio de Impacto ambiental, a las medidas de manejo ambiental señaladas en los documentos radicados con los números 16459, 17574 y 20215 y las que se enuncian a continuación:

"

1. *Realizar un pretratamiento adecuado para cualquier disposición de residuos sin importar su naturaleza. Para el caso de los residuos sólidos que no se especifica el pretratamiento, deberá adicionarse el material de cobertura luego de cada disposición.*
2. *La clausura de la celda considerada como un sistema de encapsulamiento, deberá garantizar el aislamiento total de los residuos contenidos en ella.*
3. *En cuanto a los lixiviados, deberán hacerse caracterizaciones trimestrales de cada uno de los pondajes, con el fin de controlar su humedad y el contenido de los metales pesados originados por la descomposición de los residuos.*
4. *Las celdas en operación deberán contar con su cubierta para favorecer el proceso de evapotranspiración de los líquidos contenidos en ellas.*
5. *En el sitio de descargue de contenedores de los residuos, deberá realizarse una adecuación resistente a cambios climáticos y condiciones eólicas de la zona, de manera tal, que las canecas o recipientes ubicados en este sitio no tengan ningún contacto con el medio.*
6. *Realizar un adecuado manejo técnico, sanitario y ambiental para el tratamiento y disposición final de residuos domésticos e industriales.*
7. *Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan Operativo, Plan de Contingencia, Plan de Monitoreo, Cronograma de actividades en los términos y condiciones del Estudio de Impacto Ambiental, formulados para el tratamiento de lodos con características domésticas y especiales y los relacionados para otro tipo de residuos peligrosos, sólidos semisólidos y líquidos que pueden ser dispuestos en rellenos de seguridad, según la Guía para el Diseño de Rellenos de Seguridad en América Latina del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria – CEPIS-.*
8. *Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a que haya lugar.*
9. *Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad vigente.*
10. *Contar con personal que tenga la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos.*
11. *Informar el tipo de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que está autorizada para manejar.*

RESOLUCIÓN No. 0141 **DE** 04 FEB. 2013

Por medio de la cual se autoriza la cesión parcial de la licencia ambiental otorgada con Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24 de mayo de 2010 y se adoptan otras determinaciones

12. *En caso de tratarse de un derrame de los residuos autorizados, el plan de contingencia debe seguir los lineamientos del Decreto 321 de 1999, por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del municipio, para atender otro tipo de contingencia.*
13. *Tomar todas las medidas de carácter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminación que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos peligrosos.*
14. *La permisionaria de la Licencia Ambiental al recibir el residuo o desecho peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del transportador. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento y/o disposición, final del residuo o desecho peligroso, el receptor es solidariamente responsable con el generador (art. 18 del Decreto 4741 de 2005).*
15. *Presentar en cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental un informe semestral que contenga los resultados de estudios de seguimiento a la estabilidad e impermeabilización que se realicen en las celdas* ***describiendo el tipo de residuos que se disponen y se han generado o no lixiviados de cada una.***
16. *Presentar un Informe semestral que consolide los tipos de residuos peligrosos que se disponen en el relleno de seguridad, informando como mínimo:* ***tipo de residuo, fecha de recepción, composición química, pretratamiento (en caso de que se aplique), cantidad y número de celda en la que se dispuso.***
17. *Aplicar en el funcionamiento del relleno, en la construcción y mantenimiento de las celdas, lo establecido por la Resolución 1096 de 2000, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000.*
18. *Dar cumplimiento a los parámetros de control, mediante monitoreos semestrales, a excepción de los análisis de lixiviados cuya prueba será trimestral, los cuales deberán analizarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:*

AGUA: Para los pozos. Monitoreo y control ubicados en cada celda
AIRE: Calidad de aire
BIOGÁS:En las chimeneas instaladas en cada celda (3 por cada celda)
RUIDO: Con sonómetro debidamente calibrado
LIXIVIADOS: De acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 869 de 2004, RAS y CEPIS, concordante con lo previsto en el numeral 4.2.6. del E.I.A.

Los resultados deben remitirse a la Oficina Provincial Sabana Occidente de la C.A.R, para su evaluación y los plazos deberán contarse a partir de la ejecutoria de la presente providencia."

Que la citada resolución fue notificada personalmente al representante legal de la sociedad, el día 20 de octubre de 2006, quedando debidamente ejecutoriada y en firme el día 28 del mismo mes y año (fl. 722 vuelto).

Que con fundamento en el Informe Técnico OPSO No. 0132 del 4 de febrero de
