WILMER JARAMILLO CORDOBA
Ingeniero Civil

Diseños, Construcciones, Interventorías y Asesorías

OBRA: INSTITUCIONAL CENTRO EDUCACIÓN DEL CDI SAN FRANCISCO JAVIER - PIKNINI KANA

INFORME OCTUBRE 03 DEL 2023 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

	
FACHADA LADO NORTE	FACHADA LADO NORTE
	
FACHADA LADO SUR	FACHADA LADO SUR
	
FACHADA LADO OESTE	FACHADA LADO OESTE

Barrio Los Almendros No.11-40 Cel.3166990747 Email: wiljaco14@gmail.com

	
FACHADA LADO ESTE	FACHADA LADO ESTE
	
FACHADA LADO ESTE	FACHADA LADO ESTE

INFORME No 02

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACION DEL CDI SAN FRANCISCO JAVIER - PIKNINI KANA
CONTRATANTE: WILMER JARAMILLO CORDOBA
RESIDENTE: ARQ. IVAN GIOVANNI HERRERA JAY
DIRECCIÓN: AV. SAN LUIS TOM HOOKER
No. DE CONTRATO:
FECHA DE INICIO: 01 DE OCTUBRE 2023

Miércoles 18 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuo con el levante del muro cerramiento

OBRA CUBIERTA

- En este día se continuo con el desmonte de la lámina de ecoroof en mal estado bloque primer piso

- En este día el personal de cubierta está gratiando y aplicando pintura anticorrosivo perfil estructura metálica cubierta bloque primer piso

OBRA ACABADO

- En este día se está raspando los muros de los salones bloque segundo piso
- En este día se está aplicando estuco sobre muros salones bloque segundo piso
- En este día se está aplicando graniplas al espejo de la fachada oeste del bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS





En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando el graniplast al espejo lado oeste del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando el graniplast al espejo lado oeste del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando el graniplast al espejo lado oeste del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando el graniplast al espejo lado oeste del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando el graniplast al espejo lado oeste del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando el graniplast al espejo lado oeste del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiado a perfil en mal estado y aplicación de pintura anticorrosivo a la estructura de la cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiado a perfil en mal estado y aplicación de pintura anticorrosivo a la estructura de la cubierta bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiado a perfil en mal estado y aplicación de pintura anticorrosivo a la estructura de la cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiado a perfil en mal estado y aplicación de pintura anticorrosivo a la estructura de la cubierta bloque primer piso
	

En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiado a perfil en mal estado y aplicación de pintura anticorrosivo a la estructura de la cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando la lámina de ecoroof, gratiado a perfil en mal estado y aplicación de pintura anticorrosivo a la estructura de la cubierta bloque primer piso
	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento

jueves 19 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con el armado del hierro de la viga sobre muro cerramiento
- En este día se comenzó con la formaleta de la columna, formaleta viga sobre muro cerramiento

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con las instalaciones de lámina PVC para cielo raso cielo raso bloque segundo piso
- En este día se instaló el esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso

OBRA CUBIERTA

- En este día se está desmontando los cuerpos de andamio
- En este día se está aplicando pintura sobre lamina súper board para espejo superior fachada este bloque segundo piso

OBRA ELECTRICA

- En este día se cableo para la iluminaria
- En este día se continuo con la instalación de los accesorios tomas
- En este día se instaló los breakers en la caja de circuito

OBRA HIDRAULICO

- En este día se está instalando la bomba y el tanque hidroflo de la cisterna existente

OBRA ALUMINIO

- En este día se está lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS





En esta foto se observa la instalación de esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta está armando el cuerpo de andamio	En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando los cuerpo de andamio
	
En esta foto se observa al personal de cubierta desmontando los cuerpo de andamio	En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de cubierta aplicando pintura sobre la lámina de súper board donde se van a instalar el espejo del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de breakers en la caja de circuitos bloque segundo piso	En esta foto se observa el cableado de iluminación baño bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el cableado de iluminación salones bloque segundo piso	En esta foto se observa el cableado de iluminación salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal eléc-trico instalando tapa tomas	En esta foto se observa el personal eléc-trico instalando tapa tomas
	
En esta foto se observa el levante de una hilada faltante del muro cerramiento	En esta foto se observa el armado hierro de viga muro cerramiento

	
En esta foto se observa el armado hierro de viga muro cerramiento	En esta foto se observa la formaleta de la columna muro cerramiento
	
En esta foto se observa la formaleta de la columna muro cerramiento	En esta foto se observa la formaleta de la columna, viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la formaleta de la columna, viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la formaleta de la columna, viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la formaleta de la columna, viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la formaleta de la columna, viga sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal de plomería instalando la acometida tubo hidráulico	En esta foto se observa la instalación de la acometida tubo hidráulico

	
En esta foto se observa la instalación de la bomba y el tanque hidroflo	En esta foto se observa la instalación de la bomba y el tanque hidroflo
	
En esta foto se observa la instalación de la bomba y el tanque hidroflo	En esta foto se observa el personal de plomería instalando la bomba y el tanque hidroflo

Viernes 20 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con el armado del hierro de la viga sobre muro cerramiento
- En este día se comenzó con la formaleta de la columna, formaleta viga sobre muro cerramiento

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con las instalaciones de lámina PVC para cielo raso cielo raso bloque segundo piso
- En este día se instaló el esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso

OBRA CUBIERTA

- En este día se está armando los cuerpos de andamio para la instalación del canal amazona
- En este día se continuo con el desmonte de la lámina de ecoroof en mal estado bloque primer piso

OBRA ALUMINIO

- En este día se está lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso

OBRA ELECTRICA

- En este día se está instalando las lámparas en el cielo raso bloque primer piso

- **OBRA HIDRAULICO**
- En este día se está instalando la bomba y el tanque hidroflo de la cisterna existente

OBRA INSTALACIONES DE CHAPA PUERTA

- En este día se está instalando la chapa de la puerta de los salones segundo piso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso

	
En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso
	
En esta foto se observa el armado de los andamios para la instalación del canal amazona bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de los andamios para la instalación del canal amazona bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el armado de los andamios para la instalación del canal amazona bloque segundo piso	En esta foto se observa el armado de los andamios para la instalación del canal amazona bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de lámina PVC cielo raso salón bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalaciones de lámparas cielo raso	En esta foto se observa la instalaciones de lámparas cielo raso
	
En esta foto se observa la instalaciones de lámparas cielo raso	En esta foto se observa la instalaciones de lámparas cielo raso

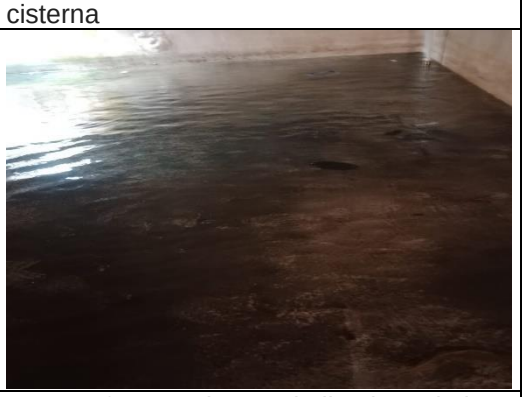
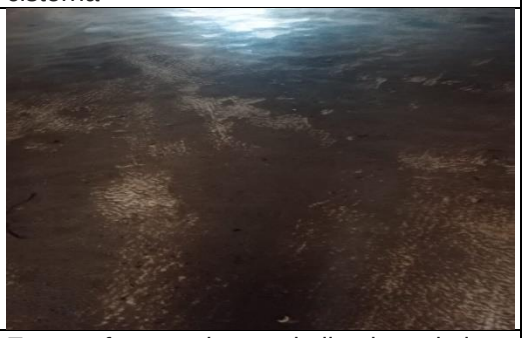
	
En esta foto se observa la instalaciones de lámparas cielo raso	En esta foto se observa la instalaciones de lámparas cielo raso
	
En esta foto se observa el personal eléc-trico instalando tapa tomas	En esta foto se observa el personal eléc-trico instalando tapa tomas
	
En esta foto se observa al personal de aluminio instalando la chapa de la puerta	En esta foto se observa al personal de aluminio instalando la chapa de la puerta
	

En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna y la viga sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventana y fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventana y fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el lavado de la ventana y fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el lavado de la ventana y fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el lavado de la ventana y fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el lavado de la ventana y fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna

	
En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna
	
En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna
	
En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna
	

En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna
	
En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna
	
En esta foto se observa la limpieza de la cisterna	En esta foto se observa la limpieza de la cisterna

sábado 21 de octubre de 2023

- En este día tiempo de lluvia intenso

lunes 23 de octubre de 2023

- En este día tiempo de lluvia intenso

Martes 24 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con el armado del hierro de la viga sobre muro cerramiento
- En este día se comenzó con la formaleta de la columna, formaleta viga sobre muro cerramiento

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con las instalaciones de lámina PVC para cielo raso cielo raso bloque segundo piso

- En este día se instaló el esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso

OBRA CUBIERTA

- En este día se está armando los cuerpos de andamio para la instalación del canal amazona
- En este día se continuo con el desmonte de la lámina de ecoroof en mal estado bloque primer piso

OBRA ALUMINIO

- En este día se está lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso

OBRA ELECTRICA

- En este día se está instalando las lámparas en el cielo raso bloque primer piso

- **OBRA HIDRAULICO**
- En este día se está instalando la bomba y el tanque hidroflo de la cisterna existente

OBRA INSTALACIONES DE CHAPA PUERTA

- En este día se está instalando la chapa de la puerta de los salones segundo piso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 3 OBRA METÁLICO (CUBIERTA)

- Técnico Carpintería Metálica 1
- Oficial 1
- Ayudante 2

CUADRILLA N° 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

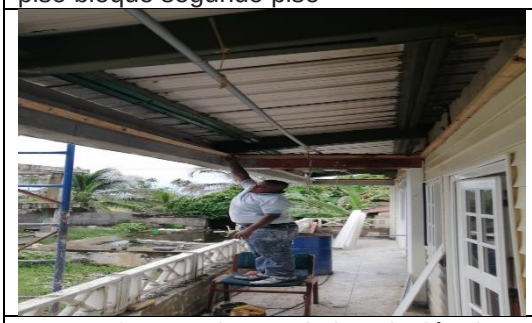
CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

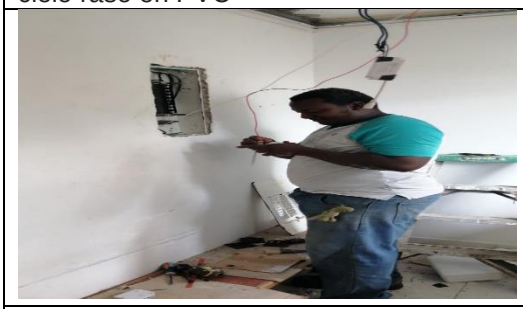
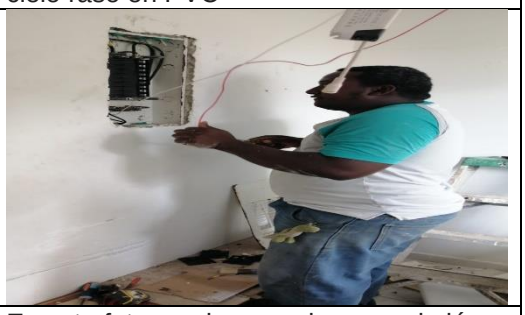
- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la terminación de la instalación de la lámina ecoroof cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa la terminación de la instalación de la lámina ecoroof cubierta bloque primer piso
	
En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso	En esta foto se observa al personal de cubierta cambiando la lámina ecoroof, gratiada de perfil, aplicación de pintura anticorrosivo bloque primer piso

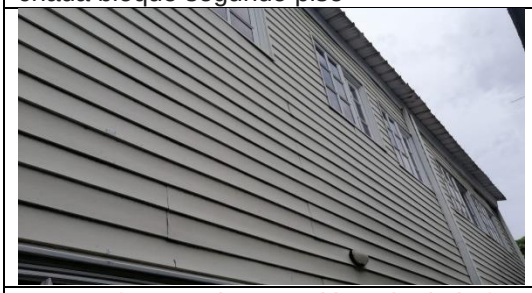
	
En esta foto se observa la terminación de la instalación de la lámina ecoroof cubierta bloque primer piso	En esta foto se observa la terminación de la instalación de la lámina ecoroof cubierta bloque primer piso
	
En esta foto se observa la instalación del de la lámina de súper board espejo bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación del de la lámina de súper board espejo bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación del de la lámina de súper board espejo bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación del de la lámina de súper board espejo bloque segundo piso
	

En esta foto se observa la instalación del de la lámina de súper board espejo bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación del de la lámina de súper board espejo bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de la estructura en listón de madera para la instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de la estructura en listón de madera para la instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de la estructura en listón de madera para la instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de la estructura en listón de madera para la instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de la estructura en listón de madera para la instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de la estructura en listón de madera para la instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la instalación de cielo raso en PVC	En esta foto se observa la instalación de cielo raso en PVC
	
En esta foto se observa la instalación de cielo raso en PVC	En esta foto se observa la instalación de cielo raso en PVC
	
En esta foto se observa el personal eléctrico instalando los breakers del salón primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal eléctrico instalando los breakers del salón primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de lámparas	En esta foto se observa la instalación de lámparas

	
En esta foto se observa la instalación de lámparas	En esta foto se observa la instalación de lámparas
	
En esta foto se observa la instalación de lámparas	En esta foto se observa la instalación de lámparas
	
En esta foto se observa al personal de aluminio está instalando bisagra y chapa puerta acceso salón segundo piso bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de aluminio está instalando bisagra y chapa puerta acceso salón segundo piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de la formaleta de la columna y viga sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la instalación de la formaleta de la columna y viga sobre muro cerramiento

	
En esta foto se observa la excavación de la zanja para la zapata de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa la excavación de la zanja para la zapata de la columna acceso muro cerramiento
	
En esta foto se observa la excavación de la zanja para la zapata de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento
	

En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventana y fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventana y fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque segundo piso
	

En esta foto se observa la instalación del bajante de agua lluvia que conecta del bloque segundo piso a la cisterna	En esta foto se observa la instalación del bajante de agua lluvia que conecta del bloque segundo piso a la cisterna
	
En esta foto se observa la instalación del bajante de agua lluvia que conecta del bloque segundo piso a la cisterna	En esta foto se observa la instalación del bajante de agua lluvia que conecta del bloque segundo piso a la cisterna
	
En esta foto se observa la instalación del bajante de agua lluvia que conecta del bloque segundo piso a la cisterna	

Miércoles 25 de octubre de 2023

OBRA CIELO RASO

- En este día se continuo con las instalaciones de lámina PVC para cielo raso cielo raso bloque segundo piso
- En este día se instaló el esquinero en PVC para instalación de cielo raso en PVC bloque segundo piso

OBRA INSTALACIONES DE CHAPA PUERTA

- En este día se está cambiando la bisagra y la chapa de la puerta de los salones bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba

- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 4 OBRA VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa el armado de andamio para la instalación lámina de súper board espejo bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de Angulo PVC cielo raso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la instalación de Angulo PVC cielo raso bloque segundo piso instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la instalación de Angulo PVC cielo raso bloque segundo piso instalación del cielo raso salón segundo piso bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la instalación de cielo raso en PVC	En esta foto se observa la instalación de cielo raso en PVC
	
En esta foto se observa al personal de aluminio está instalando bisagra y chapa puerta acceso salón segundo piso bloque segundo piso	

viernes 27 de octubre de 2023

OBRA DE CARPINTERIA

- En este día se instálalo la canal amazona bloque nivel 2

OBRA LAVADO DE VENTANAS Y MUROS

- En este día se está lavando fachada norte del bloque nivel 1
- En este día se está lavando la ventaneria del bloque nivel 1

- **OBRA HIDRAULICO**
- En este día se está instalando el tanque de 1000 Litros, mantenimiento sistema hidraulico

OBRA INSTALACIONES DE CHAPA PUERTA

- En este día se está cambiando la bisagra y la chapa de la puerta de los salones bloque segundo piso

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con la formaleta de la columna muro cerramiento
- En este día se comenzó con la fundida en concreto columna muro cerramiento
- En este día se terminó el pañete muro exterior fachada sur muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este día se está raspando los muros bajos baranda balcón bloque nivel 2
- En este día se está raspando los muros bajos baranda escalera bloque nivel 2
- En este dia se está aplicando estuco a los muros internos del bloque nivel 2
- En este día se está raspando el muro de la fachada sur bloque nivel 1
- En este dia se está aplicando pintura a los muros internos del bloque nivel 2

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 4 OBRA VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

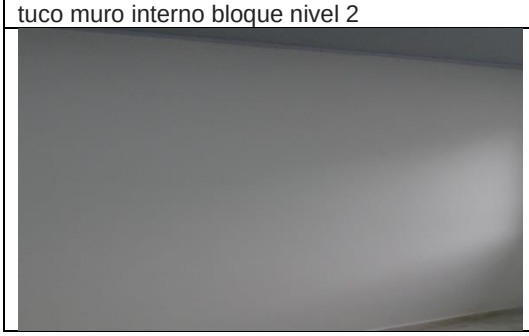
CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>En esta foto se observa el raspado del muro en mal estado fachada sur bloque nivel 1</td><td>En esta foto se observa el raspado del muro en mal estado fachada sur bloque nivel 1</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

En esta foto se observa la instalación del canal amazona bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del canal amazona bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la instalación del canal amazona bloque nivel 2	En esta foto se observa la instalación del canal amazona bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acaba-dos raspando quitando el estuco, pintura con mojo muro bajo baranda balcón bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acaba-dos raspando quitando el estuco, pintura con mojo muro bajo baranda balcón bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acaba-dos raspando quitando el estuco, pintura con mojo muro bajo baranda escalera bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acaba-dos raspando quitando el estuco, pintura con mojo muro bajo baranda escalera bloque nivel 2

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco muro interno bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando pintura a los muros internos del bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando pintura a los muros internos del bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de estuco muro interno bloque nivel 2
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco muro interno bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de estuco muro interno bloque nivel 2
	

En esta foto se observa la aplicación de estuco muro interno bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de estuco muro interno bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aluminio está instalando bisagra y chapa puerta acceso salón segundo piso bloque segundo piso	
	
En esta foto se observa el armado de la formaleta de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa el armado de la formaleta de la columna acceso muro cerramiento
	
En esta foto se observa el armado de la formaleta de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa el armado de la formaleta de la columna acceso muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil fundiendo el concreto de la columna acceso muro cerramiento
	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento del lado sur	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento del lado sur

	
En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento del lado sur	En esta foto se observa la aplicación del pañete sobre muro cerramiento del lado sur
	
En esta foto se observa al personal de plomería instalando el tanque de 1000 litros del tanque elevado bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de plomería instalando el tanque de 1000 litros del tanque elevado bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso	En esta foto se observa el personal de aluminio lavando la ventaría en PVC salones bloque segundo piso
	

En esta foto se observa el desmonte de la ventana en PVC	En esta foto se observa el desmonte de la ventana en PVC
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada norte bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1

	
En esta foto se observa el lavado de la fachada norte bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada norte bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada bloque nivel 1

sábado 28 de octubre de 2023

OBRA DE CARPINTERIA

- En este día se instálalo la canal amazona bloque nivel 2

OBRA LAVADO DE VENTANAS Y MUROS

- En este día se está lavando fachada norte del bloque nivel 1
- En este día se está lavando la ventaneria del bloque nivel 1

- **OBRA HIDRAULICO**
- En este día se está instalando el tanque de 1000 Litros, mantenimiento sistema hidraulico

OBRA INSTALACIONES DE CHAPA PUERTA

- En este día se está cambiando la bisagra y la chapa de la puerta de los salones bloque segundo piso

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con el desencofrado de la formaleta de la columna muro cerramiento
- En este día se comenzó con el levante del muro cerramiento

OBRA ACABADO

- En este dia se está lijando muros internos del bloque nivel 2
- En este dia se está aplicando graniplast a los muros internos del bloque nivel 2

OBRA ELECTRICO

- En este día se comenzó con la instalación punto eléctrico cuarto de bomba

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA N° 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 4 OBRA VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS





En esta foto se observa el raspado del muro en mal estado fachada sur bloque nivel 1	n esta foto se observa el raspado del muro en mal estado fachada sur bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de acabado lijando el muro interno bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado lijando el muro interno bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado lijando el muro interno bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado lijando el muro interno bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre el muro bajo del balcón 2do piso bloque nivel 2	En esta foto se observa la aplicación de graniplast sobre muro bajo del balcón bloque nivel 2

	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre el muro bajo del balcón 2do piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de acabado aplicando graniplast sobre el muro bajo del balcón 2do piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal de aluminio está remplazando el vidrio que se quebró, puerta acceso salón segundo piso bloque nivel 2	En esta foto se observa al personal de aluminio está remplazando el vidrio que se quebró, puerta acceso salón segundo piso bloque nivel 2
	
En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna acceso muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil desencofrando la formaleta de la columna acceso muro cerramiento

	
En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento
	

En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa al personal civil comenzando con el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando el punto eléctrico para la bomba	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando el punto eléctrico para la bomba
	
En esta foto se observa al personal eléctrico instalando el punto eléctrico para la bomba	En esta foto se observa al personal eléctrico instalando el punto eléctrico para la bomba

	
En esta foto se observa la instalación del tanque elevado bloque nivel 1	En esta foto se observa la instalación del tanque elevado bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada norte bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada norte bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1
	
En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1	En esta foto se observa al personal de lavado lavando la fachada norte del bloque nivel 1

	
En esta foto se observa el lavado de la fachada este bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada oeste bloque nivel 1
	
En esta foto se observa el lavado de la fachada sur bloque nivel 1	En esta foto se observa el lavado de la fachada sur bloque nivel 1

lunes 30 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se continuo con el levante muro cerramiento

OBRA CIELO RASO

En este día se continuo con la instalaciones de lámina PVC para cielo raso cielo raso bloque segundo piso

OBRA ACABADO

- En este día se continuo con el raspado muro bajo escalera
- En este día se comenzó con la aplicación de estuco sobre muro interior primer piso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO

CUADRILLA N° 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 7 OBRA CARPINTERIA CIELO RASO

- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA N° 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interior del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado raspando los pasamanos de la escalera del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa al personal de carpintería metálica instalando el cielo raso en PVC del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de carpintería metálica instalando el cielo raso en PVC del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	

En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa el desencofrado de la columna muro cerramiento	En esta foto se observa el desencofrado de la columna muro cerramiento

martes 31 de octubre de 2023

OBRA CIVIL

- En este día se comenzó con el armado de hierro para columna muro cerramiento
- En este día se comenzó con la formaleta muro cerramiento
- En este día se comenzó con el vaciado de columna amarre muro cerramiento

OBRA CIELO RASO

En este día se continuo con la instalación de lámina PVC para cielo raso cielo raso bloque segundo piso

OBRA ACABADO

- En este día se continuo con la aplicación de graniplast sobre muro bajo escalera
- En este día se comenzó con la aplicación de estuco sobre muro interior primer piso bloque segundo piso
- En este día se comenzó con la aplicación de estuco sobre muro interior bloque primer piso

OBRA ELECTRICO

- En este día se continuo con el cambio de lámparas en los salones del primer piso bloque segundo piso

PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORÍA

- Director de interventoría:

PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

- Director de obra: Ingeniero Wilmer Jaramillo Córdoba
- Residente de obra: Arquitecto Iván Giovanni Herrera Jay

PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATISTA

CUADRILLA No 1 OBRA CIVIL

- Maestro de obra 1
- Oficial 1
- Ayudante 1

CUADRILLA No 2 OBRA ELÉCTRICO

- Técnico electricista 3
- Ayudante 1

CUADRILLA No 4 OBRA LAVADO VENTANERIA EN PVC

- Técnico en ventanearía 1
- Ayudante 1

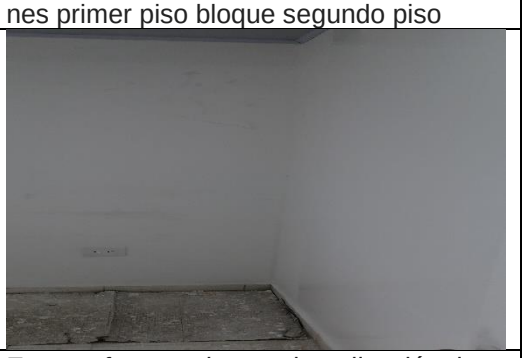
CUADRILLA No 5 OBRA PLOMERIA

- Técnico en hidrosanitario
- Oficial 1
- Ayudante 0

CUADRILLA No 6 OBRA ACABADOS

- Técnico de Acabados
- Oficial 2
- Ayudante 0

REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso

	
En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso	En esta foto se observa la aplicación de estuco sobre muros internos de los salones primer piso bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de acabado aplicando estuco sobre muro interior del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de acabado raspando los pasamanos de la escalera del bloque segundo piso
	
En esta foto se observa al personal de carpintería metálica instalando el cielo raso en PVC del bloque segundo piso	En esta foto se observa al personal de carpintería metálica instalando el cielo raso en PVC del bloque segundo piso

	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	

En esta foto se observa el levante del muro cerramiento	En esta foto se observa el levante del muro cerramiento
	
En esta foto se observa el desencofrado de la columna muro cerramiento	En esta foto se observa el desencofrado de la columna muro cerramiento

ESTADO DEL TIEMPO

	MES DE OCTUBRE 2023					
DOMINGO	**LUNES**	**MARTES**	**MIERCOLES**	**JUEVES**	**VIERNES**	**SABADO**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
15	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**
22	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
29	**30**	**31**				

TIEMPO SECO	**T.S.**	
LLUVIA MODERADO	**LL. M.**	
LLUVIA INTENSO	**LL. I.**	
LLUVIA CON RELAMPAGO	**LL. C. R.**	
LLUVIA CON BRISA	**LL. C. B.**	
DIA DE FESTIVO	**D.F.**	

PERSONAL DE TRABAJO OBRA EILMER JARRAMILLO

ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 1 Albañilería	Maestro de Obra	1	Técnico de construcción	1
02	Personal N.º 1 Albañilería	Oficial de Obra	1	Oficial	1

03	Personal N.º 1 Albañilería	Ayudante de Obra	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 2 Eléctrico	Técnico electricista	1	Técnico	1
02	Personal N.º 2 Eléctrico	Ayudante de Obra	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	cuadrilla N° 3 carpintería metálico cubierta	Técnico carpintería metálico	1	Técnico	1
02	cuadrilla N° 3 carpintería metálico cubierta	Ayudante carpintería metálico	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	cuadrilla N° 4 carpintería metálico Aluminio	Técnico carpintería metálico Aluminio	1	Técnico	1
02	cuadrilla N° 4 carpintería metálico Aluminio	Ayudante carpintería metálico Aluminio	1	Ayudante	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 5 Plomería	Técnico de Plomería	1	Técnico	1
02	Personal N.º 5 Plomería	Ayudante de Obra	0	Ayudante	0
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 6 Acabado	Oficial de acabado	2	Técnico	2

02	Personal N.º 6 Acabado	Ayudante de Acabado			
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º 7 Carpintería	Técnico en Carpintería	1	Técnico en Carpintería	1
02	Personal N.° 7 Carpintería	Ayudante Carpintería	1	Ayudante Carpintería	1
ITEM	GRUPO	OFICIO	UNIDAD	OFICIO	UNIDAD
01	Personal N.º8 Transporte y Aseo	Conductor	1	Conductor	1
02	Personal N.º 8 Transporte y Aseo	Ayudante Conductor	1	Ayudante Conductor	1

HERRAMIENTA MENORES Y EQUIPOS EN LA OBRA

ITEM	HERRAMIENTA MENORES	CANTIDAD
01	PALA	2
02	BARRA	1
03	EXTENSIÓN	3
04	NIVEL DE MAGUERA	1
05	PICO	1
ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD
05	ESCALERA DE TIJERA	3
06	TALADRO ELECTRICO PEQUEÑO	2
07	TALADRO ELECTRICO GRANDE	2
08	CUERPO DE ANDAMIO	6
09	TABLON	6
10	TIJERA	12
11	POLEA	0
12	ARNES	1

13	PULIDORA PEQUEÑA	4
14	PULIDORA GRANDE	2
15	MAQUINA DE SOLDADURA	0
16	MAQUINA PONCHADORA	0
17	COMPRESOR	0
18	NIVEL LACER	0
19	CARETILLA	1

Notas:

Residente de Obra



IVAN GIOVANNI HERRERA JAY
ARQUITECTO / ARCHITECT CUC
MAT. PROF. A08112000-18002862-ATL
CEL: 3154802091
E-MAIL: vannilyconet@gmail.com
