Santiago de Cali, diciembre 27 de 2023

Señores:

Unidad Administrativa Especial De Servicios Públicos (UAESP)
Arles Octavio Lemos Castro
Supervisor
Cl. 7 # 4-70 Centro Cultura


Asunto: Solicitud de suspensión contrato de obra N.º 4182.010.26.1.712-2023, el cual tiene como objeto *INTERVENIR ANDENES Y ZONAS VERDES IMPACTADOS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTIAGO DE CALI.*

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito se exponen las causas que por motivos ajenos a nuestra voluntad generan la solicitud de suspensión.

LA EMPRESA R&RCONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S en calidad de Contratista, solicita suspensión del contrato de obra N.º 4182.010.26.1.712-2023, fundamentado en las siguientes consideraciones:


La solicitud se realiza teniendo en cuenta que la ola invernal que se ha presentado en la Ciudad de Cali ha retrasado la actividad de Compactación del terreno, actividad que contempla el 80% del área a intervenir y es sucesora de las actividades ya ejecutadas correspondientes a descapote y excavación, siendo está un requisito técnico para continuar con la estructura del sendero peatonal.

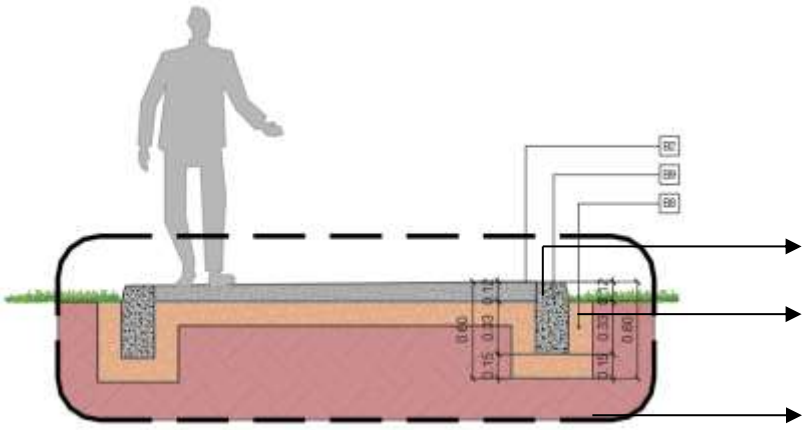

Esta situación retrasa la ejecución de las actividades sucesoras como son fundición e instalación de bordillo, relleno Roca muerta, Sub – base y nivelación de terreno, consideramos pertinente esperar a que el terreno se encuentre en óptimas condiciones para retomar actividades y garantizar la buena compactación de la zona y que la estructura del sendero peatonal se construye cumpliendo con las recomendaciones técnicas y sobre unas base o terreno sólido, teniendo en cuenta que según el reporte climático se pronostica 14 días del mes de enero de lluvias en la zona.


Por medio del presente escrito se expone el reporte climático en los últimos días según el IDEAM haciendo énfasis en el departamento del VALLE DEL CAUCA, departamento en el cual se encuentra localizado el lugar de intervención el cual corresponde a la Ciudad de Santiago de Cali – Barrio Vipasa – Calle 44 con Avenida 2ª.

- 25 Diciembre 2023 - Boletín No 359 – Dia lluvias y pronóstico de lluvias con descargas eléctricas

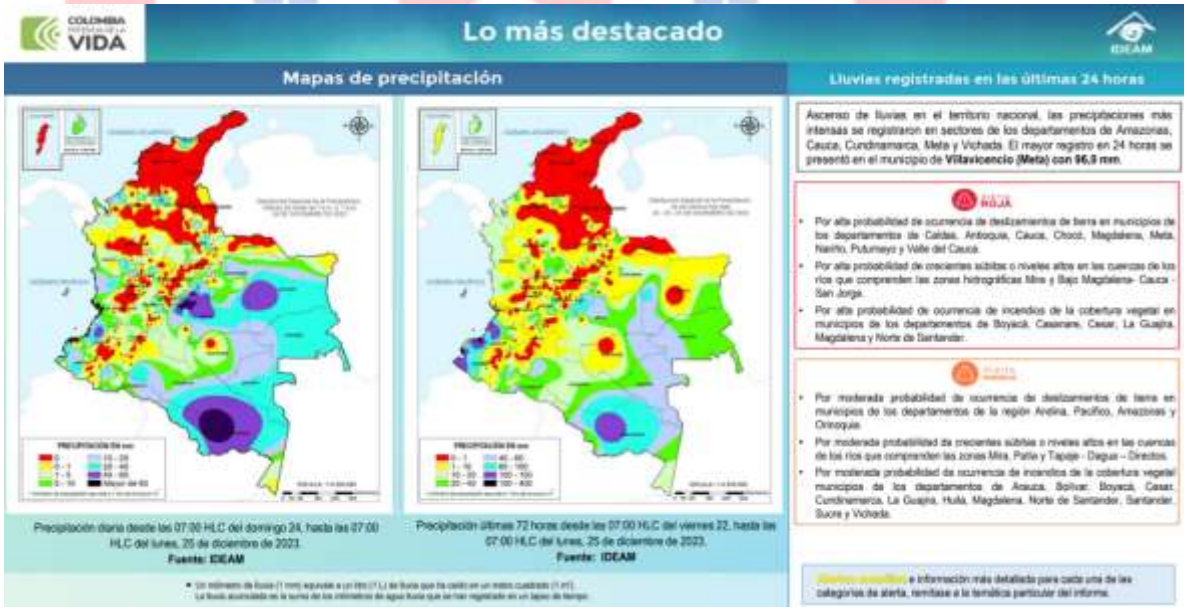




- 23 Diciembre 2026 – Boletín No 357 – Dia lluvias intensas y pronóstico de lluvias.

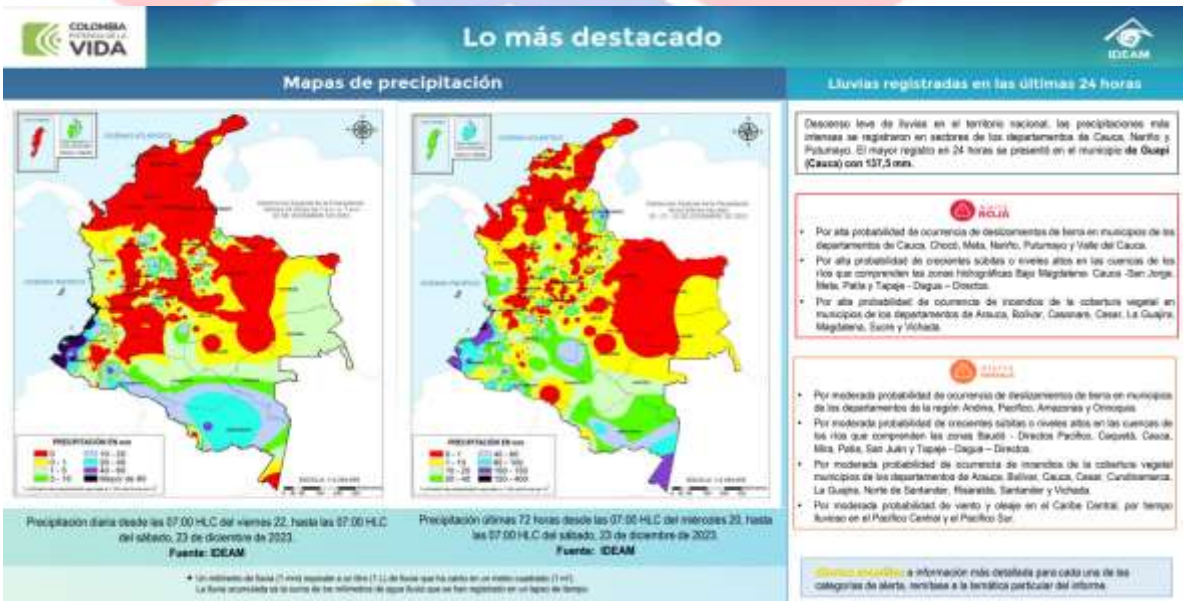




- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier periodo temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

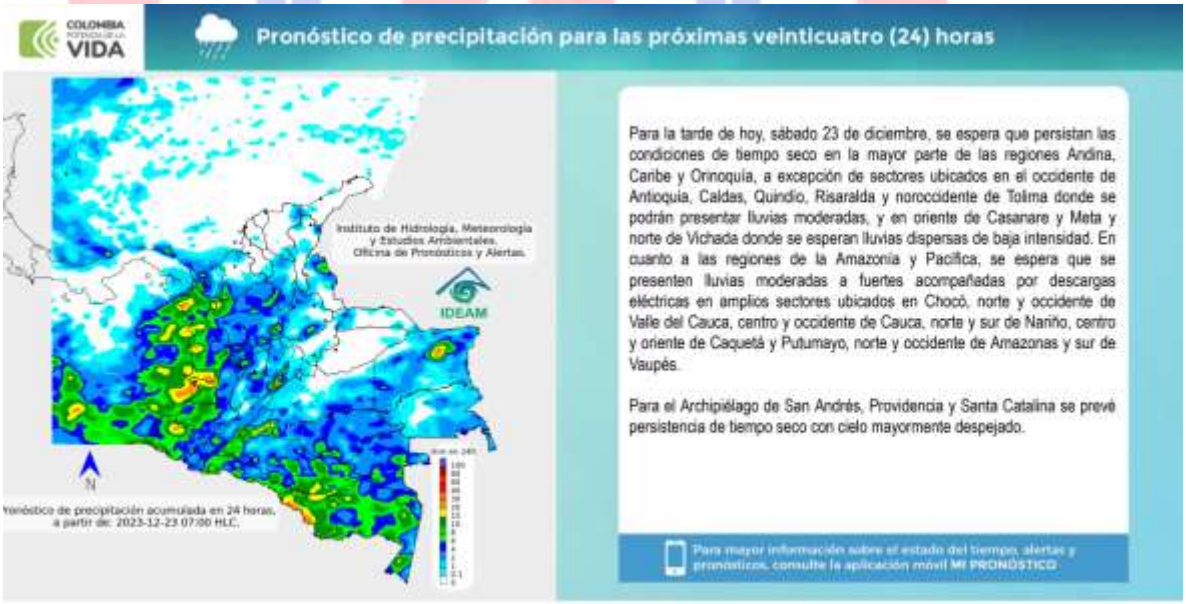


- La resolución espacial del mapa de pronóstico es de 6.5 km aproximadamente. Por lo tanto, fenómenos meteorológicos inferiores a esta escala no están considerados en esta predicción.
- La escala de colores está asociada a un rango de precipitación en el intervalo de tiempo indicado, lo que implica que el pronóstico no es determinista (un valor exacto en una zona) sino corresponde a un pronóstico cuantitativo (un rango de valores en una zona).

- 22 Diciembre 2023 – Boletín No 356 : Dia de lluvia y pronóstico de lluvias intensas.

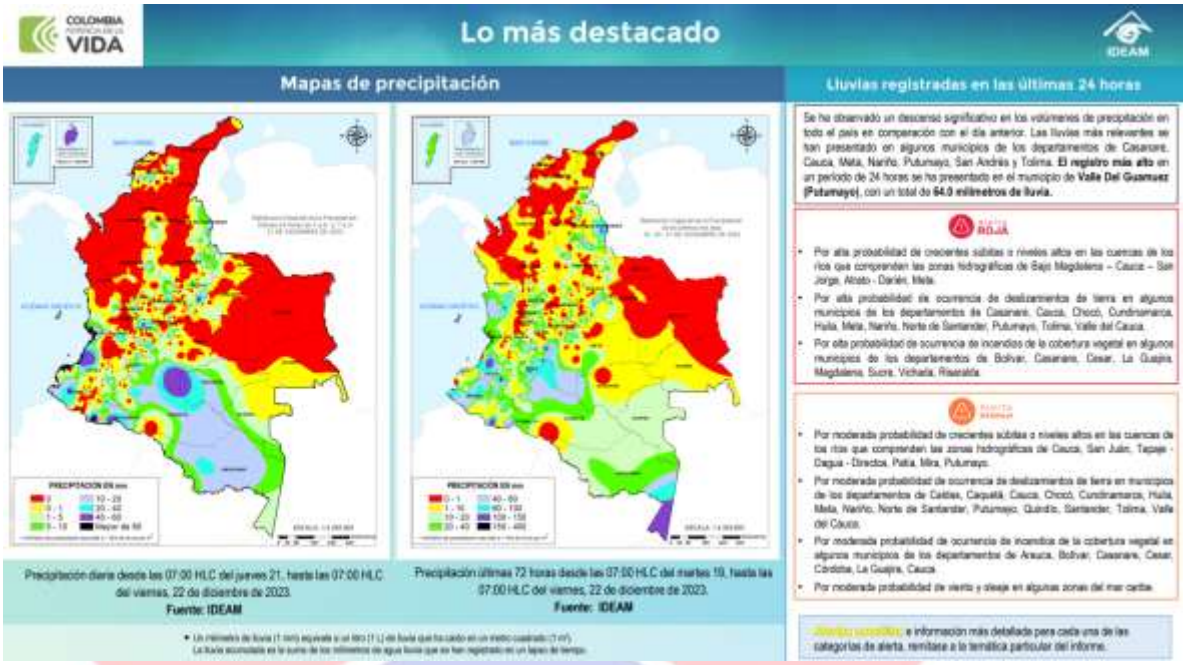



• La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier período temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
• La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

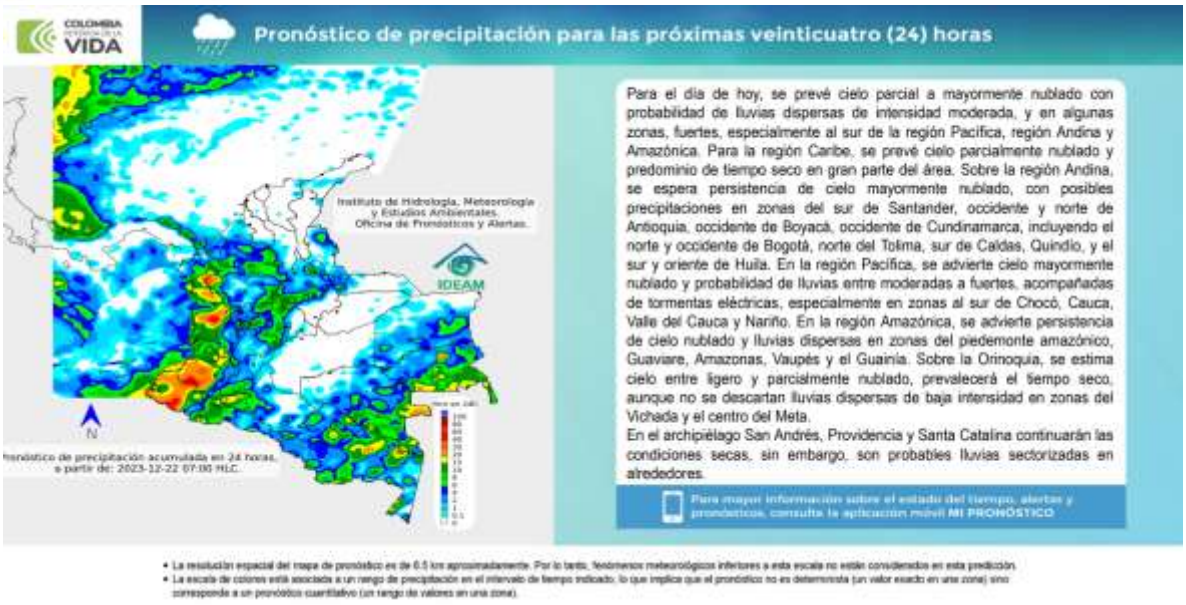

Pronostico del tiempo enero 2024.



Clima promedio en Cali en enero de 2024

El tiempo en Cali en enero 2024 cuenta con unas de **temperaturas bajas 16°C y altas de 25°C.**

Es la temperatura perfecta para explorar Cali sin sentir ni mucho calor ni mucho frío.

Habrá muchos días de lluvia durante el mes de enero en Cali. Se espera un promedio de **15 a 22 días de lluvia en Cali**, así que asegúrate de salir de casa con un buen chubasquero.

Para conocer el pronóstico del tiempo actual, de manera precisa, consulta la página de pronóstico del tiempo para 14 días en Cali.

Por lo anteriormente expuesto, la empresa R&RCONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S en aras de ejecutar a entera satisfacción el objeto contractual, solicita de manera cordial suspender el contrato de obra N.º 4182.010.26.1.712-2023 por veinte (20) días calendario.

YONNY ALEXANDER MOSQUERA ROMAÑA
R.L R&RCONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
C.C: 1077443287
