CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 10
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 10
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000583 H3 de la vigencia 2023
Nombre del Contratista:	CENTRAL DE EQUIPOS Y MONTAJES SAS
Periodo informe:	19 de mayo de 2023 – 13 de junio de 2023
Nombre de Supervisor:	YASSET ALFONSO VEJAR URIBE
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	Grupo de Mantenimiento Sistemas de Ayudas a la Navegación Aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BANDAS TRANSPORTADORAS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE
1	Desmonte general para revisión, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de banda transportadora	unidad	1	100 %
2	Revisión de estructura articulada	unidad	1	100 %
3	Revisión de pasadores y bujes de rodachinas	unidad	1	100 %
4	Revisión y alineación de platinas y soportes de la estructura articuladas	unidad	1	100 %
5	Desmonte y revisión del sistema motriz (motorreductor y unidad caterpillar)	unidad	1	100 %
6	Suministro y cambio de pasadores de empuje a cadena de arrastre Unidad Caterpillar	unidad	1	100 %
7	Suministro e instalación de aletas	unidad	37	100 %
8	Suministro y cambio de ruedas en Hytrel con rodamiento 6202zz	unidad	20	100 %
9	Cambio general de tornillería en mal estado	global	1	100 %
10	Suministro y cambio de platinas y bujes guías en mal estado	global	1	100 %
11	Suministro e instalación de tacos de engranaje	unidad	20	100 %
12	Tablero con medidor y sistema de control y automatismo de señalización de arranque	unidad	1	100 %

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE
13	Suministro e instalación de sirena para señalización sonora de arranque de banda transportadora	unidad	1	100 %
14	Suministro e instalación de Baliza monolítica de dos colores (verde y rojo) para señalización de arranque de motor	unidad	1	100 %
15	Elaboración de fichas técnicas de piezas de la banda transportadora para futuros procesos	global	1	100 %

REGISTRO FOTOGRÁFICO
















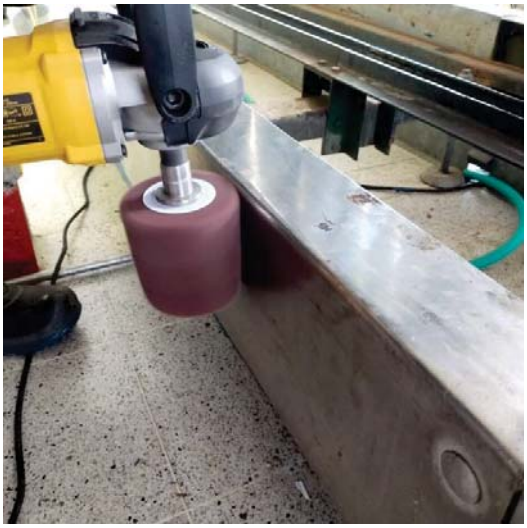




MEDIDOR DE ENERGIA
HOROMETRO
RIESGO ELECTRICO
CENTRAL DE EQUIPOS




















MEDIDOR DE ENERGIA
HOROMETRO









a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE
1	Desmonte general para revisión, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de banda transportadora	unidad	1	100 %
2	Revisión de estructura articulada	unidad	1	100 %
3	Revisión de pasadores y bujes de rodachinas	unidad	1	100 %
4	Revisión y alineación de platinas y soportes de la estructura articuladas	unidad	1	100 %
5	Desmonte y revisión del sistema motriz (motorreductor y unidad caterpillar)	unidad	1	100 %

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	AVANCE
6	Suministro y cambio de pasadores de empuje a cadena de arrastre Unidad Caterpillar	unidad	1	100 %
7	Suministro e instalación de aletas	unidad	37	100 %
8	Suministro y cambio de ruedas en Hytrel con rodamiento 6202zz	unidad	20	100 %
9	Cambio general de tornillería en mal estado	global	1	100 %
10	Suministro y cambio de platinas y bujes guías en mal estado	global	1	100 %
11	Suministro e instalación de tacos de engranaje	unidad	20	100 %
12	Tablero con medidor y sistema de control y automatismo de señalización de arranque	unidad	1	100 %
13	Suministro e instalación de sirena para señalización sonora de arranque de banda transportadora	unidad	1	100 %
14	Suministro e instalación de Baliza monolítica de dos colores (verde y rojo) para señalización de arranque de motor	unidad	1	100 %
15	Elaboración de fichas técnicas de piezas de la banda transportadora para futuros procesos	global	1	100 %

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: NO HAY		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
×	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	×	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El avance presupuestal corresponde al 0%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El avance de ejecución corresponde al 100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Yasset A. Véjar U.

YASSET ALFONSO VEJAR URIBE
C.C. 80.000.015
SUPERVISOR
