ALCALDIA MUNICIPAL PUERTO SALGAR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	26/12/2023
CONTRATO DE OBRA	326--2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME MALDONADO MORA
CONTRATISTA:	INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA / REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
SUPERVISOR	ING. ANDERSON JULIAN MONTERO GARZON
APOYO SUPERVISOR	ING. LENIN OSWALDO RUEDA USME
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.250.000
VALOR ADICIONADO 01	$ 750.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR PAGADO	$ 0
VALOR A PAGAR	$ 20.000.000
SALDO POR EJECUTAR:	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION (%)	100,00%
PLAZO INICIAL	25 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE DICIEMBRE DEL 2023

En la alcaldia de Puerto Salgar, se reunieron: El ING. LENIN OSWALDO RUEDA USME, JEFE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA oficina asesora de planeacion en calidad de SUPERVISOR y el señor JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS identificado con C.C. 19.138.986 expedida en Bogotá D.C, en calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta final del CONTRATO DE OBRA NO.326-2023 donde se ejecutaron las actividades necesarias que conllevaran al cumplimiento del objeto del contrato en mención.

CONSIDERANDO

Que una vez realizado el acta final presentado por el contratista del CONTRATO DE OBRA NO.326-2023, el cual fue aprobado por el SUPERVISOR del contrato, se ejecutan actividades de la construccion de 8 placas de concreto en EL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE EN EL SECTOR ESCUELA

Que a continuación se relaciona el desembolso a realizarle al contratista:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR A CANCELAR
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	26 de diciembre de 2023	$ 20.000.000,00
VALOR FINAL		**$ 20.000.000,00**

El valor de la presente acta es de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20,000,000), M/CTE

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:
Anexo: Memoria de Actividades Ejecutadas con Registro Fotográfico.

ING ANDERSON JULIAN MONTERO G.
SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA NO.326- 2023

CONTRATO DE OBRA NO.326- 2023

INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA/ REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS

SUPERVISOR: ING. ANDERSON JULIAN MONTERO G.

FECHA: 26DE DICIEMBRE DEL 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO			ACTA FINAL	
			CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	10,05	$ 64.900	$ 652.245	10,05	$ 652.245
365,1	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	M3	9,67	$ 152.450	$ 1.474.248	9,67	$ 1.474.248
330,1	BASE GRANULAR	M3	9,45	$ 282.850	$ 2.672.933	9,45	$ 2.672.933
4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	188,00	$ 11.850	$ 2.227.800	188,00	$ 2.227.800
500,1	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	10,05	$ 855.500	$ 8.597.775	10,05	$ 8.597.775
	COSTOS DIRECTOS				**$ 15.625.000**	**CANTIDAD EJECUTADA CONTRATO**	**$15.625.000**
	ADMINISTRACION (21%)				**$3.281.250,00**	**A-- 21%**	**$3.281.250**
	IMPREVISTOS (2%)				**$312.500,00**	**I--2%**	**$312.500**
	UTILIDAD (5%)				**$781.250,00**	**U-- 5%**	**$781.250**
	COSTO DIRECTO TOTAL CONTRATO				**$20.000.000,00**	**VALOR EJECUTADO**	**$20.000.000,00**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				**$19.250.000,00**		
	VALOR ADICIONADO NO.01				**$750.000,00**		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$20.000.000,00**		
	VALOR PAGADO POR PARTE DEL MUNICIPIO				**$0**		
	VALOR A PAGAR POR PARTE DEL MUNICIPIO				**$20.000.000**		
	PORCENTAJE DE EJECUCION (%)				**100,00%**		
	SALDO POR EJECUTAR				**$0**		
	VALOR A LIBERAR PRESUPUESTALMENTE				**$0**		

ING ANDERSON JULIAN MONTERO G.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA NO.326-2023

CONTRATISTA	INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA / REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
SUPERVISOR	ING JULIAN MONTERO


FECHA	DICIEMBRE DEL 2023

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE	LUGAR	CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE EN EL SECTOR ESCUELA

ITEM:	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	UND.	M3	REF.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LOCALIZACION	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
VIA FRENTE A LA ESCUELA	7,00	3,00	3,00	0,15	9,45
VIA FRENTE A LA ESCUELA	1,00	2,00	2,00	0,15	0,60
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL					10,05

REGISTRO FOTOGRAFICO

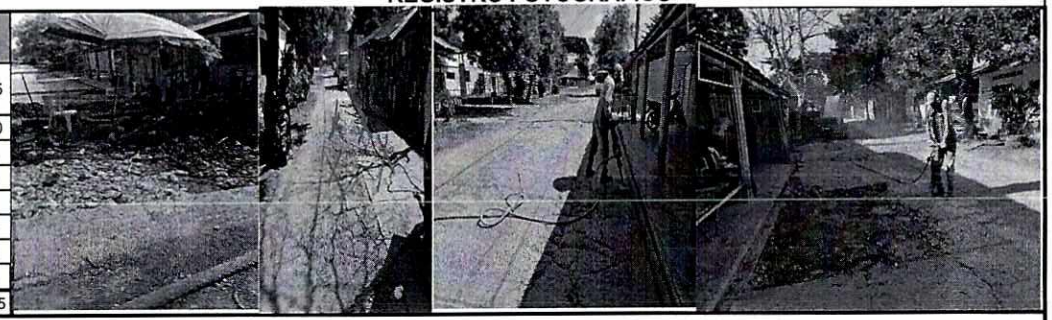

ING LENIN OSWALDO RUEDA USME
APOYO SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA NO.326-2023

CONTRATISTA	INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA / REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS	FECHA	DICIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR	ING JULIAN MONTERO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE	LUGAR	CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE EN EL SECTOR ESCUELA

ITEM:	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 Km)	UND.	M3	REF.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LOCALIZACION	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
VIA FRENTE A LA ESCUELA	7,00	3,00	3,00	0,15	9,45
VIA FRENTE A LA ESCUELA	1,00	1,45	1,00	0,15	0,22
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL					9,67

REGISTRO FOTOGRAFICO



ING LENIN OSWALDO RUEDA USME
APOYO SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA NO.326-2023


CONTRATISTA	INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA / REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS	FECHA	DICIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR	ING JULIAN MONTERO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE	LUGAR	CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE EN EL SECTOR ESCUELA

ITEM:	BASE GRANULAR	UND.	M3	REF.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LOCALIZACION	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
VIA FRENTE A LA ESCUELA	7,00	3,00	3,00	0,15	9,45
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL					9,45

REGISTRO FOTOGRAFICO

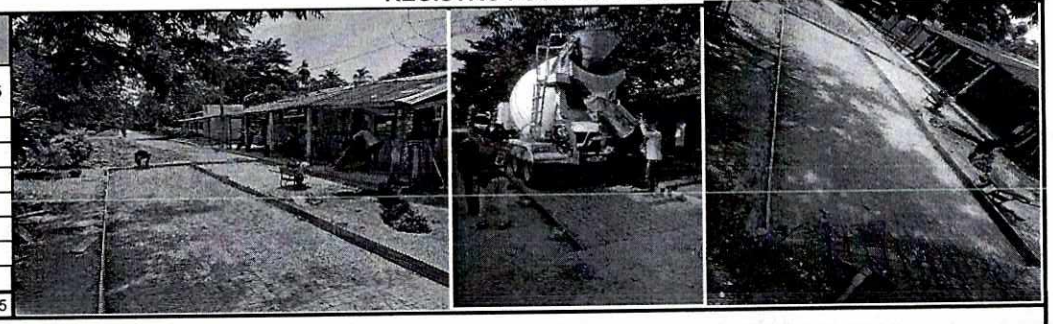

ING LENIN OSWALDO RUEDA USME
APOYO SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA NO.326-2023

CONTRATISTA	INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA / REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS	FECHA	DICIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR	ING JULIAN MONTERO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE	LUGAR	CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE EN EL SECTOR ESCUELA

ITEM:	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	UND.	KG	REF.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LOCALIZACION	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	kg/m	
VIA FRENTE A LA ESCUELA	7,00	3,00	3,00	2,98	188,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL					188,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



ING LENIN OSWALDO RUEDA USME
APOYO SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA CONTRATO DE OBRA NO.326-2023


CONTRATISTA	INGENIERIA CIVIL Y CONSULTORÍA AMBIENTAL LTDA "INCORET LTDA / REPRESENTANTE LEGAL JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS	FECHA	DICIEMBRE DEL 2023
SUPERVISOR	ING JULIAN MONTERO		

OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE SUSTITUCION DEL PAVIMENTO EXISTENTE POR PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE	LUGAR	CENTRO POBLADO DE PUERTO LIBRE EN EL SECTOR ESCUELA

ITEM:	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	UND.	M3	REF.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

LOCALIZACION	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	
VIA FRENTE A LA ESCUELA	7,00	3,00	3,00	0,15	9,45
VIA FRENTE A LA ESCUELA	1,00	2,00	2,00	0,15	0,60
					-
					-
					-
					-
					-
TOTAL					10,05

REGISTRO FOTOGRAFICO

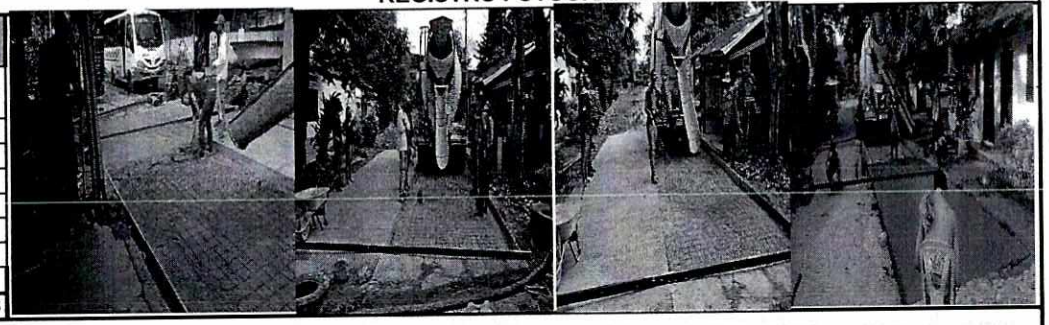

ING LENIN OSWALDO RUEDA USME
APOYO SUPERVISOR

JORGE ELIECER CAJIGAS PINEDAS
REPRESENTANTE LEGAL
