CONSORCIO INTER AMV - ANEZGA

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente, el CONSORCIO INTER AMV-ANEZGA certifica que RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS Identificado con NIT 79623949-5 en calidad de contratista de obra para CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°173-ICFE-2023 GRUPO 2, cuyo objeto es "Mantenimiento A Todo Costo De Las Cubiertas De Los Edificios De Apartamentos De Viviendas Fiscales Para El Personal De Oficiales Y Suboficiales En Bogotá Y A Nivel Nacional, Grupo 2", se encuentra a paz y salvo por concepto de servicios públicos para el mes de enero del 2024.

Atentamente,

Arq. Andrés Martínez V.
Representante Legal

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	85153591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID JOSE BARROS ATEHORTUA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CONDOMINIO PEÑABERQL CASA 142	TELÉFONO:	3205232
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4535183922	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2024
DIAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997775190

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 208.000	$ 400	$ 208.400
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 400**	**$ 208.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 162.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 85153591	BARROS ATEHORTUA DAVID JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	$ 85153591	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 378.100

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019066798	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ESPINOSA		CLL 23D # 72 B - 89	6879512	mafe_9201@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	23/02/2024	74656250	$710.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	286.000	0		0		0	1	300	0	286.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	366.100	0	0	0	0	1	400	0	366.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.000				12.000	1	100	12.100			120	12.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	45.800	1	100	45.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	286.000	286.300
Pensión	1	366.100	366.500
Riesgos Laborales	1	12.000	12.100
CCF	1	45.800	45.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	709.900	710.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1019066798	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ESPINOSA		CLL 23D # 72 B - 89	6879512	mafe_9201@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	23/02/2024	74656250	$710.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019066798	RODRIGUEZ ESPINOSA MARIA FERNANDA	59	0			N																	230301	2.288.000	366.100	0	0	0	0	EPS001	2.288.000	286.000	14-23	2.288.000	1	12.000	CCF24	2.288.000	45.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS	CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	13/02/2024	74742377	$1.902.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.900.500				1.900.500	1	1.800	1.902.300			19.005	1.902.300	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.900.500	1.902.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.900.500	1.902.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS		CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	13/02/2024	74742377	$1.902.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020749088	CASTRO QUINTERO LINA PAOLA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1079938820	Garcia Galan Breyner Asaith	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1082907929	SIERRA ANGULO CRISTHIAN LEONARDO	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1082990441	POLANCO TAFUR OMAR YESID	59	0			N		R																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
5	CC	108343104	CEBALLOS SUAREZ CRISTIAN ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1083463251	GUERRERO TORRES ARMANDO ARTURO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1083557114	ZUÑIGA RODRIGUEZ YENNIS PAOLA	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1098687645	IGLESIAS ACUÑA JHAN CARLOS	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1118836194	PEREZ OÑATE ROBERTO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1235540959	AVENDAÑO MONTERO JHON BAIRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
11	CC	19273565	LLANOS PEREZ WALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
12	CC	19589135	REYES ESTRADA FRANKLIN ABEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	5007470	IGLESIAS BELEÑO MANUEL PIO	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
14	CC	60446697	HIDALGO NIÑO HEIDY LORENA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
15	CC	7602563	CANTILLO ARAGON HUMBERTO RAFAEL	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
16	CC	7604958	AVENDAÑO ROJAS YASIR ANTONIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
17	CC	84025724	SUAREZ DAZA HERNAN RAFAEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
18	CC	84455095	MANTILLA CASTELLANO JARRISON	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
19	CC	84459665	ALMANZA LURAN JOAN ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
20	CC	85153591	BARROS ATEHORTUA DAVID JOSE	59	0			N		R																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0
21	CC	85473801	RODRIGUEZ BONILLA BEDREDIN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS	CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	16/02/2024	74740487	$475.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	187.500	0		0		0	4	700	0	188.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	4	900	0	240.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.600				36.600	4	200	36.800			366	36.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	9.000	4	100	9.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	188.200
Pensión	1	240.000	240.900
Riesgos Laborales	1	36.600	36.800
CCF	1	9.000	9.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	473.100	475.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS		CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	16/02/2024	74740487	$475.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79623949	ESCOBAR LLANOS RAFAEL FERNANDO	57	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS001	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	9.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No TRN 023 RECAUDOS SOI
OFICINA 2701 Santa Marta
CAJERO LPGD1601
FECHA 2024/02/23 HORA 14:21:56
NOMBRE APORTANTE WALBERTO
CEDULA /NIT 19273565
No CUENTA 19273565

EFECTIVO 162,500.00
TOTAL 162,500.00
PLANILLA 4540757090
Periodo de pago Año 2024 - Mes 2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

NIT 800.406.150-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 024 RECAUDOS SOI
OFICINA 2701 Santa Marta
CAJERO LPGD1501
FECHA 2024/02/23 HORA 14:23:44
NOMBRE APORTANTE WALBERTO
CEDULA /NIT 19273565
No CUENTA 19273565

EFECTIVO 81,900.00
TOTAL 81,900.00
PLANILLA 4540757600
Periodo de pago Año 2024 - Mes 1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7602563
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HUMBERTO RAFAEL CANTILLO ARAGON
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4540756329**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	9		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997778236

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.700**	**$ 209.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 162.500	$ 1.400	$ 0	$ 163.900
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 163.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS														CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7602563	CANTILLO ARAGON HUMBERTO RAFAEL	INDEPEND		$ 1.300.000				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 373.600**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS ESCOBAR			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1.01	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL

ESQUEMA

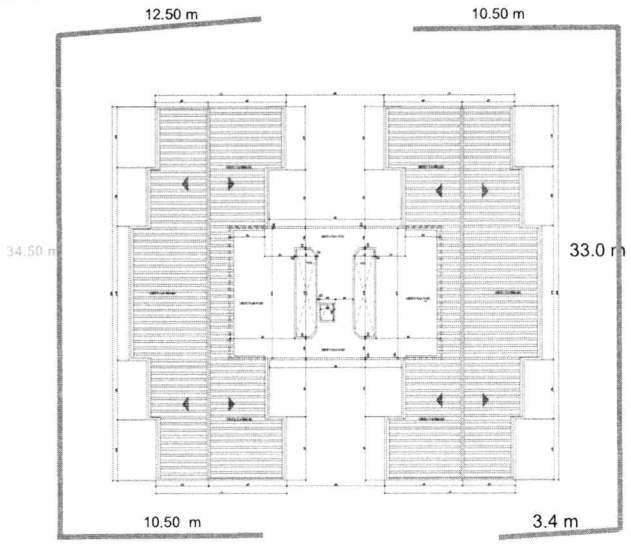

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	LONGITUD	CANT.	
LATERALES			34.50	33.00		67.50
TRASEROS			12.50	10.50		23.00
FRONTAL				3.43		3.43
SUBTOTAL						93.93
VIENEN						0.00
TOTAL						**93.93**

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,03	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	Demolición de manto y alistado existentes en cubierta y canales de desagüe. Incluye lineales, filos, dilataciones, desmonte de rejillas, procedimiento y herramientas adecuadas para conservar estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado, segun normativa ambiental.

ESQUEMA

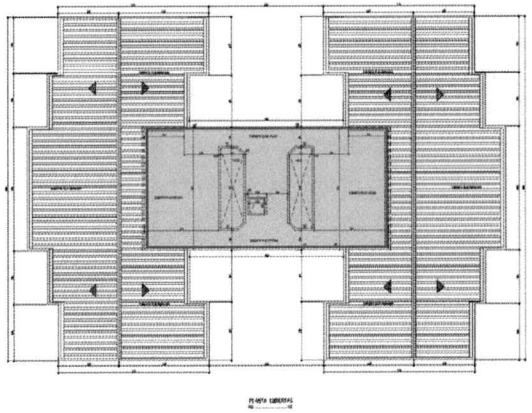

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	DESARROLLO	LONGITUD	CANT.	
CUBIERTA		6,94		10,40	1,00	72,18
VIGA CANAL		0,25	1,10	12,00	4,00	52,80
VIGA CANAL CENTRAL			1,25	6,50	2,00	16,25
DOBLEZ EN ESCOTILLA		0,20		11,54	2,00	4,62
AREA ESCOTILLA		4.66*.97+(3.87+4.66)/2*.37				-6,10
SUBTOTAL						139,74
VIENEN						0,00
TOTAL						**139,74**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR	HERNAN SUAREZ	YESENIA AMELL	ING. CARLOS BOTERO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,04	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	DESMONTE DE TEJA tipo canaleta 90 de asbesto cemento. Incluye trabajo en alturas contempla lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.

ESQUEMA

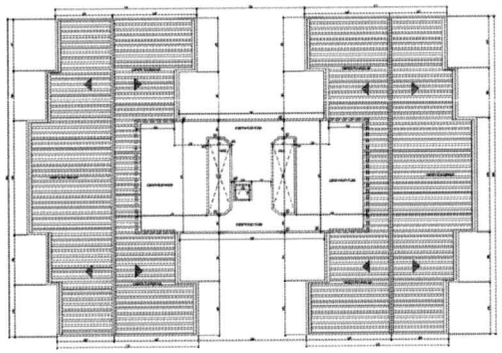

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
CUBIERTA A	54,91				2,00	109,82
CUBIERTA B	64,85				2,00	129,70
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL						239,52
VIENEN						0,00
TOTAL						**239,52**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
7	7	2023	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,06	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado.

ESQUEMA

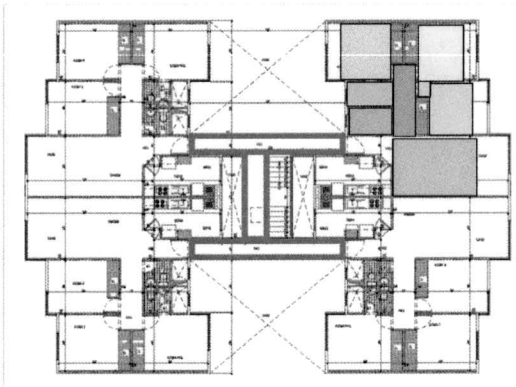

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	LARGO	LONGITUD	CANT.	
					4,00	0,00
SALA		5,75	3,20		4,00	73,60
HALL		1,06	3,88		4,00	16,45
ALCOBA 1		3,44	3,00		4,00	41,28
ALCOBA 2		2,60	2,85		4,00	29,64
ALCOBA 3		3,20	3,00		4,00	38,40
BAÑOS		1,50	2,50		8,00	30,00
SUBTOTAL						229,37
VIENEN						0,00
TOTAL						**229,37**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE CONTRATISTA:

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR	HERNAN SUAREZ	YESENIA AMELL	ING. CARLOS BOTERO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	Preliminares	ITEM	1,10	UNIDAD DE MEDIDA:	un	ACTIVIDAD	DESMONTE DE APARTOS ELECTRICOS.Desmonte de salidas e iluminacion en baños (balas) y cocina (roseta)

ESQUEMA

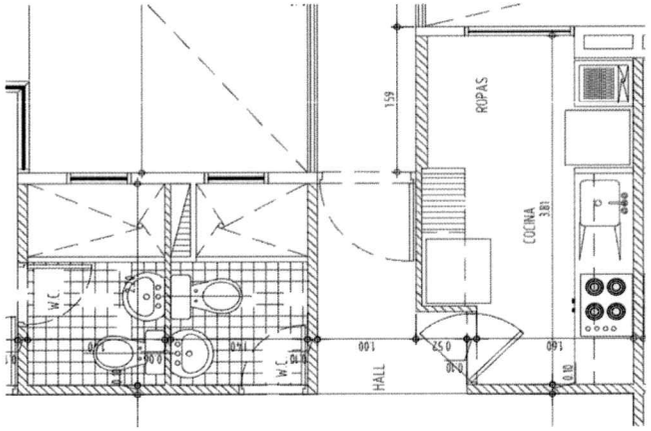

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	UNIDAD	CANT.	
Baño privado				1,00	4,00	4,00
Baño social				1,00	4,00	4,00
SUBTOTAL						8,00
VIENEN						0,00
TOTAL						**8,00**

OBSERVACIONES:

Desmonte de las balas en cielo raso de madea en baños (4) y roseta en la cocina (1)

OBSERVACIONES:

DISEÑADOR:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	RED DE DESAGUES	ITEM	2,05	UNIDAD DE MEDIDA:	m	ACTIVIDAD	DESMONTE DE TUBERIA PVC DE 3" A 6" (Incluye regata y desmonte de accesorios.)

ESQUEMA

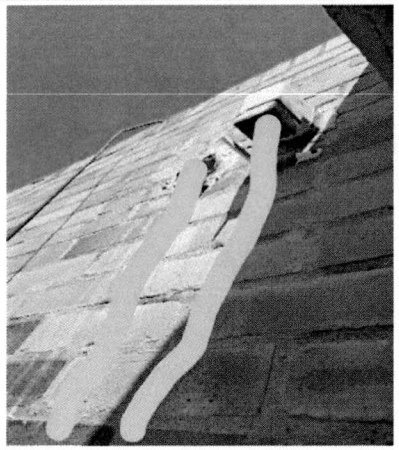

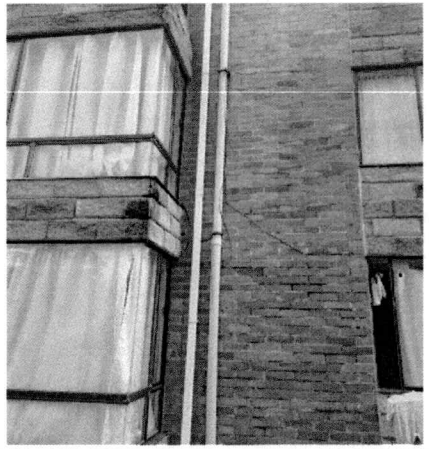

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
TUBERIA DE 2X2 CUADRADA				7,50	10,00	75,00
TUBERIA REDONDA DE 3"				7,50	5,84	43,80
desperdicio 10%						0,00
SUBTOTAL						118,80
VIENEN						0,00
TOTAL						**118,80**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE CONTRATISTA:

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRA

HERNAN SUAREZ
RESIDENTE DE OBRA

YESENIA AMELL
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ING. CARLOS BOTERO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
178	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES	ITEM	6,01	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	Pañete liso 1:3 en muros interiores. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones.

ESQUEMA

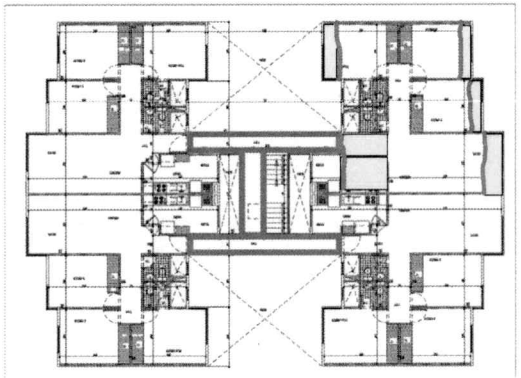

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES APTOS	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES LONGITUD	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
LOSA APTOS	SALA		1,70	3,20	4,00	21,76
	COCINA		2,10	3,75	4,00	31,50
	BAÑO		3,15	0,32	4,00	4,03
	ALCOBAS		1,48	1,00	4,00	5,92
			1,52	1,00	4,00	6,08
			0,90	3,00	4,00	10,80
			0,34	3,00	4,00	4,08
			0,34	3,00	4,00	4,08
VIGA CANAL EN LOS APTOS			0,50	15,35	4,00	30,70
SUBTOTAL						118,95
VIENEN						0,00
TOTAL						**118,95**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE INTERVENTORIA	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
2	3	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR							
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA			
CAPÍTULO	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES	ITEM	6,02	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	Pañete fachadas espesor variable, con mortero impermeabilizado. Incluye retiro de material existente, movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en alturas), así como los lineales, filos y dilataciones.		

ESQUEMA

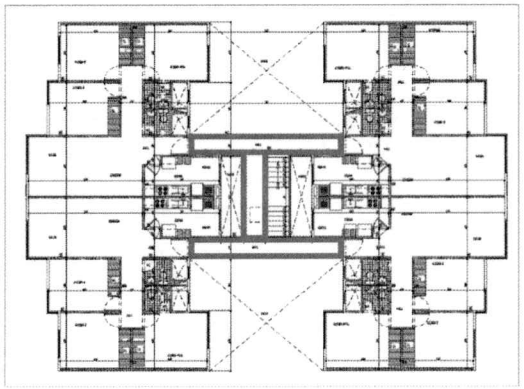

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
PLACAS AREA COMUN	2	29,79				59,58
	1	24,59				24,59

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,02	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	Impermeabilizacion de viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

ESQUEMA

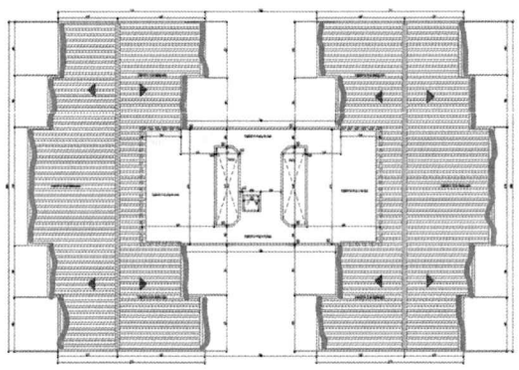

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	DESARROLLO	LONGITUD	CANT.	
VIGA CANAL	0,25	1,10	12,00	4,00	52,80
VIGA CANAL CENTRAL		1,25	6,50	1,00	8,13
SUBTOTAL					60,93
VIENEN desperdicio 2.02%					1,23
TOTAL					**62,16**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	8,01	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño.

ESQUEMA

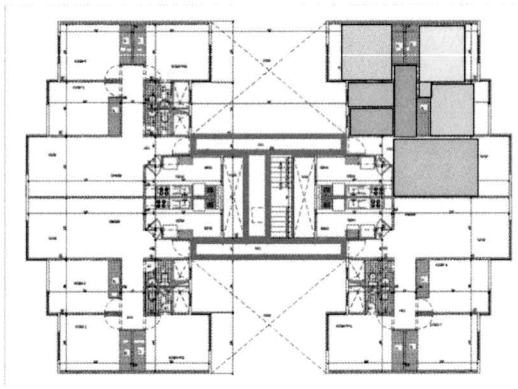

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	LARGO	LONGITUD	CANT.	
					0,00
SALA				4,00	0,00
HALL	1,06	3,88		2,00	8,23
ALCOBA 1	3,44	3,00		1,00	10,32
ALCOBA 2	2,60	2,85		2,00	14,82
ALCOBA 3	3,20	3,00		1,46	14,04
BAÑOS	1,50	2,50			0,00
SUBTOTAL					47,40
DESPERDICIO 1%					0,47
TOTAL					**47,87**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE CONTRATISTA:		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
RAFAEL FERNANDO ESCOBAR	HERNAN SUAREZ	YESENIA AMELL	ING. CARLOS BOTERO
DIRECTOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	NP-05	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	Suministro e instalación de teja en FibrocementoEternit o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.

ESQUEMA

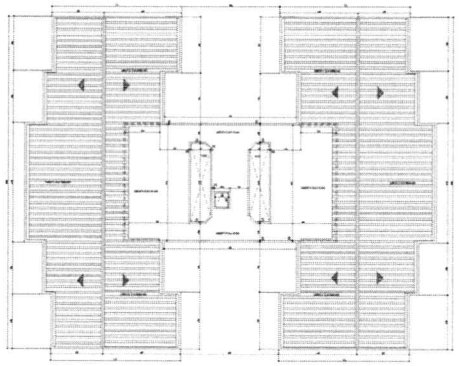

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
CUBIERTA A	54.91				2.00	109.82
CUBIERTA B	64.85				2.00	129.70
SUBTOTAL						239.52
VIENEN						0.00
TOTAL						**239.52**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL EDIFICIO GUATAPURI EN VALLEDUPAR						
CONTRATISTA	RAFAEL ESCOBAR LLANOS			INTERVENTORÍA:	CONSORCIO AMV - ANEZGA		
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	NP-04	UNIDAD DE MEDIDA:	M2	ACTIVIDAD	Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.

ESQUEMA

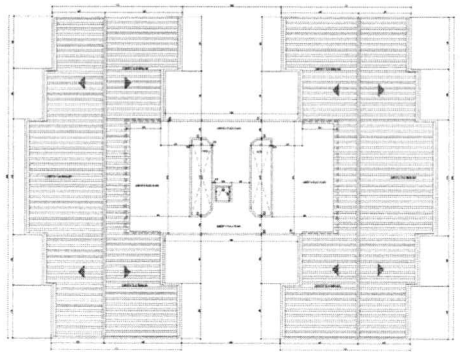

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	
CUBIERTA B			19.00	1.00	19.00
CUBIERTA A			19.00	1.00	19.00
SUBTOTAL					38.00
VIENEN					0.00
TOTAL					**38.00**

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:	REPRESENTANTE CONTRATISTA:		REPRESENTANTE INTERVENTORÍA:	
RAFAEL FERNANDO DIRECTOR DE OBRA	HERNAN SUAREZ RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ING. CARLOS BOTERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO: **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA**

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,10	UNIDAD DE MEDIDA:	un	ACTIVIDAD	DESMONTE MARCO DE ESCOTILLA METÁLICA. Medidas: entre 0,70 x 0,70 m y 1,00 x 1,00 m, Incluye marco, ángulos protectores de borde y demás elementos que la conformen, el mantenimiento y/o resane en pañete impermeabilizado sobre la superficie afectada cubriendo filos y espesores de placa que conforman el acceso, así como el trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo y seguridad en

ESQUEMA

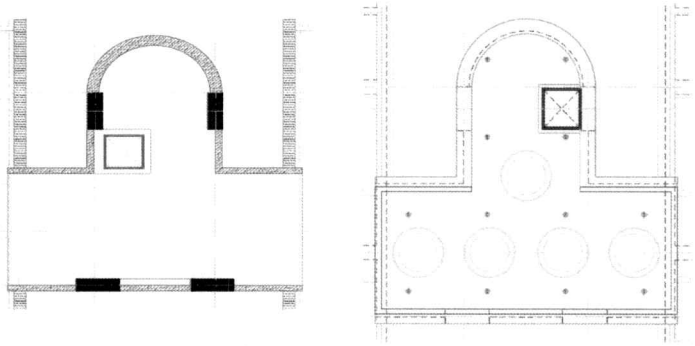

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
ESCOTILLA EN PLACA MEZANINE TANQUES				1,00	1,00
ESCOTILLA EN PLACA SUPERIOR TANQUES				1,00	1,00
ESCOTILLA EN TANQUE SUBTERRANEO				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024			

PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES	ITEM	6,02	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	Pañete fachadas espesor variable, con mortero impermeabilizado. Incluye trasiego vertical y horizontal, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), así como lineales, mochetas, antepechos, filos, juntas y dilataciones.

ESQUEMA

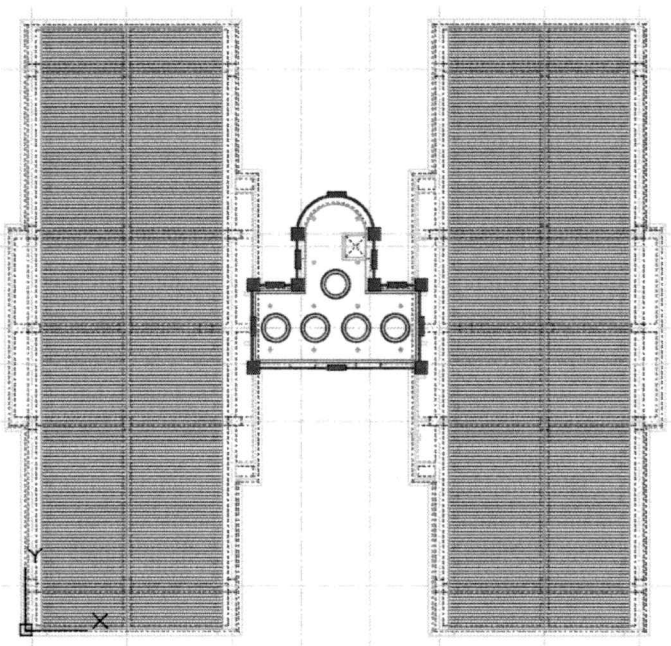

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
FACHADA MUROS DE CUBIERTA PUNTO FIJO	4,05		3,00	2,00	24,30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024			

PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,01	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	Impermeabilización de placas de cubierta y viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Durabilidad garantizada: mayor

ESQUEMA

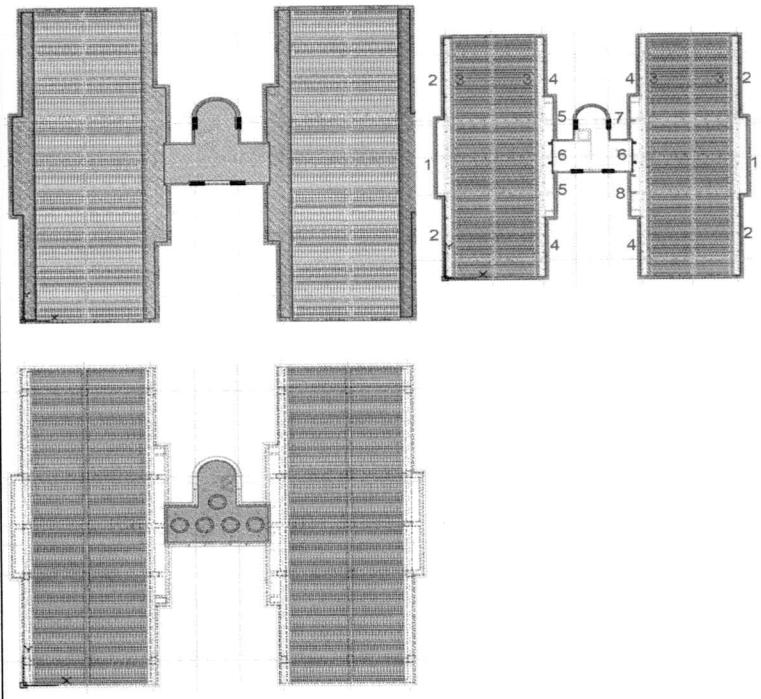

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES ALTO	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES LONGITUD	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
VIGAS CANALES TRAMO A			19,50	2,00	39,00
VIGAS CANALES TRAMO B			21,50	2,00	43,00

LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	82,00
	DESPERDICIO 0%	0,00
	TOTAL	82,00

OBSERVACIONES:

CANTIDADES ARQUITECTÓNICAS :

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	WALBERTO LLANOS P. RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ARQ. JUAN CARLOS SANDOVAL VIVES RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024			

PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,05	UNIDAD DE MEDIDA:	m	ACTIVIDAD	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 desarrollo 0.55 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + sikaflex 1A o similar + todos los elementos necesarios para la correcta instalación). Incluye trabajo y seguridad en alturas.

ESQUEMA

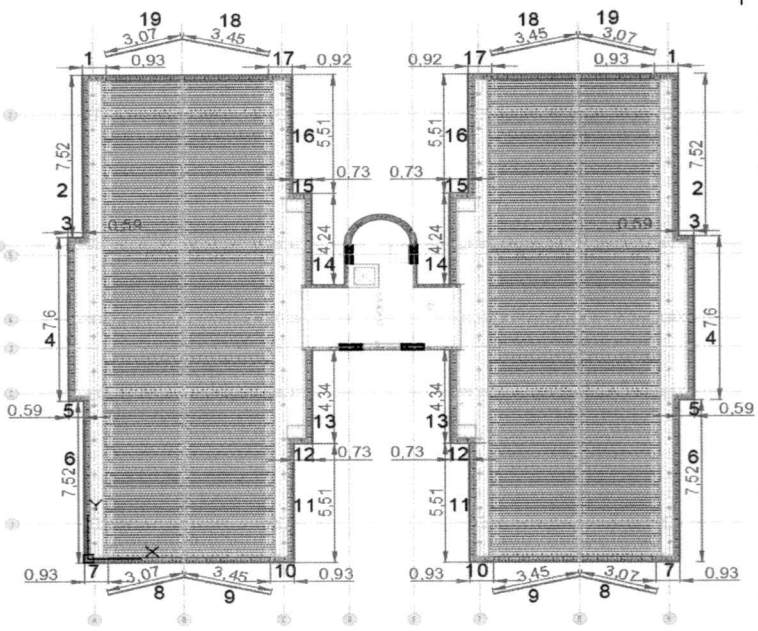

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
MURO DE CUBIERTA 1			0,93	2,00	1,86
MURO DE CUBIERTA 2			7,52	2,00	15,04
MURO DE CUBIERTA 3			0,59	2,00	1,18
MURO DE CUBIERTA 4			7,60	2,00	15,20
MURO DE CUBIERTA 5			0,59	2,00	1,18
MURO DE CUBIERTA 6			7,52	2,00	15,04
MURO DE CUBIERTA 7			0,93	2,00	1,86
URO DE CUBIERTA A DOS AGUAS 8			3,07	2,00	6,14
URO DE CUBIERTA A DOS AGUAS 9			3,45	2,00	6,90
MURO DE CUBIERTA 10			0,93	2,00	1,86
MURO DE CUBIERTA 11			5,51	2,00	11,02
MURO DE CUBIERTA 12			0,73	2,00	1,46
MURO DE CUBIERTA 13			4,34	2,00	8,68
MURO DE CUBIERTA 14			4,24	2,00	8,48
MURO DE CUBIERTA 15			0,73	2,00	1,46
MURO DE CUBIERTA 16			5,51	2,00	11,02
MURO DE CUBIERTA 17			0,93	2,00	1,86
URO DE CUBIERTA A DOS AGUAS 18			3,45	2,00	6,90
URO DE CUBIERTA A DOS AGUAS 19			3,07	2,00	6,14

OBSERVACIONES:		
	SUBTOTAL	123,28
	DESPERDICIO 2%	2,47
	TOTAL	126,00

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	WALBERTO LLANOS P. RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ARQ. JUAN CARLOS SANDOVAL VIVES RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024	01		

PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	CIELO RASOS	ITEM	8,01	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño.

ESQUEMA

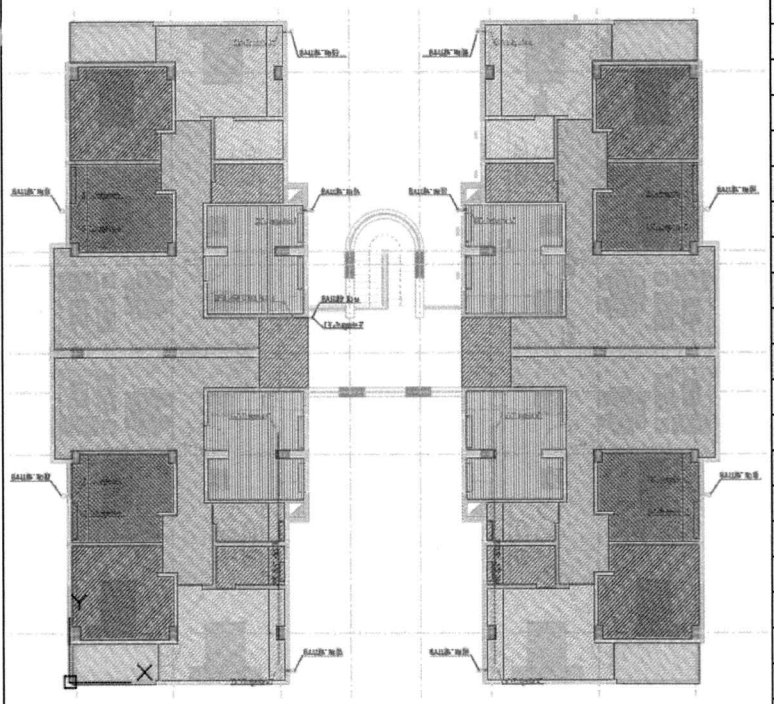

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	AREA	CANT.	
ACCESO APARTAMENTOS			4,25	0,00	0,00
SALA+COMEDOR+HALL APTO TIPO			25,37	3,00	
HABITACIÓN 2 APTO TIPO			11,00	4,00	44,00
BALCON APTO TIPO			4,20	4,00	16,80
BAÑO PRINCIPAL APTO TIPO - A			3,35	1,00	
BAÑO AUXILIAR APTO TIPO - A			3,35	2,00	6,70
BAÑO PRINCIPAL APTO TIPO - B			3,35	2,00	6,70
BAÑO PRINCIPAL APTO TIPO - B CAMBIO DE NIVEL 1			1,61	2,00	3,22
BAÑO PRINCIPAL APTO TIPO - B CAMBIO DE NIVEL 2			0,32	2,00	0,63
BAÑO AUXILIAR APTO TIPO - B			3,35	2,00	6,70
BAÑO AUXILIAR APTO TIPO - B CAMBIO DE NIVEL 1			0,81	1,00	0,81
BAÑO AUXILIAR APTO TIPO - B CAMBIO DE NIVEL 2			0,32	2,00	0,63
HABITACIÓN PRINCIPAL			12,75	4,00	
HABITACIÓN PRINCIPAL CAMBIO DE NIVEL			0,93	4,00	3,72
HABITACIÓN 3			10,50	4,00	42,00
HABITACIÓN 3 CAMBIO DE NIVEL 1			0,90	4,00	3,60
HABITACIÓN 3 CAMBIO DE NIVEL 2			0,51	4,00	
COCINA			11,90	4,00	47,60
COCINA CAMBIO DE NIVEL 1			1,11	4,00	
COCINA CAMBIO DE NIVEL 2			0,41	4,00	
COCINA CAMBIO DE NIVEL 3			0,44	4,00	
SUBTOTAL					181,11
DESPERDICIO 2%					3,62
TOTAL					185,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	WALBERTO LLANOS P. RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ARQ. JUAN CARLOS SANDOVAL VIVES RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024			


PROYECTO: **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA**


CAPÍTULO	CARPINTERÍAS METÁLICAS Y EN ALUMINIO	ITEM	9,01	UNIDAD DE MEDIDA:	un	ACTIVIDAD	Suministro e instalación de Tapa o escotilla para salida a la cubierta, Medidas: entre 0,70 x 0,70 m y 1,00 x 1,00 m, en lámina Alfajor de 1/8". Incluye anclajes, marco en ángulo de 1/8" x 2", bisagras, falleba y candado, trabajo y seguridad en alturas. Acabado en anticorrosivo y esmalte negro tipo Pintuco o similar.

ESQUEMA

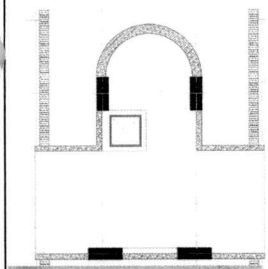



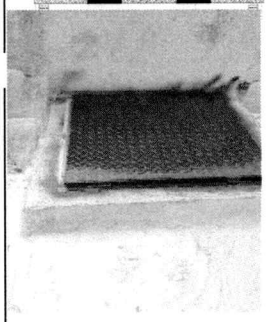



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
ESCOTILLA DE ACCESO AL MEZANINE DE TANQUES				1,00	1,00
ESCOTILLA DE ACCESO A LA PLACA DE CUBIERTA				1,00	1,00
ESCOTILLA DE ACCESO AL TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024			


PROYECTO: **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA**

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	ITEM	10,01	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	VINILO TIPO 2 Pintuco o similar, Bajo placa. Incluye 3 manos de pintura, filos, lineales y dilataciones, así como el retiro y cargue a botadero autorizado de la pintura existente en deterioro. Color blanco, según diseño.

ESQUEMA

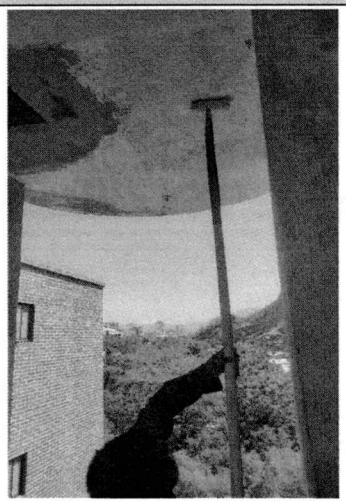



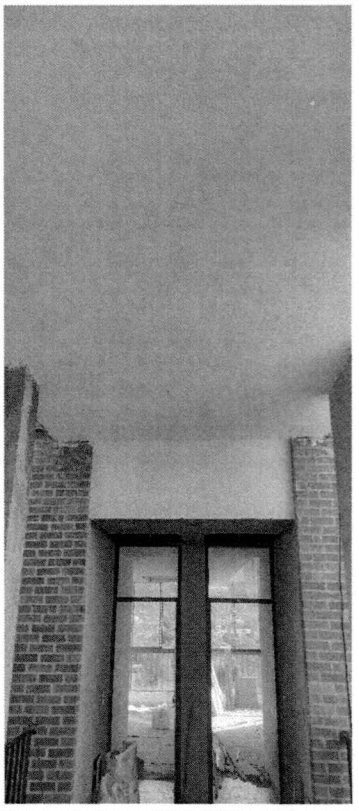

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
			24,30	1,00	24,30

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
21	2	2024			


PROYECTO: **MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA**


CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	ITEM	10,02	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	GRANIPLAST (esgrafiado) Fachadas - Colores Pastel, según diseño. Tipo Pintuco o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales.

ESQUEMA

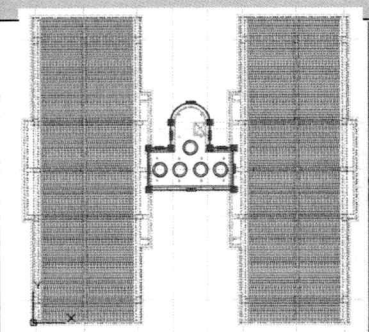

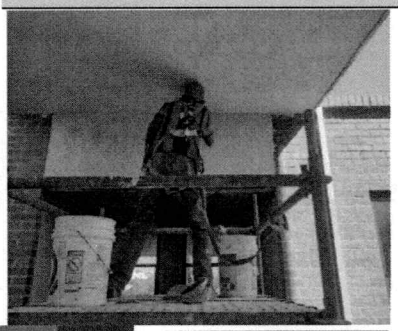

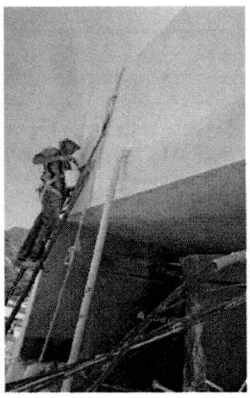





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
FACHADA MUROS DE CUBIERTA PUNTO FIJO	4,05		3,05	2,00	24,71
SOBRE ACCESO DE APARTAMENTOS	0,70		2,35	2,00	3,29
PLACA MEZZANINE		2,45	5,91		14,48
AREA RECTA ESCALERAS		2,21	2,26		4,99
AREA CURVA ESCALERAS					2,26
PARTE ALTA ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PUNTO FIJO			6,00	2,00	12,00
SUBTOTAL					61,73
DESPERDICIO 2%					1,23
TOTAL					63,00

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	WALBERTO LLANOS P. RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ARQ. JUAN CARLOS SANDOVAL VIVES RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024			

PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	ASEO GENERAL	ITEM	11,02	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	Aseo General durante y a la entrega de la obra. (Incluye elementos de aseo, trasiego horizontal y vertical, retiro de escombros a botadero autorizado.)

ESQUEMA

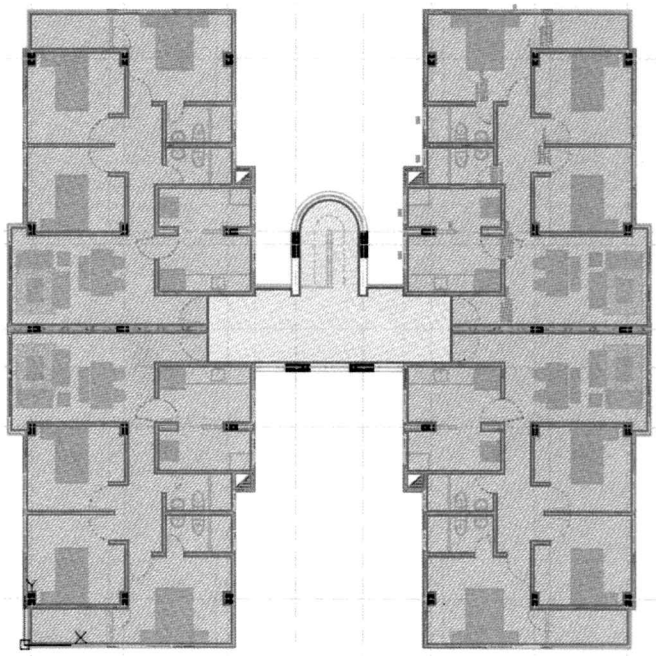

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	ÁREA	CANT.	
APARTAMENTO TIPO			82,11	1,00	82,11
ZONA COMUN PISO 5			7,89	1,00	7,89

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	2	2024	2		

PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	ASEO GENERAL	ITEM	NP-01	UNIDAD DE MEDIDA:	UN	ACTIVIDAD	ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA

ESQUEMA

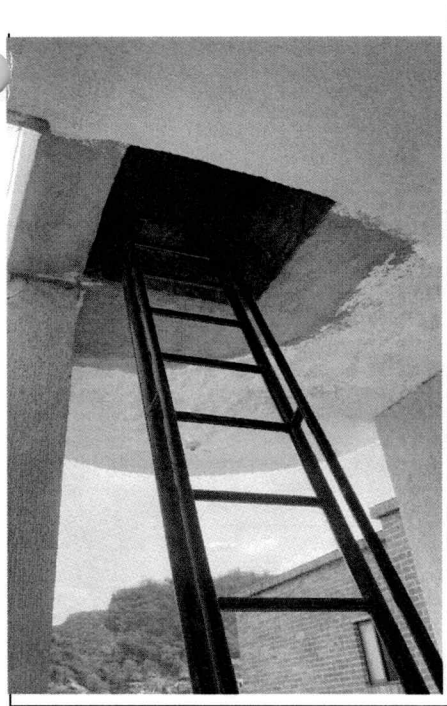



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	ÁREA	CANT.	
ESCALERA DE ACCESO AL MEZZANINE				1,00	1,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	FECHA: 09 DICIEMBRE 2023

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
22	2	2024			Ing. Walberto Llanos Perez

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA							
CAPÍTULO	PRELIMINARES		ITEM	NP-03	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	VINILO TIPO 1 PINTUCO o SIMILAR, EN MUROS INTERIORES DE LOS APARTAMENTOS A INTERVENIR.

ESQUEMA

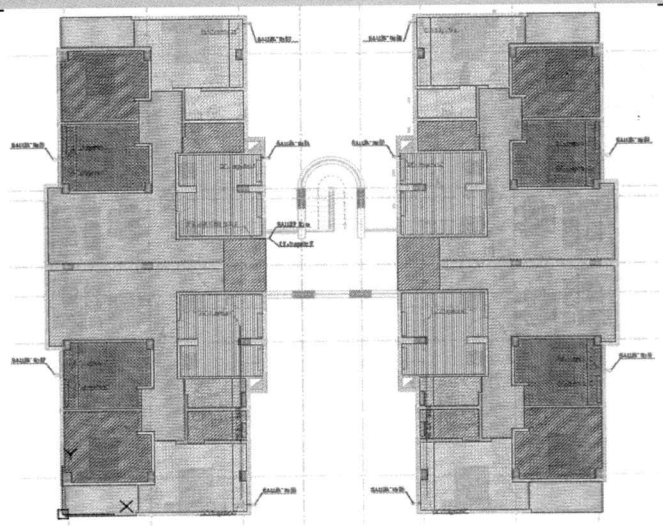

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG	ALTURA	ÁREA	No. ELEM. CANT.	MEDIDA TOTAL
MURO SALA		7,1	2,45	17,40	4,00	69,58
FRENTE SALA		3,35	0,25	0,84	4,00	3,35
RINCON SALA		0,43	0,25	0,11	4,00	0,43
ESQUINER0		0,5	2,45	1,23	4,00	4,90
MURO SALA		3,8	2,45	9,31	4,00	37,24
MURO SALA		1,85	2,45	4,53	4,00	18,13
MURO SALA		1,18	2,45	2,89	4,00	11,56
COCINA		3,47	0,4	1,39	4,00	5,55
COCINA		1,62	0,4	0,65	4,00	2,59
COCINA		2,76	0,4	1,10	4,00	4,42
HALL		2,22	2,45	5,44	4,00	21,76
HALL		1,8	2,44	4,39	4,00	17,57
BAÑOS		3,24	0,4	1,30	4,00	5,18
BAÑOS		4,19	0,4	1,68	4,00	6,70
HALL		0,3	2,4	0,72	4,00	2,88
HALL		2,07	2,4	4,97	4,00	19,87
HALL		0,29	2,4	0,70	4,00	2,78
ALCOBA 1		6,2	2,45	15,19	4,00	60,76
ALCOBA 1		3,1	2,45	6,36	4,00	25,42
ALCOBA 2		6	2,45	14,70	4,00	58,80
ALCOBA 2		3	2,448	6,10	4,00	24,42
HALL		1,44	2,4	3,46	4,00	13,82
ALCOBA 3		2,42	2,45	5,93	4,00	23,72
ALCOBA 3		1,7	2,45	4,17	4,00	16,66
ALCOBA 3		3,89	2,45	7,53	4,00	30,12
SUBTOTAL						488,22
DESPERDICIO 0%						0,00
TOTAL						488,22

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

CANTIDADES ARQUITECTÓNICAS :

RAFAEL FERNANDO ESCOBAR DIRECTOR DE OBRA	WALBERTO LLANOS P. RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ARQ. JUAN CARLOS SANDOVAL VIVES RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
18	5	2023	N/A	N/A	ARQ. DAVID JOAQUIN ESCORCIA ARIZA

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA						
CONTRATISTA	N/A			INTERVENTORÍA:	N/A		
CAPÍTULO	Luminarias	ITEM	14,1	UNIDAD DE MEDIDA:	un	ACTIVIDAD	Suministro, montaje y conexión de panel LED circular 8" 12W - 120 V de incrustar en cielo raso. Incluye accesorios de conexión y fijación.

ESQUEMA

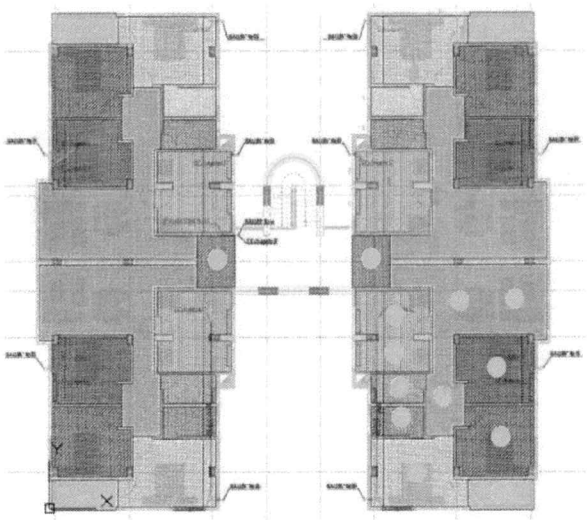

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	UN	CANT.	
ALCOBAS				3,00	4,00	12,00
HALL				1,00	4,00	4,00
BAÑO PRIVADO				1,00	4,00	4,00
BAÑO AUXILIAR				1,00	4,00	4,00
SALA-COMEDOR				1,00	4,00	4,00
COCINA - LABORES				2,00	4,00	8,00
BALCON				1,00	2,00	2,00
ACCESO APTOS						0,00
SUBTOTAL						38,00
VIENEN						0,00
TOTAL						**38,00**

OBSERVACIONES:

Luminaria para reemplazar la roseta de la cocina

OBSERVACIONES:

RAFAEL FERNANDO DIRECTOR DE OBRA	WALBERTO LLANOS P. RESIDENTE DE OBRA	YESENIA AMELL DIRECTORA DE	ARQ. JUAN CARLOS SANDOVAL VIVES RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
1	2	2024	02		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA		
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,01

CERRAMIENTO PERIMETRAL PROVISIONAL en polisombra verde, altura: 2,10 m. Incluye puerta de acceso, bases en concreto, mantenimiento durante la ejecución de la obra, desmonte al finalizar y retiro de sobrantes a botadero autorizado.

RECONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA PARTE NORTE DEL EDIFICIO MURILLO

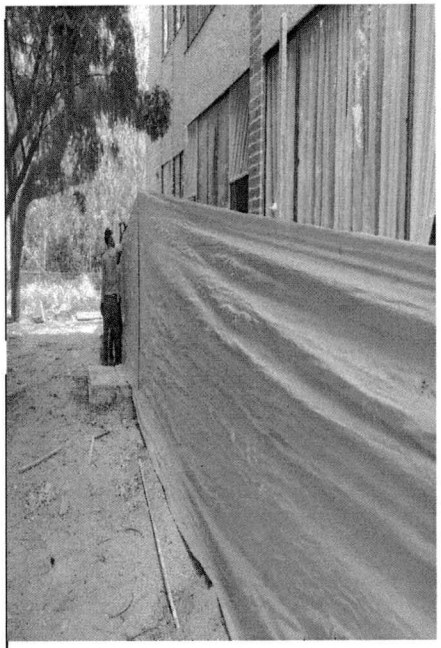

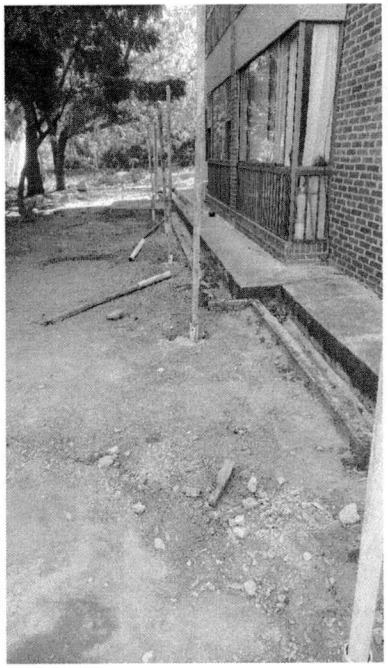

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,02	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE INTERIOR (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales, dilataciones, procedimiento y herramientas adecuadas para conservar en buen estado los muros y estructura, trasiego horizontal y vertical, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado.**

FOTOGRAFIA DE LAS AREAS COMUNES



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
· INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,04	DEMOLICIÓN PAÑETE BAJO PLACA (humedades) espesor variable. Incluye filos, lineales y dilataciones, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), procedimiento y herramientas adecuadas para conservar muro y estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado.

DEMOLICION Y APLICACIÓN DE PAÑETE EN MUROS Y PLACA

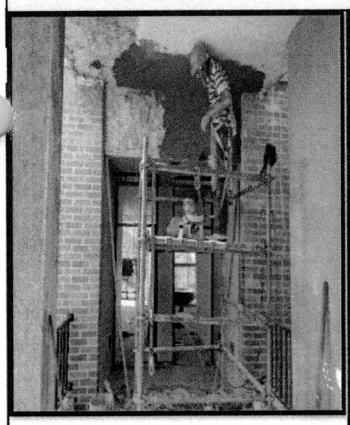

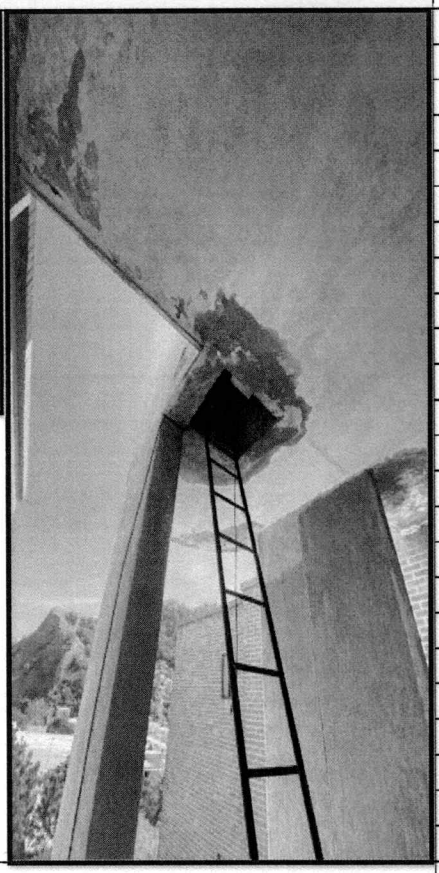

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		


PROYECTO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,05

DESMONTE CIELO RASO. Incluye desmonte de estructura (perfilería) y elementos de fijación, procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar la estructura, trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado.

DESMONTE CIELO RASO DE MACHIMBRE Y SUPERBOARD



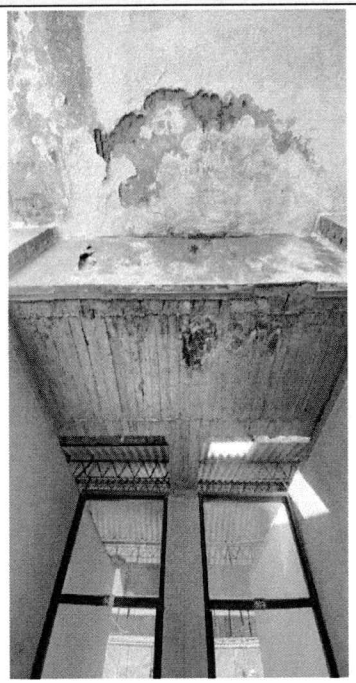

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	ÁREA	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,06	**Desmonte de tanque plástico capacidad entre 500 a 2000 litros (para almacenamiento de agua), ubicado en cubierta. Incluye retiro de tuberías y accesorios de instalación, anulación de puntos, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), trasiego vertical y horizontal, cargue y retiro de residuos a botadero autorizado o disposición final definida por el ICFE.**

DESMONTE TANQUES ELEVADOS

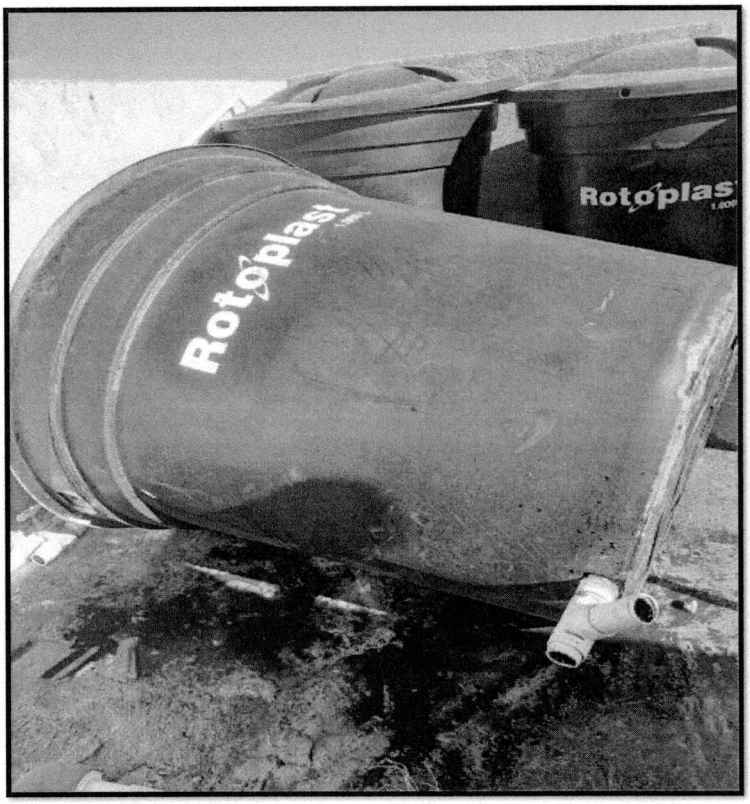

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	PRELIMINARES	ITEM	1,07	**DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA. Incluye procedimiento y herramientas adecuadas para no afectar edificación, trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), movimiento vertical y horizontal, cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.**

DESMONTE CUBIERTA Y ESTRUCTURA

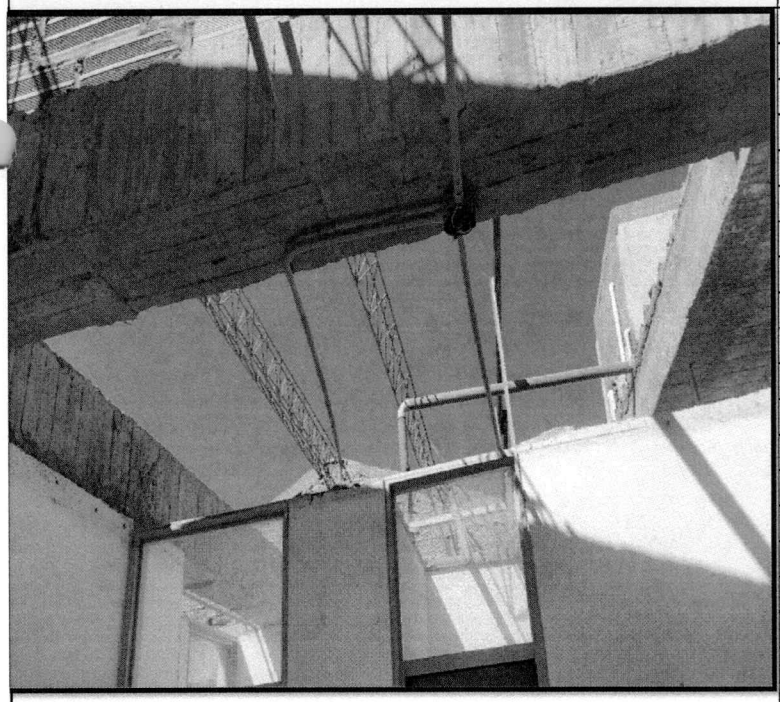

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA				
CONTRATISTA	N/A			INTERVENTORÍA:	N/A
CAPÍTULO	Preliminares	ITEM	1,08	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS.Desmonte de salidas e iluminacion en baños (balas) y cocina (roseta)	

DESMONTE PLAFONES O APARATOS ELECTRICOS



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	APARATOS	CANT.	

Página 1 de 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

DIA	MES	AÑO	CORTE N°	BALANCE No.	ELABORÓ
15	1	24	1		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA		
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA:	

CAPÍTULO	ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS	ITEM	2,01	**Estructura perfil lamina delgada PHR C ASTM A500 grado 50. Calibre según diseño. Incluye vigas, cerchas, correas, aplicación de anticorrosivo y esmalte.**

INSTALACION PERFILES DE CUBIERTA PHR C

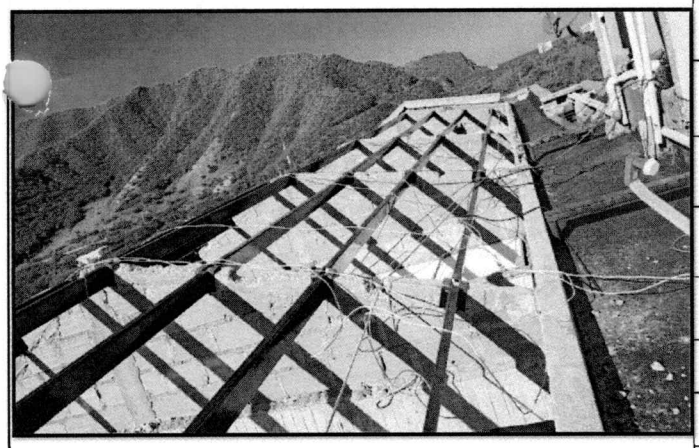

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)		Peso (kg)	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

15			CORTE N°	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO		
15	**1**	**24**	**1**	

PROYECTO	**MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA**
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA:

CAPÍTULO	**ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS**	ITEM	**2,02**	**Suministro e instalación de ACCESORIOS (PLATINAS Y ANGULOS DE UNION) ACERO A-36. Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte + protección anti fuego, anticorrosivo premium, acabado en esmalte sintetico tipo Pintulux**



PLATINAS Y ANGULOS SOLDADOS A LOS PERFILES PHR C PARA SU ANCLAJE	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
			Longitud (m)		Peso (kg/m)	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

DIA	MES	AÑO	CORTE N°	BALANCE No.	ELABORÓ
15	1	2024	1		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA:

CAPÍTULO	ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS	ITEM	2,03

Suministro e instalación de TENSORES Y TIRANTILLOS ROSCADOS 3/8"SAE 1020. Incluye tuerca, contratuerca, arandelas, soldadura, anticorrosivo, esmalte sintetico y demás accesorios para su correcta instalación. Elementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados.

TENSORES Y TIRANTILLOS ROSCADOS DE LA ESTRUCTURA METALICA



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)		Peso (kg)	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

DIA	MES	AÑO	CORTE N°	BALANCE No.	ELABORÓ
15	1	2024	1		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA				
CONTRATISTA				INTERVENTORÍA:	
CAPÍTULO	ACERO Y DEMAS ELEMENTOS METALICOS	ITEM	2,04	Suministro e instalación de Anclaje epóxico 1/2". Incluye perforación con taladro y broca, adhesivo epóxico, perno, tuerca y arandela galvanizado SAE 1045, según diseño.	

ANCLAJE DE PERNOS CON ANCHORFIX EN LA VIGA CINTA



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
		Longitud (m)		Peso (kg/m)	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07-F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA:

CAPÍTULO	RED DE DESAGUES	ITEM	3,09	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTRE 1000lt y 2000lt, (incluye reconexión a la tubería)

REINSTALACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

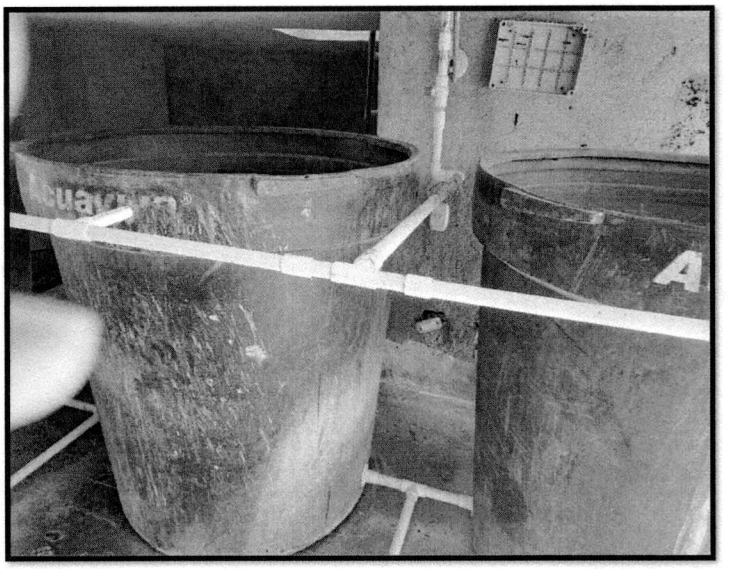

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES	ITEM	6,01	**Pañete liso Muros 1:3 Impermeabilizado. Incluye mochetas, antepechos, dinteles, filos, lineales y dilataciones.**

PAÑETE EN MUROS

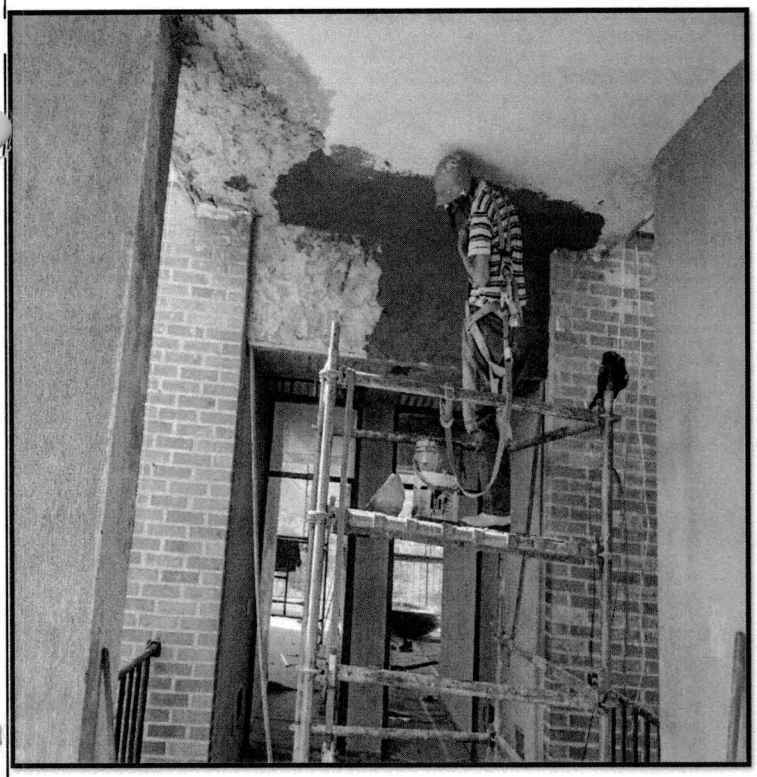

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	MORTEROS, PAÑETES Y RESANES	ITEM	6,03	**Pañete liso 1:3 bajo placa. Incluye resanes, filos, dilataciones y lineales.**

PAÑETE BAJO PLACA EN EL MEZZANINE

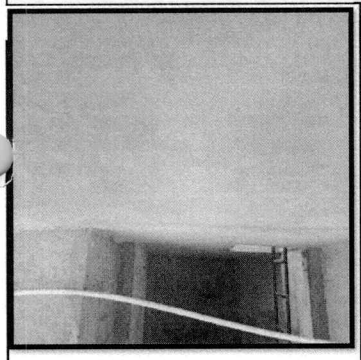

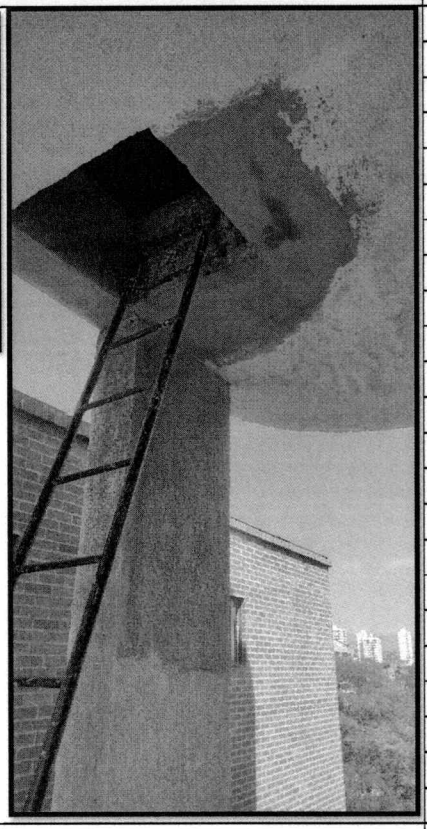

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	ÁREA	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		Arq. FABIAN CAMILO GONZÁLEZ ROJAS

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,01	**Impermeabilizacion de placas de cubierta y viga canales en manto asfaltico de 3mm, con acabado pintura reflectiva de aluminio, incluye preparación de superficie, tratamiento de fisuras, manto asfáltico, imprimación o puente de adherencia, sellos, media cañas, antepecho a altura minima de 30 cm, poyos, lineales, cuello de bajantes, implementos y capacitacion para trabajo en alturas certificados, todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Durabilidad garantizada: mayor a 10 años.**

IMPERMEABILIZACION EN VIGA CANAL Y PLACA DE TANQUES ELEVADOS EN EL MEZZANINE

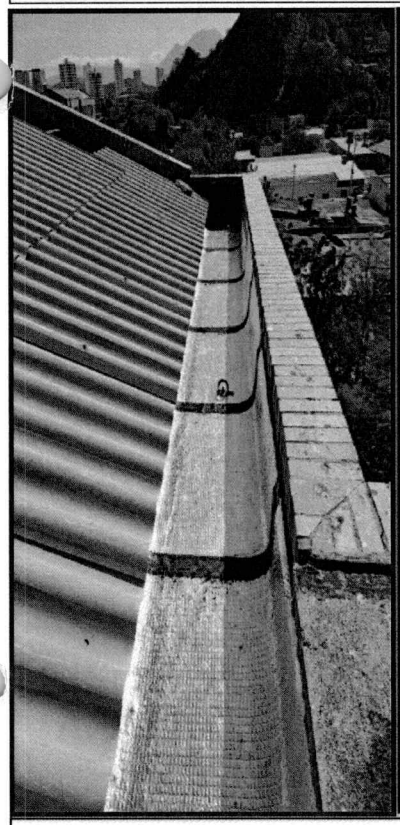

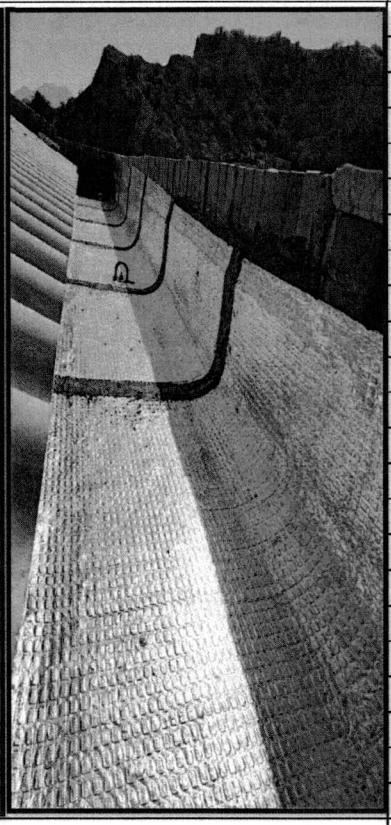

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
· INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,02	**Alistado para placa de cubierta en Mortero 1:4 Impermeabilizado espesor variable. Incluye desarrollo de viga canal, lineales, cortes, media caña, dilataciones para sello de impermeabilización, pendientado mínimo 3%, trabajo y seguridad en alturas.**

ALISTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO EN MEZZANINE.



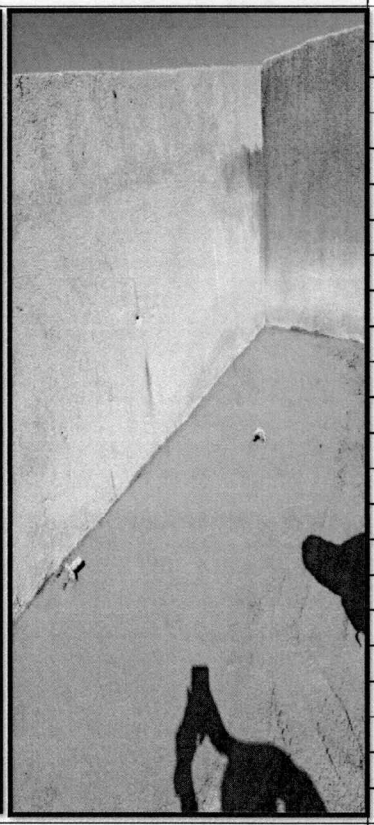

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	ÁREA	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,03	**Suministro e instalación de teja en Fibrocemento Eternit o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), lineales, ganchos, amarres y todos los elementos de fijación.**

CUBIERTA EN FIBROCEMENTO

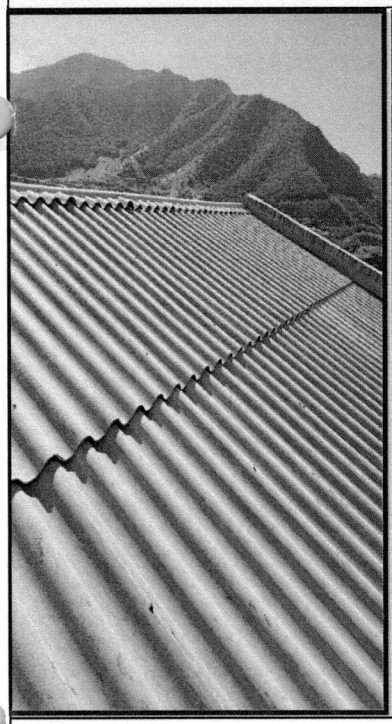

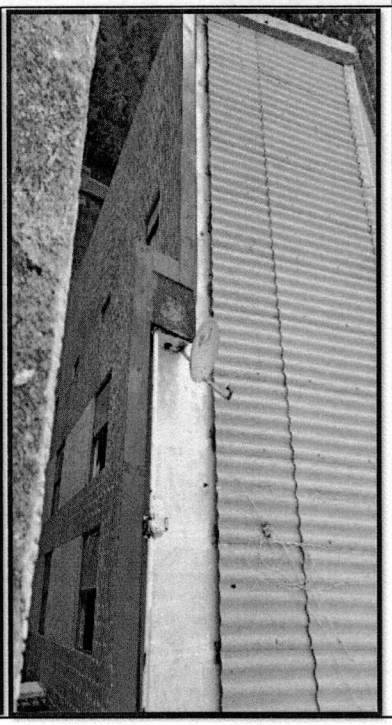

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,04	**Suministro e instalación de caballete en fibrocemento. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), el suministro de ganchos, amarres, elementos de fijación y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.**

CABALLETES DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MURILLO DE SANTA MARTA

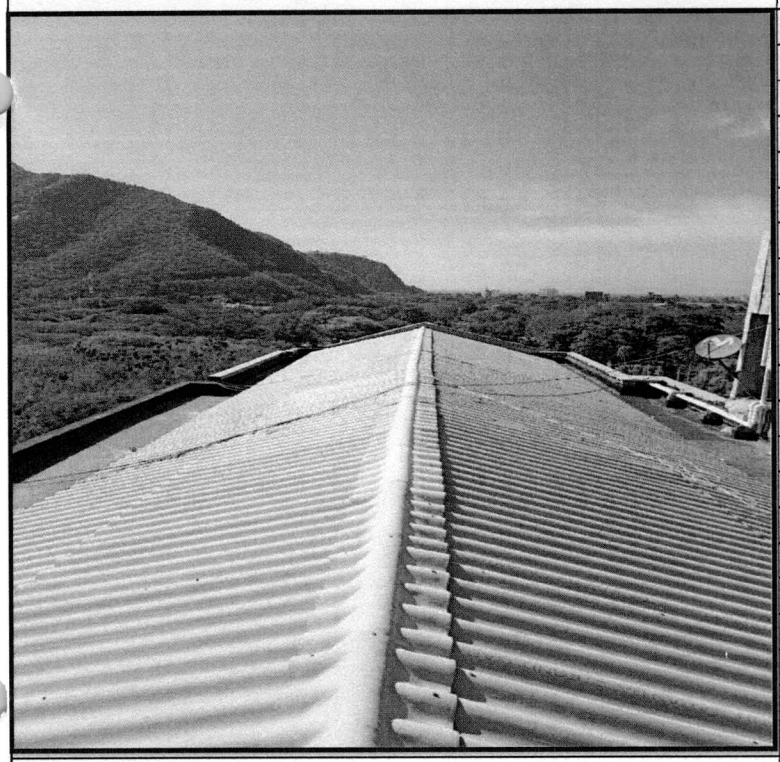

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	W. LLANOS
DIA	MES	AÑO			
19	7	2023			

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,05	UNIDAD DE MEDIDA:	m	ACTIVIDAD	**FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 desarrollo 0.55 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro y fijación a muro + sikaflex 1A o similar + todos los elementos necesarios para la correcta instalación). Incluye trabajo y seguridad en alturas.**

FOTOGRAFIA DE LOS FLANCHES INSTALADOS

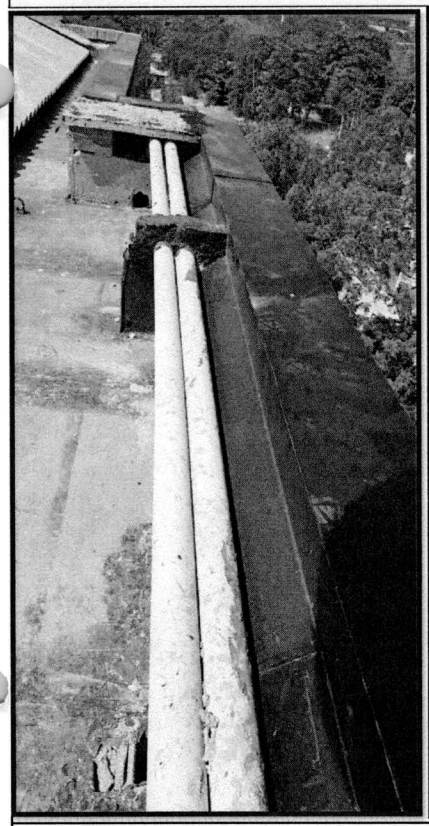

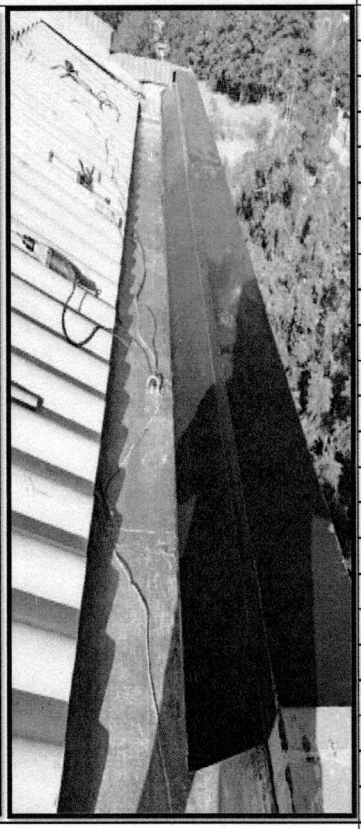

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTA	ITEM	7,06	Suministro e instalación de Mortero 1:4 perimetral que cubre las ondulaciones de la teja. Incluye trabajo y seguridad en alturas.

MORTERO PERIMETRAL ENTRE LA VIGA CANAL Y LA CUBIERTA

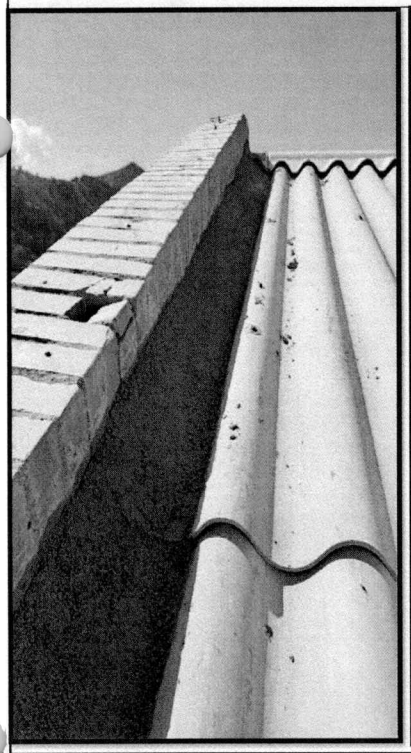

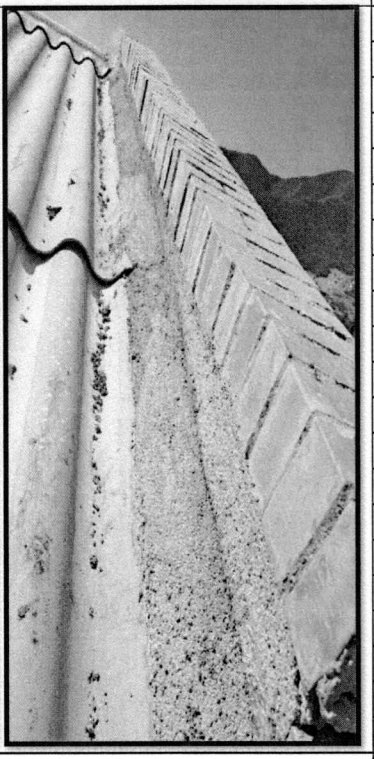

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		


PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	CIELO RASOS	ITEM	8,01	CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.H. JUNTA PERDIDA. (Perfilería metálica Cal. 26. Estructura cada 40 cm). Incluye tres (3) manos de pintura antihumedad, filos, dilatación plástica perimetral en "z", perforaciones, lineales y remates. Según diseño.

INSTALACION DE DRYWALL RH

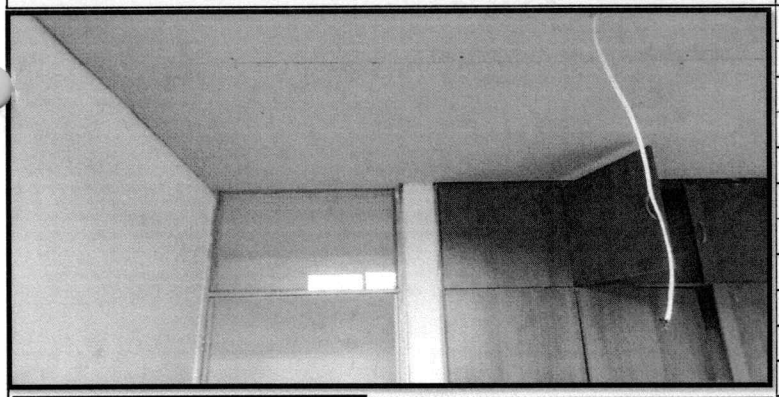

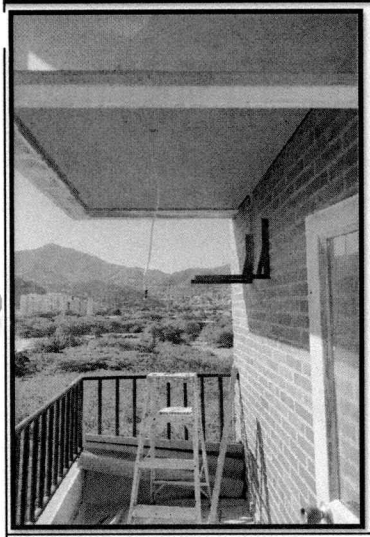

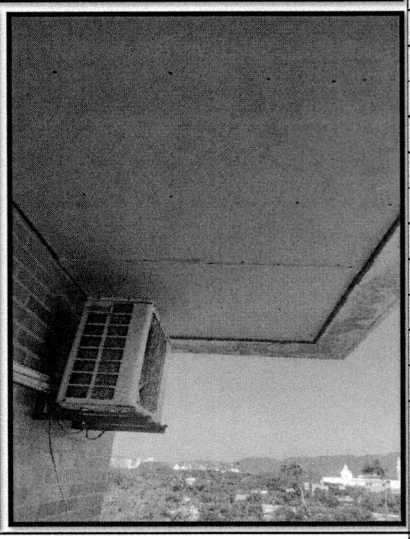

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	AREA	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
·INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016


FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
1	2	2024			W. LLANOS

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA

CAPÍTULO	ESTUCO Y PINTURA	ITEM	10,02	UNIDAD DE MEDIDA:	m2	ACTIVIDAD	**GRANIPLAST (esgrafiado) Fachadas - Colores Pastel, según diseño. Tipo Pintuco o similar. Incluye trabajo en alturas (contempla andamios, kit completo cuerpo entero de trabajo, seguridad en alturas y señalización), pintura de: filos, dilataciones y lineales.**

GRANIPLAST BAJO PLACA EN ZONAS COMUNES DEL 5° PISO



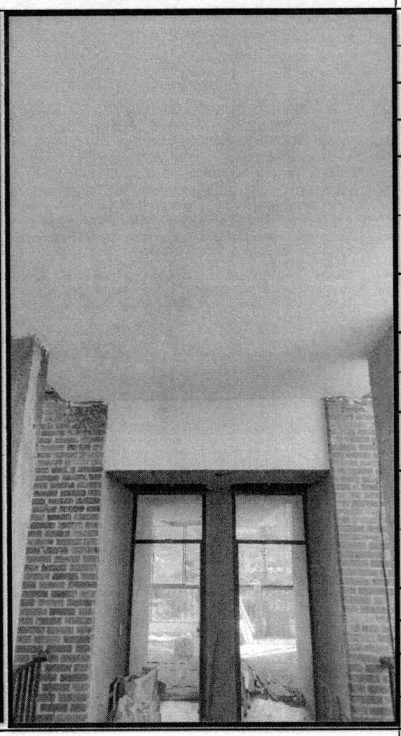

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	0,00
	DESPERDICIO 2%	0,00
	TOTAL	0,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO

MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	ASEO GENERAL	ITEM	11,01	**Suministro e instalación de protección para pisos de porcelanato y piso laminado del interior de los apartamentos, consistente en una capa de plástico o yumbolon y cartón corrugado, dicha protección se debe mantener en buen estado durante la ejecución de la obra, en todo caso, el contratista deberá garantizar el buen estado del piso existente.**

PROTECCION DE LOS PISOS EN CARTON CORRUGADO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO


MEMORIAS FOTOGRAFICAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS


CÓDIGO: ICFE-P-07 / F-13	VERSIÓN: 04	EMISIÓN: 27 MAYO 2016

FECHA			CORTE No.	BALANCE No.	ELABORÓ
DIA	MES	AÑO			
15	1	2024	01		

PROYECTO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE CUBIERTAS Y SUS AREAS COMUNES - EDIFICIO MURILLO - SANTA MARTA			
CAPÍTULO	ITEMS NO PREVISTOS	ITEM	NP-01	ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA

FOTOGRAFIA DE LA ESCALERA

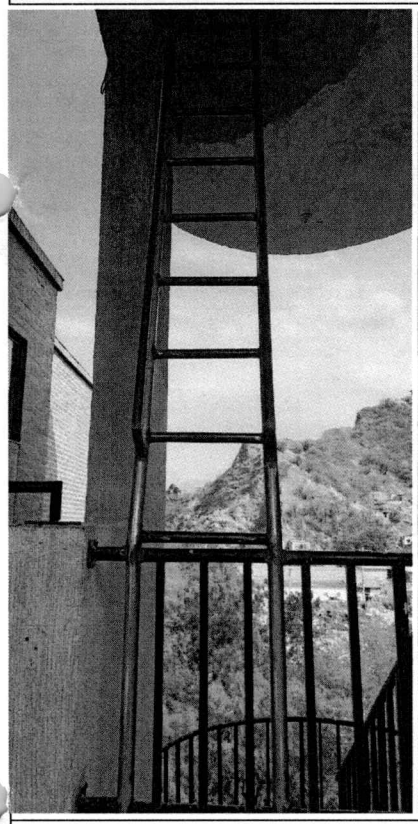

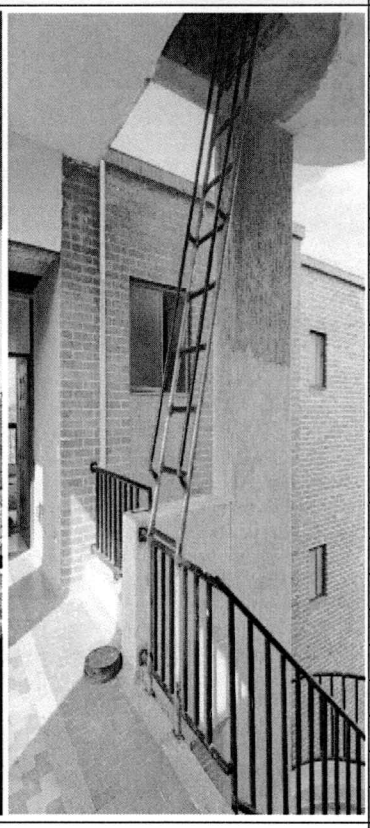

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			No. ELEM.	MEDIDA TOTAL
	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANT.	
ACCESO AL MEZZANINE				1,00	1,00
				TOTAL	1,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PAGOS DE SALARIOS U HONORARIOS

Yo Rafael Fernando Escobar Llanos, identificado (a) con la C. C. No. 79.623.949 en mi condición de contratista, certifico que para el Contrato de Obra Pública No: 173-ICFE-2023 con el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO, nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones y pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y CCF, según corresponda del personal vinculado mediante contrato laboral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de las todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de la ARL, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o II, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.

Este documento se firma en cumplimiento de las obligaciones determinadas por las leyes laborales y civiles, que contemplan los cubrimientos que debemos brindar tanto a nuestros trabajadores como a contratistas, el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO se encuentra exonerada ante cualquier reclamación que se presente derivada de lo que bajo nuestra responsabilidad certificamos y firmamos, ya que su contenido corresponde a la realidad y existen soportes de su veracidad, los cuales se encuentran bajo nuestracustodia y pueden ser consultados cuando sean requeridos.

Dada en Bogotá el día (22) de febrero de 2024

Atentamente,



Rafael Fernando Escobar Llanos
Ingeniero Civil
C.C. 79.623.949

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, el empleador **ESCOBAR LLANOS RAFAEL FERNANDO** identificado con Nit No.**79623949**, registra afiliación desde 18/05/2012, su actividad económica principal es CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS con código de actividad No 5421001 y clase de riesgo 5, estado ACTIVO.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240101128662

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 días del mes de enero de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
V1.0 | L.A.D.O.
8815_4_1_3_FR15 v. 07

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A240036449AE8B

3 DE ENERO DE 2024 HORA 09:41:14

AA24003644 PÁGINA: 1 DE 2

* *

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

****

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

****

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

****

CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS
C.C. : 79.623.949
N.I.T. : NO REPORTO

CERTIFICA:

MATRICULA NO : 00950092 DEL 23 DE JUNIO DE 1999

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 119 NO. 14 A - 25 OF 501
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL NOTIFICACION JUDICIAL : RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM
DIRECCION COMERCIAL : CL 119 NO. 14 A - 25 OF 501
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL: RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM

****

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2023
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2023
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$3,247,749,715

CERTIFICA:

ACTIVIDAD ECONOMICA : 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA. 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 4111 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES.

CERTIFICA:

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $1,639,389,008

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 4290

****
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** PERSONA NATURAL HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
****

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,700

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****
****
****
****
****
****


CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
202096-T
YOHANNA DEL PILAR
PEREZ
C.C. 26445363
RESOLUCION INSCRIPCION 282 FECHA 29/05/2015
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 214572

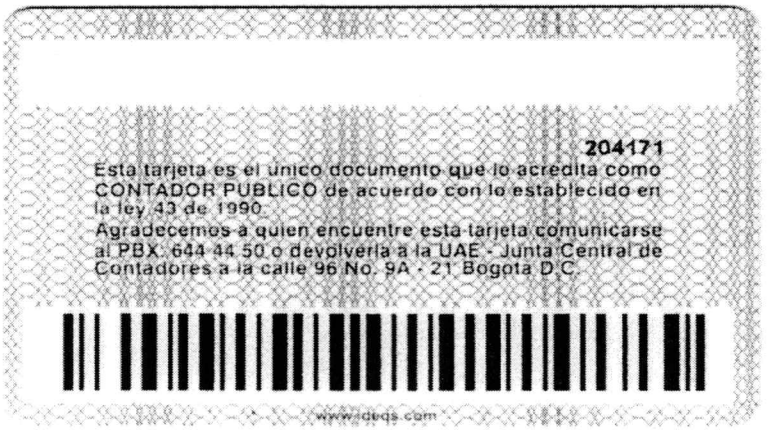
204171
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D6C9FFFDZBZCA1F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOHANNA DEL PILAR PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26445363 de AIPE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 202096-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa:	**E & R CONSTRUCCIONES SAS**		
Tipo Identificación:	**NIT Persona Jurídica**	**No. Identificación:**	**901397247**
Generado por:	**Yohanna Perez**		

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	862188
Empresa:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA - pago factura 73546255
Factura	11543136
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$368,370.00
Fecha Transacción	2024/02/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO0384
No. Producto	*****0384

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **E & R CONSTRUCCIONES SAS**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901397247**

Generado por: **Yohanna Perez**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	871215
Empresa:	PA FIDUPOPULAR - Pago Factura Essmar E.S.P
Factura	619075
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$105,350.00
Fecha Transacción	2024/02/23
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO0384
No. Producto	*****0384

Estado de la transacción

✔ Su transacción ha finalizado en estado **APROBADA**.

Información del pago	
Fecha	23/02/2024 04:21:08 PM
Referencia del pago	11543136
Descripción del pago	pago factura 73546255
Total pagado	**$368,370.00**

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	186.29.32.145
Banco	BANCO DE OCCIDENTE
Código único de seguimiento	472537638

Tus datos	
Nombre y Apellido	Reingenieria Constructora
Identificación	900203967

Información del comercio	
Nombre	AIR-E S.A.S ESP
Identificación	901380930
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: (605) 322 50 16 o envie sus datos al correo: servicioalcliente@air-e.com . Recuerde presentar su recibo de caja.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	85153591
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID JOSE BARROS ATEHORTUA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CONDOMINIO PEÑABERQL CASA 142	TELÉFONO:	3205232
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4535183922	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997775190

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 208.000	$ 400	$ 208.400
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 400**	**$ 208.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 300	$ 0	$ 162.500	$ 300	$ 0	$ 162.800
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 162.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						DÍAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE			ADMIN	TOTAL APORTE								
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
1	CC 85153591	BARROS ATEHORTUA DAVID JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-25-COLMENA	30	$ 1.300.000	$ 85153591	$ 6.800		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

TOTAL	**$ 378.100**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1019066798	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ESPINOSA	CLL 23D # 72 B - 89	6879512	mafe_9201@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	23/02/2024	74656250	$710.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	286.000	0		0		0	1	300	0	286.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	366.100	0	0	0	0	1	400	0	366.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.000				12.000	1	100	12.100			120	12.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	45.800	1	100	45.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	286.000	286.300
Pensión	1	366.100	366.500
Riesgos Laborales	1	12.000	12.100
CCF	1	45.800	45.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	709.900	710.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1019066798	MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ESPINOSA		CLL 23D # 72 B - 89	6879512	mafe_9201@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	23/02/2024	74656250	$710.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019066798	RODRIGUEZ ESPINOSA MARIA FERNANDA	59	0			N																	230301	2.288.000	366.100	0	0	0	0	EPS001	2.288.000	286.000	14-23	2.288.000	1	12.000	CCF24	2.288.000	45.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS		CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	13/02/2024	74742377	$1.902.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.900.500				1.900.500	1	1.800	1.902.300			19.005	1.902.300	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	1.900.500	1.902.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	1.900.500	1.902.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS		CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	Y	13/02/2024	74742377	$1.902.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020749088	CASTRO QUINTERO LINA PAOLA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1079938820	Garcia Galan Breyner Asaith	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1082907929	SIERRA ANGULO CRISTHIAN LEONARDO	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1082990441	POLANCO TAFUR OMAR YESID	59	0			N		R																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	108343104	CEBALLOS SUAREZ CRISTIAN ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
6	CC	1083463251	GUERRERO TORRES ARMANDO ARTURO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
7	CC	1083557114	ZUÑIGA RODRIGUEZ YENNIS PAOLA	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1098687645	IGLESIAS ACUÑA JHAN CARLOS	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1118836194	PEREZ ONATE ROBERTO JOSE	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1235540959	AVENDAÑO MONTERO JHON BAIRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
11	CC	19273565	LLANOS PEREZ WALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	19589135	REYES ESTRADA FRANKLIN ABEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	5007470	IGLESIAS BELEÑO MANUEL PIO	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
14	CC	60446697	HIDALGO NIÑO HEIDY LORENA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
15	CC	7602563	CANTILLO ARAGON HUMBERTO RAFAEL	59	0			N	R																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
16	CC	7604958	AVENDAÑO ROJAS YASIR ANTONIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	84025724	SUAREZ DAZA HERNAN RAFAEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
18	CC	84455095	MANTILLA CASTELLANO JARRISON	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	84459665	ALMANZA LURAN JOAN ALEXANDER	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
20	CC	85153591	BARROS ATEHORTUA DAVID JOSE	59	0			N		R																0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
21	CC	85473801	RODRIGUEZ BONILLA BEDREDIN	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-23	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS		CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2024-01	I	16/02/2024	74740487	$475.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	187.500	0		0		0	4	700	0	188.200	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	4	900	0	240.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.600				36.600	4	200	36.800			366	36.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	9.000	4	100	9.100	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	188.200
Pensión	1	240.000	240.900
Riesgos Laborales	1	36.600	36.800
CCF	1	9.000	9.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	473.100	475.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79623949	RAFAEL FERNANDO ESCOBAR LLANOS	CALLE 161 N 16C-28	6729006	RAFAEL.ESCOBAR@REINGENIERIASA.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2024-01	I	16/02/2024	74740487	$475.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79623949	ESCOBAR LLANOS RAFAEL FERNANDO	57	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS001	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	9.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No.TRN 023 RECAUDOS SOI
OFICINA 2701 Santa Marta
CAJERO LPGD1601
FECHA 2024/02/23 HORA 14:21:56
NOMBRE APORTANTE WALBERTO
CEDULA /NIT 19273565
No.CUENTA 19273565

EFECTIVO 162,500.00
TOTAL 162,500.00
PLANILLA 4540757090
Periodo de pago: Año 2024 - Mes 2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

VIGILADO

SF-FT-511/V4(Anverso)

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 024 RECAUDOS SOI
OFICINA 2701 Santa Marta
CAJERO LPGD1601
FECHA 2024/02/23 HORA 14:23:44
NOMBRE APORTANTE WALBERTO
CEDULA /NIT 19273565
No.CUENTA 19273565

EFECTIVO 81,900.00
TOTAL 81,900.00
PLANILLA 4540757600
Periodo de pago: Año 2024 - Mes 1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION
IMPRESA ES CORRECTA

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7602563
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HUMBERTO RAFAEL CANTILLO ARAGON
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	SANTA MARTA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4540756329	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			9				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/02/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997778236

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 1.700	$ 209.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 162.500	$ 1.400	$ 0	$ 163.900
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 1.400	$ 0	$ 163.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7602563	CANTILLO ARAGON HUMBERTO RAFAEL	INDEPEND		$ 1.300.000				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 373.600

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada
