Neiva, 27 de noviembre de 2023

Ingeniero:
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado SGA
SUPERVISOR
Ciudad

Asunto: Informe de seguimiento convenio interadministrativo No 0257 de 2023.

Cordial Saludo,

Adjunto remito Informe de seguimiento convenio interadministrativo No 0257 de 2023 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena-CAM y el municipio de San Agustín – Huila cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTOS CONSTRUIDOS EN ZONAS DEDICADAS A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA"

Cordialmente,

Adriana María Calderón

ADRIANA MARIA CALDERON VARGAS
Contratista CAM -SGA

INFORME DE SEGUIMIENTO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 0257 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM Y EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA

Se realizó el seguimiento a la ejecución física del convenio 0257 de 2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE AISLAMIENTOS CONSTRUIDOS EN ZONAS DEDICADAS A LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE FUENTES ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN - HUILA"

Se realizaron visitas de campo en las que se evidencia la ejecución del mantenimiento a 9.842 metros lineales de aislamiento con sistema de cerca viva, localizados en zonas de nacimiento del Municipio de San Agustín en 4 predios como lo indica la tabla No 01.

Tabla No. 01.
RESUMEN DE EJECUCIÓN FISICA CONVENIO No 0257 DE 2023.

Municipio	Vereda	Nombre del predio	Metros lineales ejecutados	Estado	Coordenadas	
San Agustín	La Argentina	Parcela 12 Bello Bosque	1442	100% Ejecutado	X: 751918	Y: 695788
	La Candela	El Retiro	3031	100% Ejecutado	X: 742993	Y: 644180
	El Oso	El Oso	3250	100% Ejecutado	X: 744052	Y: 695046
	El Oso	El Osoguaico	2119	100% Ejecutado	X: 744943	Y: 696116
Total metros lineales ejecutados: **9.842**						

Se realizaron vistas técnicas a cada uno de los predios acompañadas por un profesional en representación de la alcaldía de San Agustín y el profesional en representación del contratista. Se evidencia el desarrollo de las siguientes intervenciones en cada uno de los predios objeto del convenio así:

Predio No.	01
Fecha	26/10/2023
Lugar	Municipio: San Agustín vereda La Argentina, predio Parcela 12 Bello bosque.
Coordenadas	X: 751918– Y: 695788
Objetivo	Seguimiento convenio interadministrativo No 0257 de 2023 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y el municipio de San Agustín – Huila.
Asistentes	-Ingeniero Cristian David Gómez de la alcaldía San Agustín. -Ingeniero Edwin Jiménez en representación del contratista -Ingeniera Adriana María Calderón contratista CAM- SGA.
Observaciones y evidenciadas	Mediante la realización de recorrido por los 1442 metros lineales del aislamiento se evidencia la realización de las siguientes labores: 1. Limpia general de la franja del aislamiento de un (1) metro de ancho a lado y lado del cerco.  *Fotografía No 01-02 Limpia general a lado y lado del aislamiento* 2. El alambre de la cerca ha sido debidamente templado quedando el aislamiento cumpliendo su función.  *Fotografía No 03-04 Templado de cuerdas*

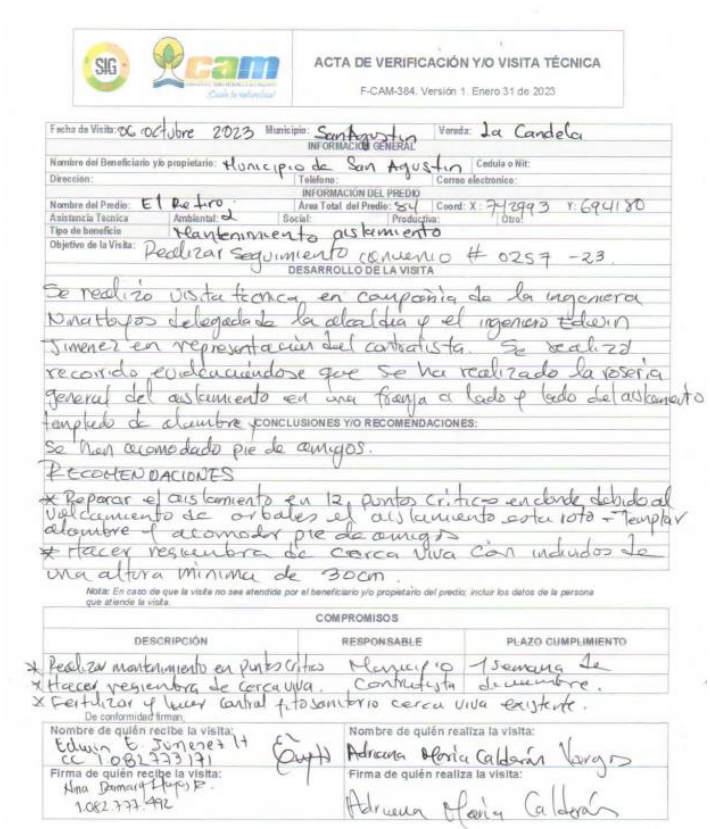
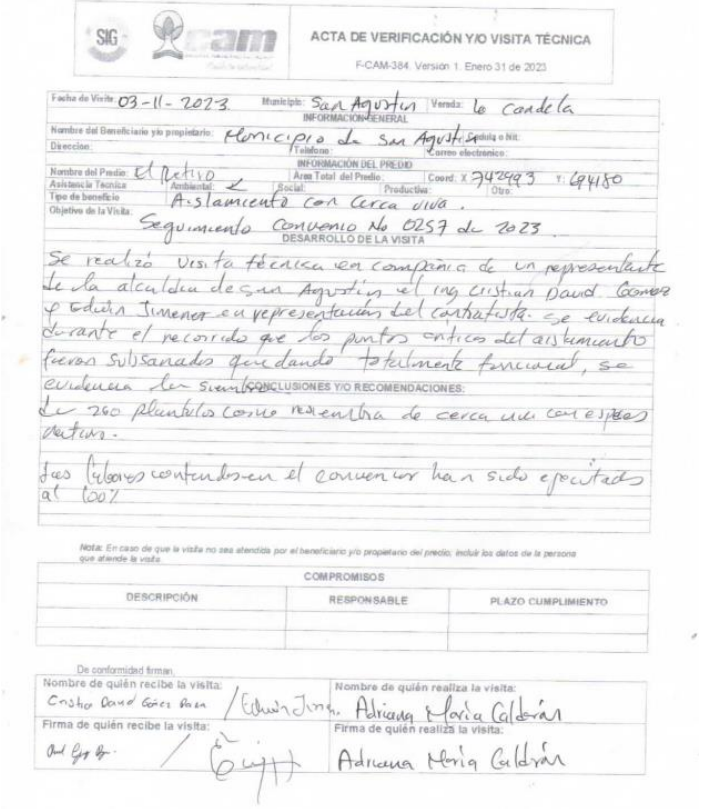
Observaciones y evidenciadas	3. Se evidencia el ajuste de pie de amigos lo cual permite que el aislamiento cumpla con sus funciones.  *Fotografía No 05-07 Ajuste de pie de amigos* 4. En la cerca viva se encuentran principalmente nacedero (*Trichanthera gigantea) y* chachafruto *(Erythrina edulis) en buen* estado sanitario, plateados y fertilizados.  *Fotografía No 08- 10 Mantenimiento a la cerca viva existente* 5. Resiembra de del material vegetal de la cerca muerto un total de 115 plántulas de chachafruto *(Erythrina edulis)* que corresponden al 20%.

Observaciones y evidenciadas	  *Fotografía No 11-12* Resiembra de material vegetal
Récord de visita	SIG cam **ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA** F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023 Fecha de Visita: 26 octubre 2023. Municipio: San Agustín. Vereda: La Argentina. INFORMACIÓN GENERAL Nombre del Beneficiario y/o propietario: RNSC. Cedula o Nit: Dirección: Teléfono: Correo electrónico: INFORMACIÓN DEL PREDIO Nombre del Predio: Parcela 12 Bello Horizonte. Área Total del Predio: Coord. X: 751918 Y: 695788 Asistencia Técnica: Ambiental: Social: Productiva: Otro: Tipo de beneficio: Aislamiento con cerca viva. Objetivo de la Visita: Seguimiento convenio No. 0257 de 2023. DESARROLLO DE LA VISITA Se realizó visita de seguimiento a la ejecución física del convenio acompañada por el ingeniero Cristian David Gómez delegado de la alcaldía y el ingeniero Edwin Jimenez en representación del contratista. Se realizó recorrido por todo el aislamiento evidenciando el cumplimiento de las labores indicadas en el convenio. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES: Se evidencia que las labores de roseria, templado de cuerdas, ajuste de Pie de amigos, mantenimiento de cerca viva y resiembra de cerca viva se ejecutaron a 100%. *Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.* COMPROMISOS DESCRIPCIÓN / RESPONSABLE / PLAZO CUMPLIMIENTO De conformidad firman. Nombre de quién recibe la visita: - Cristian David Gómez Daza 1088780806 Firma de quién recibe la visita: Nombre de quién realiza la visita: Adriana María Calderón Firma de quién realiza la visita: Adriana María Calderón. - Edwin E. Jimenez 1088773171

Predio No.	02
Fecha	06/10/2023 y 03/11/2023
Lugar	Municipio: San Agustín vereda La Candela, predio El Retiro
Coordenadas	X: 742993 – Y: 694180
Objetivo	Seguimiento convenio interadministrativo No 0257 de 2023 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y el municipio de San Agustín – Huila.
Asistentes	-Ingenieros Nina Hoyos y Cristian David Gómez de la alcaldía San Agustín. -Ingeniero Edwin Jiménez en representación del contratista -Ingeniera Adriana María Calderón contratista CAM- SGA.
Observaciones y evidenciadas	Mediante la realización de recorrido por los 3031 metros lineales del aislamiento se evidencia la realización de las siguientes labores: 1. Limpia general de la franja del aislamiento de un (1) metro de ancho a lado y lado del cerco.   *Fotografía No 13 -14 Limpia general a lado y lado del aislamiento*

Observaciones y evidenciadas	2. El alambre de la cerca ha sido debidamente templado quedando el aislamiento cumpliendo su función.   *Fotografía No 15-16 Templado de cuerdas* 3. Se evidencia el ajuste de pie de amigos lo cual permite que el aislamiento cumpla con sus funciones.   *Fotografía No 17-18 Ajuste de pie de amigos*

Observaciones y evidenciadas	4. En la cerca viva se encuentran principalmente especies de la zona en buen estado sanitario, plateados y fertilizados.  *Fotografía No 19-21 Mantenimiento a la cerca viva existente* 5. Resiembra de del material vegetal de la cerca muerto con especies de la zona principalmente melastomatáceas y rubiáceas, 260 plántulas en total que corresponde al 20% distribuidos en varios tramos del aislamiento  *Fotografía No 22-23 Resiembra* de material vegetal

Récord de visita	 

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 06 octubre 2023 Municipio: San Agustin Vereda: La Candela

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustin Cedula o Nit:

Direccion: Telefono: Correo electronico:

INFORMACION DEL PREDIO

Nombre del Predio: El Retiro Area Total del Predio: 54 Coord: X: 742993 Y: 694180

Asistencia Tecnica Ambiental: 2 Social: Productiva: Otro:

Tipo de beneficio: Mantenimiento aislamiento

Objetivo de la Visita: Realizar Seguimiento convenio # 0257 -23.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizo visita tecnica en compañia de la ingeniera Diana Vargas delegada de la alcaldia y el ingeniero Edwin Jimenez en representacion del contratista. Se realizo recorrido evidenciandose que se ha realizado la reseria general del aislamiento en una franja a lado y lado del aislamiento templado de alambre

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se han acomodado pie de amigos.

RECOMENDACIONES

* Reparar el aislamiento en 12 puntos criticos en donde debido al volcamiento de arboles el aislamiento esta roto + templar alambre + acomodar pie de amigos
* Hacer resiembra de cerca viva con individuos de una altura minima de 30cm.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO
* Realizar mantenimiento en puntos criticos	Municipio	1 semana de
* Hacer resiembra de cerca viva.	contratista	diciembre.
* Fertilizar y hacer control fitosanitario cerca viva existente.		

De conformidad firman:

Nombre de quién recibe la visita: Edwin E. Jimenez 14 CC 1082733171	Nombre de quién realiza la visita: Adriana Maria Caldrón Vargas
Firma de quién recibe la visita: Ana Dimary Lopez P. 1.082.777.492	Firma de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Version 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 03-11-2023 Municipio: San Agustin Vereda: la candela

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustin Cedula o Nit:

Direccion: Telefono: Correo electronico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: El Retiro Area Total del Predio: Coord: X 742993 Y: 694180

Asistencia Tecnica Ambiental: X Social: Productiva: Otro:

Tipo de beneficio: Aislamiento con Cerca viva.

Objetivo de la Visita: Seguimiento Convenio No 0257 de 2023.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita técnica en compañia de un representante de la alcaldia de San Agustin el ing Cristian David Gomez y Edwin Jimenez en representación del contratista. se evidencia durante el recorrido que los puntos criticos del aislamiento fueron subsanados quedando totalmente funcional, se evidencia la siembra

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

de 260 plantulas como resiembra de cerca viva con especies nativas.

las labores contenidas en el convenio han sido ejecutadas al 100%

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

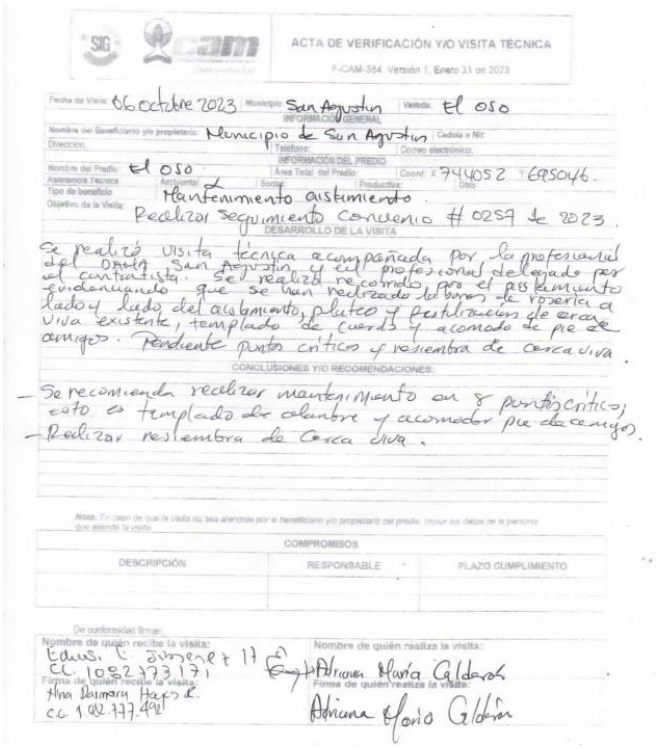
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman:

Nombre de quién recibe la visita: Cristian David Gómez Rosa / Edwin Jimenez	Nombre de quién realiza la visita: Adriana Maria Caldrón
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón

Predio No.	03
Fecha	06/10/2023 y 03/11/2023
Lugar	Municipio: San Agustín vereda EL Oso, predio El Oso
Coordenadas	X: 744052– Y: 695046
Objetivo	Seguimiento convenio interadministrativo No 0257 de 2023 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y el municipio de San Agustín – Huila.
Asistentes	-Ingenieros Nina Hoyos y Cristian David Gómez de la alcaldía San Agustín -Ingeniero Edwin Jiménez en representación del contratista -Ingeniera Adriana María Calderón contratista CAM- SGA.
Observaciones y evidenciadas	Mediante la realización de recorrido por los 3250 metros lineales del aislamiento se evidencia la realización de las siguientes labores: 1. Limpia general de la franja del aislamiento de un (1) metro de ancho a lado y lado del cerco.   *Fotografía No 24 -25 Limpia general a lado y lado del aislamiento* 2. El alambre de la cerca ha sido debidamente templado quedando el aislamiento cumpliendo su función.   *Fotografía No 26 -27 Templado de cuerdas*

Observaciones y evidenciadas	3. Se evidencia el ajuste de pie de amigos lo cual permite que el aislamiento cumpla con sus funciones.  *Fotografía No 28 Ajuste de pie de amigos* 4. En la cerca viva se encuentran especies de la zona en buen estado sanitario, plateados y fertilizados.  *Fotografía No 29-30 Mantenimiento a la cerca viva existente* 5. Resiembra de del material vegetal de la cerca muerto con especies de la zona principalmente melastomatáceas 242 plántulas que corresponde al 20% distribuidos en varios tramos del aislamiento.  *Fotografía No 31-32 Resiembra* de material vegetal

Récord de visita	

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 06 octubre 2023 Municipio: San Agustin Vereda: El 050

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustin Cedula o Nit:

Direccion: Telefono: Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: El 050 Area Total del Predio: Coord: X 744052 Y 695046.

Asistencia Tecnica: Ambiental: Social: Productiva: Otro:

Tipo de beneficio: Mantenimiento aislamiento.

Objetivo de la Visita: Realizar Seguimiento convenio # 0259 de 2023.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita técnica acompañada por la profesional del CMGRD San Agustin y el profesional delegado por el contratista. Se realizó recorrido por el aislamiento evidenciando que se han realizado labores de roceria a lado y lado del aislamiento, plateo y fertilización de cerca viva existente, templado de cuerda y acomodo de pie de amigos. Pendiente puntos criticos y resiembra de cerca viva.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar mantenimiento en 8 puntos criticos; esto es templado de alambre y acomodar pie de amigos.
- Realizar resiembra de cerca viva.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

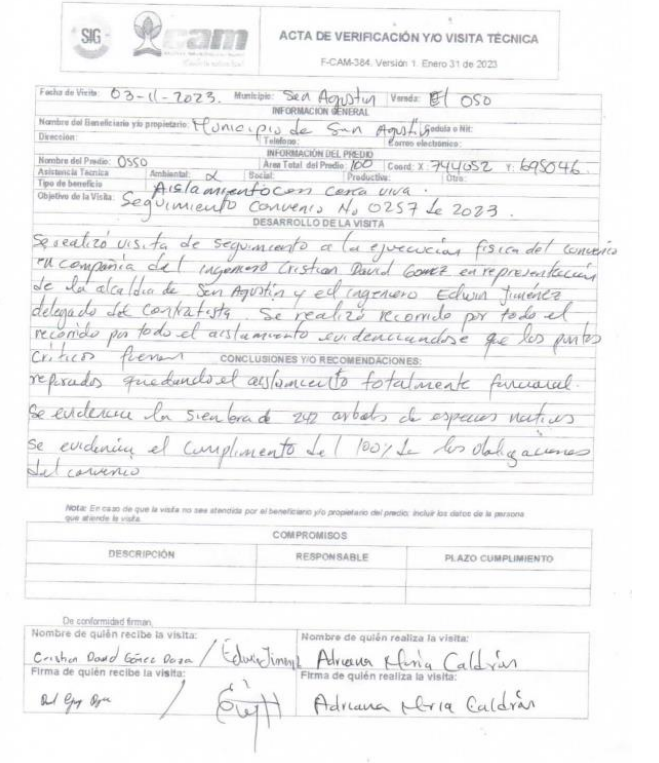
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman:

Nombre de quién recibe la visita: Edwin C. Jimenez T. CC. 1082773171

Firma de quién recibe la visita: Nombre de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón

Firma de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón



ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 03-11-2023. Municipio: San Agustin Vereda: El 050

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustin Cedula o Nit:

Direccion: Telefono: Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: 050 Area Total del Predio: 100 Coord: X 744052 Y 695046.

Asistencia Tecnica: Ambiental: X Social: Productiva: Otro:

Tipo de beneficio: Aislamiento Con cerca viva.

Objetivo de la Visita: Seguimiento Convenio No 0257 de 2023.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita de seguimiento a la ejecucion fisica del convenio en compañia del ingeniero Cristian David Gomez en representación de la alcaldia de San Agustin y el ingeniero Edwin Jimenez delegado del contratista. Se realizó recorrido por todo el recorrido por todo el aislamiento evidenciandose que los puntos criticos fueron reparados quedando el aislamiento totalmente funcional. Se evidencia la siembra de 240 arboles de especies nativas Se evidencia el cumplimiento del 100% de las obligaciones del convenio

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman.

Nombre de quién recibe la visita: Cristian David Gómez Daza / Edwin Jimenez

Nombre de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón

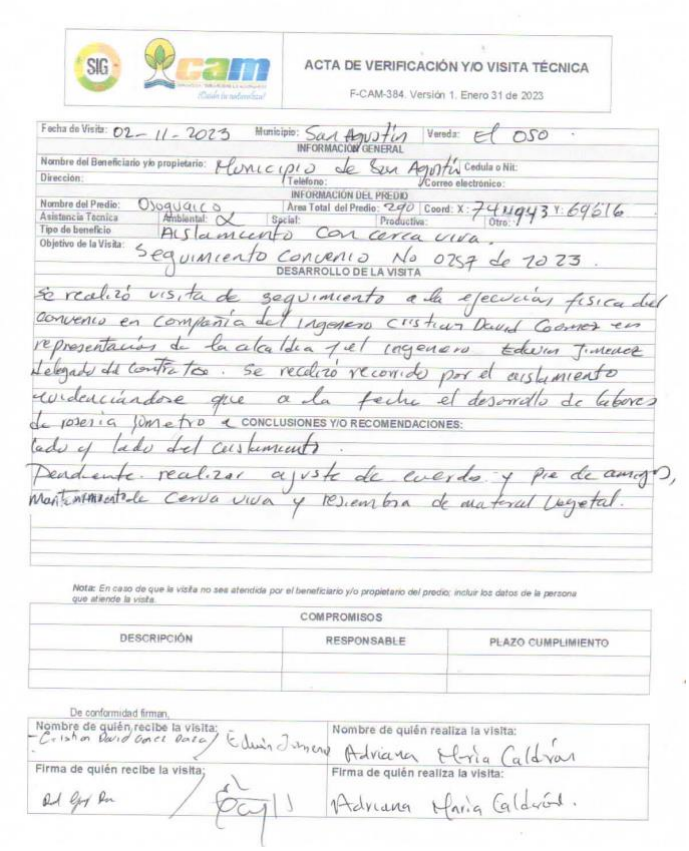
Firma de quién recibe la visita:

Firma de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón

Predio No.	04
Fecha	02/11/2023
Lugar	Municipio: San Agustín vereda El Oso, predio Osoguaico
Coordenadas	X: 744943– Y: 696116
Objetivo	Seguimiento convenio interadministrativo No 0257 de 2023 suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y el municipio de San Agustín – Huila.
Asistentes	-Cristian David Gómez alcaldía San Agustín. -Ingeniero Edwin Jiménez en representación del contratista -Ingeniera Adriana María Calderón contratista CAM- SGA.
Observaciones y evidenciadas	Mediante la realización de recorrido por los 2119 metros lineales del aislamiento se evidencia la realización de las siguientes labores: 1. Limpia general de la franja del aislamiento de un (1) metro de ancho a lado y lado del cerco.   *Fotografía No 33-34 Limpia general a lado y lado del aislamiento* 2. El alambre de la cerca ha sido debidamente templado quedando el aislamiento cumpliendo su función.

Observaciones y evidenciadas	 *Fotografía No 35 Templado de cuerdas* 3. Se evidencia el ajuste de pie de amigos lo cual permite que el aislamiento cumpla con sus funciones.  *Fotografía No 36 Ajuste de pie de amigos* 4. En la cerca viva se encuentran especies de la zona en buen estado sanitario, plateados y fertilizados. 

Observaciones y evidenciadas	  *Fotografía No 37 -39 Mantenimiento a la cerca viva existente* 5. Resiembra de del material vegetal de la cerca muerto con especies de la zona en total 169 plántulas que corresponde al 20%, 59 plántulas fueron sembradas el predio Osoguaico y 110 en el predio Parcela 12 Bello Bosque.   *Fotografía No 40-41 Resiembra* de material vegetal establecido en Parcela 12 Bello Bosque

	   *Fotografía No 42-43 Resiembra* de material vegetal
Récord de visita	

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 02-11-2023 Municipio: San Agustín Vereda: El Oso

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustín Cedula o Nit:

Dirección: Teléfono: Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Oyaguaico Area Total del Predio: 290 Coord: X: 74u943 Y: 69616

Asistencia Técnica Ambiental: X Social: Productiva: Otro:

Tipo de beneficio Aislamiento con cerca viva.

Objetivo de la Visita: Seguimiento convenio No 0757 de 2023.

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita de seguimiento a la ejecución física del convenio en compañía del Ingeniero Cristian David Cortez en representación de la alcaldía y el ingeniero Edwin Jimenez delegado del contratista. Se recibió recorrido por el aislamiento evidenciándose que a la fecha el desarrollo de labores de cerca perimetro

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Todo el lado del cerramiento.

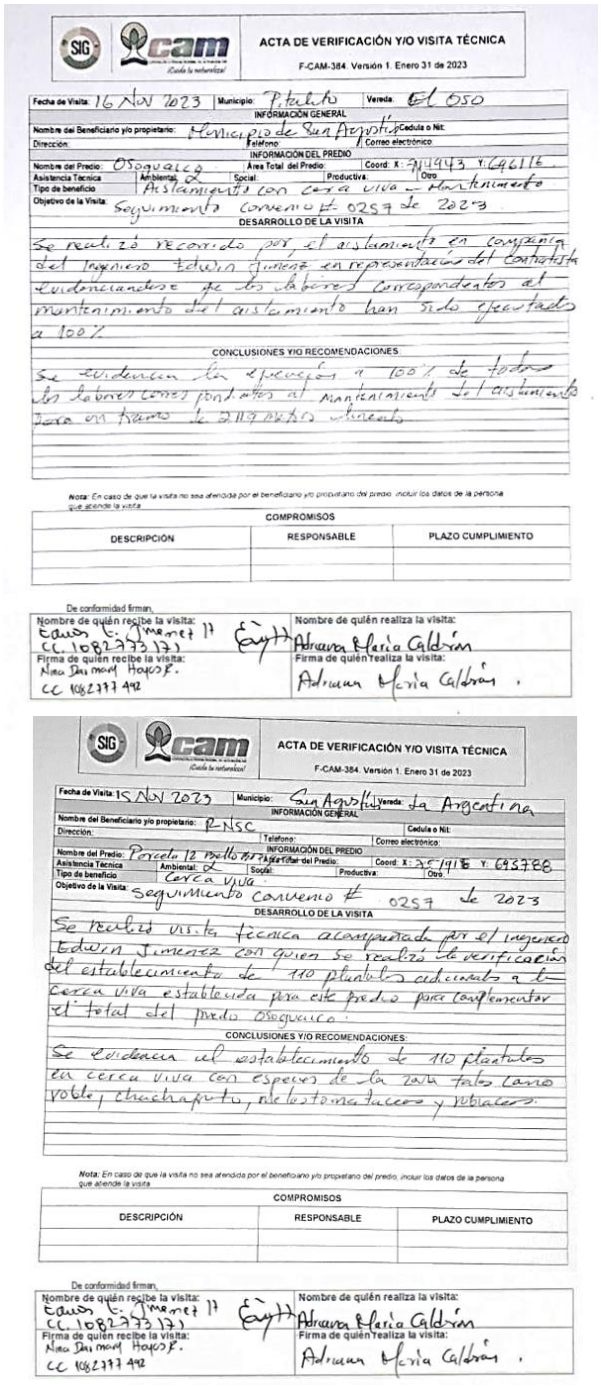
Pendiente realizar ajuste de cuerdo y pie de amigo, Mantenimiento de cerca viva y resiembra de material vegetal.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio; incluir los datos de la persona que atiende la visita.

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Cristian David Cortez Ortiz / Edwin Jimenez	Nombre de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón
Firma de quién recibe la visita:	Firma de quién realiza la visita: Adriana María Caldrón.

Récord de visita	

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 16 NOV 2023 | Municipio: Pitalito | Vereda: El Oso

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: Municipio de San Agustín | Cedula o Nit:

Dirección: | Teléfono: | Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Osoguaico | Area Total del Predio: | Coord: X: 771943 Y: 646116

Asistencia Técnica | Ambiental: X | Social: | Productiva: | Otro:

Tipo de beneficio: Aislamiento con cerca viva - Mantenimiento

Objetivo de la Visita: Seguimiento convenio # 0259 de 2023

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó recorrido por el aislamiento en compañía del Ingeniero Edwin Jimenez en representación del contratista evidenciandose que los labores correspondientes al mantenimiento del aislamiento han sido ejecutados a 100%

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se evidencian las ejecuciones a 100% de todas las labores correspondientes al mantenimiento del aislamiento para un total de 3119 MTRS aislados

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Edwin C. Jimenez H (CC. 1082773171)

Nombre de quién realiza la visita: Adriana María Calderón

Firma de quién recibe la visita: Nini Dayana Hoyos F. CC 1082777492

Firma de quién realiza la visita: Adriana María Calderón.

ACTA DE VERIFICACIÓN Y/O VISITA TÉCNICA

F-CAM-384. Versión 1. Enero 31 de 2023

Fecha de Visita: 15 NOV 2023 | Municipio: San Agustín | Vereda: La Argentina

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Beneficiario y/o propietario: RNSC | Cedula o Nit:

Dirección: | Teléfono: | Correo electrónico:

INFORMACIÓN DEL PREDIO

Nombre del Predio: Predio 12 mallos | Area Total del Predio: | Coord: X: 765916 Y: 693788

Asistencia Técnica | Ambiental: X | Social: | Productiva: | Otro:

Tipo de beneficio: Cerca viva

Objetivo de la Visita: Seguimiento convenio # 0259 de 2023

DESARROLLO DE LA VISITA

Se realizó visita técnica acompañado por el ingeniero Edwin Jimenez con quien se realizó la verificación del establecimiento de 110 plantulas adicionales a la cerca viva establecida para este predio para complementar el total del predio Osoguaico.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se evidencia el establecimiento de 110 plantulas en cerca viva con especies de la zona tales como yoplo, chachafruto, nacedero, cucharo y yolillo.

Nota: En caso de que la visita no sea atendida por el beneficiario y/o propietario del predio, incluir los datos de la persona que atiende la visita

COMPROMISOS		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO

De conformidad firman,

Nombre de quién recibe la visita: Edwin C. Jimenez H (CC. 1082773171)

Nombre de quién realiza la visita: Adriana María Calderón

Firma de quién recibe la visita: Nini Dayana Hoyos F. CC 1082777492

Firma de quién realiza la visita: Adriana María Calderón.

Cordialmente,

Adriana María Calderón

ADRIANA MARIA CALDERON VARGAS
Contratista CAM -SGA
