INFORME DE ACTIVIDADES DE ACTA No1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/11/2023 AL 31/12/2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio:	SAMC-IE-SB–001-2023
Objeto:	OBRAS DE ADECUACION Y REPARACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SALIM BECHARA
Clase de Contrato o convenio:	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE OBRAS
Fecha Inicio:	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha Terminación:	1 DE DICIEMBRE DE 2023
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	90%
Nombre del contratista:	REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S
CC / Nit:	901358559 - 0
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	ADALBERTO ARANZA MORON
Cargo del Supervisor:	RECTOR DE LA INSTITUCION

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula No 8 se presenta el informe correspondiente.


1) DESMONTE DE SALIO RASO, ESTRUCTURA Y SUMINISTRO E INST. CIELO RASO EN VINILO PVC.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la actividad desarrollada: Se procedió con el desmonte de cielo raso, estructura existente y luminarias para la instalación de la estructura y cielo raso en vinilo PVC.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Evidencia:

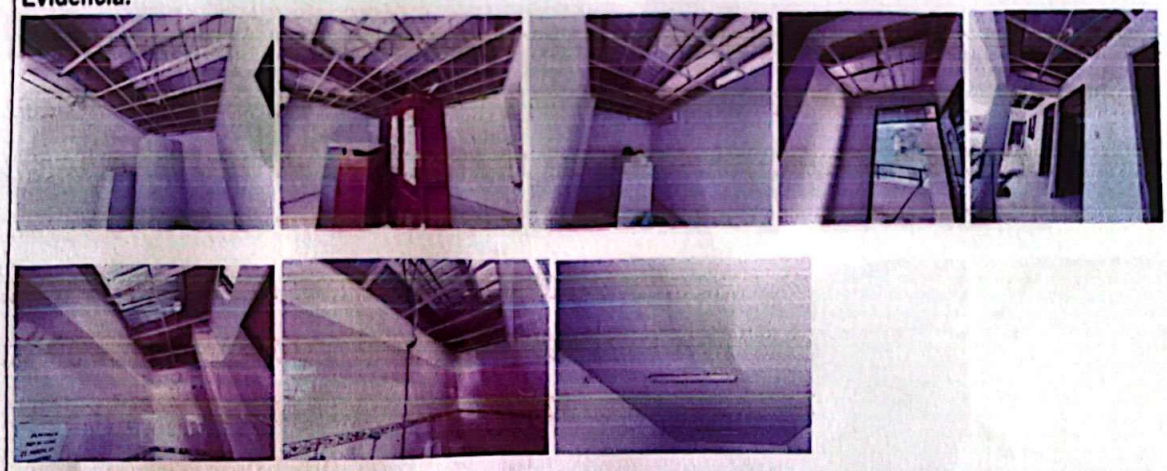

2) DEMOLICION MURO PERIMETRAL DE CALLEJON, DEMOLICION DE PAÑETE SEGUNDO PISO AREA DE ADMINISTRACION Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN SEGUNDO PISO AREA DE ADMINISTRACION.

ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la actividad: Demolición de muro superior perimetral en callejón de la institución, demolición de rebaba de pañete en segundo piso área de administración para lograr un solo plomo y proceder con el pañete impermeabilizado.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Evidencia:




3) INSTALACION DE CUBIERTA

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Describir completamente la actividad: Remate con flanche la cubierta instalada en área segundo piso de administración.

Powered by CamScanner

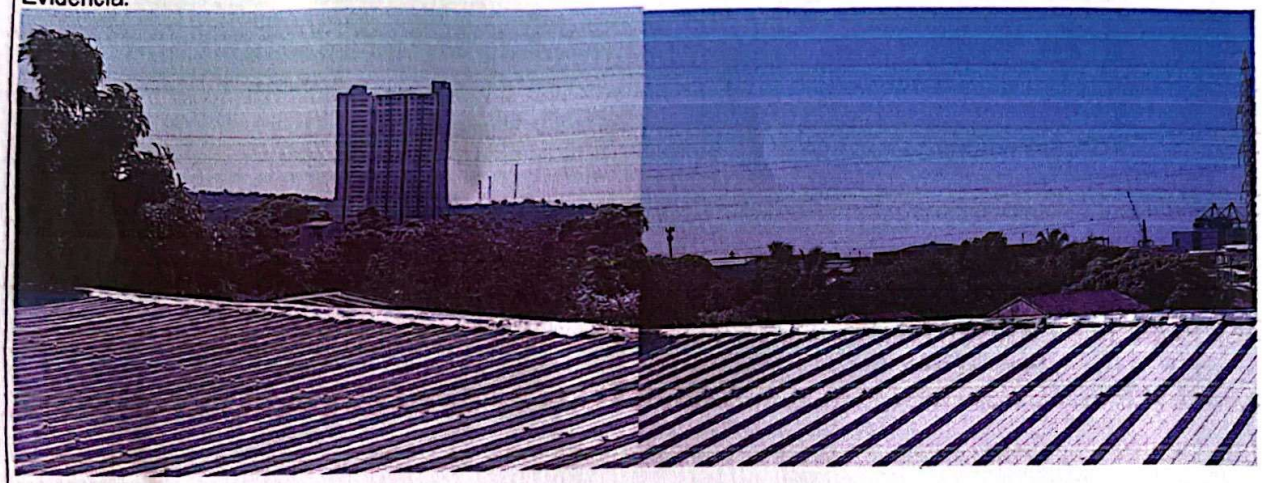OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Evidencia: 

4) ESTUCO Y PINTURA VINILO (2 MANOS, INCLUYE LIJADO DE PINTURA)

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la actividad: Levante de estuco existente para la aplicación nuevamente, se procede a lijar y aplicar dos manos de pintura.

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

Evidencia:



Powered by CamScanner

5) PINTURA KORAZA EXTERIORES

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la actividad: Se tomaron detalles en estuco y se aplicó mano de pintura Koraza para exteriores en fachada de bloque de área de administración.
Evidencia: 

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que respaldan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe en el aplicativo SECOP II de acuerdo con la Guia Presentación Informe de Actividades y Supervisión a la Ejecución Contractual.

REINGENIERIA INTEGRAL S.AS. – REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner
