INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029397-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21311-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-06	Fecha de Informe:	2024-02-13		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-09	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	59
*Localización	59	LOSA CONTRAPISO COLOR OCRE MODULO 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6, 7, Y 8 COSTADO NORTE
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	307	
Diámetro (Ø)	mm	152.53	152.53	
Masa	g	12786	12588	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18272.60	18272.60	
Densidad	Kg/m^3	2287	2244	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	614.1	637.3	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	33.6	34.9	
Resistencia a la compresión	Psi	4874.9	5061.9	
Resistencia a la compresión	%	**120.0**	**124.6**	
Patrón de fractura	-	3	4	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**34.3**
	%	**122.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Paramo
Fecha: 2024.02.13 07:51:47 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

INV E 410-13

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029403-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21311-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-07	Fecha de Informe:	2024-02-14		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-10	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	61
*Localización	61	LOSA CONTRAPISO COLOR BLANCO MODULO 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 Y 8 COSTADO NORTE Y MODULO 1 COLO BLANCO COSTADO SUR
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	307	
Diámetro (Ø)	mm	152.00	151.50	
Masa	g	12613	1267	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18145.84	18026.65	
Densidad	Kg/m^3	2272	229	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	505.0	510.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	27.8	28.3	
Resistencia a la compresión	Psi	4039.2	4110.6	
Resistencia a la compresión	%	**99.5**	**101.2**	
Patrón de fractura	-	5	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.1**
	%	**100.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.15 09:44:28 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029406-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21312-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-07	Fecha de Informe:	2024-02-14		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-10	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	62
*Localización	62	COLUMNA 3 Y 4 DE LA PERSOLA 6 / MURO RAMPA 2 MODULO 6 Y 7 COSTADO NORTE Y ZARCA DE LA RAMPA 2 MODULO 8 Y 9
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	307	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	150.50	
Masa	g	12489	12214	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18265.42	17789.46	
Densidad	Kg/m^3	2234	2236	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	588.3	524.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	32.2	29.5	
Resistencia a la compresión	Psi	4672.1	4284.9	
Resistencia a la compresión	%	**115.0**	**105.5**	
Patrón de fractura	-	5	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**30.9**
	%	**110.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.15 08:44:21 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol. Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029409-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21312-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-08	Fecha de Informe:	2024-02-13		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-11	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	63
*Localización	63	LOSA CONTRAPISO COLOR GRIS MODULO 5 , 6 ,7 Y 8 COSTADO NORTE Y LOSA CONTRAPISO COLOR GRIS MODULO 10 , 11 , 12 Y 13
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	303	
Diámetro (Ø)	mm	150.50	150.00	
Masa	g	11713	12789	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	17789.46	17671.46	
Densidad	Kg/m^3	2166	2388	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	605.3	594.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	34.1	33.7	
Resistencia a la compresión	Psi	4941.5	4881.7	
Resistencia a la compresión	%	**121.7**	**120.2**	
Patrón de fractura	-	2	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**33.9**
	%	**120.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.02.13 13:20:01 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029412-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21312-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-08	Fecha de Informe:	2024-02-13		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-11	*Resistencia nominal (Mpa)	21.0	*Resistencia nominal (Psi)	3046	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	64
*Localización	64	MURO MATERA 2 Y 2 A COSTADO NORTE
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	305	
Diámetro (Ø)	mm	150.50	151.50	
Masa	g	11967	11492	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	17789.46	18026.65	
Densidad	Kg/m^3	2213	2090	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	411.6	412.8	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	23.2	22.9	
Resistencia a la compresión	Psi	3360.0	3323.6	
Resistencia a la compresión	%	**110.3**	**109.1**	
Patrón de fractura	-	2	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.0**
	%	**109.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.02.13 13:15:25 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol. Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029415-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21312-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-09	Fecha de Informe:	2024-02-13		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-12	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	65
*Localización	65	LOSA CONTRAPISO COLOR GRIS MODULO 9 ,10 ,11 COSTADO SUR
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	305	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	151.50	
Masa	g	11859	11963	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18265.42	18026.65	
Densidad	Kg/m^3	2122	2176	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	594.2	539.5	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	32.5	30.0	
Resistencia a la compresión	Psi	4718.6	4343.9	
Resistencia a la compresión	%	**116.2**	**107.0**	
Patrón de fractura	-	5	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**31.2**
	%	**111.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Paramo
Fecha: 2024.02.13 16:37:58 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol. Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029418-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21314-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-10	Fecha de Informe:	2024-02-16		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-13	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	66
*Localización	66	LOSA CONTRAPISO COLOR OCRE MÓDULO 3, 4, 5 ,6 ,Y 7 COSTADO CENTRO
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	306	
Diámetro (Ø)	mm	150.50	151.50	
Masa	g	12264	12578	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	17789.46	18026.65	
Densidad	Kg/m^3	2253	2280	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	551.1	545.5	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	31.1	30.3	
Resistencia a la compresión	Psi	4503.7	4394.1	
Resistencia a la compresión	%	**110.9**	**108.2**	
Patrón de fractura	-	2	4	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**30.7**
	%	**109.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.02.16 16:20:47 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029421-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21314-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-12	Fecha de Informe:	2024-02-19		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-15	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	67
*Localización	67	LOSA CONTRAPISO COLOR BLANCO, MÓDULOS 10, 11 ,12 COSTADO SUR Y MODULO 10, 11 , 12, Y 13 COSTADO CENTRO Y MODULO 10, 11, 12, Y 13
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	302	302	
Diámetro (Ø)	mm	152.02	152.02	
Masa	g	11500	11500	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18150.61	18150.61	
Densidad	Kg/m^3	2098	2098	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	450.0	455.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	24.8	25.0	
Resistencia a la compresión	Psi	3590.6	3630.5	
Resistencia a la compresión	%	**88.4**	**89.4**	
Patrón de fractura	-	2	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**24.9**
	%	**88.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.19 09:47:39 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0029424-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21314-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-01-19	Fecha de Ensayo:	2024-02-12	Fecha de Informe:	2024-02-17		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-15	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	68
*Localización	68	LOSA CONTRAPISO ENTRE MATERAS 7 Y 8 COSTADO CENTRO
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	304	
Diámetro (Ø)	mm	150.50	150.50	
Masa	g	12462	11803	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	17789.46	17789.46	
Densidad	Kg/m^3	2297	2183	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	500.2	504.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	28.2	28.4	
Resistencia a la compresión	Psi	4085.4	4113.9	
Resistencia a la compresión	%	**100.6**	**101.3**	
Patrón de fractura	-	3	5	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.3**
	%	**101.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.02.17 08:41:51 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio — ONAC ACREDITADO — ISO/IEC 17025:2017 — 20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030336-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21214 -1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-06	Fecha de Informe:	2024-02-13		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-17	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	20

ID Muestra	#	C-69
*Localización	C-69	LOSA DE CONTRAPISO COLOR GRIS, COSTADO CENTRO.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	304	305	
Diámetro (Ø)	mm	153.55	153.54	
Masa	g	11854	11965	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18517.81	18515.39	
Densidad	Kg/m^3	2106	2119	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	432.5	423.8	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	23.3	22.9	
Resistencia a la compresión	Psi	3380.8	3315.1	
Resistencia a la compresión	%	**83.2**	**81.6**	
Patrón de fractura	-	2	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.1**
	%	**82.4**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030340-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21214-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-14	Fecha de Informe:	2024-02-19		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-17	*Resistencia nominal (Mpa)	21.0	*Resistencia nominal (Psi)	3046	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	70
*Localización	70	MUROS MATERA 9, COSTADO SUR.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	306	
Diámetro (Ø)	mm	151.50	151.00	
Masa	g	11841	122525	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18026.65	17907.86	
Densidad	Kg/m^3	2154	22359	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	360.0	350.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	20.0	19.6	
Resistencia a la compresión	Psi	2898.5	2839.8	
Resistencia a la compresión	%	**95.2**	**93.2**	
Patrón de fractura	-	5	5	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**19.8**
	%	**94.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.19 07:46:42 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030343-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21214-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-15	Fecha de Informe:	2024-02-19		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-18	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	71
*Localización	71	PLACA DE CONTRAPISO COLOR OCRE, COSTADO CENTRO.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	306	
Diámetro (Ø)	mm	151.50	152.50	
Masa	g	12598	12397	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18026.65	18265.42	
Densidad	Kg/m^3	2284	2218	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	559.0	555.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	31.0	30.4	
Resistencia a la compresión	Psi	4503.3	4407.8	
Resistencia a la compresión	%	**110.9**	**108.5**	
Patrón de fractura	-	5	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**30.7**
	%	**109.7**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.19 17:15:48 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030346-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21214-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-16	Fecha de Informe:	2024-02-20		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-19	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	72
*Localización	72	PLACA DE CONTRAPISO COLOR BLANCO, COSTADO CENTRO.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	305	
Diámetro (Ø)	mm	154.54	154.53	
Masa	g	11984	11654	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18757.36	18754.93	
Densidad	Kg/m^3	2095	2037	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	506.3	524.3	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	26.9	27.9	
Resistencia a la compresión	Psi	3905.0	4044.4	
Resistencia a la compresión	%	**96.2**	**99.6**	
Patrón de fractura	-	2	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**27.4**
	%	**97.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.02.20 10:54:19 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

Idicol. Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

INV E 410-13

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030348-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21215-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-06	Fecha de Informe:	2024-02-13		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-22	*Resistencia nominal (Mpa)	21.0	*Resistencia nominal (Psi)	3046	*Edad de falla (días)	15

ID Muestra	#	C-73
*Localización	C-73	PLACA DE MATERA 8, COSTADO CENTRO.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	305	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	151.50	
Masa	g	11845	11628	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18265.42	18026.65	
Densidad	Kg/m^3	2126	2115	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	384.5	381.7	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	21.0	21.2	
Resistencia a la compresión	Psi	3051.9	3073.5	
Resistencia a la compresión	%	**100.2**	**100.9**	
Patrón de fractura	-	4	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**21.1**
	%	**100.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por John Alexander Rodriguez
Fecha: 2024.02.13 14:01:28 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030352-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21215-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-21	Fecha de Informe:	2024-02-23		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-24	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	74
*Localización	74	PLACA DE CONTRAPISO COLOR GRIS, COSTADO NORTE.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	331	302	
Diámetro (Ø)	mm	152.05	150.50	
Masa	g	12845	12763	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.2	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18157.78	17789.46	
Densidad	Kg/m^3	2137	2376	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	576.9	584.1	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	32.2	32.8	
Resistencia a la compresión	Psi	4672.4	4762.9	
Resistencia a la compresión	%	**115.1**	**117.3**	
Patrón de fractura	-	4	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**32.5**
	%	**116.2**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol. Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030355-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21215-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-21	Fecha de Informe:	2024-02-26		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-24	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	75
*Localización	75	PLACA DE CONTRAPISO COLOR OCRE, COSTADO NORTE.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	302	302	
Diámetro (Ø)	mm	152.02	152.02	
Masa	g	11500	11500	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18150.61	18150.61	
Densidad	Kg/m^3	2098	2098	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	508.0	509.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	27.9	28.0	
Resistencia a la compresión	Psi	4053.2	4061.2	
Resistencia a la compresión	%	**99.8**	**100.0**	
Patrón de fractura	-	2	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.0**
	%	**99.9**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.27 08:40:42 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030358-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21215-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-23	Fecha de Informe:	2024-02-27		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-26	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	76
*Localización	76	PLACA DE CONTRAPISO COLOR BLANCO, COSTADO NORTE.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	305	
Diámetro (Ø)	mm	152.00	151.50	
Masa	g	12342	12372	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18145.84	18026.65	
Densidad	Kg/m^3	2223	2250	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	510.0	505.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	28.1	28.0	
Resistencia a la compresión	Psi	4079.3	4066.1	
Resistencia a la compresión	%	**100.4**	**100.1**	
Patrón de fractura	-	2	5	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.1**
	%	**100.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.28 06:50:20 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030361-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21216-1	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-24	Fecha de Informe:	2024-02-27		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-27	*Resistencia nominal (Mpa)	21.0	*Resistencia nominal (Psi)	3046	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	77
*Localización	77	LOSA DE CONTRAPISO, RAMPA 2, COSTDADO NORTE.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	305	
Diámetro (Ø)	mm	151.50	152.50	
Masa	g	12661	12542	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18026.65	18265.42	
Densidad	Kg/m^3	2303	2251	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	450.0	455.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	25.0	24.9	
Resistencia a la compresión	Psi	3623.2	3611.7	
Resistencia a la compresión	%	**119.0**	**118.6**	
Patrón de fractura	-	2	5	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**24.9**
	%	**118.8**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.28 08:09:09 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030364-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21216-2	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-24	Fecha de Informe:	2024-02-27		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	ARGOS						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-27	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	78
*Localización	78	PLACA DE CONTRAPISO COLOR BLANCO, BOCA CALLES, COSTADO CENTRO Y NORTE.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	305	
Diámetro (Ø)	mm	152.00	150.50	
Masa	g	12202	12189	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18145.84	17789.46	
Densidad	Kg/m^3	2205	2246	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	500.0	505.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	27.6	28.4	
Resistencia a la compresión	Psi	3997.2	4124.8	
Resistencia a la compresión	%	**98.4**	**101.6**	
Patrón de fractura	-	4	3	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**28.0**
	%	**100.0**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.02.28 08:10:25 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol® Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030367-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21216-3	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-27	Fecha de Informe:	2024-03-02		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-30	*Resistencia nominal (Mpa)	21.0	*Resistencia nominal (Psi)	3046	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	79	
*Localización	79	MURO MATERA 8, COSTADO CENTRO.	
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO	

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	305	305	
Diámetro (Ø)	mm	151.50	151.63	
Masa	g	12225	12538	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18026.65	18057.61	
Densidad	Kg/m^3	2223	2277	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	420.0	415.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	23.3	23.0	
Resistencia a la compresión	Psi	3381.7	3335.2	
Resistencia a la compresión	%	**111.0**	**109.5**	
Patrón de fractura	-	2	4	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**23.2**
	%	**110.3**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.03.04 15:02:42 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

www.idicol.com / Email: contactenos@idicol.com
IDICOL S.A.S - Calle 70 A No 52 - 27, Bogotá D.C., Colombia / PBX: 7551341 - Cel: 3114853234

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

INV E 410-13

Idicol Ingeniería, infraestructura y laboratorio

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-019

Código:	FI - GI - 116	**Versión:**	01	**Actualización:**	2021-12-04	**Página:**	1 de 1

ID Informe:	ID-0030370-2024 - 1	Orden de ingreso:	C21216-4	Versión de Informe:	1		
Fecha Recepción:	2024-02-06	Fecha de Ensayo:	2024-02-28	Fecha de Informe:	2024-02-29		
*Cliente:	CONSORCIO VAPA						
*Dirección:	CL 105 A # 14-92 OF 615	*Ciudad	BOGOTÁ	*Departamento	BOGOTÁ	*País	COLOMBIA
ID Obra:	OB-002023	*Obra	ENSAYOS DE LABORATORIO				
*Procedencia:	TREMIX						

INFORMACIÓN DEL ENSAYO

*Fecha de toma	2024-01-31	*Resistencia nominal (Mpa)	28.0	*Resistencia nominal (Psi)	4061	*Edad de falla (días)	28

ID Muestra	#	80
*Localización	80	MURO COMEDOR 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10, Y PLACA DE CONTRAPISO COLOR GRIS, COSTADO NORTE.
Tipo de material	-	CILINDRO DE CONCRETO

DIMENSIONES Y PROPIEDADES DE LA MUESTRA

Muestra	-	1	2	3
Longitud (L)	mm	306	305	
Diámetro (Ø)	mm	152.50	152.50	
Masa	g	12968	12855	
Relación Longitud / Diámetro (L/Ø)	-	2.0	2.0	
Área de la sección transversal	mm^2	18265.42	18265.42	
Densidad	Kg/m^3	2320	2308	

CÁLCULOS DE RESISTENCIA

Carga máxima	kN	566.8	595.0	
Factor de corrección	-	1.0	1.0	
Resistencia a la compresión	Mpa	31.0	32.6	
Resistencia a la compresión	Psi	4501.1	4723.1	
Resistencia a la compresión	%	**110.8**	**116.3**	
Patrón de fractura	-	5	2	

RESISTENCIA PROMEDIO	**(MPa)**	**31.8**
	%	**113.6**

ID Equipos utilizados: EQ-0538 Balanza 15000 g, EQ-0539 Prensa compresión 1000 kN, EQ-0528 Prensa universal, EQ-0592 Pie de rey (300 mm), EQ-0565 Bloque patrón para medición de longitudes (Bloque de 0.118 pulgadas), EQ-0625 Galga 2 mm.

Sitio de ejecución del ensayo: Instalaciones laboratorio IDICOL SAS, Calle 70 A # 52 - 27

Observaciones:

Firmado digitalmente por Jhon Alexander Rodríguez
Fecha: 2024.03.01 11:07:31 -05'00'

ING. JOHN ALEXANDER RODRIGUEZ
Director de ingeniería
Aprobó

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

El Laboratorio IDICOL SAS no es responsable de la información suministrada por el cliente, la cual está identificada con un asterisco * en el presente Informe
Los resultados reportados corresponden exclusivamente a las muestras de ensayo entregadas al laboratorio y analizadas
El Laboratorio IDICOL SAS no realiza muestreo. Los resultados se aplican a la muestra como se recibió
Se prohibe la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización escrita del laboratorio

ANEXO 1L. ACTA DE ENTREGA PARCIAL OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. AMBIENTE Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE – FT -21 **Versión:** 01 **Vigente desde:** 05-06-2020

Lugar:	Sitio de la Obra	**Fecha:**	29	02	2024
Hora Inicio:	10:00 am	**Hora Final:**	11:00 am		


Objetivo

Realizar una revisión final de cada una de las actividades ejecutadas para poder recibir a satisfacción la obra por parte de la interventoría, y posterior entrega al IDIGER.

Orden del día




Se realiza recorrido de obra el día 29 de febrero de 2024 entre contratista de obra e interventoría, con el fin de recibir la obra y emitir observaciones de ser pertinentes para que estas sean subsanadas y entregadas a la interventoría, para realizar la firma y recibo a satisfacción de obra y la respectiva entrega al IDIGER.

Siendo las 10:00 am se inicia recorrido de obra entre los directores tanto de obra como de interventoría donde se solicita al contratista de obra tomar los correctivos a las observaciones que se relacionan a continuación:


ITEM	FOTOGRAFÍA	ELEMENTO	OBSERVACIONES		
1		JARDINERAS ABSCISA K0+010 hasta K0+095	Retirar evidencia de aceros y rematar acabado en paredes y corona	Esteticamente no se avala	En proceso con el contratista Pedro
2		PISOS LOSETAS COLOR OCRE Y TERRACOTA	*Resellar con arena de peña cernida en toda las dilataciones *Aseo y lavado *Retirar pintura	Técnicamente se requiere sellado con arena de peña	En proceso con los subcontratistas
3		LOSAS DE CONCRETO DE COLORES	*Aseo y Lavado *Retiro exceso concreto	Esteticamente no se avala	Contratista se compromete al finalizar el detallado y mejoras
4		PATAS DE LOS POSTES ELÉCTRICOS DE CONCRETO	Retiro excedente de concreto	Esteticamente no se avala	En proceso con los subcontratistas
5		INTERCEPTA PATA MURO CON EL PISO CONCRETO COLORES	Nivelar retirando el exceso concreto	Esteticamente no se avala	En proceso con el subcontratista Moises
6		CAÑUELAS PREFABRICADAS	Cambiar por encontrarse desportillada	Esteticamente no se avala	En proceso con los subcontratistas

490

ITEM	FOTOGRAFÍA	ELEMENTO	OBSERVACIONES		
7		RAMPA COSTADO SUR DEL PROYECTO	Aplicar lechada para ocultar las manchas de pintura	Esteticamente no se avala	Contratista se compromete al finalizar el detallado y mejoras
8		MURO DE CONTENCCIÓN DESCANSO RAMPA COSTADO NORTE DEL PROYECTO	*Continuar el muro con concreto *Colocar yumbolon, sellar con Vulkem en la dilatación	Esteticamente no se avala, técnicamente no existe afectación	En proceso con el subcontratista Moises
9		JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL PISO CONCRETO DECOLORES	Retirar el exceso del sello Vulkem	Esteticamente no se avala	Contratista se compromete al finalizar el detallado y mejoras
10		MUROS DE LAS RAMPAS	Retirar el exceso de concreto	Esteticamente no se avala	Contratista se compromete al finalizar el detallado y mejoras
11		*FRANJA DE AJUSTE COLINDA MURO PARALELO - PISO CONCRETO COLORES *LOSETA OCRE	*Aplicar concreto 2500 psi para dar continuidad *Cambiar Loseta Color OCRE	Esteticamente no se avala	Se le recuerda al Contratista
12		MOBILIARIO ATENEA	Cambiar de posición donde se observen el desportillado	Esteticamente no se avala	Se le recuerda al Contratista
13		JARDINERA - PISO CONCRETO DE COLORES K0+037 hasta K0+94,85	Nivelar retirando el exceso concreto	Esteticamente no se avala	En proceso con el subcontratista Pedro
14		CAÑUELAS PREFABRICADAS	Emboquillar los elementos prefabricados	Esteticamente no se avala	Se le recuerda al Contratista
15		CAJA ELÉCTRICA N°1 K0+000	Resanar y dar continuida al acabado	Esteticamente no se avala	Se le recuerda al Contratista
16		CAJA INSPECCIÓN RED HIDROSANITARIA	*Resanar y dar continuida al acabado contorno de la caja	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista

ITEM	FOTOGRAFÍA	ELEMENTO	OBSERVACIONES		
17		BARANDA EXISTENTE DG 71A Sur	Limpiar y retirar pintura	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
18		MURO RAMPA NORTE	Resanar y mejorar acabado	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
19		CANECAS ACERO INOX	Retirar basura depositas dentro de las canecas	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
20		JARDINERAS K0+140 - K0+220	Retirar pintura	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
21		BITÁCORA	Actualizar	Se requiere para los informes mensual y fianl	En proceso Contratista
22		ELEMENTO ESTRUCTURALES CONCRETO A LA VISTA	Se evidencie la no continuidad del elemento estructural: Huecos o falta de sellado en dilataciones	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
23		FRANJA DE AJUSTE PISO LOSETA OCRE Y TERRACOTA	Demoler y construir las franjas concreto 2500 psi mezclado insitu	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
24		CAJAS RECOLECTORAS DE AGUA LLUVIA. Calle 71g sur; K0+060	Mejorar y detallar el acabado final	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
25		MURO CONTENCIÓN K0+288 Rampa Norte	nivelar corona	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
26		JARDINERA HORIZONTALE entre las abcisas K0+164 a K0+186	Mejorar acabado en todo el elemento estructural concreto a la vista con pintura gris basalto o cenizo	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista

442

ITEM	FOTOGRAFÍA	ELEMENTO	OBSERVACIONES		
27		MURO CONTENCIÓN K0+000	*Retirar bolsa colgada en la esquina exterior *Limpiar la baranda *Mejorar acabado en la pata donde indica la flecha	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
28		PISO CONCRETO PREMEZCLADO 4000 PSI FLUIDO COLORES	Mejorar acabado, detallar bordeado contra el piso loseta colores ocre y terracota	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
29		CAJA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS abscisa K0+030	Presenta tope con el acabado del piso loseta colores ocre y terracota	Por seguridad a los peatones	En proceso Contratista
30		JARDINERAS HORIZONTALES	Exponer y detallar los desagues o lloraderos; con el pañete los ocultaron	Esteticamente no se avala	En proceso Contratista
31		PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO entre las absicsas K0+262 a K0+288	Falta placa fácil de la vivienda; expuesta en el corredor del muro paralelo sector norte del proyrecto	Se requiere para Acta de Recibido Y Acta Final del proyecto	En proceso Contratista
32		COFORMACIÓN CON HYDROBLOCK; Fotografia Sábado 09 marzo / 2024	Total 22 und en el presupuesto contractual	Se requiere para Acta de Recibido Y Acta Final del proyecto	En proceso Contratista
33		RED HIDROSANITARIA entre las abscisas K0+186,65 a K0+250	En Prueba de Estanqueidad se encuentra un tramo obstruido	Se requiere para Acta de Recibido Y Acta Final del proyecto	En proceso Contratista
34		RETIE Y RETILAP	Se realizo la visita el jueves 29 de febrero 2024	Soporte de Certificación RETIE	Soporte de Certificación RETILAP
35		RED HIDROSANITARIA	Se realizó la prueba de estanqueidad mediante Flujo libre por pendiente de la tuberia	Se presenta obstrucción entre la caja 9 y 10	Evidencia de que ya no se presenta la obstrucción.

Se da por finalizado el recorrido siendo las 11:00am, y se requiere al contratista de obra subsanar en debida forma las anteriores observaciones a más tardar para el día 8 de marzo 2024, con el fin de realizar la respectiva entrega por parte del contratista de obra y recibo de obra por parte de la interventoría, para a su vez realizar la entrega de la obra al IDIGER.

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA	DIRECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	MAPO INGENIERIA SAS	
FREDY SUAREZ LUNA	DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO VAPA	
CESAR OSPINA	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO VAPA	

444

Anexo 1M – Acta de terminación obra - interventoría

MAPO Sas INGENIERIA	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO OBRA	Hoja 1 de 1 Fecha: 29 / 02 / 2024 DD / MM / AA Contrato No. 002 de 2023

CONTRATO 2 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. FONDIGER-002-2023 "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO El proyecto se encuentra ubicado dentro del perímetro urbano al sur-occidente de la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad 19 de nombre Ciudad Bolívar, barrio el mirador. El polígono de riesgo definido en el concepto técnico 8405 y sus adendas comprenden el sector del Mirador el Paraiso A, Mirador del Paraiso B y el Mirador 3, en la localidad de Ciudad Bolívar, UPZ 67 "Lucero". Limita a) costado oriental con la Quebrada Limas, hacia el costado occidental se encuentra entre la Carrera 27 y la Carrera 26D, limita al norte con la Diagonal 70U Bis sur, y al sur con la calle 71N sur y el barrio Mirador.

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

DURACIÓN INICIAL El plazo para la ejecución del contrato que se derive de la presente modalidad de selección será de OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda prorrogar su vigencia de acuerdo con las necesidades del IDIGER.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 17 (Día) Fenbrero (Mes) 2023 (Año)

PRÓRROGAS

No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
1	2,5 meses
2	Dos meses

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 18 (Día) DE octubre (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO 29 (Día) DE Febrero (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA CONSORCIO VAPA
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

INTERVENTORIA MAPO INGENIERIA SAS
(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

En Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024 se reunieron CESAR OSPINA, representante legal del Contratista, y MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA, Representante Legal de la interventoria MAPO INGENIERIA SAS, con el fin de dar por terminado el contrato de prestación de servicios anteriormente citado,cuyo plazo de ejecución venció el día veintinueve (29) de febrero de 2024

OBSERVACIONES:

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo anterior, la interventoria deja constancia que el Contratista de obra cumplió con el objeto del contrato a satisfacción y queda pendiente a su favor el saldo de $1.083'595.547

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.

INTERVENTORIA | **Representante Legal del Contratista**

Proyección	Revisión
Firma:	Firma:
Nombre Completo: MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA	Nombre Completo: CESAR OSPINA
Cargo: REPRESENTANTEL LEGAL	Cargo: REPRESENTANTEL LEGAL
Dependencia: MAPO INGENIERIA SAS	Dependencia: CONSORCIO VAPA

Anexo 2.A Inventario predial de cierre a la fecha.



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

INVENTARIO PREDIAL ACTAS DE CIERRE A LA FECHA

N.º Acta	Nombre Responsable	Dirección	Fecha 1 Visita	Fecha 2 Visita	Fecha 3 Visita	Observaciones
2	Cecilia Villamil	Diagonal 71 sur #27-27	26/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones externas por solicitud de la propietaria.
8	Blanca Nelly Melo	Diagonal 71 sur #27-63	26/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
35	Flor María Silva	Calle 71b sur #27-21	27/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
43	Flor Jaramillo	Diagonal 71 a sur #27-26	27/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
75	Martha Rojas	Calle 71c bis #27-21	26/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
88	Doris Quimbayo	Calle 71g sur #27-29	29/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
94	Mabel Sanabria	Calle 71f bis sur#27-25	29/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
140	Yolanda Quimbayo	Calle 71g bis #27-34	29/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas
131	María Fonseca	Cra 27 a #71f-54 sur	29/02/24	N/A	N/A	Se realizó registro de condiciones internas y externas

Anexo 2.B Aprobación de volante de reunión de finalización.

Gmail VOLANTE

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

4 de muchas

VOLANTE DE INVITACIÓN A REUNIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA

Recibidos ×

DIANA SOCIAL dom, 25 feb, 7:35 p.m. (hace

Cordial saludo, Dando cumplimiento a la actividad programada para el dia 09 de marzo de 2024, referente a la realización de la reunión

Mapo Ingenieria SAS Social dom, 25 feb, 10:31 p.m. (hace 10 dias)

para mi

Cordial saludo
Queda aprobado el volante por parte de interventoría.

Quedamos atenta a inquietudes

Atentamente,

Sandra J. Rodríguez A.
PROFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA
MAPO INGENIERÍA

450

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO FONDIGER 002 DE 2023



El INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO TIENE EL GUSTO DE INVITAR A LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL MIRADOR- PARAÍSO, A PARTICIPAR EN LA SOCIALIZACIÓN DE FINALIZACIÓN DE OBRA, DEL CONTRATO FONDIGER-002-2023, QUE CONSISTIRÁ EN REALIZAR UNA PRESENTACIÓN DE TODA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DESDE CADA COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SST Y SOCIAL), QUE INTERVINO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO

DIA : SÁBADO 09 DE MARZO DE 2024
HORA: 10:30 AM
LUGAR : SALÓN COMUNAL EL MIRADOR (Calle 71m sur #27-81)

NÚMERO DE CONTRATO: FONDIGER 002-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO VAPA
INTERVENTORIA : MAPO INGENIERÍA S.A.S

DATOS DE CONTACTO:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNIQUESE
ATENCIONALCIUDADANOCONTRATO002@GMAIL.COM
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:
Calle 71F BIS SUR #27ª-20
3213612515

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDIGER | BOGOTÁ

184

Anexo 2.C Registro de entrega de volantes de actas de cierre.

VOLANTE DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS FINALES

Recibidos ×

DIANA SOCIAL

jue, 22 feb, 2:25 p.m.

Cordial saludo. Adjunto propuesta de volantes sobre el levantamiento de actas finales, para su respectiva aprobación, quedo atenta a cualquier inquietud. cordia

Mapo Ingenieria SAS Social <social.maposas@gmail.com>

jue, 22 feb, 5:27 p.m.

para mi

Cordial saludo

Diana, solicitó el cronograma del levantamiento de actas de vecindad eso quedó como compromiso y queda aprobado el volante.

Agradezco su colaboración y su pronta respuesta

Sandra J. Rodriguez A.
PROFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA
MAPO INGENIERÍA

***

Aprobado. | Con mucho gusto. | OK, recibido.

Anexo 2C

453

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

Al finalizar las actividades constructivas el **CONSORCIO VAPA**, realizará el levantamiento de actas de vecindad en los predios del área de influencia directa del proyecto, entre Cra 27 y Cra 27 B y desde la calle 71h hasta la diagonal 70 u Bis, a partir del día **29 de febrero de 2024** y durante 20 días aproximadamente. Esta actividad consiste en una evaluación externa o interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica, las condiciones finales de los predios después de la realización de la obra.

El acta de vecindad final servirá al propietario con el acta de vecindad inicial para validar el estado del inmueble al iniciar y finalizar labores de obra, en caso que exista alguna afectación durante la ejecución de la misma, y así visualizar la responsabilidad que adquiere el contratista. Para adelantar el levantamiento de acta se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización del ingreso al inmueble al momento de realizar el levantamiento.

Esta actividad no tiene ningún costo, no requiere de la entrega de documentos del predio. En caso de no encontrar a una persona que los atienda y/o suministre la información necesaria, se realizará una **SEGUNDA VISITA.** Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará una **ULTIMA VISITA** y de no ser atendidos se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

La persona que lo requiera puede solicitar la copia del acta de vecindad levantada en su predio por cualquiera de los medios de atención dispuestos a la ciudadanía, después de un mes de realizada la actividad.

Número de contrato: FONDIGER -002- 2023

Contratista: Consorcio Vapa.

IDIGER BOGOTÁ

Mayor información:
Profesional Social: Diana Castillo Guerra.
Teléfono: 3133572657
Dirección: calle 71 f bis sur # 27 a 20
Correo: atencionalciudadanocontrato002@gmail.com

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega de volante primer visita actas de vecindad corte 26 - FEB - 2024					No. CONTRATO	FONDIGER002 - 2023
BARRIO:	Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	CÓDIGO CIV:	—— / ——	CÓDIGO CVP:	—— / ——

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Mabel Sanabria	30055399	Calle 71F bis sur # 29-25	3112442190	—/—	SI	NO	SI	Mabel Sanabria
2	Gobelina gonzalez	30098749	Calle 71G sur # 27-28	3215251577	—/—	SI	NO	SI	yobe gonzalez
3	Doris Quimbayo 9 con	38235460	Calle 71G sur # 27-29	3125439424	—/—	SI	NO	SI	
4	Jesus Lozano	2379784	Kra 27 # 71G 15 sur	3138582987	—/—	SI	NO	SI	
5	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G bis sur # 27	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
6	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G bis sur # 27-21	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
7	Bajo Puerta	—/—	Calle 71H sur # 27-40	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
8	Julian Diaz	—/—	Calle 71 F bis sur # 27-28	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
9	Katherine Lozano	1033934845	Calle 71F sur # 27-21	3219576160	—/—	SI	NO	SI	Viven Tarde
10	Nelsy Macias	—/—	Calle 71F sur # 27-26	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
11	Parmenio Fuentes	—/—	Calle 71D bis s. # 27-29	—/—	—/—	SI	NO	SI	Parmenio Fuentes
12	Bajo Puerta	—/—	Calle 71D bis s. # 27-32	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Martha Rojas	51 720 830	Calle 71C bis s # 27-21	3112635355	—/—	SI	NO	SI	Martha E Rojas
14	Gustavo Ayala	—/—	Calle 71 C bis s # 27-26	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
15	Alonso Diaz	6.033.655	Calle 71 B sur # 27-21	3142416322	—/—	SI	NO	SI	

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	Diana Castillo Cuevas - Prof. Social obra	Sandra Janeth Rodriguez A

455

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	entrega volante y visita acta de veracidad de cierre	FECHA:	26 Febrero 2024	No. CONTRATO	FONDIGER-002-2023
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA	
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA		
1	Cecilia Villamil.	51.707.789	Diag. 71 s. #27-27	3118929361	—/—	Si	NO	Si	Cecilia Villamil A.	
2	Ruth Enziso	—/—	Diag 71 s #27-36s	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	
3	Flor Mery Jaramillo	—/—	Diag. 71 A #27.-26s.	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	Mier. Cun
4	Carolina Malambo	53014125.	Calle 71 C sur #27-22	3142682603	—/—	Si	NO	Si	Cultures	Viernes mañ
5	Carlina Tique	28866757	Calle 71 C sur # 27-21	3219516160	—/—	Si	NO	Si	Marina Tique	Jueves.
6	Blanca Nelly Melo	51865764	Diag. 71 s. #27-63	3212721601	—/—	Si	NO	Si	Blanca Nelly M.	
7	Bajo Puerta	—/—	Diag. 71 s. #27-33	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	
8	Marco Tulio Cortes R.	2.235.343	Diag. 71 s. #27-39	—/—	—/—	Si	NO	Si		
9	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-45	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	fachada
10	Bajo Puerta	—/—	Diag. 71 s #27-44	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	
11	Paula Ortiz.	—/—	Diag 71 s. #27-52	—/—	—/—	Si	NO	Si		fachada
12	Maria Mireya leguisamón	55.060.631	Diag 71 s #27-54	3123870871.	—/—	Si	NO	Si		
13	Bajo Puerta	—/—	Diag. 71 s. #27-53	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	
14	Rafaela Villanueva	—/—	Diag 71 s. # 27-64	—/—	—/—	Si	NO	Si		
15	Sub Estación - Antena	—/—	Diag 71 s. # 27-57	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta	

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Diana Castillo Rivera	Sandra J. Rodriguez A.
NOMBRE:	Diana Castillo Prof. Jaula Obra	Sandra Janeth Rodriguez A

454

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega volante 1 visita acta de veracidad Aseo	FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	FONDIGER-002-2023
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Lizeth Sarmiento.	—/—	Diag 71 s #27-68	3112748319.	—/—	SI	NO	SI	[signature]
2	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-72	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
3	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-69	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
4	Maria Murillo	35.890.037	Diag 71 s. #27-70	3123910910	—/—	SI	NO	SI	[signature]
5	Demetrio Garzón.	6.594.165	Diag 71 s. #27-81	7904824	—/—	SI	NO	SI	[signature]
6	Maria Payán.	41.630.306	Diag 71 s #27-75	3118288780.	—/—	SI	NO	SI	[signature]
7	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-85	Bo/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerto
8	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-86	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
9	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s #27-88	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
10	Ruben Dario Tellez	4.228 520	Diag 71 s. #27-90	3227211945.	—/—	SI	NO	SI	[signature]
11	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-94	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	Diag 71 s. #27-96	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Doris Moreno	52.186.372	Diag 71 s #27-98	3028094077	—/—	SI	NO	SI	[signature]
14	Luz Adriana Betancur	52.740 239	Kra 27 b # 71 a s.02	3213015423	—/—	SI	NO	SI	[signature]
15	Bajo Puerta	—/—	Diag. 71 s. #27-89	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:	[signature]	FIRMA:	[signature]
NOMBRE:	Dana Castillo Arena - Prof. Social Obra	NOMBRE:	Sandra Janeth Rodriguez Alvarez

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	entrega volante y visita carta de veracidad cierre			FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO		Tendicare - 002 - 2024
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:		—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-87	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
2	Ciro Caraballo	1024469580	Diagonal 71 a #27-88	3138986385	—/—	SI	NO	SI	Ciro Caraballo
3	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-82	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
4	Leonidas Diaz	17126360	Diagonal 71 a #27.71	3232381963	—/—	SI	NO	SI	
5	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-45	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
6	Maria del Rosario Caballero	—/—	Diagonal 71 a #27-76	3137587282	—/—	SI	NO	SI	María
7	Luis Andres Nora Caballero	80.020.148	Diagonal 71 a #27-70	3115859989	—/—	SI	NO	SI	
8	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-64	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
9	Lucas Ramirez	6.612.520	Diagonal 71 a #27-54	3219074393	—/—	SI	NO	SI	
10	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-50	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-51	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	Diagonal 71 a #27-44	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Bajo Puerto	—/—	Diag. 71 a #27-36	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
14	Norbelly Cardenas	—/—	Diag 71 a #27-30	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
15	Alvin Morales.		Calle 71 B # 27-36		—/—	SI	NO	SI	

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		Sandra J. Rodriguez A.
NOMBRE:	Dara Castillo Cuevas - Prof Social obra	Sandra Janeth Rodriguez Alvarez

458

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega volante y visita acta de veracidad cierre	FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	Fenoscar-CCO-2023
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-25	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
2	Kimberly Pinzon	1000790760	Calle 71 B sur #27-31	3118740071	—/—	SI	NO	SI	Kimberly P
3	Kimberly Pinzon	1000790760	Calle 71 B sur #27-37	3118740071	—/—	SI	NO	SI	Kimberly P
4	Johana Lopez	4199954	Calle 71 B sur #27-46	3015936281.	—/—	SI	NO	SI	Johana L.
5	Yeison Garzon.	1120571900	Calle 71 B sur #27-45	3103402726.	—/—	SI	NO	SI	
6	Bajo Puerta.	—/—	Calle 71 B sur #27-52	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
7	Bajo Puerto	—/—	Calle 71 B sur #27-51	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
8	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-59	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
9	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-56	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta.
10	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-65	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-62	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-69	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-70	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
14	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-75	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
15	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur #27-76	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	Dani Castillo Guevara- Profesional Social chip	Sandra J. Rodriguez G. Sandra Janeth Rodriguez

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01 Versión:3 Vigente desde: 14/02/2018	Pág: 1 de 1
ASUNTO:	entrega volante y visita acta de verdad cierre		FECHA:	27 Febrero 2024	No. CONTRATO	FONDIGER-002-2023	
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD: Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 B sur # 27-81	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
2	Bajo Puerta	—/—	Lote Baldio (calle 71 B)	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
3	Jose Moreno	5.771.130	calle 71 B sur # 27-88	3132872112	—/—	SI	NO	SI	
4	Colegio Nuevalida	—/—	Calle 71 B sur # 27-89	—/—	—/—	SI	NO	SI	Andrea Aguilar
5	Colegio Nueva Vida	—/—	calle 71 B sur # 27-95	—/—	—/—	SI	NO	SI	
6	Carlos A Sanchez	19.345.756	Cra 27 b # 71 a 26 s	3102178378	—/—	SI	NO	SI	
7	Yesid Sanchez	—/—	Cra 27 b # 71 b 04 s	—/—	—/—	SI	NO	SI	
8	Colegio Nuevo Vida.	—/—	Calle 71 C sur # 27-96.	—/—	—/—	SI	NO	SI	Andrea Aguilar
9	Lucinda Galindo	—/—	calle 71 C sur # 27-57	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
10	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 C sur # 27-51	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 C sur # 27-49	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Jose Joaquin Gutierrez	—/—	Calle 71 C sur # 27-39	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 C sur # 27-33	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
14	Michelle Cerquera	—/—	Calle 71 C sur # 27-27	—/—	—/—	SI	NO	SI	No firma
15	Hector Guatavita	—/—	Calle 71 C bis s. # 27-32	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	Dayra Castillo Guevara - Prof Social Cbia	Sandra Janeth Rodriguez A.

460

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	entrega volante y visita acta de veracidad cierre	FECHA:	26 febrero 2024	No. CONTRATO	Fanalgas - CO2-2023
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—
				CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Blanca lilia Millán	51.878761	Calle 71 c sur #27-28	3134518169.	—/—	SI	NO	SI	Blanca
2	Blanca Lilia Millán	51878761	Calle 71C sur #27-38	3134598169	—/—	SI	NO	SI	Blanca
3	Blanca Lilia Millán	51878761	Calle 71 C sur # 27-46	3134598169	—/—	SI	NO	SI	Blanca
4	Blanca Lilia Millán	51878761	calle 71 C sur # 27-52	3134598169	—/—	SI	NO	SI	Blanca
5	Lilia Gordillo.	—/—	Cra 27 B # 71 c 36 s.	3102064273	—/—	SI	NO	SI	NO Firma
6	Bajo Puerta.	—/—	Calle 71 c bis s #27 A 53	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
7	Colegio Paraiso sede B	—/—	Calle 71 c bis s. #27 A 50	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
8	Bajo Puerta (caja de vivienda)	—/—	Calle 71 c bis s. #27 A 49	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
9	Bajo Puerta	—/—	calle 71 c bis s. #27 A 41	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
10	Monica Casas.	23973166	Calle 71 c bis s. #27 A 36	3138935781	—/—	SI	NO	SI	Monica Casas
11	Bajo Puerta	—/—	calle 71 c bis s #27 A 37	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 c bis s. #27 A 29	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Martha Jimenez	28575357	calle 71 c bis s. #27 A 30	—/—	—/—	SI	NO	SI	Martha
14	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 c bis s. #27 A 22	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
15	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 c bis s. #27 A 23	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta

Notes

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Sandra Castillo	Sandra J. Rodriguez A.
NOMBRE:	Diana Castillo Guerra - Prof Social Cbia	Sandra Janeth Rodriguez A

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	entrega volante 3 visita acta de veracidad cierre	FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	TENDER EK - CC2 - 2024
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Blanca lilia Millan.	51.878.761	calle 71c bis sur #27 a 18	3134598169	—/—	SI	NO	SI	
2	Maritza Ariza	1031161738	calle 71 c bis s. #27 A 17	3202830519	—/—	SI	NO	SI	Maritza Ariza
3	Maria Raigoso	24.864.952	calle 71 c bis s. #27 A 11	3106133139	—/—	SI	NO	SI	María Raigoso
4	Bajo Puerta	—/—	calle 71c bis s. #27 A 14	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
5	Bajo Puerta	—/—	calle 71 c bis s. #27 A 08	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
6	Bajo Puerta	—/—	calle 71 c bis s. #27 A 05	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
7	Ruben Guarin.	19.252.421	calle 71 c bis s. #27 A 38	3209336773	—/—	SI	NO	SI	Ruben Guarin
8	Bajo Puerta	—/—	calle 71 c bis s. #27-31	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerto
9	Bajo Puerta	—/—	calle 71c bis s #27-25	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
10	Bajo Puerta.	—/—	calle 71d bis s. #27-37	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta.
11	Luis Alberto Moreno	1121921969	calle 71d bis s. #27-41	3135391018	—/—	SI	NO	SI	Luis Alberto
12	Bajo Puerta	—/—	Cra 27a #71c 56 sur.	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Blanca Aurora Mora	41791444	Calle 71F sur #27-33	3214242865	—/—	SI	NO	SI	Blanca Mora.
14	Bajo Puerta	—/—	Calle 71F sur #27-27	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
15	Bajo Puerta	—/—	Calle 71F sur #27-37	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	Diana Castillo Cuevas - Prof. Ecual obo	Sandra J. Rodriguez Alvarez

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE AMBIENTE · CAMBIO CLIMÁTICO · IDIGER

CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
COMPONENTE SOCIAL

Código:208-MB-Ft-01 | Versión:3 | Pág: 1 de 1 | Vigente desde: 14/02/2018

ASUNTO:	entrega volante 1 visita cctl de vecindad crema			**FECHA:**	27 febrero 2024	**No. CONTRATO**	FENDIGER-002-2023
BARRIO:	El Mirador	**LOCALIDAD:**	Ciudad Bolívar	**CÓDIGO CIV:**	—/—	**CÓDIGO CVP:**	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 F 1 sur # 27-32	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
2	Sandra Guzman	52.873.438	Cra 27 a # 71 F-10 sur	3219428766	—/—	SI	NO	SI	Sandra Guz
3	Sandra Guzman.	52.873.438	Calle 71F bis sur #27-38	3219428766	—/—	SI	NO	SI	Sandra Guz
4	Hernando Pastar	6.859.467	calle 71 F bis s # 27-48	3208258935	—/—	SI	NO	SI	Hernando
5	Luz Marina Monroy	35.490.163	calle 71 F bis s. #27-40	3112301038	—/—	SI	NO	SI	Luz Marina Monroy R
6	Blanca Garcia	41 501 049	calle 71 F bis s. # 27-31	—/—	—/—	SI	NO	SI	Blanca Garcia
7	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27-37	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
8	Blanca Cortes	41.721.628	calle 71 F bis s. # 27-45	3115548213	—/—	SI	NO	SI	Blanca Cortes
9	Diana Rocio Herrera.	—/—	calle 71 F bis sur # 27-49	3143435242	—/—	SI	NO	SI	
10	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s # 27A 05	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s # 27 A 06	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s #27A 14	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s # 27 A 15	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
14	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s # 27 A 21	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
15	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s # 27 A 25	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	Diana Castillo Guerra - Prof Social Obra	Sandra Janeth Rodriguez Alvarez

463

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	entrega volante y visita acto de vecindad cierre	FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	FondiGeek-002-2024
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Dayana Rodriguez	—/—	calle 71 F bis sur #27 a 24s	3106889853	—/—	Si	NO	Si	Dayana R.
2	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis sur #27 a 20	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
3	Diana Noscue	1331162836	calle 71 F bis s. #27 a 29	3143711426.	—/—	Si	No	Si	Diana
4	Isabel Bermeo	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 32	—/—	—/—	Si	NO	Si	Isabel Bermeo
5	Guillermo Manjarrez	3.084723	calle 71 F bis s. #27 a 37	3124294251	—/—	Si	NO	Si	Guillermo
6	Margot Sanchez	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 40	3202668227	—/—	Si	NO	Si	Margot Sanchez
7	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 46	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
8	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 47	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
9	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 51	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
10	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 50	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 59	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis s. #27 a 54	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
13	Ana Isabel Herrera	20.440.471	Kra 27 b #71 F 18 sur	—/—	—/—	Si	NO	Si	Ana Isabel Herrera
14	Jesus macadam	20.537134	Kra 27 b # 71 F 36 s	3143511259	—/—	Si	NO	Si	
15	Bajo Puerta	—/—	calle 71 F bis sur #27 a 63	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		
NOMBRE:	Diana Castillo Cuenca - prof social obra.	Sandra Janeth Rodriguez A.

964

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	entrega volante Visita ficta de veracidad de cierre	FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	FONDICER-002-2023
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Jaime Alberto Mora	19.364.029	Calle 71G sur #27-34	3142705296	—/—	Si	NO	Si	Jaime Amado
2	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G sur #27-39	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
3	Monica Amado	1000047 2011	Calle 71G sur # 27-44	3232409699	—/—	Si	NO	Si	Monica Amado
4	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G sur # 27-40	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
5	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G sur #27-41	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
6	Bajo Puerta	—/—	calle 71G sur #27-47	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
7	Bajo Puerta	—/—	calle 71G sur #27-50	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
8	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G sur #27-53	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
9	Flor Maria Vasquez	41.572.262	Calle 71G sur #27-59	7906209	—/—	Si	NO	Si	Flor Marquez
10	Blanca Ramos	—/—	Kra 27a #71G20 sur	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
11	Blanca Ramos	—/—	Calle 71G Biss. #27A16	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 G Bis #27-56	—/—	—/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
13	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G Bis s.t #27-55	—/—	-/—	Si	NO	Si	Bajo Puerta
14	Dayana Rojas.	—/—	Calle 71G Bis s.t #27-51	—/—	—/—	Si	NO	Si	Dayana Rojas.
15	Sandra Milena Noreña	52.962.803	Calle 71G Biss. #27-50	3123073516	—/—	Si	NO	Si	Sandra Noreña

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Diana Castillo	Sandra Lorneth Rodriguez
NOMBRE:	Diana Castillo Guerra – Prof Social obra	Sandra L. Rodriguez A

465

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	Entrega volante y visita acta de veracidad cierre			FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	FondCrec-002-2023	
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Sandra Milena Noreño	52.962.803	Calle 71G Bis s # 27-46	312 307 3516	—/—	SI	NO	SI	Sandra Noreño
2	Sandra Milena Noreña	52 962 803	Calle 71 H sur # 27-	312307 3516	—/—	SI	NO	SI	Sandra Noreño
3	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G Bis s. # 27-47	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
4	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 G Bis s # 27-40	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
5	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 G Bis S #21-41	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
6	Luz Edely Arias Cano	—/—	Calle 71 G Bis s. # 27-33	—/—	—/—	SI	NO	SI	Luz edely arias
7	Jhon Jairo Andrade	—/—	Calle 71 G Bis s # 27-	—/—	—/—	SI	NO	SI	SIN FIRMA
8	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 G Bis s. # 27-27	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
9	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 H sur # 27-46	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
10	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 H sur # 27-54	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
11	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 H sur # 27-60	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Bajo Puerta	—/—	Calle 71 H sur # 27-66	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
13	German Beltrán	—/—	Calle 71 H sur # 27-74	—/—	—/—	SI	NO	SI	German Beltran.
14	Pablo Palencia	14247642.	Calle 71 H sur # 27-80	—/—	—/—	SI	NO	SI	Pablo Palencia.
15	Martha Rojas.	—/—	calle 71c bis sur # 27-	Se realiza	acta de veracidad apenas se va a entregar el volante.				

OBSERVACIONES:	

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		FIRMA: Sandra J. Rodriguez A.
NOMBRE:	Dina Castillo Guerra - prof social obra	NOMBRE: Sandra Janeth Rodriguez

466

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega volante y visita acta de veracidad cierre	FECHA:	27 febrero 2024	No. CONTRATO	FENOGEK-002-2023
BARRIO:	El Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Miriam Lozano	41.691.179	Calle 71 I Bis sur #27-27	3123667215	—/—	SI	NO	SI	
2	Parque Mirador "Bolsillo"	—/—	Cra 27 B con Diagonal	—/—	—/—	Si	NO	SI	Yeidy N. cabic.
3	Transmicable	—/—	Calle 71H. con Cra 27	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
4	Bajo Puerta	—/—	Calle 71F bis s. #27a62	—/—	—/—	Si	NO	SI	Bajo Puerta
5	Bajo Puerta	—/—	Calle 71C sur #27-45	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
6	Bajo Puerta	—/—	Calle 71F sur #27-40	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
7	Maria Fonseca	—/—	Cra 27 A #71F 54s	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:		FIRMA: Sandra J. Rodriguez
NOMBRE:	Diana Castillo Queviva - Prof. Social obra	NOMBRE: Sandra Janeth Rodriguez N

679

Anexo 2.D Aprobación de volante de finalización.

Gmail

VOLANTE

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

1 de muchas

DIANA SOCIAL jue, 29 feb, 10:54 a.m. (hace
Cordial saludo, Dando cumplimiento a los requerimientos contractuales, se hace el envío de la propuesta del volante de finalización de c

Mapo Ingenieria SAS Social vie, 1 mar, 12:01 a.m. (hace 5 días)
para mí

Cordial saludo

Queda aprobado el volante por parte de la interventoría.


Quedamos atenta a inquietudes

Atentamente,

Sandra J. Rodríguez A.
PROFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA
MAPO INGENIERÍA

"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"

FINALIZACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO FONDIGER 002 DE 2023

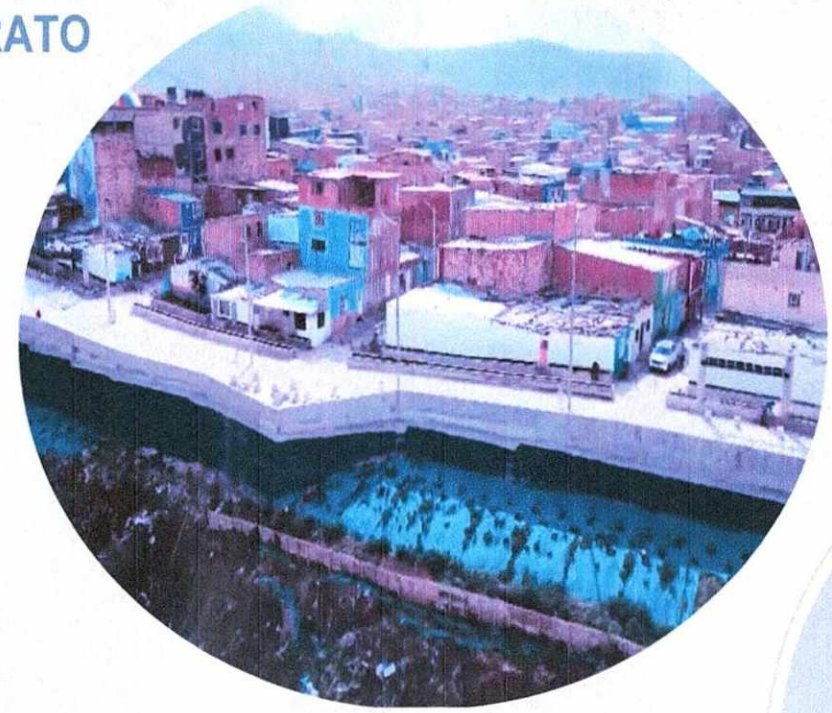

El INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO TIENE EL GUSTO DE INFORMAR A LA COMUNIDAD DEL SECTOR EL MIRADOR- PARAÍSO, QUE SE HAN FINALIZADO TRABAJOS DE OBRA, DEL CONTRATO FONDIGER-002-2023, AGRADECEMOS POR LA TOLERANCIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO Y ESPERAMOS HABER CONTRIBUIDO EN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE TODA LA COMUNIDAD DEL SECTOR.

NÚMERO DE CONTRATO: FONDIGER 002-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO VAPA
INTERVENTORIA : MAPO INGENIERÍA S.A.S

DATOS DE CONTACTO:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNIQUESE
ATENCIONALCIUDADANOCONTRATO002@GMAIL.COM
PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:
Calle 71F BIS SUR #27³-20
3213612515

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDIGER | BOGOTÁ

Anexo 2.E Aprobación de volante de reunión extraordinaria.

Gmail in:sent

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

40 de 279

VOLANTE DE CONVOCATORIA A REUNIÓN EXTRAORDINARIA (PROPIETARIOS- LADERA)

Recibidos ×

DIANA SOCIAL lun, 12 feb, 11
Cordial saludo, Debido a la situación presentada el día viernes 09 de febrero de 2024, donde un propietario de uno de los predios inició

Mapo Ingenieria SAS Social lun, 12 feb, 12:32 p.m.
para mí

Cordial saludo:
Diana, después de revisar el volante, esta interventoría le da el Vo Bo, para ser impresas y distribuidas.

Atentamente,

Sandra J. Rodríguez A.
PRPOFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA
MAPO INGENIERÍA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Contrato de Obra FONDIGER 002 de 2023

Contratista: Consorcio VAPA

Estamos cumpliendo con nuestro objetivo y queremos agradecer por tu paciencia.

En esta oportunidad, queremos invitarte a participar de la reunión extraordinaria, programada para el día sábado 18 de febrero de 2024 a las 2:00 pm, donde se socializará con los propietarios de los predios aledaños a la ejecución de obra, sobre temas de interés común como: el cuidado y apropiación del proyecto, apertura de ventanas y/o puertas colindantes a la obra, y generalidades de obra.

Esperamos contar con su presencia, Gracias.

LUGAR: Punto de atención a la comunidad (calle 71f bis sur #27ª-20)
FECHA: Sábado 17 de febrero de 2024 a las 2:00 am
ATENCIÓN TELEFÓNICA: 3213612515
CORREO ELECTRÓNICO: atencionalciudadanocontrato002@Gmail.com

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDIGER | BOGOTÁ

Anexo 2.F Registro de entrega de divulgación de volantes de reunión extraordinaria

BOGOTÁ CUIDADO CLIMÁTICO - BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega de Volantes de Reunion extraordinaria	FECHA:	13 de Febrero/24	No. CONTRATO	FONDIGER 002-2023
BARRIO:	Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Daniel Orjuela	1029282476	Diagonal 71s #27-36	3106993094	—/—	SI	NO	SI	Daniel Orjuela
2	Cecilia	—/—	Diagonal 71s #27-27	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
3	Flor Maria Silva	39.795546	Calle 71B sur #27-21	7902055	—/—	SI	NO	SI	flor silva
4	Flor Mery Jaramillo	—/—	Diagonal 71A s# 27-26	3212688555	—/—	SI	NO	SI	Flor Jaramillo
5	Bajo Puerta	—/—	Calle 71C sur # 27-22	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
6	Carlina Tique	28866757	Calle 71C sur # 27-21	—/—	—/—	SI	NO	SI	Carlina Tique
7	Gustavo Ayala	—/—	Calle 71C bis s # 27-26	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
8	Manuel Gregorio Ensuncio	78111294	Calle 71C bis s # 27-21	3142749196	—/—	SI	NO	SI	manuel lopez
9	Bajo Puerta	—/—	Calle 71D bis sur # 27-32	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
10	Parmenio Fuentes	19268455	Calle 71D bis s # 27	3102954892	—/—	SI	NO	SI	Parmenio F.
11	Nelsy Masias	—/—	Calle 71F sur # 27-26	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
12	Juan Gabriel Lozano		Calle 71F sur #27-21		—/—	SI	NO	SI	
13	Bajo Puerta	—/—	Calle 71F bis s. #27-28	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta.
14	Mabel Sanabria	30055399	Calle 71F bis sur #27-25	3112442190	—/—	SI	NO	SI	Mabel
15	Bajo Puerta	—/—	Calle 71G sur # 27-28	—/—	—/—	SI	NO	SI	

OBSERVACIONES:

	ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA:	Diana Castillo Cuervo.	Sandra J. Rodriguez A.
NOMBRE:	Diana Castillo C. - Profesional Social obra	Sandra Janeth Rodriguez Alvarez.

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL					Código:208-MB-Ft-01		
						Versión:3		Pág: 1 de 1
						Vigente desde: 14/02/2018		
ASUNTO:	entrega de volantes de reunion extraordinaria			FECHA:	13 febrero 2024	No. CONTRATO	FENICER 002 -2023	
BARRIO:	Mirador	LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar	CÓDIGO CIV:	—/—	CÓDIGO CVP:	—/—	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Doris Quimbayo	—/—	Calle 71G sur #27-29	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
2	Jesus Lozano	2379684	Cra 27 #71G 15 sur	3138862987	—/—	SI	NO	SI	
3	Hasly Gonzalez	—/—	Calle 71G Bis sur #27-21	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	1) Diana Castillo G. - profesional social obra.	NOMBRE:	Sandra J. Rodriguez A. / Sandra Janeth Rodriguez Alvarez.

Anexo 2.G Registro de entrega de cartas de invitación a comité veedor No.10.

BOGOTÁ	CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL	Código:208-MB-Ft-01	
		Versión:3	Pág: 1 de 1
		Vigente desde: 14/02/2018	

ASUNTO:	Entrega de cartas de invitación a comite veedor nº10	FECHA:	10- Febrero-2024	No. CONTRATO	FONDIEE002 - 2023
BARRIO:	Mirador	LOCALIDAD:	ciudad Bolivar	CÓDIGO CIV:	— / —	CÓDIGO CVP:	— / —

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Jeidy Mileya Nuñez	52241283	Calle G1G Bis sur #29A17	3103075107	Jacmiradordequiba@gmail.com	SI	NO	SI	52241283 Jeidy N.
2	Gilberto Rincon	—/—	Calle 71F bis sur #27-40	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
3	Blanca Lilia Millan	—/—	Calle 71 C sur #27-28	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
4	Jose Joaquin Gutierrez	79444329	Calle 71 c sur #27-39	3107918240	—/—	SI	NO	SI	Jose J Gutierrez
5	Eluira Torres	36276540	Calle 70 sur #27 c42	3212640186	—/—	SI	NO	SI	Eluira Torres
6	Hasly Gonzalez	—/—	Calle 71G bis s #27-21	—/—	—/—	SI	NO	SI	Bajo Puerta
7	Yonis Ariza	12636913	Kr 27 bis A #73d 87 s	3203669721	Jacbellaclor190126@gmail.	SI	NO	SI	
8	Mariela Cortes	52127057	Cr 27 I #72 A 23 s.	3107564417	mariela cortes71@hotmail.com	SI	NO	SI	
9	Ana Mercedes Mora	—/—	Calle 71 I #27M 16	—/—	—/—	SI	NO	SI	Julio Buitrago-
10	Jose Valencia	15931128	Calle 71 Q sur #27-84	3132724853	—/—	SI	NO	SI	Cecilia Diaz
11	Jose Alberto Gutierrez	—/—	— / —	—/—	—/—	SI	SI	NO	Via Whatsapp
12	Wilmar Gutierrez	—/—	Cra 27 B #27 K 20 sur	—/—	—/—	SI	SI	NO	Via Whatsapp
13									
14									
15									

OBSERVACIONES:

ELABORÓ		REVISÓ	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	Diana Milena Castillo Guerra - Prof Social Obra	NOMBRE:	Sandra J. Rodriguez Q - Interventoria

Powered by CamScanner

Anexo 2.H Actas de reuniones extraordinarias.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Punto de Atención a la comunidad	Fecha:	17	febrero	2024
Hora Inicio:	2:30pm	Hora Final:	3:30pm		

Objetivo Acta Reunión extraordinaria con propietarios

- Efectuar reunión con los propietarios de los predios ubicados adyacentes al Proyecto, Con el fin de tocar temas de interés general

Orden del día

- Recepcionar a los asistentes a la reunión en el punto de atención a la comunidad
- exponer temas generales de obra a los asistentes
- informar a los propietarios sobre la restricción de apertura de ventanas.
- obtener registro fotográfico y de asistencia de la actividad

Desarrollo de la Reunión:

- El día 17 de febrero de 2024, se efectuó reunión extraordinaria, convocada por el consorcio UAPA, dirigida a los 19 Propietarios de los predios que se encuentran ubicados adyacentes a la obra, Con el fin de exponer temas generales de obra y a su vez informar sobre la restricción de apertura de ventanas y/o puertas.

- Se dá inicio a la reunión siendo las 2:30pm, con una asistencia de 11 personas a las cuales se les expresó lo siguiente:

a) Se informó sobre el avance general de obra, por parte del area técnica del contratista de obra, Permitiendo Contextualizar a la comunidad sobre el trabajo ejecutado a la fecha, donde Surgieron Preguntas como: ¿Que tipo de plantas se sembraron en las jardineras?, dando claridad que las especies implantadas son (margaritas, buganbilias, Lirios de páramo, calamagrotis y penisetum), explicando que son especies que

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Se adapten a las condiciones ambientales del lugar.
b) el contratista de obra expone que a la fecha se han abierto 2 ventanas en predios ubicados sobre la ladera y que previamente se socializó en reuniones que esta actividad no estaba permitida y que debido al cumplimiento de unas especificaciones técnicas contractuales el contratista debería cumplir con un repello impermeabilizante y una pintura blanca tipo koraza como acabado de los muros de estos predios y al verse modificado por el propietario, afectaría el cumplimiento del mismo, considerandose un hallazgo y posterior detrimento, llevando a implicaciones legales. es así que se refiera a los propietarios que abrir ventanas y/o

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Puertas no está permitido ya que afectaría también las polizas de garantía del trabajo.

c) Se solicita se haga extensiva la información a los propietarios que no pudieran asistir, con el fin de mantener informada a la comunidad.

D) Se deja terminada la reunión y se realiza registro fotográfico y de asistencia a la actividad

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Ivana castillo Cultura Edwin Zambrano	profesional social Residente de obra	Consorcio VIA Consorcio VIA	1 Ivana Castillo Edwin Zambrano.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. [x] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. ____

2. TEMA DE LA SESIÓN: Reunión Extraordinaria con propietarios

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Punto de atención a la comunidad

5. FECHA: 17-02-24

6. HORARIO 6.1. INICIO: 2:30 pm 6.2. FIN: 4:00.

HOJA 1 DE 2

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
1	Martha Rojas	Ciudad B.	Mirador		X														Comunidad	3112635355		Martha C. Rojas
2	Israel Moreno García	Ciudad Bolívar	Mirador	X																3114655246		
3	Jacqueline Sánchez	Ciudad Bolívar	Bogotá																	3208985940		Jacqueline Sánchez
4	Jesús Chozón	Ciudad B.V.	Mirador B																	3135986298		
5	María Rojas	Ciudad Bol	Mirador		X															3116542326		
6	Alvaro Pérez	Ciudad B	Mirador	X																3138449756		
7	Nelsy Macías	Ciudad Bolívar	Mirador		X															3202520176		
8	Herrera Camilo	C. Bolívar	Mirador	X																79.767.730		
9	Flor María	Silva	Mirador																	7902056		Flor Silva
10	Doris E. Bonilla	Ciudad B	Mirador		X															3125439434		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales) en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. [X] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. _____

2. TEMA DE LA SESIÓN: Reunion extraordinaria con propietarios

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Punto de atención a la comunidad

5. FECHA: 17 02 24

6. HORARIO 6.1. INICIO: 2:30 6.2. FIN: 4:00

HOJA 2 DE 2

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Victima del conflicto	Migrante Internacional	Ninguna de las anteriores				
11	YOLANDA QUINTERO M.	BOLIVAR	MIRADOR		X															3005739354		
12	Juan Gabriel	Ciudad Bolivar	Mirador	X																3145815121		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

Anexo 2.I Metodología de capacitación a empleados No. 10 y 11.

Gmail

capacitación a empleados

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

Mapo Ingenieria SAS Social lun, 12 feb, 1
Cordial saludo: Diana, después de revisar la metodología por segunda vez, esta interventoría realiza las observaciones dentro del docur

DIANA SOCIAL lun, 12 feb, 2
Cordial saludo, Se adjunta nuevamente metodología, actualizada. Quedo atenta,

Mapo Ingenieria SAS Social lun, 12 feb, 3:48 p.m.
para mí

Cordial saludo:
Diana, después de revisar la metodología y agradecemos por las correciones, esta interventoría lo aprueba.

Atentamente,

Sandra J. Rodríguez A.
PRPOFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA
MAPO INGENIERÍA

Responder Reenviar

48

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá, D.C., 06 de febrero de 2024

Señores:
MAPO INGENIERIA S.A.S
Atte. María Alexandra Posada Peña
Representante Legal

Referencia: Contrato de Obra No 002 de 2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***


Asunto: Metodología capacitación a empleados de obra N°10 sobre el sentido de pertenencia.

Justificación de la actividad:

Realizar las capacitaciones con los empleados es de importancia alta, debido a que son estrategias enfocadas a cumplir con los objetivos y la misión de la compañía.
Es así como se motiva al personal a participar de lúdicas y temáticas que aportan significativamente al recurso más importante de una organización, el cual es el recurso humano.

Objetivo:
Propiciar de acuerdo con los lineamientos contractuales del proyecto, espacios de participación para los empleados en obra, a través de las actividades que involucran el buen funcionamiento de la dinámica laboral durante la ejecución del proyecto.

Descripción de la metodología:
A continuación, se describe la metodología para el desarrollo de la capacitación a empleados en obra correspondiente al mes de febrero de 2024, con el fin de dar a conocer la gestión que realizará el componente social frente al programa de capacitación a empleados en obra.



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

El contratista CONSORCIO VAPA, de acuerdo con las actividades programadas para el desarrollo del programa de capacitación a empleados en obra, diseñó una metodología aplicada a la dinámica social de acuerdo a los requerimientos de interés común que puedan identificarse en la ejecución de las labores de obra, en donde el tema a tratar será el sentido de pertenencia, tema que tendrá una duración de 30 minutos aproximadamente.

Se busca incluir esta temática, debido a que durante la ejecución del proyecto se evidenció que, es importante que los trabajadores se sientan apoyados e incluidos en los propósitos y objetivos que tiene la compañía en donde desempeñan un cargo laboral.

Por lo tanto, esta temática se considera oportuna y a su vez permitirá exponer ante los trabajadores la importancia de conocer conceptos básicos de convivencia, que serán aportes a nivel personal y laboral, tales como, respeto, comunicación asertiva, empatía, salud mental y sentido de pertenecía.

Para la presente capacitación, se busca exponer el tema (sentido de pertenencia), ya que, a través de estas actividades generadas por el componente social, se incentiva la comunicación y la participación de un equipo de trabajo, que a su vez permiten adquirir apropiación del trabajo que se realiza.

> "El sentido de pertenencia laboral, también es conocido como engagement laboral. Este concepto tiene que ver con el sentimiento de formar parte de algo, con sentirse identificado con los valores de la empresa para la que se trabaja y con el equipo del que se es parte. Pero, además en la parte emotiva, también tiene que ver con el apoyo y el esfuerzo de la empresa para fomentar esa pertenencia.
>
> En este aspecto, el sentido de pertenencia no solo impacta positivamente las relaciones, el trabajo en equipo y el clima laboral, sino que contribuye a mejoras en la motivación, el compromiso, el desempeño y la retención del personal. El sentido de pertenencia empresarial mejora la productividad de los trabajadores y el rendimiento de la compañía."
>
> https://recursoshumanos.tv/blog-de-la-semana/el-sentido-de-pertenencia-en-las-organizaciones-y-sus-beneficios/

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Este espacio de acercamiento a los trabajadores y personal calificado, tendrá una charla expositiva por parte de la profesional social, en donde se les brindará todas las herramientas necesarias para realizar una dinámica que consistirá en desarrollar un trabajo de apropiación con los colaboradores, lo cual permitirá fomentar un ambiente de trabajo motivante y productivo.

Esta actividad se llevará a cabo el día martes 13 de febrero de 2024 en obra, con el fin de poder tener aprovechamiento del espacio y la participación del equipo de trabajo en su totalidad.

Se inicia esta actividad con una convocatoria de asistencia hacia los integrantes del equipo de trabajo en obra, con el fin de involucrarlos en actividades que impulsen el cumplimiento de los objetivos organizacionales por medio de capacitaciones que aporten al mejoramiento continuo, y efectividad durante la ejecución del proyecto.

1) Se espera contar con la participación del 100% de los empleados en obra, para un total de (25) trabajadores como personal (MONC), Y el equipo de profesionales de obra (5).

2) La finalidad de esta actividad es dar a conocer a los empleados que cuando los miembros de un equipo están motivados y la organización valora sus contribuciones, disfrutarán haciendo más de lo que se espera de ellos, generando un sentido de pertenencia con la compañía.

3) Una de las ventajas es que los trabajadores que se sienten apoyados e incluidos dentro de una compañía son más proactivos.

4) Se realizará esta actividad en obra, ya que permitirá una gestión más efectiva de la actividad, con los asistentes a la capacitación.

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

5) Una vez ejecutada la charla, se procederá a realizar una retroalimentación conjunta, lo cual permitirá involucrar a los trabajadores en temas que beneficiarán el buen desarrollo de sus actividades laborales como miembros de un equipo de trabajo.

Desarrollo de la actividad:

1. Se iniciará la actividad, con la presentación del tema a tratar (El sentido de pertenencia), se expondrá a los empleados de obra que el fin de la charla es fomentar una cultura trasparente y cumplir con los objetivos de la compañía, dicha charla tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos, en donde se hablará de la importancia de implementar límites sanos, saber identificar los estresores, tomarse descansos y buscar apoyo, con el fin de encontrar una salud mental optima.

2. Se procederá a efectuar una actividad rompe hielo, la cual tendrá una duración de 10 minutos, y tendrá por nombre Cabeza, rodilla, sentado, vuelta y caramelo. actividad que se desarrollará de la siguiente manera:

https://www.youtube.com/watch?v=s0P0D1YayRw

Dinámica N°1: Actividad rompe hielo (Cabeza, rodilla, sentado, vuelta y caramelo)

- Se conformarán 2 grupos de 12 personas, en donde se ubicarán de frente, y el director de la dinámica dispondrá de 8 caramelos, los cuales serán ubicados de manera aleatoria, dando paso al director de la actividad, quien indicará cuando se haga (cabeza, rodilla, sentado, vuelta) y cuando se diga caramelo, los más agiles cogerán el caramelo del suelo.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=w9DAgLdVvek

Conclusión:

Esta actividad permite integrar al equipo de trabajadores en una dinámica de esparcimientos, lo que a su vez permite sacarlos de sus labores rutinarias y generar espacios de relajación.

Actividad N°2: (Sentido de pertenencia)
Esta actividad permitirá integrar al equipo de trabajo con el cual se está desarrollando el ejercicio, deduciendo que es importante entender que trabajamos con personas que también forman parte de las labores diarias que desarrollamos como equipo de trabajo y que impulsan al cumplimiento de unas metas. La actividad N°2: Actividad sobre el sentido de pertenencia (JENGA)

Esta dinámica de integración ayudará a los empleados a tener un espacio de participación en donde el trabajo en equipo y el resultado de armar una estrategia para evitar que la torre de un juego tradicional conocido como (JENGA) sea derrumbada, Es así que esta actividad se efectuará de la siguiente manera:

- Se darán instrucciones a los participantes para que formen dos equipos de 12 personas, con el fin de organizar al equipo de colaboradores para iniciar la actividad.

- Posteriormente, se dará la siguiente instrucción: cuando el director de la dinámica lo indique se formarán grupo A y grupo B, en el cual irán pasando 1 participante de cada equipo a mover 1 ficha del (JENGA), hasta que algún equipo deje caer la torre, ahí finalizará el juego.

  "El sentido de pertenencia disminuye el estrés y la sensación de aislamiento, lo que a su vez tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional de los empleados. Los empleados felices y saludables son más propensos a estar motivados y a contribuir de manera efectiva a la empresa".

  Fuente:
  https://www.google.com/search?q=beneficios+de+tener+sentido+de+pertenencia&rlz=1C1ALOY_esCO1048CO1048&oq=beneficios+de+tener+sentido+de+pertenencia&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIICAEQABgWGB7SAQoxMTEwM2owajE1qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Conclusión:

Esta actividad permite que todo el equipo de trabajo haga una dinámica que involucre propiciar estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos en común y a su vez apropiarse del esfuerzo que requiere llegar a la meta.

Paso a paso:

Antes:

1. En el taller N°10 de capacitación los empleados de la obra, se vio la necesidad de manejar como tema principal el sentido de pertenecía, debido a que se están culminando las actividades de obra y es necesario generar ese sentido de pertenencia del trabajador.

2. Se coordino, la realización de la capacitación a empleados el día 13 de febrero de 2024 en obra a las 2:30 pm

3. Para la realización de esta capacitación se contará con 16 caramelos.

Durante:

1. Se acopiará como centro de convocatoria el campo de trabajo en obra, debido a la necesidad de contar con la participación de todo el personal de obra, ya que el número de personas convocadas superan las 30 personas y se hace necesario contar con un espacio más amplio.

2. Se tendrá registro de asistencia de los participantes a la actividad, lo cual permitirá evidenciar la participación de los convocados.

3. Se aplicará una dinámica de trabajo, la cual facilitará la recepción de la información y la participación de todos los integrantes, esta actividad se desarrollará de la siguiente manera:

Final:

1. Al finalizar la ejecución de esta actividad, el contratista CONSORCIO VAPA procederá a darle cierre a la actividad con el registro de un acta de capacitación, la cual permitirá evidenciar la ejecución de esta actividad.

2. Se espera que esta actividad promueva la participación del ejercicio realizado en los trabajadores, proporcionando herramientas que promuevan, las buenas prácticas relacionales en la dinámica laboral y de esta manera generar un buen ejercicio laboral, lo que conllevara a una efectividad en las tareas que involucren a todo el equipo de trabajo.

Estas actividades además de ser instructivas son aprovechables en temas de apropiación y reconocimiento, además de poder evidenciar la importancia y los beneficios de contar con personal comprometido y con sentido de pertenencia.

Cordialmente,

FIRMA: _____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

ANEXOS: N/A
Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN A EMPLEADOS DE OBRA N°11- IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL

Recibidos ×

DIANA SOCIAL <atencionalciudadanocontrato0... 26 feb 2024, 6:24 a.m.
para mí

Cordial saludo,

Por medio de la presente, se realiza el envío de la metodología de capacitación a empleados de obra final que se requirió efectuar por solicitud de la supervisión social de la entidad con el fin de dar cumplimiento a temas contractuales, esta se realizará el día 28 de febrero a las 7:00 am, quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Diana Castillo Guerra
Profesional Social
CONSORCIO VAPA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



METODOLOGIA N...

Mapo Ingenieria SAS Social <social.maposas... 26 feb 2024, 9:14 p.m.
para DIANA

Cordial saludo:

Diana, esta interventoría evidencia la subsanación de las observaciones enviadas, por lo cual se aprueba esta metodología

Atentamente,

Sandra J. Rodríguez A.
PROFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA

...

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Observaciones M...

Responder Reenviar

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá, D.C., 25 de febrero de 2024

Señores:
MAPO INGENIERIA S.A.S
Atte. María Alexandra Posada Peña
Representante Legal

Referencia: Contrato de Obra No 002 de 2023 ***"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"***

Asunto: Metodología capacitación a empleados de obra N°11 sobre igualdad de Género en el ámbito laboral.

Justificación de la actividad:

Realizar las capacitaciones con los empleados es de importancia alta, debido a que son estrategias enfocadas a cumplir con los objetivos y la misión de la compañía.
Es así como se motiva al personal a participar de lúdicas y temáticas que aportan significativamente al recurso más importante de una organización, el cual es el recurso humano.

Objetivo:
Propiciar de acuerdo con los lineamientos contractuales del proyecto, espacios de participación para los empleados en obra, a través de las actividades que involucran el buen funcionamiento de la dinámica laboral durante la ejecución del proyecto.

Descripción de la metodología:
A continuación, se describe la metodología para el desarrollo de la capacitación a empleados en obra correspondiente al mes de febrero de 2024, con el fin de dar a conocer la gestión que realizará el componente social frente al programa de capacitación a empleados en obra.

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

El contratista CONSORCIO VAPA, de acuerdo con las actividades programadas para el desarrollo del programa de capacitación a empleados en obra, diseñó una metodología aplicada a la dinámica social de acuerdo a los requerimientos de interés común que puedan identificarse en la ejecución de las labores de obra, en donde el tema a tratar será la igualdad de Género en el ámbito laboral, tema que tendrá una duración de 20 minutos aproximadamente.

Se busca incluir esta temática, debido a que se debe dar cumplimiento a los requerimientos contractuales el contrato y a su vez propicia la concientización de los colaboradores para generar un ambiente de trabajo optimo.

Por lo tanto, esta temática se considera oportuna y a su vez permitirá exponer ante los trabajadores la importancia de conocer conceptos básicos de convivencia, que serán aportes a nivel personal y laboral, tales como, respeto, comunicación asertiva, empatía, salud mental, sentido de pertenecía e igualdad de Género en el ámbito laboral.

Para la presente capacitación, se busca exponer el tema (Igualdad de Género en el ámbito laboral), ya que, a través de estas actividades generadas por el componente social, se incentiva la comunicación y la participación de todo un equipo de trabajo, que a su vez permiten adquirir conciencia de temas que son importantes a la hora de trabajar con un equipo de trabajo mixto.

"La igualdad de género en el lugar de trabajo se entiende como la igualdad de trato y acceso de los empleados y las empleadas a las oportunidades, incluyendo la participación económica y empresarial, así como la toma de decisiones; también implica valorar por igual los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades con independencia del género".

La diversidad en el lugar de trabajo abarca la raza, el género, el grupo étnico, la edad, la educación, la religión, la orientación sexual, la ideología política, el estado físico y mental, así como otras características y cualidades distintas entre las personas.

https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/igualdad-de-genero-y-diversidad#:~:text=La%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero%20en,los%20diferentes%20comportamientos%2C%20aspiraciones%20y

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Este espacio de acercamiento a los trabajadores y personal calificado, tendrá una charla expositiva por parte de la profesional social, en donde se les brindará todas las herramientas necesarias para realizar una dinámica que consistirá en desarrollar un trabajo de apropiación con los colaboradores, lo cual permitirá fomentar un ambiente de trabajo motivante y productivo.

Esta actividad se llevará a cabo el día miércoles 28 de febrero de 2024 en obra, con el fin de poder tener aprovechamiento del espacio y la participación del equipo de trabajo en su totalidad.

Se inicia esta actividad con una convocatoria de asistencia hacia los integrantes del equipo de trabajo en obra, con el fin de involucrarlos en actividades que impulsen el cumplimiento de los objetivos organizacionales por medio de capacitaciones que aporten al mejoramiento continuo, y efectividad durante la ejecución del proyecto.

1) Se espera contar con la participación del 100% de los empleados en obra, para un total de (25) trabajadores como personal (MONC), Y el equipo de profesionales de obra (5).

2) La finalidad de esta actividad es dar a conocer a los empleados que actualmente toda empresa deberá garantizar la igualdad de género en sus labores diarias y a su vez deberá propiciar un ambiente de trabajo óptimo para este fin.

3) Una de las ventajas es que los trabajadores que se sienten incluidos y necesarios dentro de una compañía, son empleados más productivos.

4) Se realizará esta actividad en obra, ya que permitirá una gestión más efectiva de la actividad, con los asistentes a la capacitación.

5) Una vez ejecutada la charla, se procederá a realizar una retroalimentación conjunta, lo cual permitirá involucrar a los trabajadores en temas que beneficiarán el buen desarrollo de sus actividades laborales como miembros de un equipo de trabajo.

Desarrollo de la actividad:

1. Se iniciará la actividad, con la presentación del tema a tratar (Igualdad de Género en el ámbito laboral) se expondrá a los empleados de obra que el fin de la charla es fomentar una cultura trasparente y cumplir con los objetivos de la compañía, dicha charla tendrá una duración de aproximadamente 10 minutos, en donde se hablará de la importancia de tener una participación igualitaria e inclusiva entre todo un equipo de trabajo diverso, constituye un elemento clave para el cumplimiento y la continuidad de una compañía.

2. Se procederá a efectuar una actividad rompe hielo, la cual tendrá una duración de 10 minutos, y tendrá por nombre Cabeza, rodilla, sentado, vuelta y caramelo. actividad que se desarrollará de la siguiente manera:

https://www.youtube.com/watch?v=s0P0D1YayRw

Dinámica: Actividad (Colegas)- Igualdad de Género en el ámbito laboral

Se pide a las personas participantes que respondan tres preguntas simples.

¨ Suponiendo que estás perdido en una isla desierta, ¿con qué colega de trabajo te gustaría estar?

¨ Suponiendo que ganaste un viaje al que puedes llevar a tres colegas, ¿a quién del grupo elegirías?

¨ Si necesitas organizar un evento, ¿a qué colega elegirías para echarte una mano?

Se solicitará a las personas participantes que rellenen la respuesta en una tarjeta, y que, además de los nombres, aporten la justificación.

Cada persona llenará su tarjeta anónima.

Una vez rellenadas las tarjetas, se colocarán en un sobre.

La persona formadora/coordinadora de esta dinámica solicitará que el alumnado se siente en un círculo y presenten sus justificaciones para las elecciones, sin indicar los nombres de los/las colegas elegidos/as.

Las palabras clave presentadas en estas justificaciones se anotarán en una tabla, pizarra...y se convertirán en valores importantes.

Aquí se aprovechará para informar y formar sobre los valores que fomentan la igualdad entre el personal.

Fuente: https://es.linkedin.com/pulse/dinámicas-de-igualdad-confederacion-de-empresarios-de-la

Conclusión:

Esta actividad permite integrar al equipo de trabajadores en una dinámica de esparcimientos, lo que a su vez permite sacarlos de sus labores rutinarias y generar espacios de participación y concientización de temas que aportan al mejoramiento, al rendimiento y a un cumplimiento de objetivos.

En este caso tratar este tema, fomenta el respeto por el otro y el buen trato en cuestiones de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, accesos a múltiples cargos, remuneraciones justas, conciliaciones entre lo personal y lo laboral y aceptación de la diversidad cultural, de género, raizal y étnica con la que contamos actualmente.

Paso a paso:

Antes:

1. En el taller N°11 de capacitación los empleados de la obra, se vio la necesidad de manejar como tema principal la igualdad de Género en el ámbito laboral, debido a que se están culminando las actividades de obra y es necesario generar ese sentido de participación igualitaria en los empleados, ya que "*Las empresas deben promover la igualdad en el trabajo de diferentes maneras y en diferentes áreas de la organización. La igualdad*

es algo fundamental que debe ser contemplado en todo momento y durante todos los procesos en una empresa, desde la selección del personal hasta el diseño de planes de formación".
https://www.personio.es/glosario/igualdad-en-el-trabajo/#

2. Se coordino, la realización de la capacitación a empleados el día 28 de febrero de 2024 en obra a las 7:00 am

3. Para la realización de esta capacitación se contará con 25 fichas bibliográficas, bolígrafos, papel periódico y marcadores.

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Durante:

1. Se acopiará como centro de convocatoria el campo de trabajo en obra, debido a la necesidad de contar con la participación de todo el personal de obra, ya que el número de personas convocadas superan las 25 personas y se hace necesario contar con un espacio más amplio.

2. Se tendrá registro de asistencia de los participantes a la actividad, lo cual permitirá evidenciar la participación de los convocados.

3. Se aplicará una dinámica de trabajo, la cual facilitará la recepción de la información y la participación de todos los integrantes, esta actividad se desarrollará de la siguiente manera:

Final:

1. Al finalizar la ejecución de esta actividad, el contratista CONSORCIO VAPA procederá a darle cierre a la actividad con el registro de un acta de capacitación, la cual permitirá evidenciar la ejecución de esta actividad.

2. Se espera que esta actividad promueva la participación del ejercicio realizado en los trabajadores, proporcionando herramientas que promuevan, las buenas prácticas relacionales en la dinámica laboral y de esta manera generar un buen ejercicio laboral, lo que conllevara a una efectividad en las tareas que involucren a todo el equipo de trabajo.

Estas actividades además de ser instructivas son aprovechables en temas de apropiación y reconocimiento, además de poder evidenciar la importancia y los beneficios de contar con personal comprometido y con sentido de pertenencia.

Cordialmente,

FIRMA: _____

FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

ANEXOS: N/A
Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

Anexo 2.J Cierre PQR No.8.

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Código:208-MB-Ft-49 | Versión: 1 | Pág: 1 de 1 | Vigente desde:29/03/2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	002-2023	Contrato de Interventoría No.	008-2023	P.Q.R.S No.	08

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR		UPZ		BARRIO: EL MIRADOR	CÓDIGO CIV	TIPO DE OBRA
Nombre	No	Nombre	No			
N/A		N/A	N/A			

INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA		INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA					
CONTRATO No 002-2023		CONTRATO No 209-2022					
FECHA DE ELABORACIÓN		DÍA	9	MES	02	AÑO	2024

REFERENCIA AL PLIEGO

Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.

CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS		DOCUMENTO
Jaime Alberto Mera.		NO
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	E- MAIL	TELÉFONO
Calle 71 G Sur # 27-34		

TIPO DE MANIFESTACIÓN

QUEJA		PETICIÓN	✓	SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA		OTRO/CUÁL?	NO

FORMA DE SOLICITUD

PERSONAL	✓	TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL?	NO

DESCRIPCIÓN

El dia 09 de febrero de 2024 se recepciona PQRS Nº8, por parte del Señor Jorge Alberto Mera, propietario del predio ubicado en la direcdn Calle 71 G Sur # 27 -34, debido a que por el paso de maquinaria se afecto el cerden en el voladizo, es asi que el consorcio VAPA, en calidad de ejecutor del contrato, se compromete a realizar el arreglo respectivo del daño presentado

COMPONENTE RESPONSABLE DE TRAMITAR LA SOLICITUD

SOCIAL		TÉCNICO	X	SISOMA		OTRA/CUÁL?	

FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN REALIZADA	PRODUCTO/ RESULTADO
29/02/24	Se realiza cierre de PQRS Nº8 realizando el respectivo arreglo	Arreglo de daño de cerden

DATOS DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
DIANA CASTILLO GUERRA	RESIDENTE SOCIAL DE OBRA

SE GENERÓ COMPROMISO	SÍ	NO	CUÁL?

Solicitante:	Proyectó	Revisó:
Firma:	Firma:	Firma:
NOMBRE: JAIME ALBERA	NOMBRE: Diana Castillo Guerra	NOMBRE: Sandra Janeth Rodriguez
CC: 19.364.074	CARGO: Profesional social obra	CARGO: Prof. Social - interventoria
Ciudadano o Ciudadana que solicita.	Contratista de Obra	Contratista de Interventoria

503

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71 G sur # 27-34		Fecha:	15	02	2024
Hora Inicio:	2:15 pm	Hora Final:	2:30 pm.			

Objetivo Acta de compromiso por daño en anden

- Levantamiento de Acta de compromiso por daño ocacionado en anden del predio

Orden del día


- Realizar visita al predio calle 71 G sur # 27-34 para verificar daño
- levantar acta de compromiso con el señor Jaime Alberto Mora

Desarrollo de la Reunión:

El día 15 de febrero se levanta Acta de compromiso con el señor Jaime Alberto Mora en su predio ubicado en la calle 71 G sur # 27-34, donde por parte del area técnica se informa que a más tardar el día 27 de febrero se realizará la respectiva reparación de ladrillo tollete en borde de andén y limpieza general, ocasionada por descargue de material de obra.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

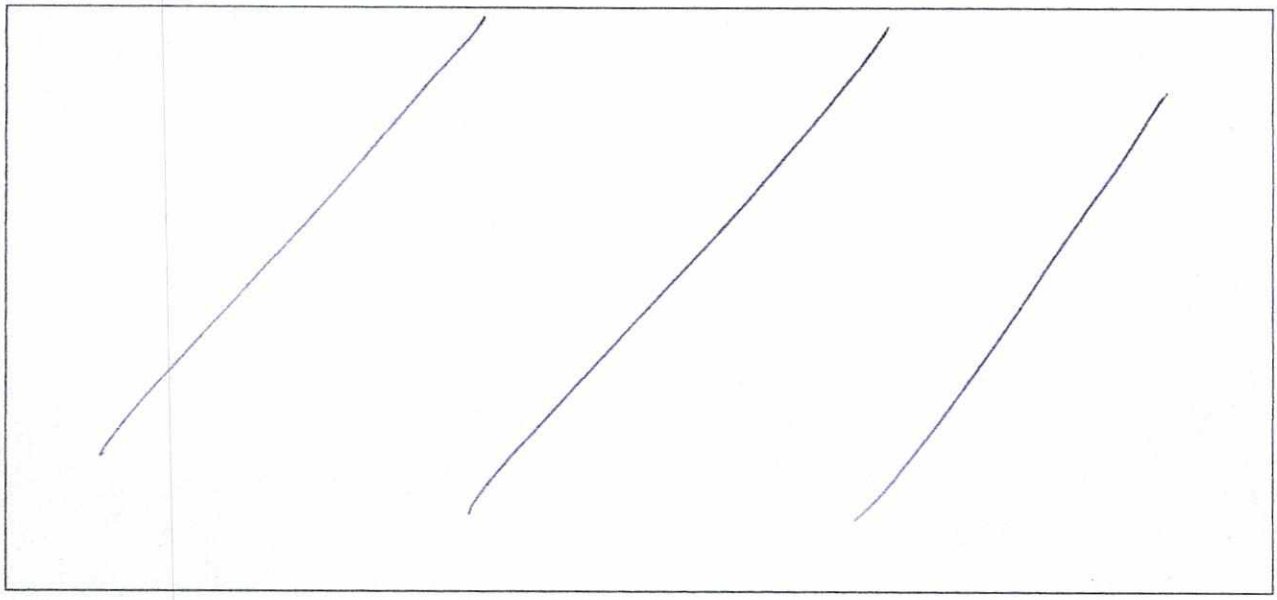

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de los participantes en el desarrollo de la gesta reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Jaime Alberto Mora	Propietario	— / —	
Diana Milena Castillo	Prof. Social Contratista	Consorcio UAPA	
Sandra Janeth Rodriguez	Prof. Social - Interventora	MAPO - SAS	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Calle 72 Sur #27-34	**Fecha:**	29	febrero	2024
Hora Inicio:	4:00pm	**Hora Final:**	5:00pm		

Objetivo Cierre de Pqrs N°8


- Realizar Cierre de Pqrs N°8 por afectación en anden del predio Perteneciente al señor Jaime Alberto Mora.

Orden del día

- el dia 29 de febrero de 2024, se realizará visita al predio y arreglo respectivo del daño
- Tomar registro fotográfico de la actividad.
- Cerrar Pqrs.


Desarrollo de la Reunión:

- el dia 29 de febrero de 2024, se efectuó cierre de Pqrs N°8, por motivo de daño en anden por paso del Mini cargador, durante la ejecución de obra, es así que se efectua el respectivo arreglo por parte del contratista de obra, quedando a satisfacción del propietario.
- Se realiza cierre del Compromiso y de Pqrs.
- Se realiza registro fotográfico de la actividad.



Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

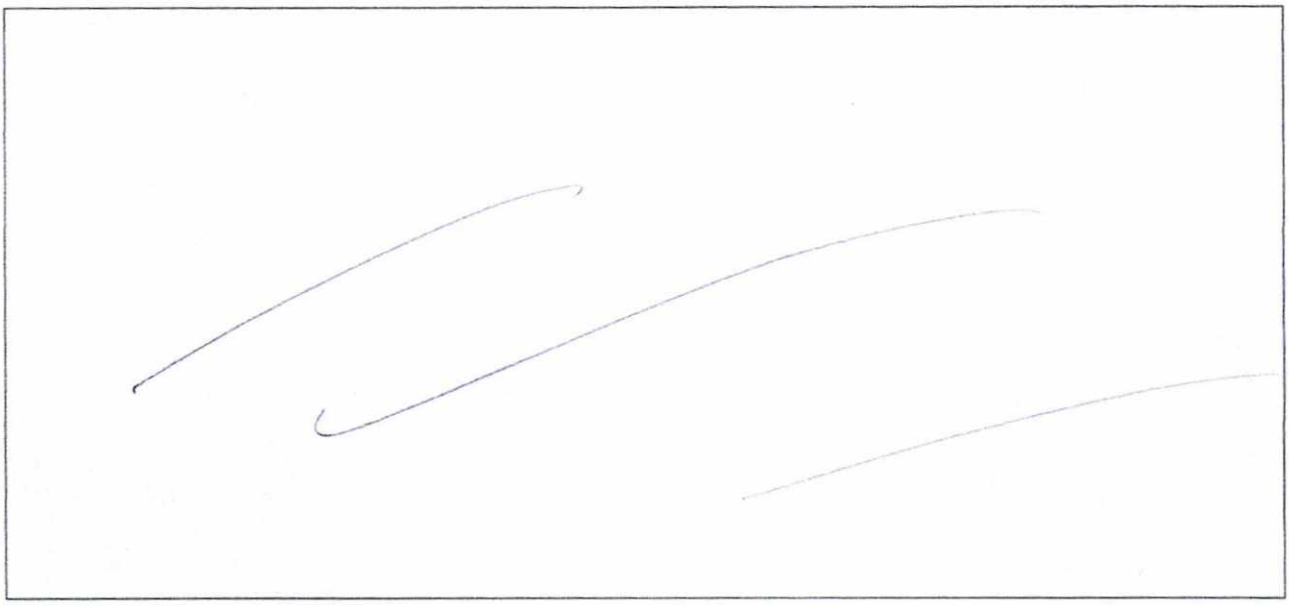

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes (Requiere firma de todos los que asistieron a la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Diana Carolina Cifuentes	Profesional Social	Contratista UAPA	1
Edwin Zambrano	Residente de obra	Contratista UAPA.	Edwin Zambrano.
Sandra Janeth Rodriguez	~~Profe~~ Social-interv.	MAPO S.A.S	Sandra J. Rodriguez

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Anexo 2.K Cierre PQR No.3.

BOGOTÁ | CAMBIO CLIMÁTICO · IDIGER

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Código:208-MB-F1-49
Versión: 1 | Pág. 1 de 1
Vigente desde 29/03/2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	002-2023	Contrato de Interventoría No.	008-2023	P.Q.R.S No.	1

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR		UPZ		BARRIO: EL MIRADOR	CODIGO CIV	TIPO DE OBRA
Nombre	No	Nombre	No.			
N/A	3	N/A	N/A			

INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA		INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA					
CONTRATO No 002-2023		CONTRATO No. 209-2022					
FECHA DE ELABORACIÓN		DÍA	31	MES	OCT	AÑO	2023

REFERENCIA AL PLIEGO

Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.

CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS			DOCUMENTO
Doris Quimbayo			No Refiere
DIRECCIÓN DOMICILIO		E- MAIL	TELÉFONO
Calle 71g Sur #27-29		NO	3125439424

TIPO DE MANIFESTACIÓN

QUEJA	X	PETICIÓN		SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA		OTRO/CUÁL?	NO

FORMA DE SOLICITUD

PERSONAL	X	TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL?	NO

DESCRIPCIÓN

El día 31 de octubre de 2023, se recibió queja por parte de la señora Doris Quimbayo, propietaria del predio ubicado en la dirección Calle 71g Sur #27-29, quien manifiesta su inconformidad, referente a que ve con preocupación que no se pañetará su muro del predio que inicialmente colindaba con la acera, sin embargo ella expresa lo siguiente: Cuando se realizo el levantamiento del acta de vecindad de inicio se le expresó a ella que su casa formaría parte de las predios a los cuales se les pañetaría y pintará su muro ya que ello antes del levantamiento de acta de vecindad. la realización de esta actividad, sin embargo el predio aledaño a su vivienda construyó muro que genera espacio entre su casa y el mismo. Es así que ella reclama y solicita que se de cumplimiento con pañete en su muro.

COMPONENTE RESPONSABLE DE TRAMITAR LA SOLICITUD

SOCIAL		TÉCNICO	X	SISOMA		OTRA/CUÁL?	

FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN REALIZADA	PRODUCTO/ RESULTADO
03/11/23	Se expuso caso ante comité de obra.	Se dió aval por parte del area técnica.
04/11/23	Se le informó a la señora que si se pañetaría el muro de su casa y que el area técnica realizaria respectiva formal, sin embargo ella expresa que no firmará hasta no haber culminado el proceso	El concepto fué positivo para la actividad de pintura y pañete como respuesta
28/02/24	Se cierra Peqrs N° 3	Pintura de fachada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
DIANA CASTILLO GUERRA	RESIDENTE SOCIAL DE OBRA

SE GENERÓ COMPROMISO	SÍ	NO	CUÁL?
	x		

Solicitante:	Proyectó:	Revisó:
Firma:	Firma:	Firma: Sandra J. Rodriguez H.
NOMBRE Doris Quimbayo	NOMBRE Diana Castillo	NOMBRE Sandra Jeneth J Rodriguez
CC: 39235460	CARGO Profesional Social obra	CARGO Prof. Social-interv.
Ciudadano o Ciudadana que solicita	Contratista de Obra	Contratista de interventoría

BOGOTÁ CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	Código:208-MB-Ft-49
		Versión: 1 / Pág: 1 de 1
		Vigente desde:29/03/2017

INFORMACION DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	002-2023	Contrato de Interventoría No.	008-2023	P.Q.R.S No.	1

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR		UPZ		BARRIO: EL MIRADOR	CÓDIGO CIV	TIPO DE OBRA
Nombre	No	Nombre	No			
N/A	3	N/A	N/A			

INFORMACION OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No. 002-2023	CONTRATO No. 209-2022

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	31	MES	OCT	AÑO	2023

REFERENCIA AL PLIEGO

Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias; interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico

CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO
Doris Guimbayo	NO

DIRECCIÓN DOMICILIO	E- MAIL	TELÉFONO
Calle 71g Sur # 27-29	NO	3125439424

TIPO DE MANIFESTACIÓN

QUEJA		PETICIÓN		SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA		OTRO/CUÁL?	NO
	X								

FORMA DE SOLICITUD

PERSONAL		TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL?	NO
	X				

DESCRIPCIÓN

Ya que ella autorizó el levantamiento del acta de vecindad de inicio la realización de esta actividad.

La profesional social de obra recepciona la PQRS y remite esta solicitud al area técnica, quien se encargará de efectuar la debida respuesta a la presente queja.

NOTA: La propietaria se rehusó a firmar el documento y refiere que lo hará una vez se de cumplimiento a su solicitud.

COMPONENTE RESPONSABLE DE TRAMITAR LA SOLICITUD

SOCIAL		TÉCNICO	x	SISOMA		OTRA/CUÁL?	

FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN REALIZADA	PRODUCTO/ RESULTADO

DATOS DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
DIANA CASTILLO GUERRA	RESIDENTE SOCIAL DE OBRA

SE GENERÓ COMPROMISO	SÍ	NO	CUÁL?
			emitir respuesta a la Queja impuesta por la propietaria del predio

Solicitante:	Proyectó:	Revisó:
Firma:	Firma:	Firma:
NOMBRE: Doris Guimbayo.	NOMBRE: Diana Castillo	NOMBRE
CC: 38235460.	CARGO: Profesional social obra	CARGO
Ciudadano o Ciudadana que solicita.	Contratista de Obra	Contratista de Interventoría

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71 Sur #27-29	Fecha:	31	OCT	2023
Hora Inicio:	10:00AM	Hora Final:	10:20AM		

Objetivo Acta De seguimiento a PQRS N° 3

- evidenciar Compromiso sobre la queja que manifiesta la señora Doris Quimbayo, Referente a pañetar y pintar el muro de su casa.

Orden del día

1. Registrar Queja en famato PQRS para dar trámite Correspondiente
2. Realizar acta de compromiso como soporte de seguimiento a PQRS.
3. Delegar Respuesta al area técnica

Desarrollo de la Reunión:


1 El dia 31 de octubre de 2023, se recibió PQRS N° 3 por Parte de la Profesional Social de obra, quien diligenció la Queja de manera formal en formato PQRS y quien se encargará de remitir la solicitud al área Técnica, ya que al ser una actividad netamente técnica, será esta misma quien de manera formal efectue respuesta.

2. Se da claridad que la señora Doris Quimbayo, se niega a Firmar el famarto de PQRS y a su vez acta de seguimiento a PQRS.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

SÍO

	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

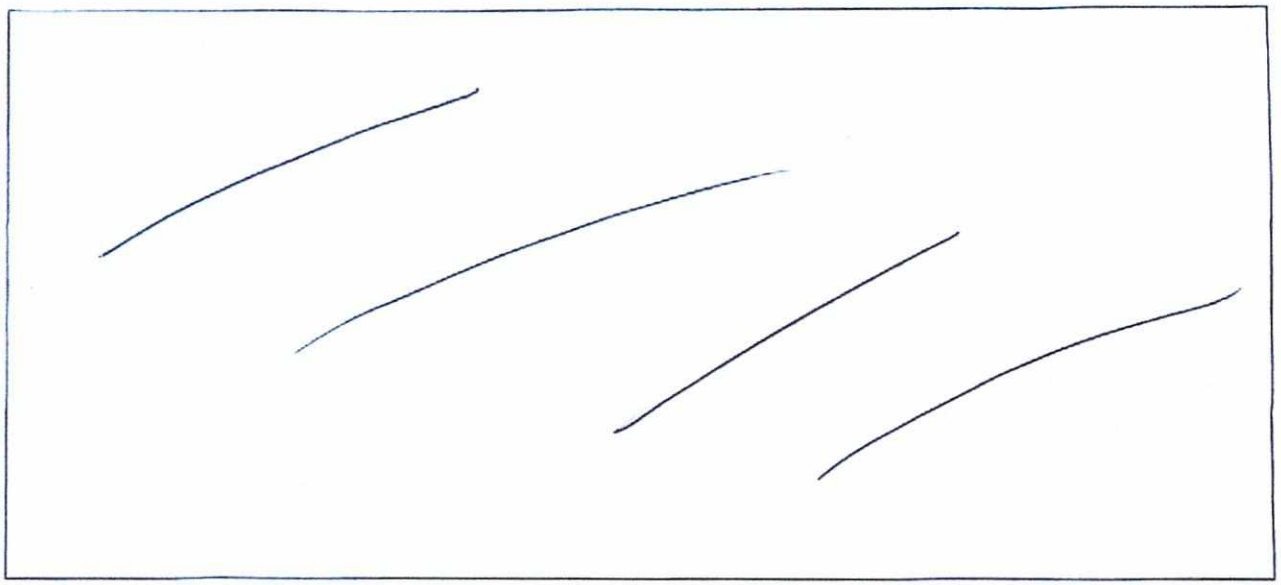

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Diana Castillo Guerra Maria Serrano L.	Profesional Social Prof. Social	Cajacó VAPA Interventoría Mapfo	1 Maria Serrano L

Powered by CamScanner

SII

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Calle 71G #27-29	Fecha:	02	febrero	2024
Hora Inicio:	3:30 pm	Hora Final:	4:00 pm		

Objetivo ACTA DE SEGUIMIENTO A PQRS #3

- Realizar visita al predio de la señora Doris Quimbayo, Propietaria del Predio ubicado en la Calle 71G #27-29, Con el fin de evidenciar seguimiento a PQRS N° 3.

Orden del día

-El dia 02 de febrero de 2024 se efectuó visita a la señora Doris Quimbayo Con el fin de realizar seguimiento a PQRS N° 3, donde inicio a adecuación de muro para inicio de pañete.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 02 de febrero de 2024, se realizó seguimiento a PQRS N° 3, en donde se inicia con adecuación de muro para proceder a realizar el pañete del mismo.

- Se efectua Compromiso con la propietaria del predio en mención donde se le explica que se realizará el respectivo cierre una vez se halla pañetado su muro en su totalidad.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Doris E. Quinchoya Digna Castillo Cuesta Sandra Janeth Rodríguez	Propietaria profesional social Prof. Social	vivienda. Consorcio MAPA MAPO - Ingeniería	Sandra J. Rodríguez

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	calle 7 G sur # 27-29.	Fecha:	28	febrc	2024
Hora Inicio:	4:00pm	Hora Final:	4:15pm		

Objetivo

- efectuar cierre de PQRS N° 3. perteneciente al predio de la Sra Doris Quimbayo.

Orden del día

- Realizar visita para verificación de peñete y pintura del predio
- efectuar cierre de PQRS.
- realizar registro fotográfico.

Desarrollo de la Reunión:

-El dia 28 de febrero de 2024, se realiza visita al predio de la Señora Doris Quimbayo propietaria del predio ubicado en la dirección calle 7 G # 27-29, quien habia instaurado PQRS por solicitud de Peñete y pintura de su fachada, es así que dando cumplimiento al Compromiso Pactado se procede a verificar y efectuar cierre de la misma, quedando a conformidad de las partes.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requisito único de los participantes para validar la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Catalina Cuenca	profesional local	consorcio UAPA	
Doris E Quimbayo	propietaria	Vivienda.	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Anexo 2.L Cierre PQR No.4.

BOGOTÁ | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Código 208-MB-FI-49 | Versión 1 | Pág: 1 de 1 | Vigente desde 29/03/2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato de Obra No.	002-2023	Contrato de Interventoría No.	008-2023	P.Q.R.S No.	1

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR		UPZ		BARRIO: EL MIRADOR	CÓDIGO CIV	TIPO DE OBRA
Nombre	No	Nombre	No.			
N/A	4	N/A	N/A			

INFORMACIÓN OBJETO DE CONTRATO DE OBRA	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No 002-2023	CONTRATO No 209-2022

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	23	MES	11	AÑO	2023

REFERENCIA AL PLIEGO

Programa de atención al ciudadano: El contratista deberá disponer de un sistema de atención al ciudadano en el que se registren, de manera ordenada y sistemática, todos los requerimientos ciudadanos Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias, interpuestos por los ciudadanos por medio presencial, escrito, telefónico o correo electrónico.

CIUDADANO QUE SOLICITA ATENCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO
Blanca nelly Melo matinez.	NO

DIRECCIÓN DOMICILIO	E- MAIL	TELÉFONO
Diagonal 71#77-63 Sur	Senatoriequidad@gmail.com	3232721601

TIPO DE MANIFESTACIÓN

QUEJA		PETICIÓN		SOLICITUD DE INFORMACIÓN		SUGERENCIA		OTRO/CUÁL?	NO
	✓								

FORMA DE SOLICITUD

PERSONAL		TELEFÓNICO		OTRO/CUÁL?	NO
	X				

DESCRIPCIÓN

El dia 23 de noviembre de 2023, la señora Blanca nelly Melo Matinez. Solicita al contratista de obra visita al Predio, con motivo de afectación a sus ventanas por vibración de trabajos de Obra. el contratista de obra en atención a su solicitud efectua visita a su predio, evidenciando averias en sus ventanas. Por medio de registro fotografico en 1er nivel y 2do nivel. el asi que el componente técnico refiere a la sra que una vez se esté culminando la ejecución de obra se verificará con el acta de Veracidad inicial y si efectivamente hay afectación el contratista realizara las respectivas arreglos.

COMPONENTE RESPONSABLE DE TRAMITAR LA SOLICITUD

SOCIAL		TÉCNICO	X	SISOMA		OTRA/CUÁL?	

FECHA DE SEGUIMIENTO	ACCIÓN REALIZADA	PRODUCTO/ RESULTADO
06/12/23	Se programa Seguimiento para el dia 06 de diciembre de 2023	Acta de Seguimiento al compromiso.
29/02/24	Se realiza cierre de la poliza, reemplazando los vidrios averiados	Arreglo de vidrios.

DATOS DEL CONTRATISTA QUE RECIBE LA QUEJA, RECLAMO O SUGERENCIA

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
DIANA CASTILLO GUERRA	RESIDENTE SOCIAL DE OBRA

SE GENERÓ COMPROMISO	SI	NO	CUÁL?
	X		emitir respuesta a la Queja impuesta por la propietaria del predio

Solicitante:	Proyectó:	Revisó:
Firma: Blanca nelly melo m.	Firma: Diana Castillo	Firma: Sandra J. Rodriguez F.
NOMBRE Blanca nelly melo m.	NOMBRE Diana castillo	NOMBRE Sandra Janeth J. Rodriguez
CC 51805706 Bta	CARGO Profesional social obra.	CARGO Prof. Social - Doctora
Ciudadano o Ciudadana que solicita	Contratista de Obra	Contratista de Interventoría

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Diagonal 71 #27-63 SUR	Fecha:	06	Diciem	2023
Hora Inicio:	3:00 pm	Hora Final:	3:30 pm.		

Objetivo Visita de seguimiento a predio por avería en ventanas.

- Realizar visita de seguimiento a vivienda par PARES N°4, la cual presentaba Queja por avería en vidrios de ventana.

Orden del día

- Realizar visita al predio perteneciente a la Sra Nelly Melo, ubicado en la direcada Diagonal 71 #27-63 SUR.
- Evidenciar averías en ventanas de predio.


Desarrollo de la Reunión:

El día 06 de diciembre de 2023, se realizó visita en predio ubicado en la direcada Diagonal 71 #27-63 SUR, perteneciente a la señora Nelly Melo quien manifestó queja por avería en las ventanas de 1er y segundo nivel de su predio. a causa de las vibraciones por labores de obra.

Se verifica que efectivamente no se encontraban los vidrios fracturados registrados en el levantamiento del acta de vecindad inicial.

Es así que el contratista de obra, se compromete a realizar las arreglos respectivos una vez se este culminando labores de obra, ya que posiblemente puedan haber pronunciamiento de las averías.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

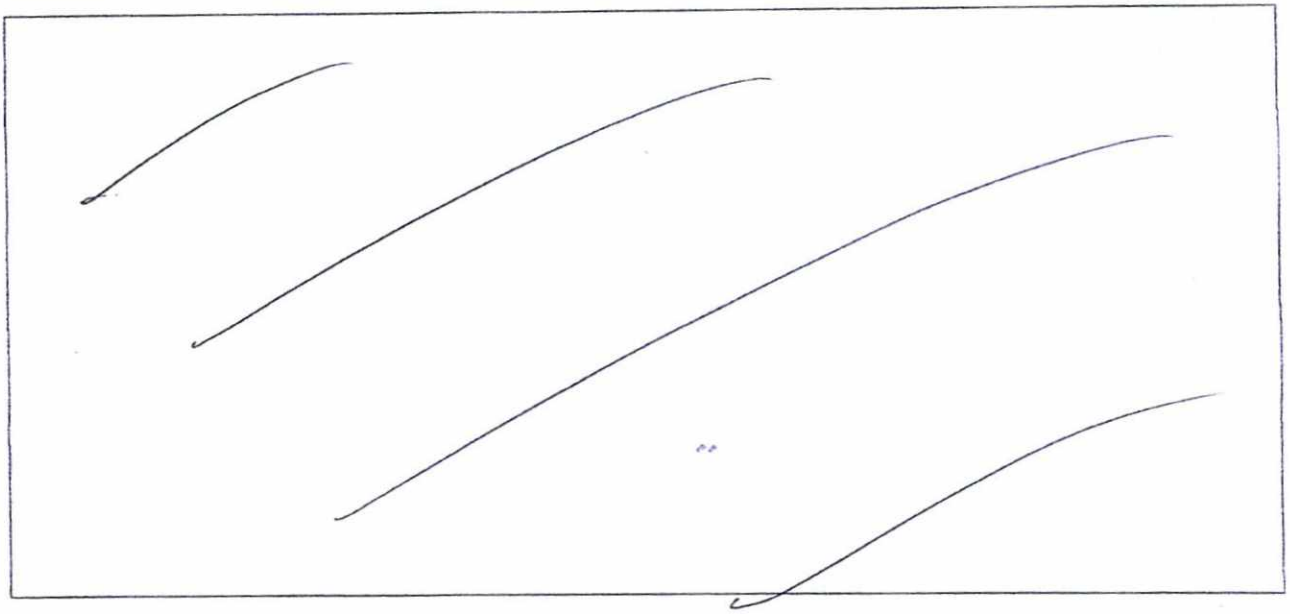

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1) Diana castillo Cucina Carlos Andres López	profesional social Residente obra	Consorcio UAPA Consorcio UAPA	1) Diana castillo
Blanca Nelly melo 51 865 704 Bto'	m. propietaria	del predio	Blanca nelly mel

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Diagonal 71 Sur #27-63	Fecha:	14/15 febrero 2024
Hora Inicio:	2:30pm	Hora Final:	3:30pm.

Objetivo Acta de seguimiento A PQRS N°4

-efectuar seguimiento a PQRS N° . Por avería en vidrios, con el fin de solicitar cotización para los respectivos arreglos por parte del contratista de obra

Orden del día

- Efectuar visita al predio perteneciente a la señora Nelly Melo.
- solicitar cotización del daño ocasionado para su posterior reparación.
- levantar acta de compromiso y registro fotográfico de la actividad.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 14/15 de febrero de 2024, se realizó visita al predio ubicado en la Diagonal 71 Sur #27-63, perteneciente a la señora Nelly Fonseca, con el fin de solicitar una cotización de los vidrios de sus ventanas que fueron afectados a causa de las vibraciones ocasionadas por trabajos de obra. Es así que la señora se compromete a realizar la cotización de los mismos y así poder realizar el arreglo respectivo de sus ventanas.
- El contratista de obra se compromete a realizar la reparación antes del 29 de febrero del 2024.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Recuerde firmar todas las páginas que participe por este medio)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Guevara	profesional social	Conservación UAPA	
Blanca Nelly Melo	Propietaria	Predio afectado.	Blanca Nelly Melo
Sandra Janeth Rodríguez	Prof. Social - interv	MAPO Ingeniería	S. Rodríguez

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Diagonal 71 sur #27-63	Fecha:	24	02	2024
Hora Inicio:	3:00 pm	Hora Final:	4:00 pm		

Objetivo

- Realizar el cierre de PQRS N°4. por querias en vidrios a la señora Blanca Nelly Melo

Orden del día

- Realizar visita y cambio de los vidrios averiados
- Se realizara el cierre
- Tomar registro fotográfico y acta.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 24 de febrero se realiza visita al predio con dirección diagonal 71 sur # 27-63 perteneciente a la señora Blanca Nelly Melo con el fin de cambiar vidrios averiados por la ejecución de la obra, es así que se efectua el respectivo arreglo por parte del contratista, quedando a satisfacción la propietaria.
- Se realiza cierre de pqrs y acta de compromiso
- Se realiza registro fotográfico y acta.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana M. Castillo	Profesional Social	Consorcio Uapa	
Blanca Nelly Melo	Propietaria	Propiedad.	
Sandra Janeth Rodriguez	Prof. Social - interv.	MAPO - ingeniería	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Anexo 2.M Acta y registro de asistencia a comité veedor No.10.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Puntodeatenciónala comunidad	Fecha:	16	02	2024
Hora Inicio:	2:30 pm.	Hora Final:	3:40pm		

Objetivo Acta de Reunión de Comité Veedor N° 10

- Efectuar reunión de comité veedor N° 10, con el fin de exponer los últimos avances de obra.

Orden del día

- Recepcionar a los integrantes del comité
- Iniciar la presentación de los diferentes avances de cada componente de obra (Social, Técnico, ambiental y SST)
- Realizar recorrido por la obra

Desarrollo de la Reunión:

El día 16 de febrero de 2024, Se efectua último comité veedor de obra por el contrato FONDIGER 002-2023 en donde Se realizan las siguientes actividades:

a) Se recepciona a los integrantes del comite veedor contando con la participación de 5 personas.

b) Seguido se inicia presentación de cada uno de los componentes de obra, en donde la parte técnica informa sobre actividades como: iluminaciónyelectricidad, aguas lluvias adecuado proceso, biciparqueadero, jardineras, geotextil biodegradable para la revegetalización, pergolas y plantas enredaderas, mobiliario, comedores, pintura sobre muros, etc, despues de la exposición Se da el espacio para dudas o inquietudes, en donde yeidy pregunta respecto a las fisuras que presenta el muro baranda?, la parte tecnica explica la manera en que Se construyo el muro y que las fisuras son debido a un proceso normal del concreto, asi mismo que el muro paso por otro proceso de corte y Sellado asi que no hay ningun riesgo, el componente SST y ambiental

Powered by CamScanner

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

expone que desde este componente son actividades repetitivas pero no menos importantes como lo son: humectación, control de tráfico, entrega de EPP, capacitaciones inducciones, y se reportan mas de 1000 arboles sembrados. Desde el componente Social igualmente se informan las actividades realizadas desde el comite veedor anterior reportando: reuniones realizadas, murales, encuestas, talleres de cultura realizados, pqrs, divulgación de informaciòn y capacitaciones a empleados.
c) Se da nuevamente espacio para inquietudes, pero no se recibe ninguna.
d) Se comparte refrigerio, se toma registro fotográfico y se levanta acta, por último se da cierre a la actividad.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Relacionar firma de los asistentes que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Milena Castillo	Prof Social	Consorcio UAPA	
Sandra Rodriguez	Prof-Social-interventor	MAPO Ingeniería	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)

Código: DE-FT-52
Versión: 3
Página: 1 de 2
Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. [X] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [ ] OTRO 1.3.1. ____

2. TEMA DE LA SESIÓN: Reunión de Comité Veedor N° 10

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Punto de atención a la comunidad

6. FECHA: 16-02-24 | 6. HORARIO 6.1. INICIO: 2:30pm 6.2. FIN | HOJA 1 DE 1

7.1. N°	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenquero	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
1	Gilberto Rivera	Ciudad Bolivar	Mirador					67											—/—	3133255875	—/—	
2	Yeidy Mireya Nava García	Ciudad Bolivar	El Mirador		X			46										X	—/—	3103075107	jacmiradordequibo@gmail.com	
3	Ana Hercely Hoy	Ciudad Bolivar	El paiso					67											—/—	3132425289	—/—	
4	Myam [illegible]	Ciudad Bolivar	[illegible]					[illegible]											—/—	3125207270	—/—	
5	Mireya Sandoval	Ciudad Bolivar	Mirador					56										X	—/—	3112839707	—/—	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

Powered by CamScanner

629

Anexo 2.N Presentación aprobada de comité veedor No. 10.

Gmail presentación

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Etiquetas

Presentación Comite Veedor

Recibidos ×

DIANA SOCIAL mié, 7 feb, 4
Cordial saludo, Adjunto presentación del comité veedor n°10, quedo atenta a cualquier inquietud. cordialmente Diana Castillo Guerra Pr

Mapo Ingenieria SAS Social dom, 11 feb, 6:57 p.m.
para mi

Cordial saludo

Presentación del comité veedor n°10. Aprobado

Atentamente,

Sandra J. Rodríguez A.
PROFESIONAL SOCIAL- INTERVENTORÍA.
MAPO INGENIERÍA.

REUNIÓN DE COMITÉ VEEDOR 10
CONTRATO FONDIGER 002-2023



ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a los asistentes
2. Presentación de los profesionales asistentes
3. Actividades del componente técnico
3. Actividades del componente SST y Ambiental.
4. Actividades del componente Social.
4. Inquietudes de los asistentes
5. Cierre de la reunión

COMPONENTE TÉCNICO

AVANCES DE OBRA

Base granular clase B (B600) 25/01/23





AVANCES DE OBRA

Actividad de pañete en muros 2/02/24





AVANCES DE OBRA

Instalación de redes eléctricas 20/01/24



530

AVANCES DE OBRA

Instalación de redes de alcantarillado 22/01/24





AVANCES DE OBRA

Instalación de Muro Baranda 17/01/24



AVANCES DE OBRA

Construcción de jardineras 27/01/24



AVANCES DE OBRA

Construcción de Losas de contrapiso (urbanismo) 30/01/23





AVANCES DE OBRA

instalación de geomembranas para el control de erosión y revegetalización





AVANCES DE OBRA

Cerramiento del proyecto con los postes de concreto y alambre de púas en la ladera.





531

AVANCES DE OBRA

Instalación de pisos loseta y fundida de franja de ajuste





AVANCES DE OBRA

Instalación de estructura metálica para las pérgolas





AVANCES DE OBRA

Instalación de mobiliario en concreto





AVANCES DE OBRA

Impermeabilización de las jardineras





AVANCES DE OBRA

Sumideros, Cañuelas y cajas de aguas lluvias







AVANCES DE OBRA

Instalación carque de pozos



AVANCES DE OBRA

Construcción de muro comedor





COMPONENTE SST

Actividades SST


Protección a los sumideros de PMT 9/01/2024





Actividades SST

Humectación de vía 16/01/2024





Actividades SST

Señalización de PMT y cerramiento 27/01/2024





Actividades SST

Entrega de EPP a empleados 25/01/2024





S33

Actividades SST

Capacitación a empleados e inducción a personal nuevo 29/01/2024





COMPONENTE AMBIENTAL

Actividades ambientales

Limpieza y desinfección de baños portátiles 30/01/2024





Actividades ambientales

Limpieza y evacuación de residuos sólidos 1/02/2024





Actividades ambientales

Siembra y riego de individuos arbóreos en zona de obra y ladera 26/01/2024





COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE DIALOGO CIUDADANO
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Entrega de volantes informativos 31/01/2024




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE DIALOGO CIUDADANO
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN
Entrega de volantes informativos 9/01/2024




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE DIALOGO CIUDADANO
PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD
Mantenimiento y actualización de puntos satélites 23/01/23




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE DIALOGO CIUDADANO
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
30/01/2023




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE SOSTENIBILIDAD
Implementación de encuestas de satisfacción con la comunidad 31/01/24




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE SOSTENIBILIDAD
Talleres de cultura ciudadana 29/01/2024




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE SOSTENIBILIDAD
Talleres de cultura ciudadana 03/02/2024




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE SOSTENIBILIDAD
Talleres de cultura ciudadana 20/01/2024 - 03/02/2024




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EMPLEADO EN OBRA
Capacitación a empleados de obra 12/01/24




ACTIVIDADES SOCIALES

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA CIUDADANA
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Recorridos urbanos 16/01/24– 31/01/24




INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD



GRACIAS

536

Anexo 2.Ñ Acta de reunión taller de cultura ciudadana No.8.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Cra 27 c 1 con Calle 71 I Bis s	Fecha:	03	02	2024
Hora Inicio:	10:00 am	Hora Final:	3:00 pm		

Objetivo Acta de Taller de Cultura ciudadana N° 8

- Efectuar taller de cultura ciudadana n° 8 en un punto critico de basura a solicitud de la comunidad.

Orden del día

- Recepcionar y tomar registro de asistencia a la comunidad que participará en la actividad.
- Llevar a cabo comunicación asertiva con la propietaria del predio para utilizar el espacio para colocar las materas.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 3 de febrero se lleva a cabo por solicitud de la comunidad, el último taller de cultura ciudadana con el fin de adecuar un nuevo punto critico de basura para ser intervenido con material aprovechable (llantas) con plantas con el proposito de evitar la contaminación ambiental debido a las basuras que son arrojadas allí.
- Se da inicio a la actividad recepcionando a los asistentes
- Se realiza acercamiento con la señora Alba propietaria del predio quien tiene el anden cubierto con latas para solicitar autorización de retirar dichas latas e intervenir el espacio con las materas.
- Despues de obtener el permiso de la propietaria se procede a despejar el espacio retirando las latas y se inicia una jornada de aseo para eliminar rastros de basura y malos olores.
- Se inicia el pintado de llantas por parte de la comunidad asi mismo se pinta muro de la propiedad con el fin de dar una nueva cara al espacio.
- Seguido a esto con el apoyo de la comunidad se inicio el proceso de siembra de buganbilias en las materas en llantas, en total se colocarón 8 materas compuestas

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

por 2 llantas.
- Se realiza compartir con la comunidad.
- Se toma registro fotográfico y se finaliza la actividad.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de los asistentes con excepción de la comunidad)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Milena Castillo G	Prof. Social	Consorcio UAPA	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN — 1.1. [ ] REUNIÓN — 1.2. [X] TALLER — 1.3. [ ] OTRO — 1.3.1. _____

2. TEMA DE LA SESIÓN: Taller de Cultura Ciudadana N° 8

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Cra 27c con Calle 71 I Bss.

5. FECHA: 3 02 24

6. HORARIO — 6.1. INICIO: 10:00am — 6.2. FIN: 3:00pm

HOJA 1 DE 3

7.1. N°	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Victima del conflicto	Migrante Internacional	Ninguna de las anteriores				
1	Ruby Alexandra Mosquera Perea	Ciudad bolivar	Paraiso					22												3247725937		
2	Vera montero Yolreth Daniela	Ciudad bolivar	paraiso					23												3229728090		
3	Edward Alejandro Chacon Merchan	Ciudad bolivar	Paraiso					20												3025123764		
4	Sonia Ariza	Ciudad Bolivar	Bella flor					42												3203669724		
5	Jenny Cano	C. Bolivar						48												3133543660		
6	Blanca Barreto	C. Bolivar						24												3115351782		
7	LISBETH ROMAÑOS	C. Bolivar						24												3015458715		
8	maritza Bernal	C. Bolivar						43												3023273069		
9	Ana Mercedes	19 ciudad bolivar	el paraiso					67												3132428887		
10	Luz Marina castro	19 ciudad Bolivar	el paraiso					67												3132428887		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN — 1.1. [ ] REUNIÓN — 1.2. [x] TALLER — 1.3. [ ] OTRO — 1.3.1. _____

2. TEMA DE LA SESIÓN: Taller de Cultura ciudadana n° 8

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Cra 27c con Calle 71 I Bis S.

5. FECHA: 3 2 24

6. HORARIO — 6.1. INICIO: 10am — 6.2. FIN: 3pm

HOJA 2 DE 3

7.1. N°	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Victima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
11	Ines Bernal C.	Paraiso	Paraiso					59.												3971536		Ines Bernal
12	Jeran		paraizo					45												1077601804		Jeran
13	paola.		paraiso																	1610186.87		Paola Ayala
14	José J. Salazar	Paraiso	Paraiso					60												3002409803		
15	ALEXANDER RUEDA	CB PARAISO	CIUDAD BOLIVAR					39												3197531422		
16	Luz Jerominda	CB paraiso	paraiso					50												3152435664		
17	Elia Jimenez	C.Bolivar	Paraiso					64												3158332545		Elia Jiménez
18	Jenifer tapia	Paraiso	Paraiso					18												1148685269		Jenifer t
19	Jorge Almagai	Paraiso																		52976974		Jorge Almagai
20		Paraiso	Paraiso					43												3208983908		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN — 1.1. [ ] REUNIÓN — 1.2. [X] TALLER — 1.3. [ ] OTRO — 1.3.1. _____

2. TEMA DE LA SESIÓN: Taller de cultura ciudadana nº 8

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Cra 27 c con Calle 71 I Bis s

5. FECHA: 3 2 24

6. HORARIO — 6.1. INICIO: 10 am - 6.2. FIN: 3 pm

HOJA 3 DE 3

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
21	Gonzalo Plaza		Mirador					54												3108021163		
22	[illegible]		Mirador					70												3017238286		
23	Maria		Mirador					54												27.6[illegible]340		Maria D.
24	[illegible]		Mirador					60												4156664		
25	Humberto Ab.L		[illegible]					55												1155836771		
26	Nubia Fernanda		Mirador					61												3213204306		
27	Teresa C.		Mirador					60												3143808038		
28	Jairo Giraldo		Mirador					66												16261254		
29	Jeny Diaz		Paraiso					23												3232469256		
30	Maria Castillo		Paraiso					57												3134539998		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

Anexo 2.O Actas de recorridos urbanos.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Zonal de Influencia directa	Fecha:	28	feb.	2024
Hora Inicio:	2:00pm	Hora Final:	3:00pm		

Objetivo Recorrido urbano - Acompañamiento interventoría

- Realizar recorrido urbano semanal, con el acompañamiento de la interventoría, evidenciando gestión de actividades locales en obra

Orden del día

- efectua recorrido urbano, actualizar puntos satélites de información y aplicar encuestas de satisfacción.
- realizar acompañamiento para la aplicación de cierre de actas de vecindad.

Desarrollo de la Reunión:

- El día 28 de febrero de 2024, se realizó recorrido urbano con el acompañamiento de la interventoría, con el fin de verificar levantamiento de actas de vecindad de cierre, actualización de puntos satélites de información con volante de inicio de actividad de cierre de actas de vecindad y la aplicación de 3 encuestas de satisfacción con la comunidad, es así que se realiza el acompañamiento respectivo a las actividades anteriormente nombradas y se procede a cerrar el recorrido urbano, con el levantamiento del acta.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de los asistentes que participaron de la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana castillo Guerra	Profesional social	Conserva IMPA	Diana Castillo

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Zona de Influencia de Obra	Fecha:	20	02	2024
Hora Inicio:	12:00 Am.	Hora Final:	1:30pm		

Objetivo Acta de Recorrido Urbano con la interventoria

- Efectuar recorrido urbano con acompañamiento de la interventoria para realizar actualización de puntos satelites y aplicación de encuestais de satisfacción a la comunidad.

Orden del día

- Iniciar recorrido con interventoria por los 3 puntos satélites
- Actualizar puntos satélites.
- Aplicar durante el recorrido 3 encuestas de satisfacción
- Realizar registro fotográfico y levantar acta de la actividad

Desarrollo de la Reunión:


El dia 20 de febrero se realiza recorrido urbano con acompañamiento de la interventoria realizando las siguientes actividades:

a) Visitar los 3 puntos satélites ubicados en diferentes puntos del barrio, en donde se encuentran actualmente volantes de PMT y se procede al retiro del mismo por vencimiento del PMT.

b) Se aplican 3 encuestas de satisfacción con la comunidad con el fin de evidenciar la percepción que tiene la Comunidad referente al avance de obra y como este beneficiará a toda una ciudad, es así que la percepción es positiva ya que le ofrece otro aspecto al barrio y mejora la calidad de vida del sector.

C) se realiza registro fotográfico de la actividad realizada.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

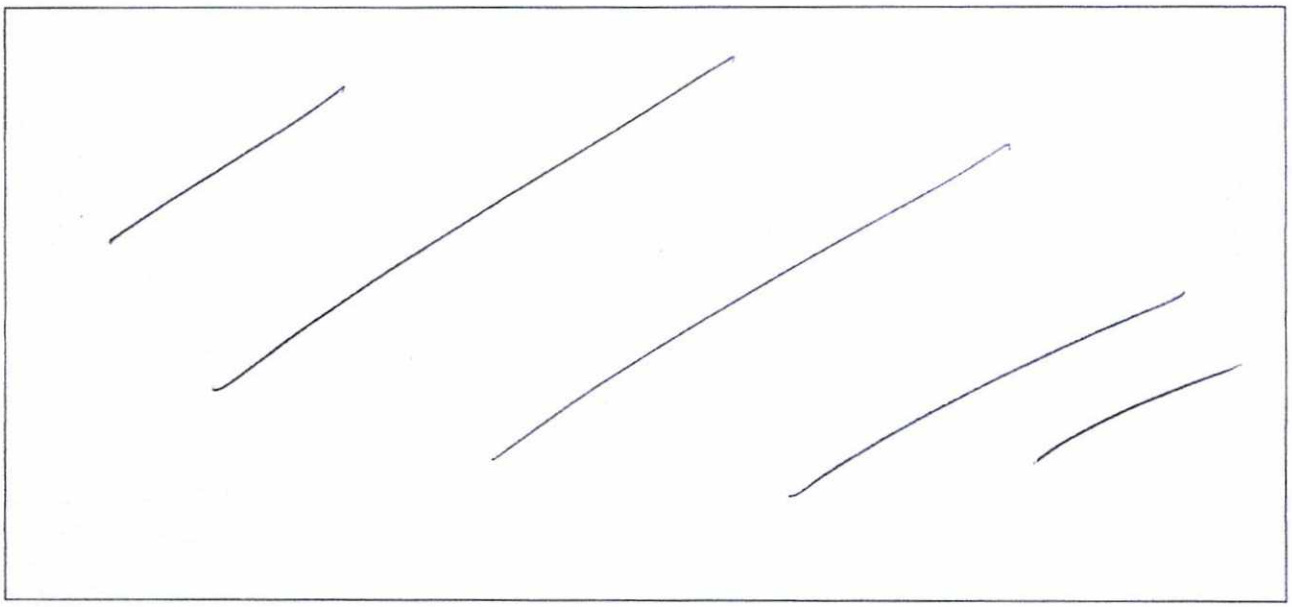

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que hacen parte de la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo G. Sandra Janeth Rodriguez	Profesional Social Profesional Social	Contratista UAPA Consorcio Mapo Ingeniería	Diana Castillo G. Sandra J. Rodriguez

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Zona de influencia de Obra	**Fecha:**	15	02	24
Hora Inicio:	10:00Am	**Hora Final:**	11:00AM		

Objetivo Recorrido urbano con acompañamiento de la interventoría.

- Efectuar recorrido urbano con el fin de verificar puntos satélites de información y aplicación de encuestas de satisfacción

Orden del día

- Realizar recorrido visitando los 3 puntos satelites para evidenciar el estado en el que se encuentran
- Aplicar 3 encuestas de satisfacción a la comunidad buscando conocer que expectativas tienen frente al proyecto.

Desarrollo de la Reunión:

-El dia 15 de febrero se lleva a cabo recorrido urbano en donde se realizan las siguientes actividades:

a) Visitar los 3 puntos satélites para verificar su estado y se evidencia que se encuentra volante de PMT actualizado a la fecha.

b) Aplicar encuestas de satisfacción a 3 personas de la Comunidad, con el fin de indagar la Percepción que se tiene respecto al desarrollo de la obra en ejecución y Como esta beneficiará el desarrollo de toda una ciudad.

c) Se evidencia mantenimiento de punto satélite de información N°3, Perteneciente al salón Comunal del Mirador, ya que el volante se encontraba en mal estado, se reemplaza el mismo.

548

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página: 1 de 2** **Vigente desde:** 27/09/2021

D) Se finaliza recorrido urbano con evidencia de registro fotográfico.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Cuevas	Profesional social	Consorcio VAPA	
Sandra Janeth Rodriguez	Profesional Social - interv.	MAPD - Ingeniería	

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Zona aledaña de obra		Fecha:	06	feb	2024
Hora Inicio:	8:30 am	Hora Final:	9:30 AM			

Objetivo Recorrido urbano con acompañamiento de la interventoria.

- Efectuar recorrido urbano. con el acompañamiento de la interventoría, con el fin de verificar aplicación de encuestas de satisfacción y retirar volantes de puntos satélites de información.

Orden del día

- Efectuar recorrido
- aplica encuestas de satisfacción.
- Acompañar la actividad.

Desarrollo de la Reunión:


El dia 06 de febrero de 2024, se realizó recorrido urbano, con el acompañamiento de la interventoría, donde se verificó que durante el recorrido urbano se aplicaron las 3 encuestas de satisfacción con la comunidad donde se evidencia que la comunidad esta satisfecha con la ejecución de la obra. Consideran que beneficiará al sector, en temas de activación económica, embellecimiento y mejoramiento del espacio público.

- se retiran volantes de puntos satélites de información, actualizando datos con información vigente para la comunidad

- Se efectua registro fotográfico de las actividades reportadas.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

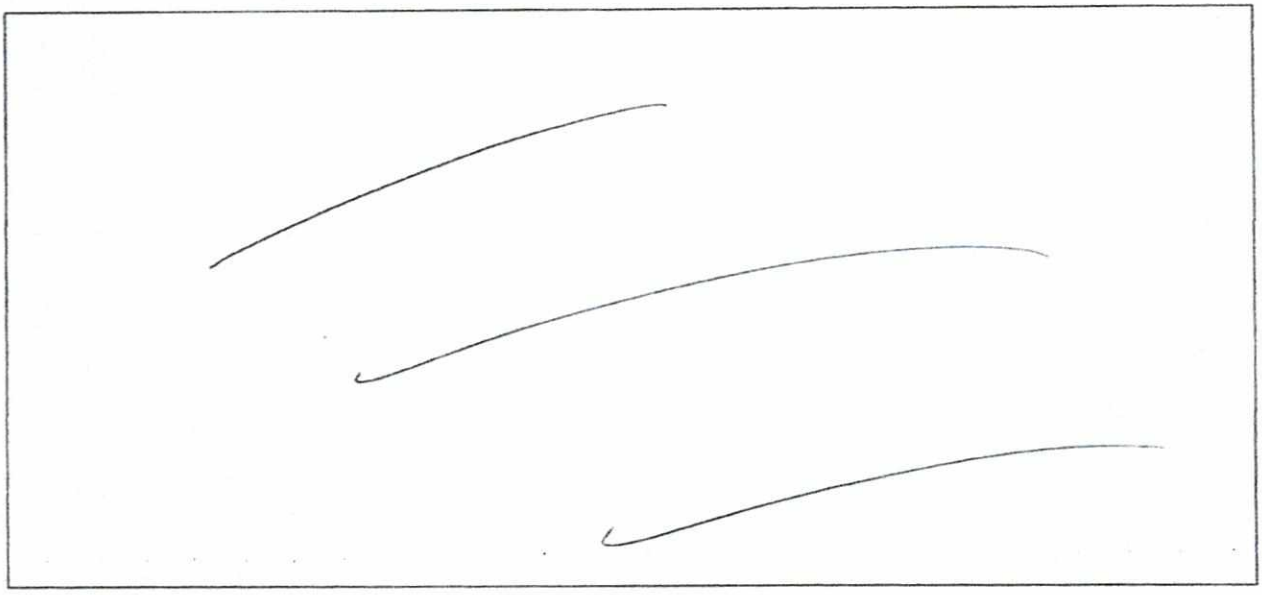

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento		

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Diana Castillo Cifuentes	Profesional Social	Consorcio LAPA	1
Sandra Janeth Rodriguez	Profesional Social	Interventoria MAPO	Sandra J. Rodriguez

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Anexo 2.P Programación de actividades sociales.

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL DE OBRA CONTRATO N° 002 - 2023

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Diana Milena Guerra	**SEMANA DE REGISTRO**	
NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Sandra Rodriguez	2024-01-29	

ACTIVIDADES COMPLETADAS	FECHA
El lunes 22 de enero de 2024, se realiza visita al predio ubicado en la Diegonal 71 sur # 27-63 de la señora Blanca Nelly Melo, quien solicita evaluar por parte del contratista unas afectaciones presentadas en su predio.	22/01/2024
El día martes 23 de enero de 2024, se afectuará recorrido urbano y aplicación de 3 encuestaas de satisfacción con la comunidad.	23/01/2024
El día martes 23 de enero de 2024, se realizó actualización de puntos satélites, retirando el volante de convocatoria de taller de cultura ciudadana N°7	23/01/2024
El día miercoles 24 de enero de 2024, se realizó vista en punto critico de basura por parte de la parroquia local, policia del cuadrante del sector el paraíso, representantes del comité veedor, lideres comunitarios y Consorcio Vapa, a las 2 pm, en donde se evaluarón estrategias para colaborar con la parroquia para minimizar el impacto respecto a esta mala practica.	24/01/2024
El día jueves 25 de enero de 2024, se realizó mantenimiento de valla informativa.	25/01/2024
Se llevo a cabo ultima visita de seguimiento por vibraciones al predio de la señora Maria Fonseca cra 27 a # 71 f 54 sur, en donde se le explica a la propietaria que al finalizar el proyecto se realizaran los arreglos pertinentes.	26/01/2024

ACTIVIDADES EN CURSO	FECHA
N/A	**N/A**

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA	FECHA / HORA
Se enviará a la interventoria propuesta de volante y metodología de taller de cultura n°8	29/01/2024-4 pm
Se efectuará reunion con la profesional social de transmicable.	30/01/2024-2 pm
Se divulgara un total de 40 volantes de invitación a taller y se actualizaran puntos satélites de información	31/01/2024-9 am
Se realizará recorrido urbano y se aplicaran encuestas de satisfacción.	1/02/2024-9 am
Se dará cierre a PQRS por pañete de la señora Doris Quimbayo.	2/02/2024-8 am
El dia sabado 3 de febrero, se efectuara taller de cultura ciudadana n°8 a las 10 am.	3/02/2024

ACTIVIDADES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES	CUESTIONES URGENTES (PQRS)	FECHA
N/A	NO	

COMENTARIOS U COMPROMISOS

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL DE OBRA CONTRATO N° 002 - 2023

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Diana Milena Guerra	**SEMANA DE REGISTRO**	
NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Sandra Rodriguez	2024-01-29	

ACTIVIDADES COMPLETADAS	FECHA
El lunes 22 de enero de 2024, se realiza visita al predio ubicado en la Diegonal 71 sur # 27-63 de la señora Blanca Nelly Melo, quien solicita evaluar por parte del contratista unas afectaciones presentadas en su predio.	22/01/2024
El día martes 23 de enero de 2024, se afectuará recorrido urbano y aplicación de 3 encuestaas de satisfacción con la comunidad.	23/01/2024
El día martes 23 de enero de 2024, se realizó actualización de puntos satélites, retirando el volante de convocatoria de taller de cultura ciudadana N°7	23/01/2024
El día miercoles 24 de enero de 2024, se realizó vista en punto critico de basura por parte de la parroquia local, policia del cuadrante del sector el paraíso, representantes del comité veedor, lideres comunitarios y Consorcio Vapa, a las 2 pm, en donde se evaluarón estrategias para colaborar con la parroquia para minimizar el impacto respecto a esta mala practica.	24/01/2024
El día jueves 25 de enero de 2024, se realizó mantenimiento de valla informativa.	25/01/2024
Se llevo a cabo ultima visita de seguimiento por vibraciones al predio de la señora Maria Fonseca cra 27 a # 71 f 54 sur, en donde se le explica a la propietaria que al finalizar el proyecto se realizaran los arreglos pertinentes.	26/01/2024

ACTIVIDADES EN CURSO	FECHA
N/A	**N/A**

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA	FECHA / HORA
Se enviará a la interventoria propuesta de volante y metodología de taller de cultura n°8	29/01/2024-4 pm
Se efectuará reunion con la profesional social de transmicable.	30/01/2024-2 pm
Se divulgara un total de 40 volantes de invitación a taller y se actualizaran puntos satélites de información	31/01/2024-9 am
Se realizará recorrido urbano y se aplicaran encuestas de satisfacción.	1/02/2024-9 am
Se dará cierre a PQRS por pañete de la señora Doris Quimbayo.	2/02/2024-8 am
El dia sabado 3 de febrero, se efectuara taller de cultura ciudadana n°8 a las 10 am.	3/02/2024

ACTIVIDADES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES	CUESTIONES URGENTES (PQRS)	FECHA
N/A	NO	

COMENTARIOS U COMPROMISOS

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL DE OBRA CONTRATO N° 002 - 2023

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Diana Milena Guerra	**SEMANA DE REGISTRO**	
NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Sandra Rodriguez	2024-01-29	

ACTIVIDADES COMPLETADAS	FECHA
El día 05 de febrero de 2024, se realizó recorrido en el frente de obra, con el acompañamiento de la secretaria de Habitat, con el fin de verificar el area de los 19 predios que se encuentran de cara a la fachada, de manera que la secretaría de habitat pueda identidicar la zona proyectada para poder realizar una intervención a futuro en los muros de las viviendas, plasmando arte y cultura. Ver Acta de recorrido con habitat / Ver Registro fotográfico	5/02/2024
El dia 07 de febero de 2024, se efectuó segundo recorrido, con el acompañamiento de la Secretaría de habitat, con el fin de indagar con la comunidad, y puntualmente con 4 propietarios, sobre su aval para realizar prueba piloto y así poder dar inicio a implantar murales sobre fachadas correspondientes a las direcciones (calle 71 f bis sur#27-28, calle 71f bis sur #27-25, calle 71G sur #27-28 y calle 71f sur #27-21), sin embargo se aclara con los propietarios que es una prueba incial ya que aun no se cuenta con los recursos por parte de la secretaria del habitat	7/02/2024
El día 10 de febrero de 2024, se efectuó la entrega de 12 cartas de invitación a comité veedor N°10, en donde se invitó a los participantes del comité veedor a asistir en la reunión programada para el día 16 de feberero de 2024	10/02/2024
El día 09 de feberero de 2024, se recepcionó PQRS N°8, a causa de actividades en obra, durante el paso de un bobcat que transportaba tierra, se afectó el anden del predio ubicado en la dirección calle 71Gsur # 27-34, perteneciente al señor Jaime Mora, es así que el contratista de obra se compormete a realizar el arreglo respectivo, con el fin de poder dar cumpimiento y cierre a la misma	9/02/2024
El dia 6 de febrero de 2024, se realiza recorrido urbano con el acompañamiento del apoyo social de interventoria, en donde se actualizan los 3 puntos satélites de información retirando volante de invitación a taller de cultura ciudada N°8, asi mismo, se aplican las 3 encuestas de satisfacción con la comunidad del sector, identificando que el turismo y el comercio se verá beneficiado y tendrá una valorizaión exponencial	6/02/2024
El día 01 de Febrero de 2024, se efectuó reunión extraordinaria con el Equipo social de La Rolita Transmicable, La profesional social del IDIGER y la profesional social del contratista de obra, en donde se trataron temas como: Entrega de la obra a la comunidad, Posibilidaad de realizar convocatoria de diferentes artistas del sector para implementar murales (dependiendo de la respuesta por parte de la entidad), articulaciones con entidades como UAESP, equipo social de transmicable y alcaldía para reunión programada para el día 17 de febrero, programación de reunión para el día 06 de febrero con LIME, el equipo de transmicable y el contratista de obra para realizar visitas a puntos criticos de basura y charlas sobre manejo de las mismas (a cargo de LIME) .	1/02/2024
Para el periodo reportado el día 6 de febrero de 2024, se realizó la aplicación de las encuestas de satisfacción aplicadas a 3 personas de la comunidad, esta actividad se realizó durante el recorrido urbano y se logra evidenciar que la comunidad percibe que la obra ejecutada es de gran beneficio para el sector y para la localidad, ya que incrementará el turismo y la activacion económica.	6/02/2024

El día 07 de febrero de 2024, se realizó reunión con la rolita (Transmicable) en la cual se tartaron temas de articulación para proponer en mesa de trabajo programada para el día 13 de febrero de 2024, la cual tendrá como fin dar orientación acerca de temas como:a que entidad se realizará la entrega del proyecto, a quien se atribuirá el mantenimiento de la misma, que entidad se encargará de actividad de murales sobre fachadas, y cuando se efectuará la inauguración de la obra	7/02/2024
El día 08 de febrero de 2024, se efectuó reunión extraordinaria con la profesional social de La rolita (Transmicable) y representantes de artistas locales y comité de grafiteros, en donde se abordaron temas puntuales sobre la ejecución de murales sobre fachadas de las viviendas, ¿quien se encargaría de esta actividad? y ¿como sería la participación del colectivo artístico en el mismo?, es así que la profesional social de obra, da claridad a los participantes, de que contractualmente el alcance del contratista se limita a entregar las culatas de los predios que se encuentran de cara a la ladera pañetadas y pintadas en color blanco, y a su vez la entidad IDIGER, no cuenta con recursos para gestionar esta actividad, sin embargo la Secretaría Distrital de Habitat se encuentra interesada en conseguir los recursos para poder llevar a cabo esta iniciativa.	8/02/2024

ACTIVIDADES EN CURSO	FECHA
N/A	N/A

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA	FECHA / HORA
Se asistirá a sensibilización, convocada con Alaldía Local, (ICBF), sobre reclutamiento infantil. A su vez se realizará visita al predio de la señora Carlina Tique, propietaria del predio ubicado en la dirección calle 71 c sur #27-21, con el fin de manifestarle la solicitud de retirar tubería saliente de la culata de la vivienda, ya que desemboca sobre los trabajos realizados de obra.	12/02/2024
Se tendra reunión interinstitucional, con el fin de abarcar temas de interés general, debido a la entrega de la obra, esta se efectuará en el auditorio de Transmicable, a las 10:00 am.	13/02/2024
Se efectuará capacitación a empelados de obra N° 10 a las 2:30 pm, con el fin de dar cumplimiento a las actividades contractuales. (esta seríe la última capacitación a realzar)	14/02/2024
Se realizará recorrido urbano y aplicación de 3 encuestas de satisfacción, con el acompañamiento de la interventoría	15/02/2024
Se efectuará comité veedor N°10, a las 2:30 Pm, en el punto PAC	16/02/2024
Se realizará mesa de trabajo con presencia de LIME, veeduría y JAC	17/02/2024

ACTIVIDADES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES	CUESTIONES URGENTES (PQRS)	FECHA
N/A	NO	

COMENTARIOS U COMPROMISOS

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL DE OBRA CONTRATO N° 002 - 2023

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Diana Milena Guerra	**SEMANA DE REGISTRO**	
NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Sandra Rodriguez		2024-01-29

ACTIVIDADES COMPLETADAS	FECHA
Se realiza acompañamiento a sensibilización con policia nacional, integracion social y icbf sobre el reclutamiento infantil.	12/02/2024
Se realiza visita a doña carlina con el fin de solicitar autorización para cortar y sellar tubo de aguas lluvias que afectaba la obra.	12/02/2024
Se efectua envio de volante para invitar a propietarios de los predios adyacentes a la ladera a reunion extraordinaria para su respectiva aprobación.	12/02/2024
Se realiza la entrega de volantes de reunion extraordinaria a los 19 predios adyacentes a la ladera.	13/02/2024
Se realiza mesa de trabajo interinstitucional con Secretaria de Habitat, policia naciaonal, alcaldia local, juntas de accion comunal, la rolita, artistas del sector y comunidad.	13/02/2024
Se efectua capacitación a empleados n°10 donde se trato el tema de sentido de pertenencia	14/02/2024
Se efectua recorrido urbano y se aplican 3 encuestas de satisfaccion a la comunidad con acompañamieno de la interventoria.	15/02/2024
Se realiza el seguimiento a pqrs 4 y 8.	15/02/2024
Se lleva cabo el corte de tubo del predio de la señora Carlina Tique.	15/02/2024
Se fectua reunión de comité veedor n°10 contando con la participacion de 6 integrantes.	16/02/2024
Se realiza recorrido con la entidad LIME, junta de accion comunal y comunidad.	17/02/2024
Se efectua reunion extraordinaria con los propietarios de los predios adyacentes a la obra.	17/02/2024
Se realiza jornada de aseo en donde se invita a la comunidad a participar de manera voluntaria.	17 y 18 de febrero

ACTIVIDADES EN CURSO	FECHA
N/A	N/A

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA		FECHA / HORA
Efectuar oficio para la UAESP, con el fin de que generen código RUPI y oficio para informar fechas tentativas para inauguracion de obra.		19/02/2024
Asistir a reunion con Secretaria de Habitat e IDIGER/ colocar figuras en llantas en la obra.	2pm/9am	20/02/2024
Efectuar reunion con la rolita, biblioteca, jac para concretar actividades a desarrolar en inauguración	10am	21/02/2024
Se realizará recorrido urbano, aplicación de 3 encuestas de satisfacción y actualizacion de puntos satélites con el acompañamiento de la interventoría	9am	22/02/2024
Enviar cronograma de cierre de actas de vecindad	4pm	23/02/2024
Efectuar visita a predio perteneciente a la sra Norbelly Cardenas en la dirección Diagonal 71 a #27-30 sur	9am	24/02/2024

ACTIVIDADES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES
N/A

CUESTIONES URGENTES (PQRS)	FECHA
NO	

COMENTARIOS U COMPROMISOS

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL DE OBRA CONTRATO N° 002 - 2023

NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	Diana Milena Guerra	**SEMANA DE REGISTRO**	
NOMBRE DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Sandra Rodriguez	2024-02-26	

ACTIVIDADES COMPLETADAS	FECHA
El día 24 de febrero de 2024, se realizó cierre de PQRS N°4, presentada por afectación en ventanas del predio perteneciente a la sra Blanca Nelly Melo, realizando el respectivo cambio de las mismas, quedando a satisfacción de las partes.	24/02/2024
El día 22 de febrero, se envió a la interventoría propuesta de volantes de actas de vecindad de cierre de las 3 visitas, los cuales fueron avalados por la interventoría el mismo día, para su posterior divulgación, los días 26 y 27 de febrero de 2024	22/02/2024
El día 23 de ferero de 2024 se realizó el envío del cronograma de ejecución de actas de vecindad de cierre a la interventoría, con el fin de proceder a dar inicio a esta actividad.	23/02/2024
El día 20 de febrero de 2024, se realiza recorrido urbano con el acompañamiento del apoyo social de interventoría, en donde se realiza la actualizacion de los 3 puntos satélites de información donde se retira volante de PMT, así mismo, se aplican las 3 encuestas de satisfacción con la comunidad del sector, identificando que la comunidad se encuentra conforme con la ejecución del proyecto, ya que este beneficiará con el incremento del turismo	20/02/2024
El día 21 de febrero se llevó a cabo reunion extraordinaria por parte del componente social de obra, integrante de la iblioteca Violeta, equipo social de la Rolita Transmicable y el acompañamiento de la interventoría, dónde se adelntó gestión para la realización de inauguración del proyecto, es así que en esta mesa de trabajo, se identificaron propuestas de actividades y presentaciones por parte de la comunidad del sector tales como: (exposiciones de fotografía, serigrafía, Bordados de abuelas del sector, grafitis de laboratorio, productos naturales elaborados por mujeres quibanas y un picnic literario entre otros	21/02/2024
El día 20 de febrero se efectuó el envío de un oficio a la UAESP, con el fin de informar a la entidad sobre la fecha de entrega de la obra y las 11 canecas de basura que se instalaron en la misma, y a su vez solicitar la inscripción y generación del codigo Rupi, permitiendo así, integrar este espacio dentro de la ruta de recolección de basuras	20/02/2024

ACTIVIDADES EN CURSO	FECHA
N/A	**N/A**

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PRÓXIMA SEMANA		FECHA / HORA
Enviar presentación de reunión de finalización de obra, iniciar con divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad	8-5pm	26/02/2024
Divulgación de volantes de cierre de actas de vecindad y actualización de puntos satélite	8-5pm	27/02/2024
Capacitación a empleados de obra, recorrido urbano y aplicación de encuestas	7am-2pm	28/02/2024
cierre de PQRS N° 3 y 8	8-5pm	29/02/2024

ACTIVIDADES QUE HAN QUEDADO PENDIENTES	CUESTIONES URGENTES (PQRS)	FECHA
N/A	NO	

COMENTARIOS U COMPROMISOS

Anexo 2.Q Actas de control y seguimiento actividades sociales.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Punto PAC	Fecha:	09	febrero	2024
Hora Inicio:	3:00 Pm	Hora Final:	5:00 pm.		

Objetivo Acta de seguimiento a actividades sociales de obra

- Realizar seguimiento a las actividades programadas de obra y ejecutadas a la fecha.

Orden del día

- efectuar seguimiento a actividades ejecutadas y programadas en el componente social.

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 09 de febrero de 2024, se realizó verificación de actividades sociales ejecutadas y programadas para el presente periodo, tales como:

- Programación de capacitación a empleados de obra n°10.
- programación de reunión de comité veedor n°10.
- Programación de reunión interinstitucional para coordinar temas de articulación para entrega de la obra.

- Se verifica lo siguiente:

a) se efectuó el dia martes 13 de febrero de 2024, la reunión interinstitucional con presencia de: Secretaria del habitat, Alcaldía local, Instituto Distrital de turismo, Policia nacional, integrantes del comité veedor, Presidentes de juntas aledañas, interventoría y consorcio VAPA. Donde se concretaron mesas de trabajo entre la secretaria de

SC3

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

hábitat y mesa local de grafiteros para acordar actividad de murales y a su vez integración entre el IDT y emprendedores del territorio.
- se verifica que se realizan 2 reuniones extraordinarias con el equipo social de la redita (Transmicable) para tratar temas de entrega de obra.
- el día 07 de febrero de 2024, se realizó recorrido urbano con la Secretaría de hábitat y el consorcio VAPA.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que asistieron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Sandra Janeth Rodríguez y David Castillo Olivera	Profesional Social-interv psicosocial	MATO Ingeniería Consorcio VAPA	Sandra J. Rodríguez y

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

SG4

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Punto de atención a la comunidad	Fecha:	19	febrero	2024
Hora Inicio:	1:30 Pm	Hora Final:	2:45		

Objetivo Acta de seguimiento a actividades - Apoyo a la supervisión.

- Efectuar mesa de trabajo con el apoyo a la supervisión social del IDIGER, y profesional social de obra.

Orden del día

- efectua mesa de trabajo para acordar temas generales para culminación del proyecto.
- Realiza recorrido por obra con el acompañamiento del apoyo a la supervisión social de la entidad

Desarrollo de la Reunión:

- El dia 19 de febrero de 2024. Se realizó mesa de trabajo conjunta, entre el apoyo a la supervisión social del IDIGER y la profesional social de obra. donde se expusieron los siguientes temas:

a) Revisar la viabilidad de apoyar la conformación de un comité de seguridad, conformado por integrantes de la comunidad, que tengan comunicación directa con la estación de la policía y el cuadrante de seguridad de la Alcaldía local, con el fin de apoyar a la comunidad, ya que se ha evidenciado dentro la ejecución de la obra, diferentes incidentes de hurto de material en la misma. esto como una medida de sostenibilidad de la obra, adicionalmente se revisará con el representante legal y/o director de obra. la posibilidad de entregar 2 cámaras de seguridad a la JAC del barrio El Mirador, que puedan ser operadas por el mismo comité de seguridad. esta

gestión se realizara dentro del programa de cultura ciudadana.

b.) Se solicita, efectuar charla sobre Igualdad de Género en el ámbito laboral. Con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de capacitación a empleados de obra.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Acuña Lucy Sepulveda A.	Profesional social Profesional social	Consorcio VMA IDIGER	

Powered by CamScanner

566

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Punto de atención a la comunidad	Fecha:	16	febrero	2024
Hora Inicio:	11:00Am.	Hora Final:	12:00Pm.		

Objetivo Acta de seguimiento a actividades sociales con apoyo a la supervisión.

- Efectuar reunión con el componente social, liderado por el apoyo a la supervisión social del IDIGER, Interventoría y el equipo social del contratista.

Orden del día

- plasmar alternativas para la inauguración de la obra.
- realizar acuerdos para ejecutar antes del evento.
- efectuar compromisos

Desarrollo de la Reunión:

- el día 16 de febrero de 2024 se efectua reunión con el equipo social de la entidad, la interventoría y el contratista con el fin de plasmar temas generales para la inauguración de la obra.

a) Desde el apoyo a la supervisión social de la entidad se indaga sobre propuestas de actividades a efectuar en la inauguración de la obra.

b) La profesional social de obra expone lo siguiente:

- se ha gesticnado con emprendimientos locales, la participación de la Fundación , quienes trabajan con fotografías de los inicios y Fundación del sector, plasmado un museo local, quien propone realiza una pequeña exposición, mostrando el talento local, y así incentivar la participación y activación de recorridos turísticos, articulados a la entrega de la obra "corredor turístico".

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

- Se expresa que se ha avanzado con propuestas realizadas por la rolita (Transmicable) referente a realiza enlaces con BiBlored, para expaner a los niños un relato y/o taller de titeres, de igual forma en articulación con la JAC del barrio se está coordinando la participación de Grupo de baile de personas de la tercera edad.
- El apoyo a la supervisión social de la entidad, soliata que se adelanten mesas de trabajo y/o reuniones articuladas con otras entidades, con el fin de ir clasificando un orden del dia y que actividades se presentarían en el evento.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Diligenciar firma de los participantes hasta quince (15) de la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

- finalmente se plantean los siguientes compromisos:

- Concretar actividades para Presentar en la inauguración de la obra a cargo del contratista de obra.
- Efectuar acompañamiento por parte de la interventoría. en estas actividades.
- Dolger genera compromiso para articulación con IDEARTES, para el desarrollo de actividades culturales para la entrega de la obra a la comunidad.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Castillo Guevara	Profesional social	Consorcio UMPA	Diana Castillo G.
Sandra Janeth Rodríguez	Profesional-Social-interv	MAPO-Ingeniería	Sandra J. Rodríguez
Lucy Sepúlveda A.	Profesional Social	IDIGER	

Anexo 2.R Actas y registros de asistencia a capacitación a empleados No. 10 y 11.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	Frente de Obra		Fecha:	14	02	2024
Hora Inicio:	2:00 pm	Hora Final:	2:40 pm			

Objetivo Acta de Capacitación a empleados Nº 10

-Efectuar capacitación a empleados de obra Nº 10 con el tema de exposición "Sentido de Pertenencia".

Orden del día

- Realizar registro de asistencia de empleados de obra
- Iniciar actividad rompe hielo, luego exposicion de tema
- Culminar con actividad de aprendizaje
- Realizar acta de la actividad y registro fotografico.

Desarrollo de la Reunión:

-El día 14 de febrero del 2024 se realiza capacitación de empleados nº 10 contando con una partiapación de 15 personas, con el tema a tratar Sentido de pertenencia. Se llevan a cabo las siguientes actividades en la capacitación:

a) Se realiza registro de asistencia de los trabajadores que participan en la actividad.

b) Luego se inicia la actividad rompe hielo propuesta que consistia en obedecer ciertas ordenes como tocarse la cabeza, dar vueltas y coger un caramelo actividad de esparcimiento y velocidad.

c) En seguida se expone el tema "Sentido de pertenencia", explicando que el sentido de peritenencia impacta positivamente no solo el trabajo en equipo y el clima laboral sino que tambien contribuye a la motivación, desempeño y compromiso

dentro de un ambiente laboral.
d) Se finaliza la capacitación con una segunda actividad en donde se forman 2 grupos para participar en el juego de Jenga buscando identificar que se aprendio en la exposición del tema, ya que se buscaba generar el trabajo en equipo y la apropiación de nuestro proyecto.

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Diana Milena Castillo	Profesional social	Contrato IMRD	

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. [ ] REUNIÓN 1.2. [ ] TALLER 1.3. [x] OTRO 1.3.1. capacitación a empleados de obra

2. TEMA DE LA SESIÓN: sentido de pertenencia

3. ÁREA RESPONSABLE

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Zona de obra

5. FECHA: 14/02/24 6. HORARIO 6.1. INICIO: 2:30pm 6.2. FIN: 3:00pm HOJA 1 DE 2

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.6. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
1	Rafael Garcia	19	Mirador	x				40												3134858928		Rafael
2	Jesus Garcia	19	Verbenal	x				47												3144488259		Jesus M
3	Ricardo Basabe	19	Paraiso	x				32												3132606349		Ricardo
4	Jaidar mesino	19	Vista cam	x				28												3001108138		Jaidar
5	Arturo Hernandez	19	Valparaiso	x				57												3105027839		Arturo
6	Jonathan Garzon	19	paraiso	x				22												3228780208		Jonathan
7	Hector fabiola	19	paraiso	x				45												79848940		
8	Angel Hernandez	19	Paraiso	x				41												3143419571		
9	Mecardo Fernandez	19	Potosi	x				30												30267 5818		
10	Benjamin Gonzalez		Kenedy	x				53												3156234121		

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

573

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. [ ] REUNIÓN 1.2 [ ] TALLER 1.3. [x] OTRO 1.3.1. capacitación a empleados de obra

2. TEMA DE LA SESIÓN: Sentido de pertenencia

3. ÁREA RESPONSABLE:

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Nojo

5. FECHA: 14 02 24

6. HORARIO 6.1. INICIO: 2:30pm 6.2. FIN: 3:00pm

HOJA 2 DE 2

7.1. Nº	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso									7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Víctima del conflicto	Migrante Internacional	Ninguna de las anteriores				
11	Alfonso Montero	Suba	Santa Rita	X				32												3118029686		ALFONSO MO
12	Adalberto Salcedo	19	Paraiso	X				51												3219577479		A2
13	Carlos Acevedo	19	Paraiso	X				32												3003154791		Carlos
14	Nelson David Tique	19	Paraiso	X				25												3104248449		Nelson David Tiq
15	Fulton Gor	19	Paraiso	X				38												313 93 699		Fulton

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	ACTA DE REUNIÓN	Código: DE-FT-21
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Vigente desde: 27/09/2021

Lugar:	frente de obra		Fecha:	28	Febrero	2024
Hora Inicio:	7:00Am	Hora Final:	7:20Am			

Objetivo Capacitación a empleados de obra N° 11

-efectuar capacitación a empleados de obra N° 11, con el tema Igualdad de género en el ámbito laboral.

Orden del día

- efectuar capacitación N°11 (Igualdad de género en el ámbito laboral)
- Tomar registro Fotográfico
- Realizar registro de asistencia.

Desarrollo de la Reunión:

-el dia 28 de febrero de 2024, se realizó capacitación a empleados de obra N°11 con la temática (Igualdad de género en el ámbito laboral), la cual tuvo una participación de 20 personas, y se especificó lo siguiente:

a). Se explicó que el fin de tratar esta temática yace en entender la igualdad de género, como igualdad de trato y acceso a empleados y empleadas, mismas oportunidades, incluyendo la participación económica y empresarial, así como la toma de decisiones, también implica valorar por igual los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades con independencia del género.

b) se procedió a realizar preguntas referentes a la exposición, generando un espacio de participación, de esta manera se concluyó la charla.

c) Se tomó registro fotográfico y de asistencia de la capacitación.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
1 Laura Castillo Cerra	Profesional Social	Consorcio UMA	1 Laura Castillo C.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN: 1.1. ☐ REUNIÓN 1.2. ☐ TALLER 1.3. ☑ OTRO 1.3.1. Capacitación a empleados N°11

2. TEMA DE LA SESIÓN: Igualdad de Género en el ámbito laboral

3. ÁREA RESPONSABLE: componente social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Frente de obra.

5. FECHA: 28 02 24 6. HORARIO 6.1. INICIO: 7:00Am 6.2. FIN: 7:30Am HOJA 1 DE

7.1. N°	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso										7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indigena	Rrom	Persona con discapacidad	Victima del conflicto	Migrante Internacional	Ninguna de las anteriores				
1	Hector Lasso	19	Paraiso	X				/										X	— / —	3137581973	— / —	
2	Arturo Nampaque	19	Mirador	X				/										X	— / —	3204721671	— / —	
3	Guillermo Cifuentes	19	Alpes.	X				/										X	— / —	3143354146	— / —	
4	Alfonso Garzon	19	Mirador	X				/										X	— / —	3004721176	— / —	
5	Jonathan Garzon	19	Mirador	X				/										X	— / —	3203211416	— / —	
6	Wilberto Acevedo	19	Paraiso	X				/										X	— / —	3114721652	— / —	
7	Medardo Fernandez	19	Candelaria	X				/										X	— / —	3017523817	— / —	
8	Fredy Cuellar	Kenedy	Patio Bonito	X				/										X	— / —	3213724194	— / —	
9	Alfonso Montero	Usme	Alfonso Lopez	X				/										X	— / —	— / —	— / —	
10	Carlos A. Lopez	Kennedy	Alsacia	X				/										X	— / —	3103075106	— / —	

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

	REGISTRO DE ASISTENCIA PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO (PERSONA NATURAL)	Código: DE-FT-52 Versión: 3 Página: 1 de 2 Vigente desde: 17/03/2022

1. TIPO DE SESIÓN
1.1. ☐ REUNIÓN 1.2. ☑ TALLER 1.3. ☐ OTRO 1.3.1. Capacitación a empleado N°11

2. TEMA DE LA SESIÓN: Capacitación a empleados sobre Igualdad de Género

3. ÁREA RESPONSABLE: Componente Social

4. LUGAR DE REALIZACIÓN: Frente de Obra

5. FECHA: 28 02 24

6. HORARIO 6.1. INICIO: 7:00am 6.2. FIN: 730am

HOJA 1 DE 2

7.1. N°	7.2. NOMBRE Y APELLIDOS	7.3. LOCALIDAD EN DONDE UD VIVE	7.4. BARRIO EN DONDE UD VIVE	7.6. SEXO				7.5. EDAD (Años)	7.7. POBLACIÓN(ES) O SECTOR EN EL QUE SE IDENTIFICA. Marque más de una opción, si es el caso									7.7.1. ¿CUÁL? Especifique tipo de población o sector	7.8. TELÉFONO / CELULAR	7.9. CORREO ELECTRÓNICO	7.10. FIRMA
				Hombre	Mujer	Intersexual	No definido		Negro	Afrodescendiente	Palenqueros	Raizal	Indígena	Rrom	Persona con discapacidad	Victima del conflicto	Migrante internacional	Ninguna de las anteriores				
11	Pedro Fernandez	Usme	la aurora	X				/										X	— / —	3212363126	— / —	
12	Andres Correa	19	Paraiso.	X				/										X	— / —	3114721129	— / —	Andres C.
13	Carolina Jimenez	Usme.	la aurora.		X			/										X	— / —	3000725141	— / —	
14	Fabian Olaya	Kenedy.	Bosa.	X				/										X	— / —	4702346	— / —	Fabian O.
15	Arnold Gutierez	Suba		X				/										X	— / —	3114722312	— / —	
16	Jaider Mesino	Suba.		X				/										X	— / —	3135767176	— / —	Jaider.
17	Hilberto Cortes.	Tunjuelito.	Tunal.	X				/										X	— / —	3203721154	— / —	Hilberto C.
18	Diana Capera	19	Alpes.		X			/										X	— / —	3113241554	— / —	
19	Carlos Acevedo	Usme.	la aurora	X				/										X	— / —	3004722113	— / —	Carlos Ace.
20	Andrey Contreras	Usme	la aurora.	X				/										X	— / —	3135721472	— / —	Andrey Contrera

Al diligenciar este formulario autoriza la recolección, almacenamiento, uso y circulación de sus datos personales de acuerdo a nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales (https://www.idiger.gov.co/politica-de-tratamiento-de-datos-personales), en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y las demás normas reglamentarias.

Anexo 2.S Certificados de residencia.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930695561
Fecha: 06/12/2023 2:45:49 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ANDRES FELIPE CORREA PANQUEVA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1016065812, tiene su domicilio en CL71GSUR#27A-31, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 06 del mes Diciembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE (e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/6/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930490981
Fecha: 18/08/20232 2:03:03 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) REYNEL ALFONSO GARZON MOGOLLON, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80174903, tiene su domicilio en CL71FBisSUR#27A-20, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 14 del mes Agosto del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE (e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 8/14/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930490981
Fecha: 18/08/20231 2:03:03 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) YEISON DAVID TIQUE ANDRADE, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1026595057, tiene su domicilio en CL71HSUR#27-68, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 18 del mes Agosto del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE (e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 8/18/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930697191
Fecha: 07/12/2023 8:38:45 a. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JONATHAN STIVEN GARZON VILLAMARIN, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1007699471, tiene su domicilio en CL71DBisSUR#27A-21, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 07 del mes Diciembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE(e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/7/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930536531
Fecha: 07/09/20232 2:15:20 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) HUBERTO ENRIQUE CORTES SIMERMAN, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1007573922, tiene su domicilio en CL71FBisSUR#27A-20, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 11 del mes Septiembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA (e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 9/11/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930536531
Fecha: 07/09/20231 2:15:20 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) BENJAMIN RAFAEL RAMOS GOMEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 85203986, tiene su domicilio en CL71FBisSUR#27A-20, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 07 del mes Septiembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE (e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 9/7/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930572841
Fecha: 26/09/2023 1:44:14 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) DIANA YONAHIRA CAPERA PRADA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1106395300, tiene su domicilio en CL71KSUR#27Q-26, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 26 del mes Septiembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE(e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 9/26/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20236930708361
Fecha: 13/12/2023 4:23:57 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) WILBERTO ACEVEDO CAMPO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 9086185, tiene su domicilio en KR27L#71FSUR-41, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 13 del mes Diciembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE(e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 12/13/2023

Radicado No. 20236930670061
Fecha: 22/11/2023 7:49:30 a. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ANDRES FELIPE CEBALLOS, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1033795546, tiene su domicilio en CL71KSUR#27Q-26, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 22 del mes Noviembre del año 2023, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

TATIANA PIÑEROS LAVERDE(e)
ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 11/29/2023

Anexo 2.T. Consolidado personal MONC

	MATRIZ MONC Y POBLACIÓN VULNERABLE	
	CONTRATO 002- 2023	Versión 1 02/09/2022
	OBJETO	
	"CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL TRAMO 1 DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA LADERA 1 DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR REMOCIÓN EN MASA EN EL PASEO ILLIMANI, UBICADO EN EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 "LUCERO"	
	INTERVENTORÍA: 240-2022	

HOJAS DE VIDA DE PERSONAL RECIBIDAS MES UNO (1)													
DATOS GENERALES					CONTRATADO		CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		MONC		Observaciones	CARGO QUE DESEMPEÑA	
	NOMBRE (S)	APELLIDOS	LUGAR DE RESIDENCIA (BARRIO O LOCALIDAD)	Fecha de recepción Hoja de Vida	SI	NO	SI	NO	SI	NO			
1	ANDRES	CORREA	MIRADOR	16-nov-23	X			X	X		Reportado en informe mensual de obra N°10,11,12,13	AYUDANTE	
2	REYNEL ALFONSO	GARZÓN	PARAISO	22-may-23	x			X	X		Reportado ingreso en el informe mensual N°4-5-6-7-8-9,10,11,12,13	OFICIAL	
3	YEISON DAVID	TIQUE	MIRADOR	22-may-23	x			X	X		Reportado ingreso en el informe mensual N°4-5-6-7-8-9,10,11,12,13	AYUDANTE	
4	JHONATAN	GARZÓN	MIRADOR	16-nov-23	X			X	X		Reportado en informe mensual de obra N°10,11,12,13	AYUDANTE	
5	HUMBERTO ENRIQUE	CORTES SIMERMAN	MIRADOR	###	x			X	X		Reportado en informe mensual de obra N°10,11,12,13	AYUDANTE	
6	BENJAMIN RAFAEL	RAMOS GOMEZ	MIRADOR	25-jul-23	x			X	X		Reportado en el informe mensual de obra N°7-8-9,10,11,12,13	AYUDANTE	
7	DIANA	CAPERA PRADA	MIRADOR	22-jul-23	x			X	X		Reportado en el informe mensual de obra N°7-8-9,10,11,12,13	AUXILIAR SST	
8	WILBERTO	ACEVEDO	MIRADOR	22-jul-23	x			X	X		Reportado en el informe mensual de obra N°7-8-9,10,11,12,13	AUXILIAR SST	
9	ANDRES	CEBALLOS	MIRADOR	25-jul-23	x			X	X		Reportado en el informe mensual de obra N°7-8-9,10,11,12,13	AYUDANTE	
ELABORÓ		DIANA CASTILLO GUERRA PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA											
REVISÓ Y APROBÓ		SANDRA RODRIGUEZ											

Anexo 2.U Acta de compromiso por sellamiento de tubería

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

Lugar:	Calle 72C Sur #27-21	**Fecha:**	12	febrero	2024
Hora Inicio:	2:54pm	**Hora Final:**	3:30 pm		

Objetivo Acta de compromiso para TAPE de tubería.

- Efectuar visita al predio ubicado en la dirección Calle 72C Sur #27-21, en donde se presenta aguas salientes por tubería en 2 puntos de cara a la fachada.

Orden del día

- Se realiza visita al predio ubicado en la dirección calle 72C Sur #27-21, perteneciente a la señora Carlina Triqué, con el fin de informar a la propietaria sobre la necesidad de realizar el retiro respectivo de un tubo donde provienen aguas residuales que recaen sobre la fachada.

Desarrollo de la Reunión:

- El día de febrero de 2024, se realiza visita al predio perteneciente a la señora Carlina Triqué. propietaria del predio ubicado en la dirección calle 72C Sur #27-21, esto con el fin de exponerle a la señora que las aguas lluvias salientes por la tubería afectan el trabajo realizado en obra.

- Es así que la señora autoriza que el contratista de obra retire el ducto saliente, de conformidad de las partes.


- El trabajo se efectuará el día 13 de febrero de 2024 en horas de la mañana.

- Firman de conformidad las partes.

- La señora Carlina autoriza se firme por ella, ya que no sabe escribir.

Powered by CamScanner

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** DE-FT-21 **Versión:** 02 **Página:** 1 de 2 **Vigente desde:** 27/09/2021

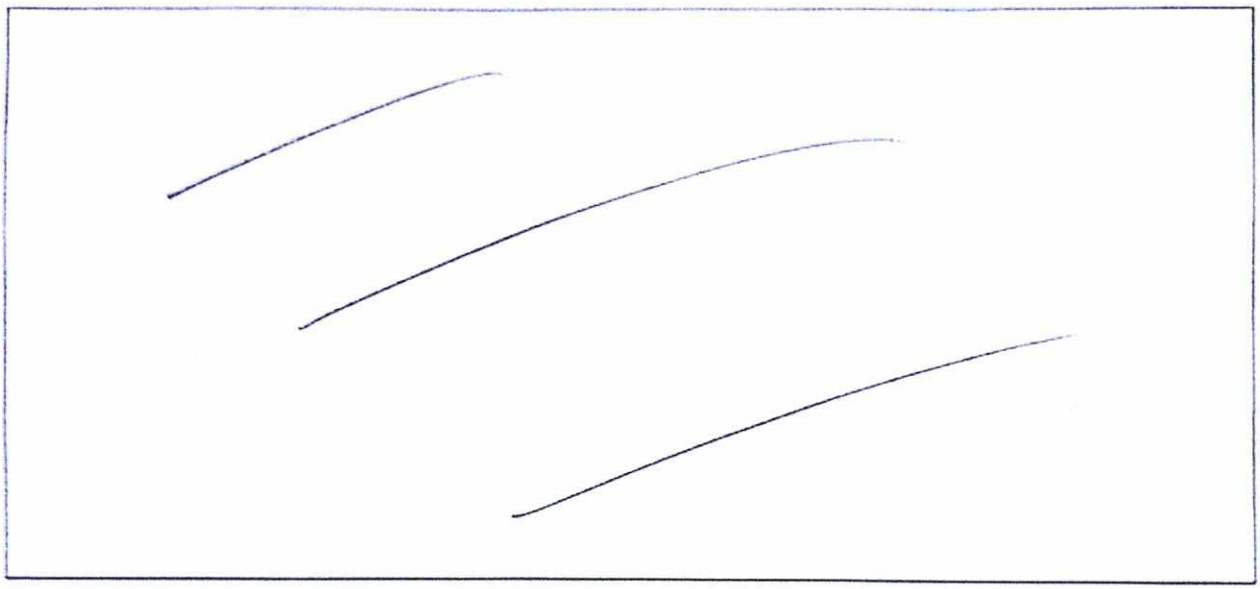

Compromisos adquiridos

Actividad	Responsable	Fecha de cumplimiento

Participantes (Requiere firma de las personas que participaron en la reunión)

Nombre	Cargo/Rol/Contratista	Dependencia/Entidad	Firma
Carlina Tique	Propietaria	Ulu Lenda	Carlina T.
Edwin Zambrano Rojas	Residente de Obra	Consorcio Vega Conservación MMA	Edwin Zambrano R.
Diana Castillo	Residente social		Diana Castillo

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio climático.

Powered by CamScanner

Anexo 2.V Encuestas de satisfacción a la comunidad y consolidado.

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 6 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Manuel Simon Diaz.
DIRECCIÓN: Calle 71 H # 27-54.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?


   X SI / NO / PORQUE
   ellos siempre estan prestos a colaborar.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   X SI / NO / PORQUE
   he visto mucho trabajadar de esta zona

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   X SI / NO / PORQUE
   cultura y estetica y belleza al sector y valorizacion



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

~~SI~~ NO / PORQUE

colocan las señales de información y los empleados.

Cordialmente,

FIRMA:_____

FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 6 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Cecilia Diaz
DIRECCIÓN: Calle 71 G sur # 27-84

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   ~~SI~~/ NO / PORQUE
   cuando hay reuniones explican las cosas a la comunidad.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   ~~SI~~/ NO / PORQUE
   porque hay gente del barrio. y deberian dar mas empleo.

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   ~~SI~~/ NO / PORQUE
   es una zona turistica y se aprovechaba mucho al conocimiento de nuevas partes de Bogotá y comercidmo

597

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

X SI / NO / PORQUE

porque no sería obra sino contara con estas cosas.


Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

308



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 6 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Doris Quimbayo.
DIRECCIÓN: Calle 71 G sur # 27-29.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   SI/ NO / PORQUE Regular.
   porque a veces no complen las fechas en que se van a realizar dichas actividades.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?


   ~~SI~~/ NO / PORQUE
   he visto que a muchos desempleados que habian se encuentran trabajando alli

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   ~~SI~~/ NO / PORQUE beneficia a los predios con mejor nivel atraves de la obra ha tenido calidad de vida a la comunidad, se acaba los consumidores o mitigación.

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

599



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

~~SI~~ NO / PORQUE
los obreros tienen sus elementos de protección
tiempo de capacitación a los empleados.
tiempos de recesos, y enseñan a los empleados.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

600

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Germán Beltrán
DIRECCIÓN: Calle 71 h sur #77-24

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   SI/ NO / PORQUE

   no he tenido problemas con nadie.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   SI/ NO / PORQUE

   Porque hay trabajo para la comunidad.

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   SI/ NO / PORQUE

   porque traerá beneficios a la comunidad.

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

601

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

SI/ NO / PORQUE

Se ha visto señalización y personal de obra.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Yolanda Venegas.
DIRECCIÓN: Calle 72 h #27A-22 Sur.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   SI/ NO / PORQUE

   Prestan buen servicio.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   SI/ NO / PORQUE

   Porque están trabajando la misma comunidad del barrio.

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   SI/ NO / PORQUE

   Vienen más turistas

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

SI/ NO / PORQUE

he visto el paletro.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Rosa Helena Prieto
DIRECCIÓN: Cra 27 B # 71 G 50

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   SI/ NO / PORQUE
   No he escuchado comentarios respecto a la obra

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   ~~SI~~/ NO / PORQUE
   porque he escuchado que mucha gente tiene empleo en la obra.

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   ~~SI~~/ NO / PORQUE
   porque se ve empleabilidad

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

SI/ NO / PORQUE
si deberan tener porque es una obra


Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com

606



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Jesus Rodriguez
DIRECCIÓN: Cra 27 D # 71 D 28.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?


   SI/ NO / PORQUE
   no he presentado ninguna inquietud.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   SI/ NO / PORQUE
   hay varios vecinos que trabajan allí

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   SI/ NO / PORQUE
   porque todas las obras dan desarrollo al sector y valor



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

SI/ NO / PORQUE
hay señalización y medidas de seguridad en trabajadores.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Jose Mauricio Velandia
DIRECCIÓN: Calle 71 B #27-25

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?


   X SI/ NO / PORQUE
   porque siempre nos ponen cuidado

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   X SI/ NO / PORQUE
   trabaja mucha gente

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   X SI/ NO / PORQUE
   va a ver turismo y se valorizara el sector



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

   ~~X~~ NO / PORQUE
   se ve polisombra y la gente la daña.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Andrea Ochoa
DIRECCIÓN: Calle 71 h sur # 27 b 32

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   X SI / NO / PORQUE
   han puesto cuidado y han tenido en cuenta a la comunidad

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   X SI / NO / PORQUE
   nos ha dado paso frente al turismo generando economia solidaria

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   X SI / NO / PORQUE
   por que se patrocinan nuestro procesos, pero igualmente buscar estrategias para generar economía en todo el sector.



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

SI/ ~~NO~~ / PORQUE
no las veo y si cuenta no me he fijado.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Gabriel Rodriguez
DIRECCIÓN: Calle 71 G Sur #27-32

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?


   SI/ NO / PORQUE
   Porque han sido cordiales.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   SI/ NO / PORQUE
   Porque esta obra es muy importante para la comunidad.

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   SI/ NO / PORQUE
   Si todo traerá desarrollo y beneficios.



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

   SI/ NO / PORQUE


   he visto.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com



CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2024

Señores:

Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático- IDIGER
Atn. Lucy Sepúlveda Araujo
Apoyo a la supervisión para la Reducción del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

REFERENCIA.: CONTRATO FONDIGER-002-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS ENTRE LASECRETARÍA DEL HÁBITAT, LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, EL INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – IDIGER Y EL FONDO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO – FONDIGER PARA EJECUTAR ACCIONES DE ANÁLISIS DE RIESGOS, REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DEL POLÍGONO DE RIESGO DEFINIDO EN EL CONCEPTO TÉCNICO 8405 Y SUS ADENDAS PARA EL SECTOR DE MIRADOR EL PARAÍSO A, MIRADOR DEL PARAÍSO B Y EL MIRADOR 3, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, UPZ 67 LUCERO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL TRAMO 1 Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"

NOMBRE: Wilmer Peilla.
DIRECCIÓN: Cra 7B # 79 C - 19.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

1. Considera usted que durante la ejecución de la obra, se le ha brindado a la comunidad una atención oportuna, clara y cordial, referente a las inquietudes, quejas, reclamos, peticiones y/o sugerencias que se han presentado?

   SI/ NO / PORQUE
   Desconocemos, sabemos que se está haciendo la obra, pero no.

2. Considera usted que el proyecto Mirador Illimani de la localidad de Ciudad Bolívar, ha incrementado la generación de empleo en la localidad?

   SI/ NO / PORQUE
   hay gente del barrio trabajando ahí.

3. ¿Cree usted que la obra le trajo o traerá beneficios a la comunidad del sector y al desarrollo de la ciudad?

   SI/ NO / PORQUE
   incrementará el turismo.

CONSORCIO VAPA
NIT. 901.669.477-1

4. ¿La obra cuenta con señalización y medidas de seguridad?

SI/ NO / PORQUE

lo he visto.

Cordialmente,

FIRMA:_____
FREDY SUAREZ LUNA
Director de obra

Proyectó: *Diana Castillo Guerra*
Revisó: *Fredy Suarez*

CALLE 105 A N° 14 - 92 OFICINA- 615 Bogotá CEL: 321 3757097
email: consorciovapa2023@gmail.com
