CONSORCIO OBRASO	**ACTA**	**CÓDIGO DE-FOR-01**
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 3/11/2023
HORA:10.30 AM
ACTA NRO:1

REUNIÓN CONVOCADA POR	"SCJ -SECRETARIA DE SEGURIDAD"
TIPO DE REUNIÓN	RECORRIDO DE OBRA "DIAGNOSTICO"
CONTRATO N°	No.CSJ-1805-2023
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de CDSCJ
ORGANIZADOR	
APUNTADOR	ING Jhonatan Chacón Cadena
ASISTENTES	ING Jhonatan Chacón Cadena-ARQ María Piedad Espinosa-ARQ Hugo Correal- Sargento Viceprimero Héctor Zabala

TEMAS DE DISCUSIÓN
Recorrido de Diagnóstico-frente Sala de Operaciones Cantón Norte

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN
Zona de intervención -Sala de Operaciones Cantón Norte

Se realiza recorrido inicial, identificando las siguientes novedades

1-FACHADA PRINCIPAL BRIGADA COMANDO: Actividades a ejecutar: Retiro de capas deterioradas de pintura, aplicación de pintura exterior, verificación de humedades, cambios de luminarias, demarcación vial, sondeo de bajantes y limpieza de canales .









2.PASILLO CENTRAL: Limpieza de marquesina, arreglo de perfilería metálica, sondeo de bajantes, aplicación de pintura exterior y cambio de luminarias









3.SALA BLANCA: Instalación de puerta en vidrio templado incluye sanblasting




4.ENTRADA SEGURIDAD MILITAR: Instalación de cubierta tipo domo incluye perfilería metálica y aplicación de pintura en fachada





5.B-10 INGENIEROS MILITARES: Verificación de goteras, cambio luminarias, verificación de ventana tipo persiana, instalación de puntos eléctricos, resanes generales y aplicación de pintura interior



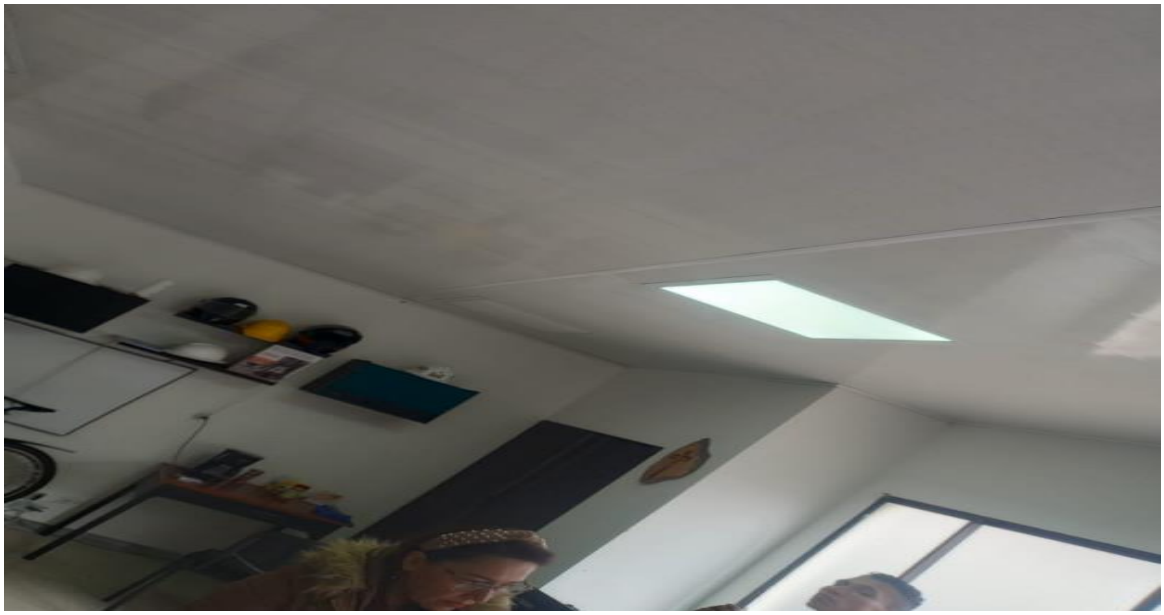

6.EL FUERTE: Cambio de luminarias, sondeo de puntos sanitarios, cambio de acrílico de puertas existentes, cambio de chapas puertas baños, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte a perfilería de divisiones baños





7.DIVISION GENERAL -SALA JUNTAS: Verificación de bajantes, limpieza de canal, resanes generales y aplicación de pintura interior





8.OFICINA JEFE DE ESTADO MAYOR: Cambio de luminarias, cambio de mueble en madera baño, resanes generales y aplicación de pintura interior




9.SEGURIDAD MILITAR: Resanes generales, aplicación de pintura interior, cambio de canaleta, instalación de canaleta nueva, cambio de chapa, arreglo tomas eléctricas, verificación de Ventanearía existente y humedades







NFORMATIVA

10.OFICINA GENERAL SARGENTO MAYOR, OFICINA SAC, OFICINA V2, OFICINA V3, OFICINA JURIDICA, OFICINA COMUNICACIÓN E INFORMACION, OFICINA B7, B9, B1, B4: Resanes generales, aplicación de pintura interior, cambio luminarias y verificación de la red eléctrica

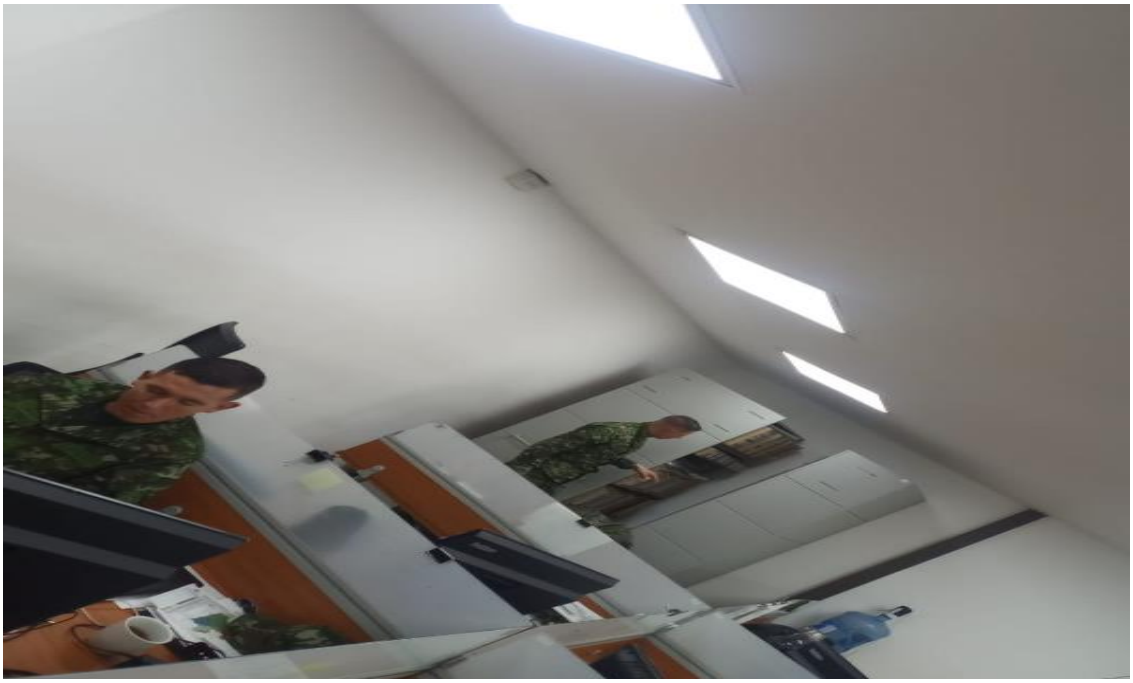



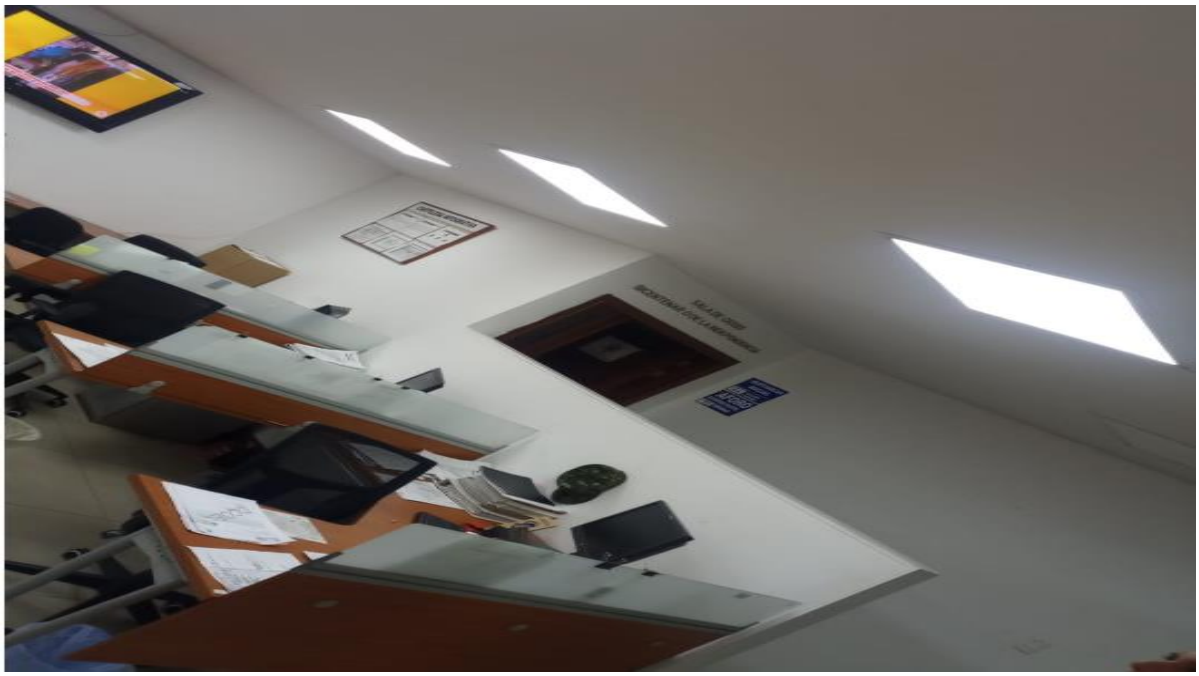











FELIZ CUMPLEAÑOS

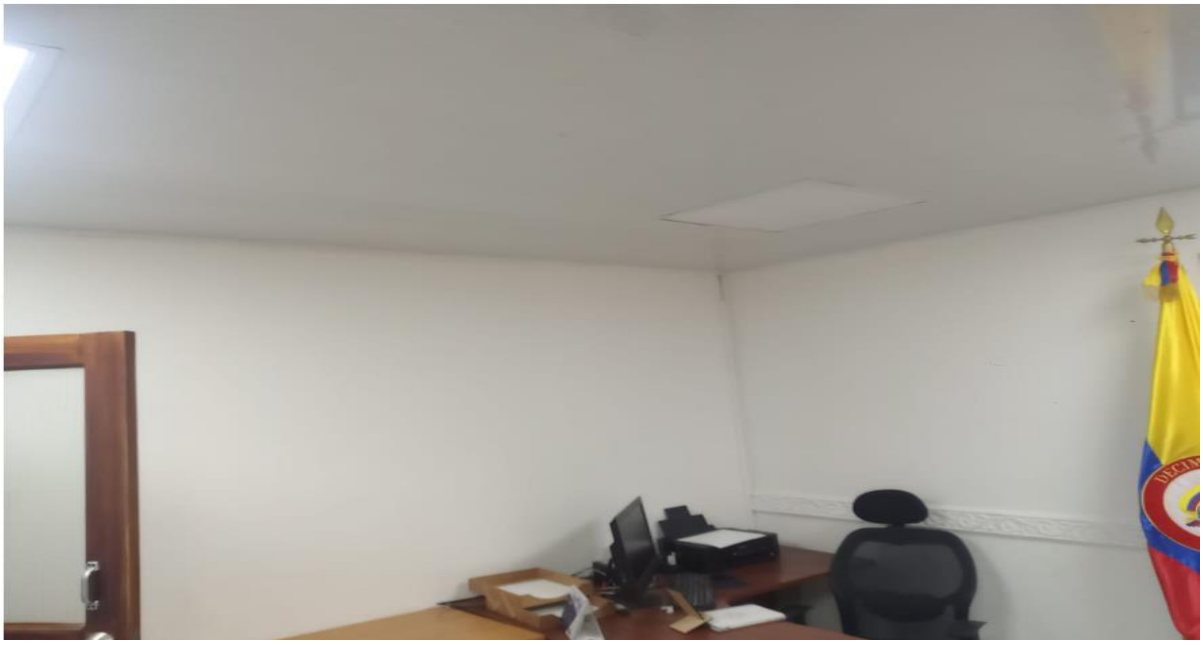













11.BASER 13: Revisión hidráulica, revisión cuarto de bombas

CONCLUSIONES

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
JHONATAN CHACON	CONTRATISTA	
MARIA PIEDAD ESPINOSA	INTERVENTORIA	
HUGO CORREAL	ASESOR DE INFRAESTRUCTURA	
Sargento Viceprimero HECTOR ZABALA	FINCA RAIZ BR13	
