CONSORCIO
OBRAS W

1185-WR-2023

Bogotá, 26 de diciembre de 2023

0053-1805SCJ

Señor
FERNANDO JIMENEZ POLO
Director de interventoría
TOTALL INC SAS BIC

Ref.: CONTRATO DE OBRA No.SCJ-1805-2023“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

Asunto: Condiciones Eléctricas Estación San Cristóbal


Se realiza revisión de cableado el cual se pone en evidencia que por cortos en la red
Quitaron los retornos en ciertas zonas y los cambiaron, cambiando la línea por la tierra aislada.
Se requiere hacer cambio de cableado arreglo de empalmes y revisión de tablero el cual consiste en mantenimiento preventivo y cambio de breakers según su estado
El cambio de cableado no se realizará por completo ya q vamos a cambiar lo que está en corto no más
El cambio de iluminación se sugiere hacerlo todo ya q se debe tener en cuenta futuros trabajos por garantía de cambio de lámparas viejas
Todos los empalmes se encuentran con cinta y se requiere revisar y cambiar por derivadores para dejar cumpliendo norma, se requiere hacer salida de 2 tomas corriente y dos interruptores para cambiar cableado quemado y dar una mejor distribución de las zonas.

Se muestra registro fotográfico de las condiciones eléctricas:






CONSORCIO
OBRAS W

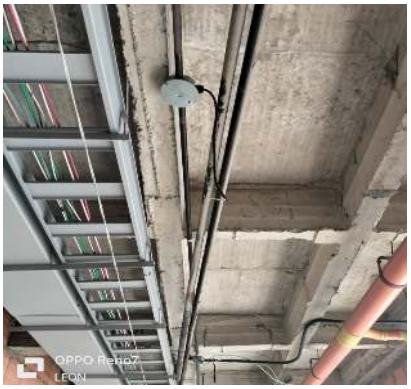



Cordialmente,

CONSORCIO OBRAS W
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá
