Alcaldía Municipal de Floridablanca	**INFORME DE VISITA TECNICA DE CAMPO**
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INFORME DE VISITA TECNICA INSTITUTO COMUNITARIO MINCA SEDE C


1. Participantes.

	AREA
ING YEIMY LIZETH ORTIZ BELTRAN	Contratista secretaria de Educación

2. Localización.

La visita se desarrolló en el instituto minca sede C, ubicado en la Diag 45 No 114 A -35 Zapamanga IV Etapa en la figura 1, se señala el lugar en el cual se realizo la vista desde una vista en planta en un medio digital.

Figura 1. *Ubicación geográfica del Instituto Minca sede C.*

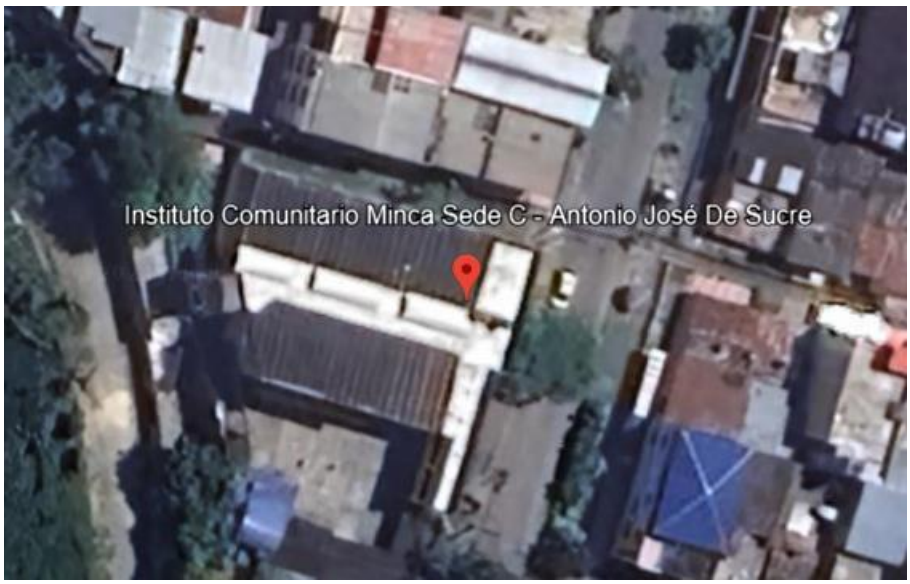

Fuente: Tomado de Google earth.

3. Desarrollo de la visita técnica de campo.

Se realizo el desplazamiento al sitio para atender la solicitud y revisión de infraestructura, bienes y servicios, calidad educativa, conectividad, para atender las afectaciones que se

presentan en el instituto Comunitario Minca sede C, En donde se realizaron las siguientes actividades:

3.1. Estructura de muros y escaleras con grietas: Se observa que el muro y las escaleras tiene una separación y tiene varias grietas, como se observa en la figura 1.

Figura 1. Insertar desagüe de aguas lluvias



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.2. Solicitar permiso para talar el árbol en la institución educativa: Se observa que el árbol es un riesgo para la institución educativa, ya que está en mal estado y se pueda caer afectando el muro de cerramiento y la vecindad, como se observa en la figura 2.

Figura 2. Talar Árbol de la institución educativa



Fuente: Registro fotografico tomado en campo.

3.3. Concertina de cerramiento: Toma de medidas en campo para la instalación de concertina en toda el área de cerramiento de la institución educativa con un área de 250 m2, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Concertina de cerramiento:



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.4. Sillas en mal estado: Se evidencia que las sillas se encuentran en mal estado, como se muestra en la figura

Figura 4. Sillas en mal estado:



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.5. Cambio de cubierta y cielo raso, Se observa la necesidad de cambiar la cubierta y el cielo raso en el salón de inglés en la institución educativas, de un área 96 m2 como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Cambio de cubierta



Fuente: Registro fotografico tomado en campo..

3.6. Solicitar Fumigación contra zancudos a ETV de salud pública: Se observa la necesidad de solicitar la fumigación contra zancudos en ETV de salud pública, ya que se hace evidencia de muchos mosquitos y insectos

3.7. Desalojo de vivientes. Se observa la necesidad de hacer la solicitud para el desalojo de vivientes que están dentro del área de la institución educativa
