Avanxa
Soluciones Integrales S.A.S
Nit: 901330763-5

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)



MEJORAMIENTO PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1

TESALIA, HUILA
DICIEMBRE DE 2023

La Plata, Huila – Colombia
Teléfonos No. 3104396818
E-mail: avanxasas@gmail.com

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL 4
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INICIALES A EJECUTAR 5

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

1. INTRODUCCIÓN

El contrato de obra pública No. 1613 de 2023, tiene por objeto EL MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.", nace de las necesidades manifestadas por beneficiarios directos del municipio de Tesalia; los estudios previos fueron elaborados por la Secretaría de Agricultura y Minería, quien determina la necesidad de adelantar el proceso de Mínima Cuantía, los cuales fueron aprobados por el Comité de Contratación, de tal manera, el Departamento Administrativo de Contratación adelanto el Proceso de mínima Cuantía No. SDAMCOB0067-23, con la finalidad de satisfacer la necesidad prevista y que mediante el procedimiento contractual SECOP II,se adjudica el proceso mediante carta de aceptación del 20 de noviembre de 2023. Los recursos con los que se ejecutó la obra son 100% recursos del departamento del Huila, que fueron dispuestos por el señor gobernador Luis enrique Dussan para acometer este mejoramiento, en apoyo a las necesidades manifestadas por los beneficiarios directos.

El contrato tiene una duración inicial de 2 meses contados a partir del acta de inicio, la cual fue suscrita el 05 de diciembre de 2023 por la Secretaría de Agricultura y Minería sin exceder el 30 de diciembre de 2023. La supervisión esta a cargo del Ingeniero FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA Profesional Universitario SEDAM en apoyo de la alcaldía del municipio de Tesalia Huila.

Con el presente contrato, se logró el mejoramiento de 16 caballerías de la plaza de ferias de Tesalia, las cuales se encuentran en mal estado y en donde se tenía cerramiento en gran parte en guadua.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

2. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE CONTRACTUAL

El objeto del presente contrato es "**MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA-DEPARTAMENTO DEL HUILA.**" el cual contiene los análisis técnicos, económicos y financieros de las obras físicas requeridas que son, mejoramiento mediante cerramiento en tubería metálica, construcción de puertas metálicas y fachada en madera, suministro e instalación de comederos.

Con el mejoramiento se permitirá brindar el servicio de 16 pesebreras y/o caballerizas en condiciones óptimas.



Imagen no. 1 Caballerizas antes de ser intervenidas.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

Antes del mejoramiento se contaba con un área aproximada de 100m^2 distribuidos en 8 caballerizas de 2,5m x 5m aproximadamente, el cerramiento era en guadua amarrado a tubería de 3" con alambre y puertas sencillas en madera.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Las actividades ejecutadas fueron las siguientes:

I. Caballerizas:

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	**PESEBRERAS**			
1,1	Preliminares	GL	1,00	1,00
1,2	Puerta marco metálico parte superior hierro inferior madera	UND	16,00	16,00
1,3	Fachada pesebrera en madera	UND	8,00	8,00
1,4	Comederos y soportes de agua	UND	16,00	3,00
1,5	División de pesebreras en tubería de 1-1/2" calibre 16 - 1 cara	UND	26,00	26,00

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

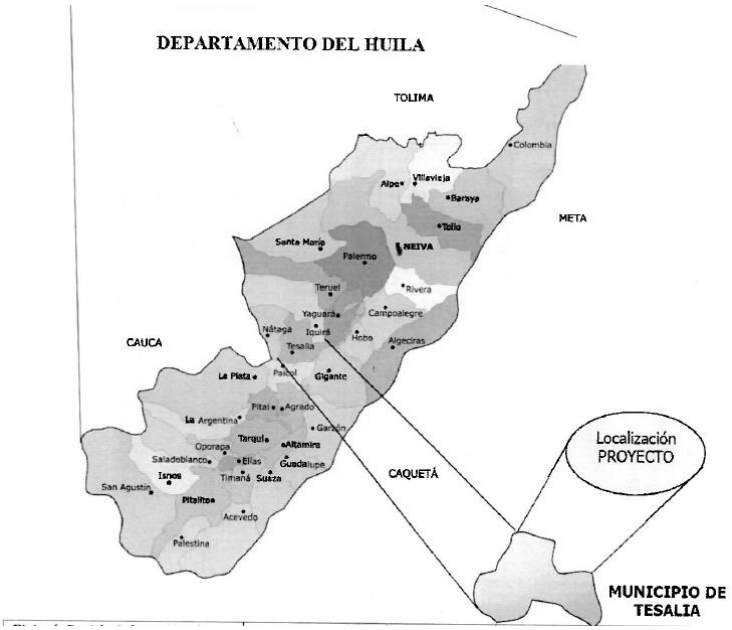


Imagen no. 2. Localización General Municipio de Tesalia



CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

Imagen no. 3. Localización Plaza de ferias

ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. PRELIMINARES

Se procedió a retirar con herramienta menor (pala, rastrillo) material cascarilla de arroz, estiércol de las caballerías ubicándolo en la parte trasera para ser aprovechado por la comunidad en abono, luego se retiró partes de alambre, guadua, puntillas y se procedió a adecuar el terreno con recebo en una cantidad de 11 m^3 aproximados.



Imagen no. 4 Cerramiento caballerizas

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

AREA INTERVENIDA: 100 m^2 aproximadamente, de acuerdo a los diseños por el ente contractual se distribuye el área existente en 16 caballerizas de dimensiones aproximadas de 2,5m x 2,5m.

CANTIDAD recebo: 11 m3





Imágenes 5 y 6.Actividades de retiro y limpieza área caballerizas y relleno con recebo

1,2 Puerta marco metálico parte superior hierro inferior madera.
En esta actividad se realizó puertas metalizas de 1,14x 1,4 m en ángulo 1 1”x1/8”.se procedió a soldar sobre tubo metálico de 3” existente, seguido se le instalaron tablero en tabla burra atornillada con tornillo de 2”x ¼” y se aplicó anticorrosivo. Se les adiciono portacandado en varilla de ¼”.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

CANTIDAD CONTRACTUAL: 16 unidades
CANTIDAD EJECUTADA: 16 unidades





Imágenes 7 y 8.Instalacion de puertas

1,3 Fachada pesebrera en madera: se realizaron huecos de 50 cm aproximadamente y se anclaron las columnas en madera de 10x10 cm, seguido se instalaron tabla burra de 30 cm, logrando una altura de 1,80 metros, se anclaron a las columnas con tornillería auto perforante 4 tornillos por tabla, dos a cada extremo, se inmunizo la tabla.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

CANTIDAD CONTRACTUAL: 8 und
CANTIDAD EJECUTADA: 8 und








Imágenes 9, 10 y 11.fachada

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

1,4 **Comederos y soportes de agua:** Se utilizó madera para armar soporte de descanso de las canecas, seguido se anclaron con tornillo de ¼" x 1 ½" a la tabla y se aseguraron también a la tubería divisoria metálica.

Contratado 16
Ejecutado: 03

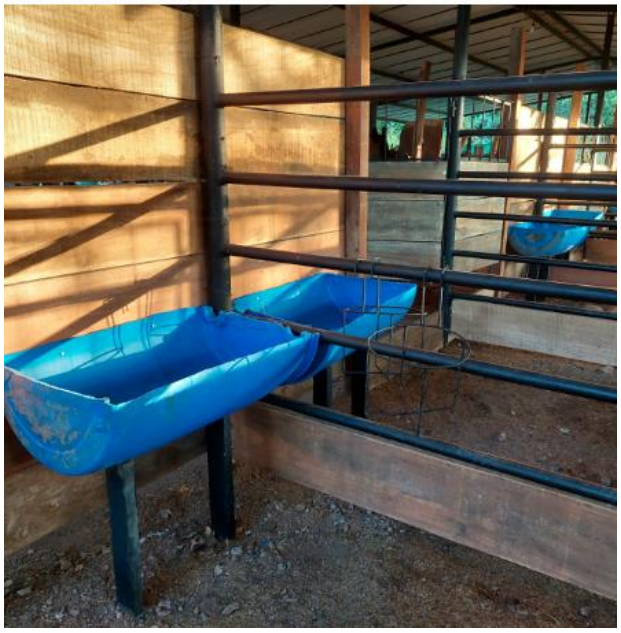

Imágen 12.

Caneca plástica 55 galones a la mitad, dos Soportes en madera y anclada con tornillería ¼" y alambre, soporte bebedero varilla ¼".

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)

1,5 División de pesebreras en tubería de 1-1/2" calibre 16 - 1 cara, se soldaron 5 tubos, se pintaron con anticorrosivo, seguido en la parte baja se adicionaron dos secciones de ángulos de 20 cm en las caras central parte baja del tubo de 3" para atornillar la tabla., en la parte lateral izquierda o fondo de las caballerizas se adiciono una columna de 10x10 en madera por no existir soporte en madera ò metálico y se adiciono un tubo más metálico de 1 ½".



Imagen 13.
Divisiones Metálicas, lateral izquierdo fondo.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)



Antes



Imágenes 14 y 15.Antes de intervención.

CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE FERIAS MUNICIPIO DE TESALIA – DEPARTAMENTO DEL HUILA No. 1613 DE 2023 – GOBERNACIÓN DEL HUILA

INFORME ACTA PARCIAL NO. 1
(05 DICIEMBRE AL 18 DICIEMBRE DE 2023)





Imágenes 16 y 17.Después de intervención.

Queda pendiente la instalación de 13 soportes de bebedero y comederos para terminar según cantidades contratadas.

Cordialmente,

CELIMO BERNEY VALENCIA ULE.
R.L. AVANXA SOLUCIONES INTEGRALES SAS.
