Agilitix	ACTA DE INSTALACIÓN EQUIPOS

Acta #	REFERENCIA	DIA	MES	AÑO
1	Acta de Instalación de Equipos	28	Feb	2020

PARTICIPANTES		
NOMBRE	**EMPRESA**	**FIRMA**
Guillermo Corredor	Transmilenio S.A.	
Julian Montañez	Agilitix S.A.S.	


RESPONSABLE DEL ACTA: Julian Montañez	**APROBACION DE INSTALACIÓN:** A la fecha de firma Agilitix S.A.S y Transmilenio S.A., acuerdan la "Aprobación" de la instalación de los equipos Netapp del contrato CTO753-19.
FACILITADOR: Guillermo Corredor	

ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Estimados Señores:

A continuación, se relacionan las actividades con las que se determinan la finalización de la instalación de los equipos Netapp.

- **NODOS Activos:**

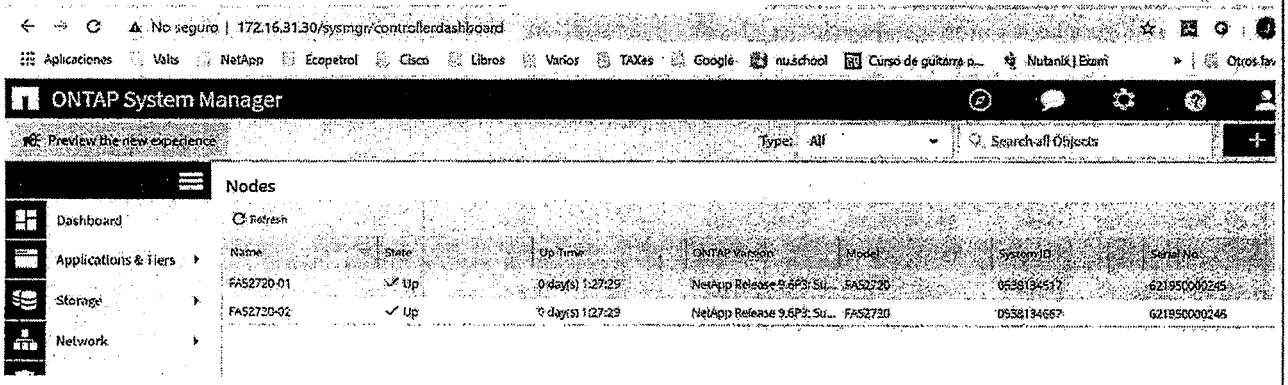

- **Discos Disponibles:**

60 Discos en Total
48 Discos Duros (36 de 10TB + 12 de 2TB)
12 Discos SSDs (950GB)

- **Licencias Activas**

Package	Entitlement Risk	Description
NFS License	✓	No risk
CIFS License	✓	No risk
iSCSI License	✓	No risk
FCP License	✓	No risk
SnapRestore License	✓	No risk
SnapMirror License	✓	No risk
FlexClone License	✓	No risk
SnapVault License	✓	No risk
SnapManagerSuite License	✓	No risk

- **HA (Alta Disponibilidad):**

Los 2 nodos del sistema FAS2720 están activos y configurados para funcionar en modo de alta disponibilidad
Cluster HA Status: ✓ All nodes are paired and ready for takeover.

