
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI**	**Página:** 1 de **13** **Código:** **Versión:** 1 **Fecha de emisión:**

FECHA	**DD**	18	**MM**	12	**AA**	2023	**CORTE N°**	2		**ELABORÓ**	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	**NIT O C.C**	901766614-8	**CONTRATO N°**	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	**NIT O C.C**	901550907-2	**CONTRATO N°**	2392 DE 2023

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	**ITEM**	1,04	**DESCRIPCIÓN**	DESMONTE DE CIELORRASO	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	RECEPCION	



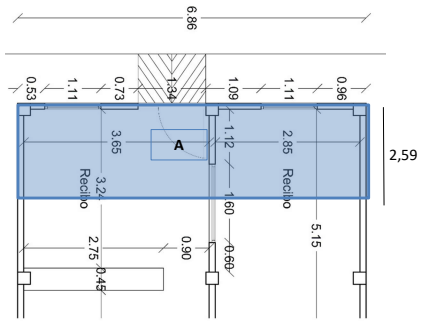




Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A	**6,86**		**2,59**		**17,78**

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI**	**Página:** 2 de 13 **Código:** **Versión:** 1 **Fecha de emisión:**

FECHA	**DD**	18	**MM**	12	**AA**	2023	**CORTE N°**	2		**ELABORÓ**	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	**NIT O C.C**	901766614-8	**CONTRATO N°**	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	**NIT O C.C**	901550907-2	**CONTRATO N°**	2392 DE 2023

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	**ITEM**	1,10	**DESCRIPCIÓN**	DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	**UNID.**	UN	**UBICACIÓN**	ATENCION AL CLIENTE	

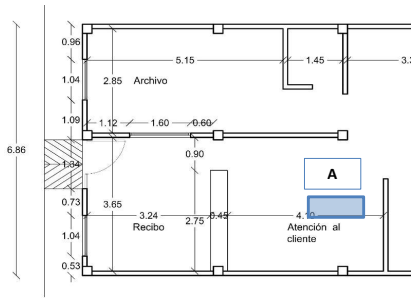



Localización	DIMENSIONES			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
A				1	**1,00**

OBSERVACIONES:	**SUBTOTAL** 1,00
	VIENE DE LA PAGINA DE
	TOTAL 1,00


Residente de obra: ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL
Mat. Profesional 1370069167 BLV

Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional 0520237815ANT

FECHA	DD	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2		ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,17	DESCRIPCIÓN	DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO	UNID.	M	UBICACIÓN	CUBIERTA VIGA CANAL

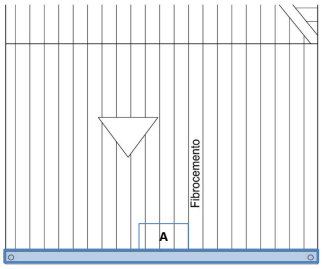







Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A			6,84	1	6,84


FECHA	DD	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2		ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	**NIT O C.C.**	901766614-8	**CONTRATO N°**	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	**NIT O C.C.**	901550907-2	**CONTRATO N°**	2392 DE 2023

CAPÍTULO	3	CARPINTERIA METALICA	ITEM	3,18	DESCRIPCIÓN	VENTANERIA EN ALUMINO ANONIZADO SISTEMA 5020 VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	UNID.	M2	UBICACIÓN	FACHADA PRINCIPAL

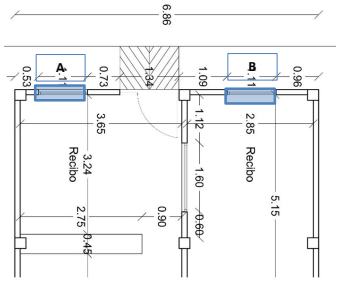

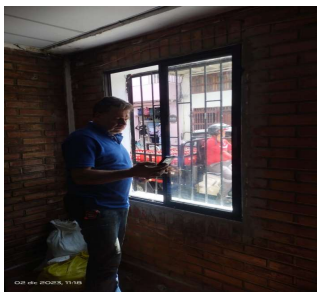

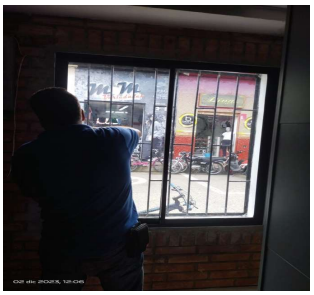

Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A	1,25	1,20		1	1,49
B	1,05	1,20		1	1,26

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	2,75
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	2,75

Residente de obra: ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL
Mat. Profesional 1370069167 BLV

Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional 0520237815ANT


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI**	**Página:** 5 de 13 **Código:** MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 **Versión:** 01 **Fecha de emisión:** 11 - 08 - 2021

FECHA	**DD**	18	**MM**	12	**AA**	2023		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	**NIT O C.C.**	901766614-8	**CONTRATO N°**	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	**NIT O C.C.**	901550907-2	**CONTRATO N°**	2392 DE 2023

CAPÍTULO	10	FACHADAS Y REVESTIMIENTOS	**ITEM**	10,02	**DESCRIPCIÓN**	LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	MUROS DE PATIO INTERNO Y PATIO EXTERNO	











Localización	DIMENSIONES			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
A		2,45	6,77	1	**16,59**
B		4,00	5,88	1	**23,52**
C		2,3	2,5	2	**11,50**
D		2,45	0,71	2	**3,48**
E		2,45	0,22	1	**0,54**


FECHA	DD	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2	ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	11	IMPERMEABILIZACION	ITEM	11,04	DESCRIPCIÓN	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	UNID.	M	UBICACIÓN	CUBIERTAS

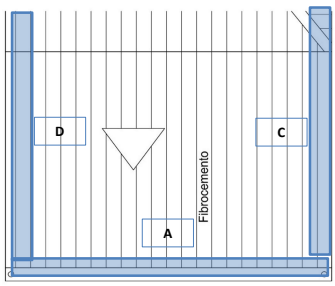

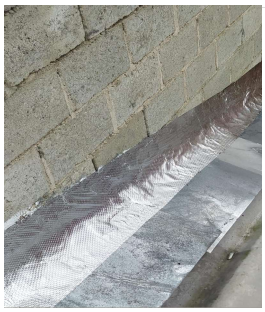

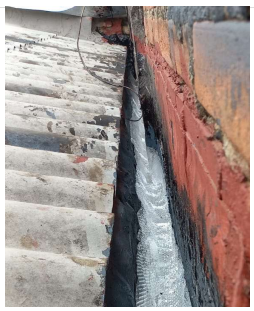



Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A			6,80	1	6,80
B			4,1	1	4,10
C			4,1	1	4,10
15,00					

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL 15,00
	VIENE DE LA PAGINA DE
	TOTAL 15,00

Residente de obra: ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL
Mat. Profesional 1370069167 BLV


Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional 0520237815ANT

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI	Página: 7 de 13 Código: Versión: 01 Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA	DD	18	MM	12	AA	2023	CORTE N°	2		ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	12	MAMPOSTERIA	ITEM	12,08	DESCRIPCIÓN	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=12CM	UNID.	M2	UBICACIÓN	CUARTO DE COMUNICACIONES

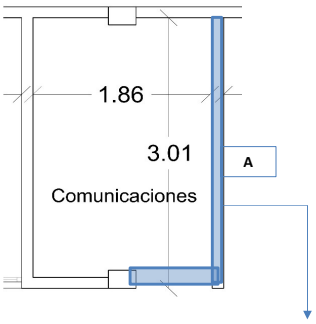








Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A		2,4	2,84	1	6,80

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

FECHA	D 18	MM 12	AA 2023		CORTE N° 2	ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	14	PISOS	ITEM	14,16	DESCRIPCIÓN	GUARDAESCOBA CERÁMICA 30,5X10CM	UNID.	M	UBICACIÓN	MUROS DE PATIO EXTERNO









Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A			15,90	1	15,90
B			15,90	1	15,90
C			6,77	1	6,77
D			5,77	1	5,77
E			2,6	1	2,60
F			2,6	1	2,60
G			0,46	1	0,46
			SUBTOTAL		50,00
			VIENE DE LA PAGINA DE		
			TOTAL		50,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra: ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL
Mat. Profesional 1370069167 BLV


Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional 0520237815ANT


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI	Página: 9 de 13 Código: Versión: 01 Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA	D	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2	ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	15	RED ELECTRICA	ITEM	15,07	DESCRIPCIÓN	LUMINARIA LED 120X30CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA	UNID.	UN	UBICACIÓN	ZONA DE ATENCION AL CLIENTE

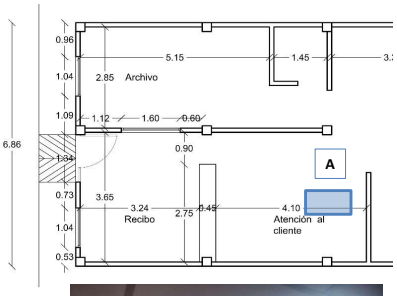

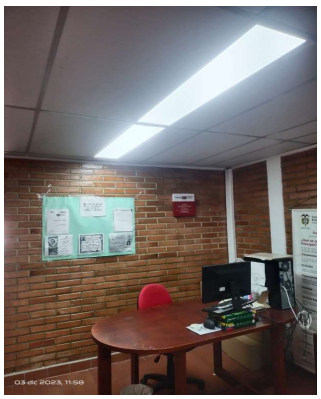

Localización	DIMENSIONES			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
A				1	1,00

SUBTOTAL	1,00
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

Residente de obra:	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL	Director de Interventoría:	FEDERICO GAITCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional	1370069167 BLV	Mat. Profesional	0520237815ANT

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI**	**Página: 10** de **13** **Código:** **Versión: 01** **Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021**

FECHA	**D**	18	**MM**	12	**AA**	2023		**CORTE N°**	2	**ELABORÓ**	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	**NIT O C.C.**	901766614-8	**CONTRATO N°**	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	**NIT O C.C.**	901550907-2	**CONTRATO N°**	2392 DE 2023

CAPÍTULO	15	RED ELECTRICA	**ITEM**	15,29	**DESCRIPCIÓN**	SALIDA AIRE ACONDICIONADO	**UNID.**	UN	**UBICACIÓN**	ZONA DE ATENCION AL CLIENTE







Localización	DIMENSIONES			No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud		
A				1	**1,00**

SUBTOTAL	**1,00**
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	**1,00**

OBSERVACIONES:


Residente de obra:	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL	Director de Interventoría:	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional	1370069167 BLV	Mat. Profesional	0520237815ANT

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI	Página: 11 de 13 Código: Versión: 01 Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021


FECHA	D	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2	ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	15	RED ELECTRICA	ITEM	15,44	DESCRIPCIÓN	CANALETA PLASTICA 60X40MM	UNID.	M	UBICACIÓN	ZONA DE ATENCION AL CLIENTE

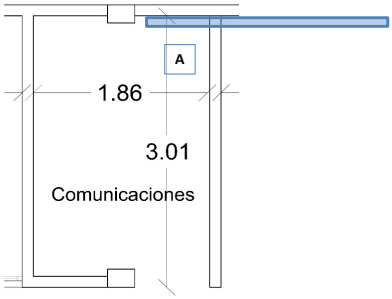



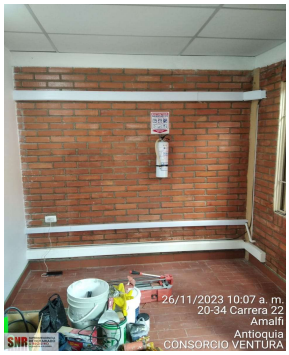

Localización	DIMENSIONES			No Elem.	HOJA: 1 DE 1
	Ancho	Alto	Longitud		TOTAL
A			8,60	1	8,60

SUBTOTAL	8,60
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	8,60

OBSERVACIONES:


Residente de obra:	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL	Director de Interventoría:	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional	1370069167 BLV	Mat. Profesional	0520237815ANT

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI	Página: 12 de 13 Código: Versión: 01 Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA	D	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2	ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	17	RED SANITARIA	ITEM	17,19	DESCRIPCIÓN	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	UNID.	M	UBICACIÓN	ZONA DE ATENCION AL CLIENTE

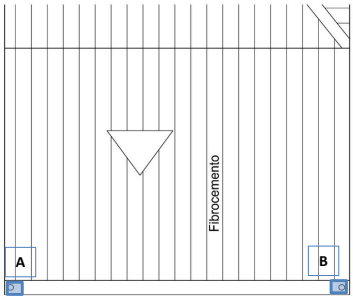



Localización	DIMENSIONES			No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
	Ancho	Alto	Longitud		
A			**4,00**	1	**4,00**
B			**4,00**	1	**4,00**

SUBTOTAL	**8,00**
VIENE DE LA PAGINA DE	
TOTAL	**8,00**

OBSERVACIONES:

Residente de obra:	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL	Director de Interventoría:	FEDERICO GARCIA ARBELAEZ
Mat. Profesional	1370069167 BLV	Mat. Profesional	0520237815ANT

FECHA	D	18	MM	12	AA	2023		CORTE N°	2	ELABORÓ	ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO EDIFICACION DICAC	NIT O C.C.	901766614-8	CONTRATO N°	2467 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	NIT O C.C.	901550907-2	CONTRATO N°	2392 DE 2023

CAPÍTULO	20	ADICIONALES	ITEM	20,18	DESCRIPCIÓN	DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION AIRES ACONDICIONADOS (Incluye Recarga Gas Refrigerante R-401a o el que corresponda, Punta Agua, Punto electrico, Tuberia en cobre hasta 3 ml)	UNID.	M	UBICACIÓN	ZONA DE ATENCION AL CLIENTE







Localización	DIMENSIONES Ancho	Alto	Longitud	No Elem.	HOJA: 1 DE 1 TOTAL
A				1	1,00
