RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

C D R
a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a

CONTRATO No. 152 DE 2023

CUYO OBJETO ES:

“REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ.”

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME AVANCE DE OBRA FINAL
MAYO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO – REGISTRO FOTOGRÁFICO
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA
4. METODOLOGÍA DE LA EJECUCIÓN
5. PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTO
6. PRESUPUESTO
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Bogotá, se celebró el contrato de obra **No. 152 DE 2023** con fecha 18 de diciembre de 2023, entre la Nación Consejo Superior de la Judicatura, y la firma **CARLOS RODOLFO DAZA RAMÍREZ**, cuyo objeto es; "**REALIZAR ADECUACIONES DE DESPACHOS Y RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA DEL PALACIO DE JUSTICIA ALFONSO REYES ECHANDÍA DE BOGOTÁ."**, con el cual el contratista se compromete a realizar las obras allí pactadas y cumplir los compromisos incluidos en el contrato y sus respectivos anexos y documentos.

El presente informe, tiene como propósito dar a conocer las diferentes actividades de orden técnico, desarrolladas por el Contratista e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control de las actividades en obra en cuanto a las especificaciones técnicas de cada una de las fases que compone el contrato de mantenimiento.

El informe contiene temas de orden general, actividades ejecutadas por parte del Contratista a partir de la iniciación del contrato, de tal manera que permite conocer y evaluar de una forma rápida los temas e indicadores de gestión sobre el estado técnico, administrativo, operativo y financiero del contrato de obra.

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO – REGISTRO FOTOGRAFICO


El proyecto consiste en las adecuaciones de despachos y restauración de carpintería del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá, ubicado en la Carrera Calle 12 # 7-65 en Bogotá trabajos ejecutados del 26 de diciembre del 2023 al 29 de abril del 2024.


CAPITULO 2
CAMBIO DE PISO LAMINADO

2.1 PISO LAMINADO

Suministro e instalación piso laminado semibrillante o texturizado, tipo industrial, HDF Calidad primera AAA. Incluye Yumbolon, suministro e instalación de remate 1/4 de círculo perimetral, pirlan de puertas y paño deslizante en los muebles. No incluye guarda escoba.

CORTE SUPREMA
Ubicación.
Sala de audiencias 1 - piso 1 – incluye frente de plataforma de magistrados
M2: 46.59

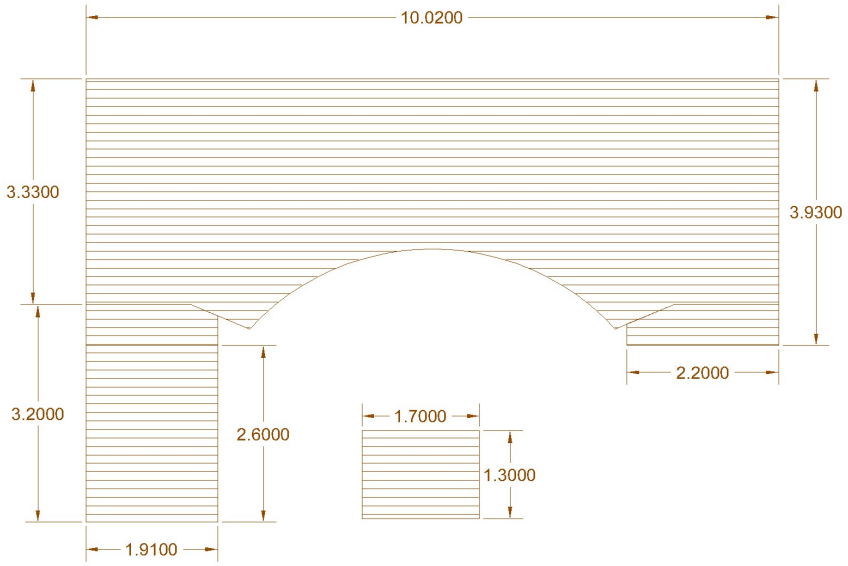

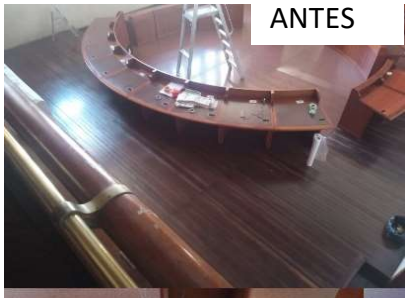




ANTES



CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

PROCESO

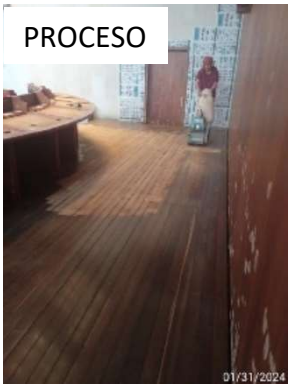

PROCESO




PROCESO



FINAL



FINAL

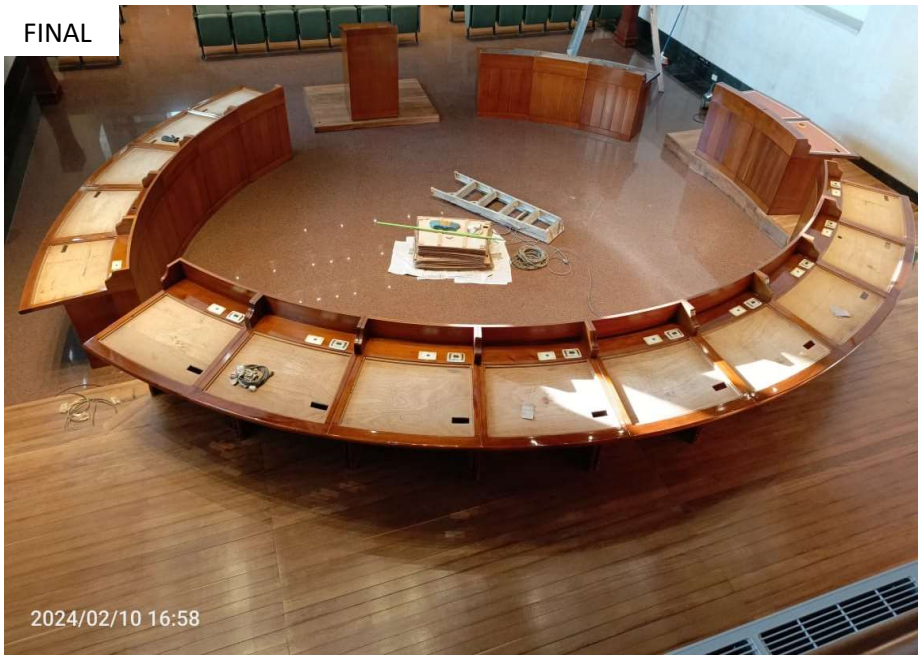


FINAL



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


CONSEJO DE ESTADO


Ubicación.
Sala de audiencias 1 - piso 1 – incluye frente de plataforma de magistrados
M2: 63.34

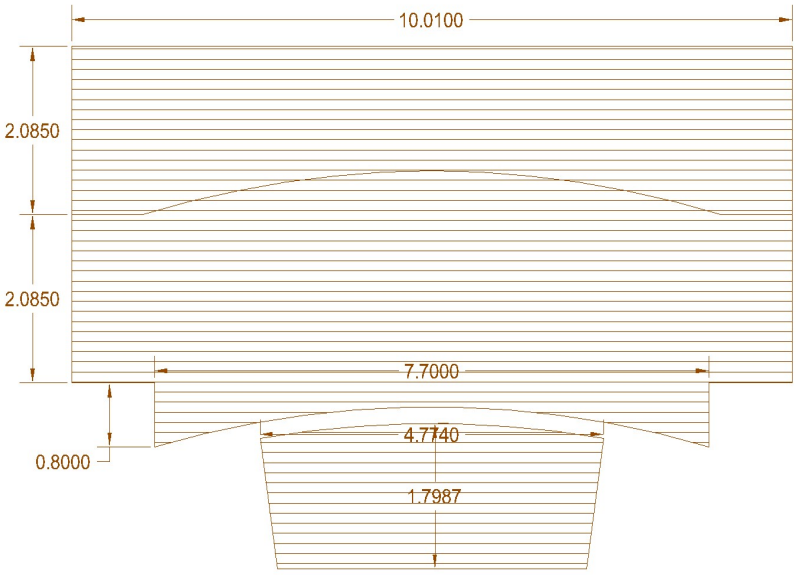


ANTES



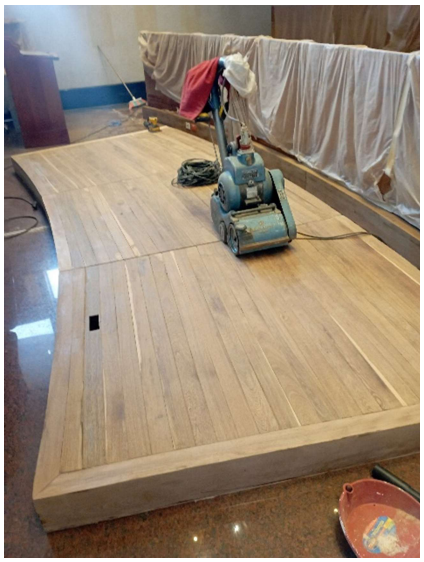


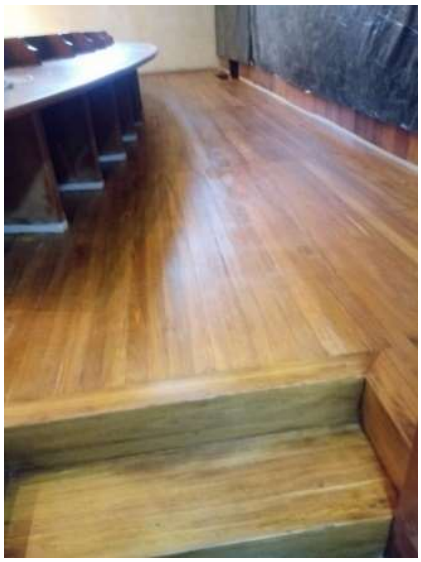

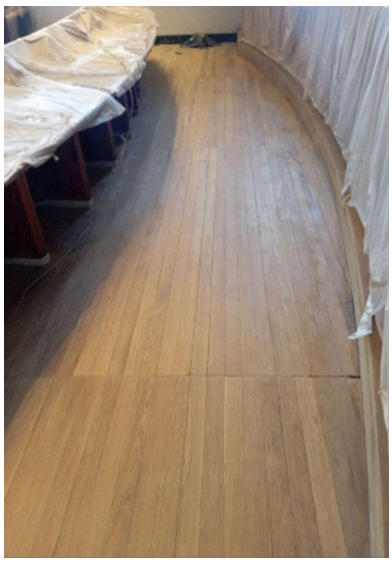

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 3 presidencia, oficinas auxiliares, sala de gobierno

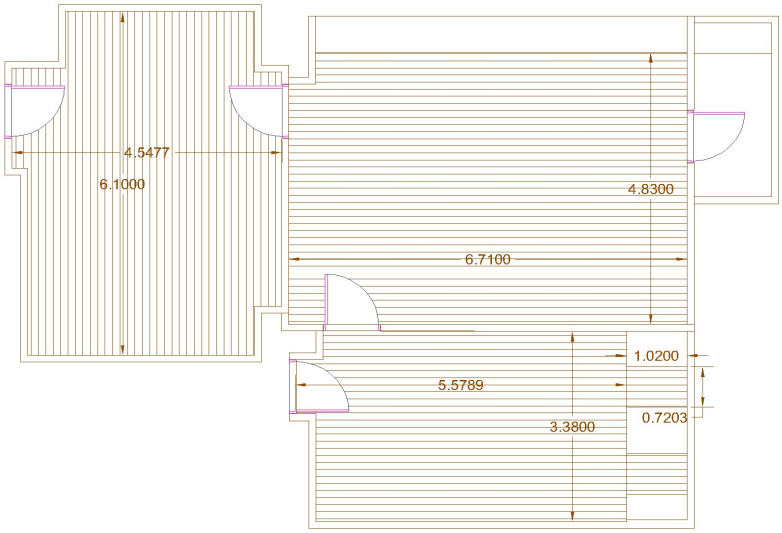





















ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Salas de decisión 304 – 305 – 404 - 405
M2 106,54

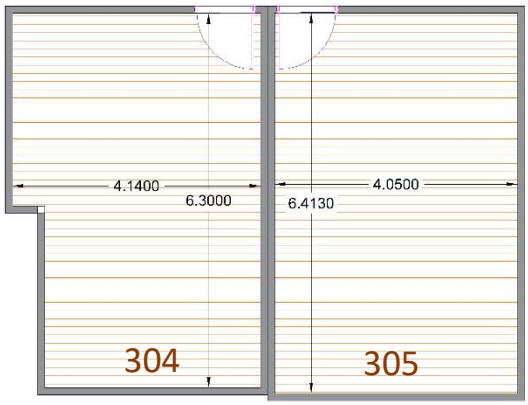

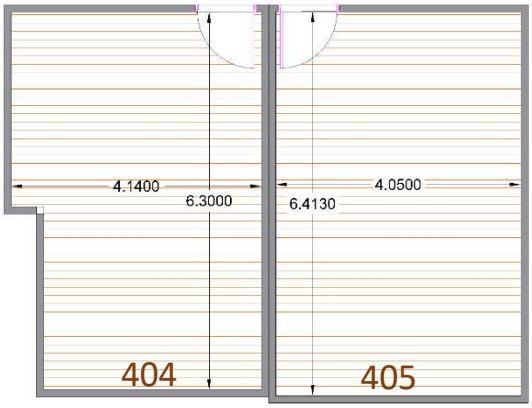

ANTES 305 Y 405



ANTES 304 Y 404



PROCESO 305 Y 405




PROCESO 304 Y 404



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


FINAL 305 Y 405

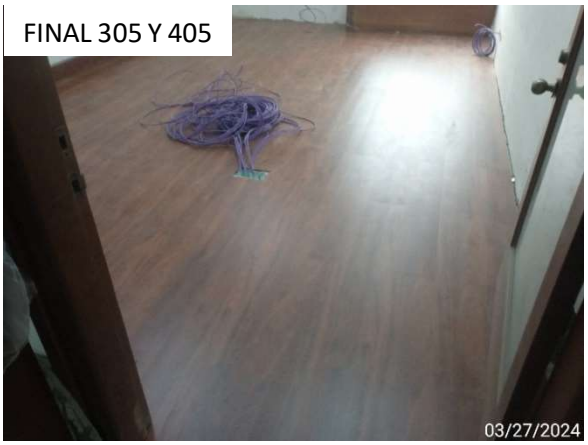


FINAL 304 Y 404



Ubicación.
Piso 4 despacho 416
M2 55.08

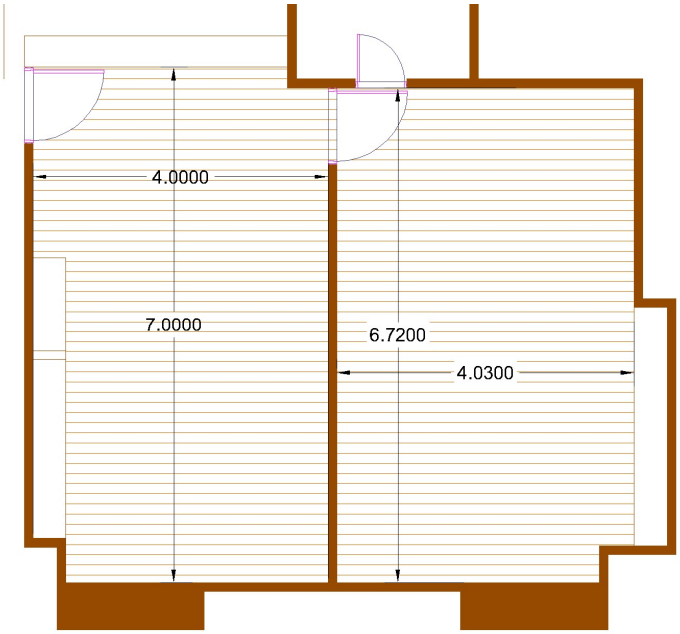

ANTES

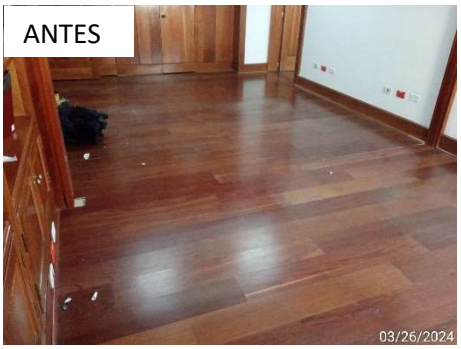

DESMONTE




INSTALACION



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


C D R a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

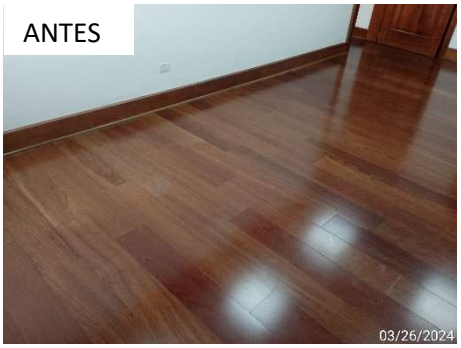





Ubicación.
Despacho 509
M2 .61.44

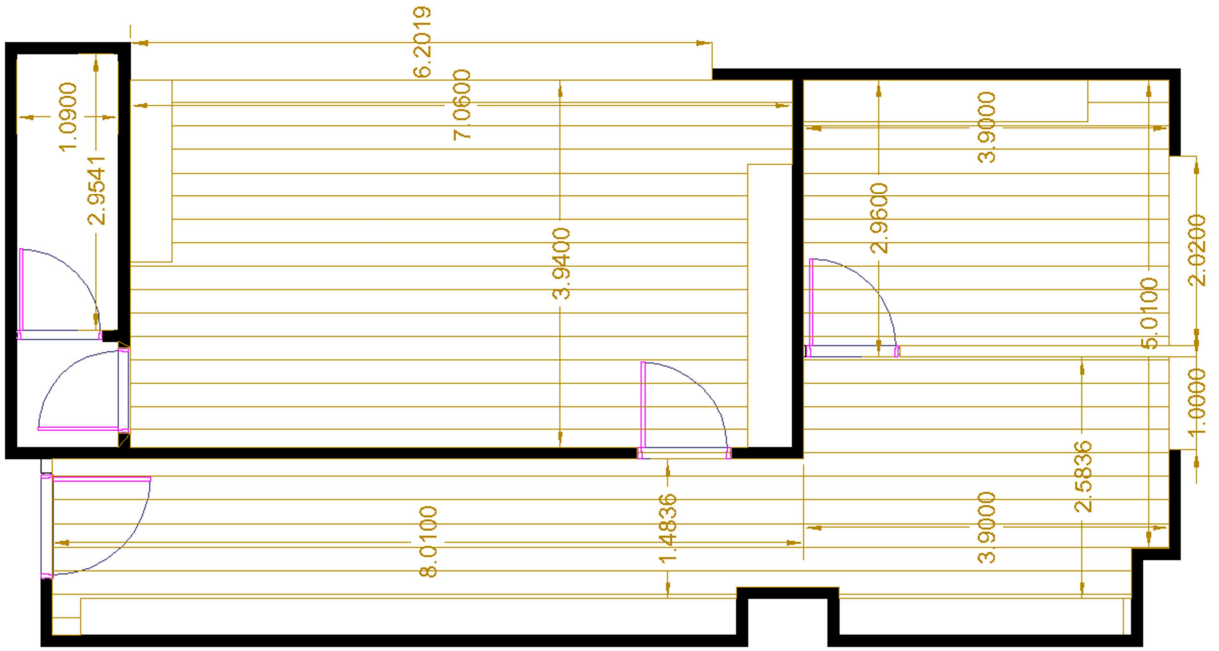








ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

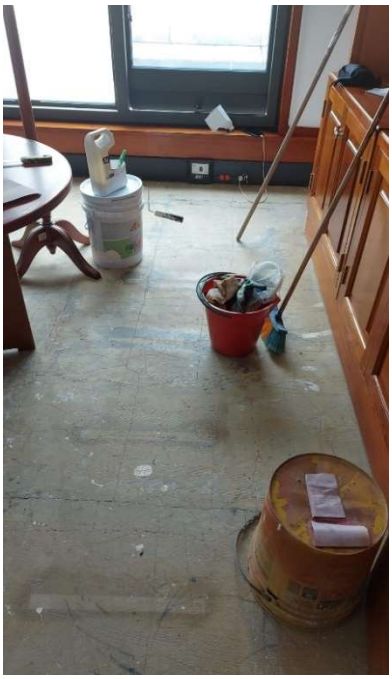



Proceso de desmonte de piso




ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Final instalación piso







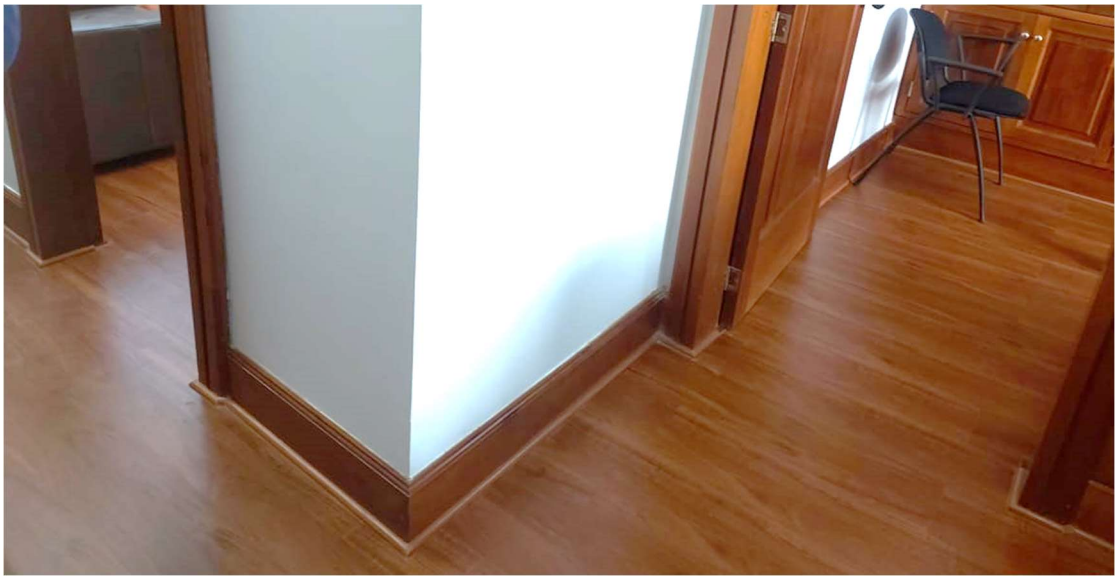

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

CORTE CONSTITUCIONAL

Ubicación.
Piso 8 despacho 801 y 802
M2 153.59



Antes 801





Proceso 801





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Final 801





DESPACHO 801: este despacho se vuelve a pulir por que el magistrado no recibio el tono natural de la madera






Final 801





Antes 802

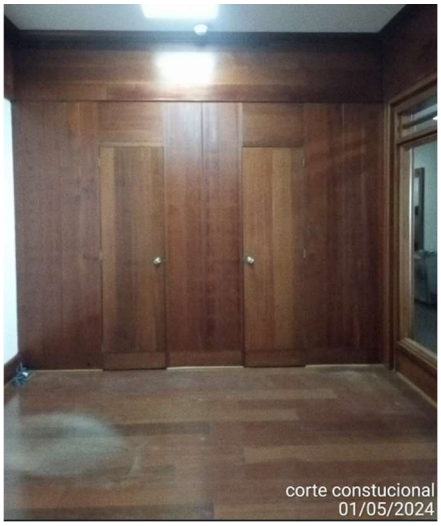





Proceso 802





Final 802

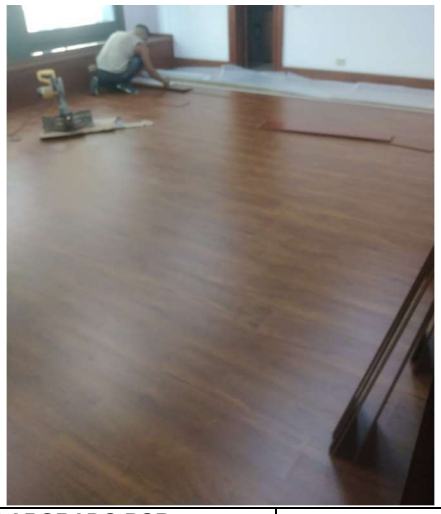

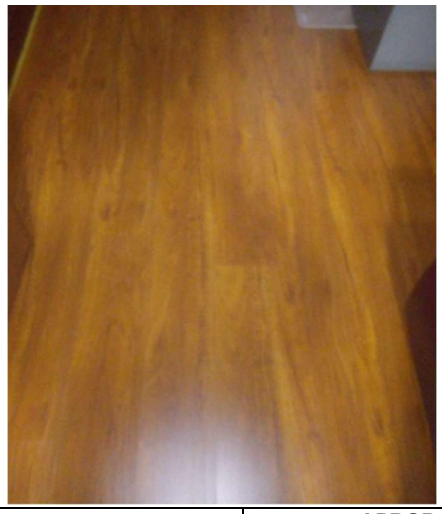

CAPITULO 3
RESTAURACION DE CARPINTERIA EMPOTRADA


CORTE SUPREMA

3.1 FACHADA PUERTA VENTANA EN VIDRIO MARCOS EN MADERA

Restauración de módulo de fachada puerta ventana despachos en madera y vidrio a dos caras (interna y externa). Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. El metraje incluye marcos en vidrio y puerta marco tipo.


CORTE SUPREMA

Ubicación.
Piso 2 secretaria general
M2 8.42

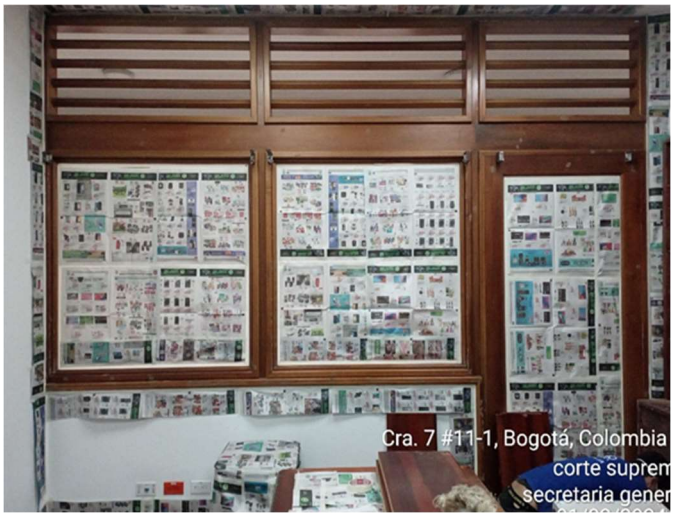



Ubicación.
Piso 3 Pasillo principal
M2 78.97



ANTES



PROCESO



FINAL






ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General



Ubicación.
Piso 3 pasillo principal, despachos magistrados puertas cara interna despachos 313 – 312 – 311 – 310 – 307
M2 6.10





ANTES

PROCESO




ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

FINAL



Ubicación.
Piso 3 pasillo lateral
M2 19.581

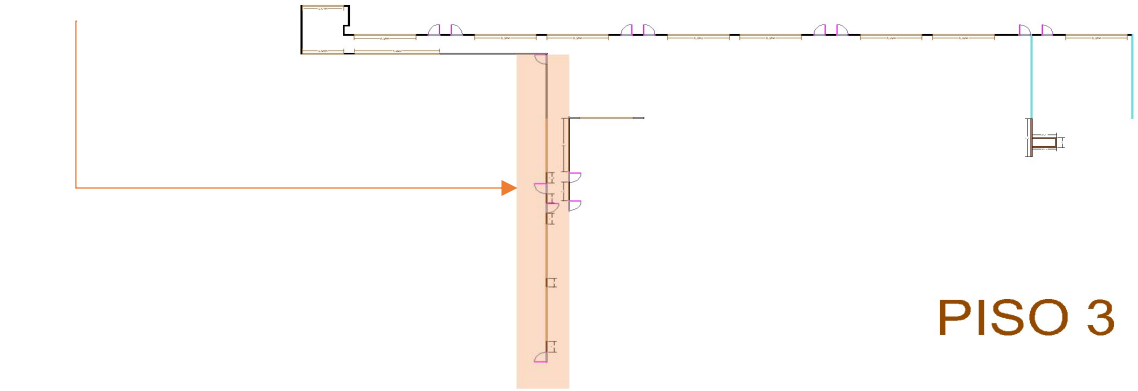






ANTES PROCESO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

FINAL



Ubicación.
Piso 4 pasillo general
M2 96.79

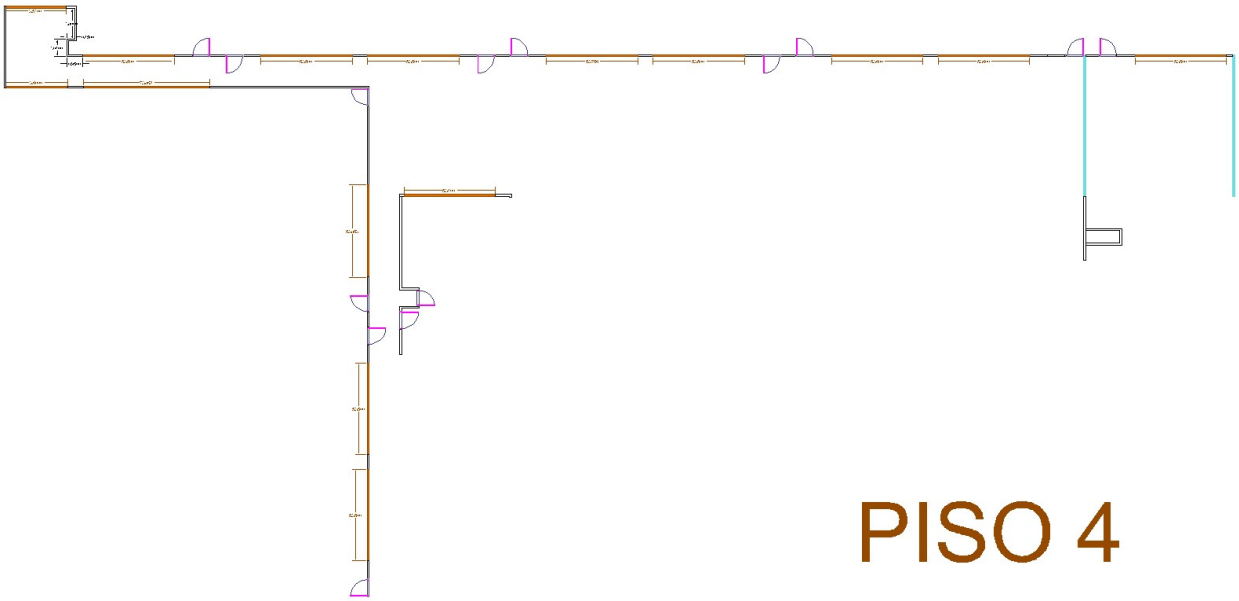



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia











ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

C D R a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia













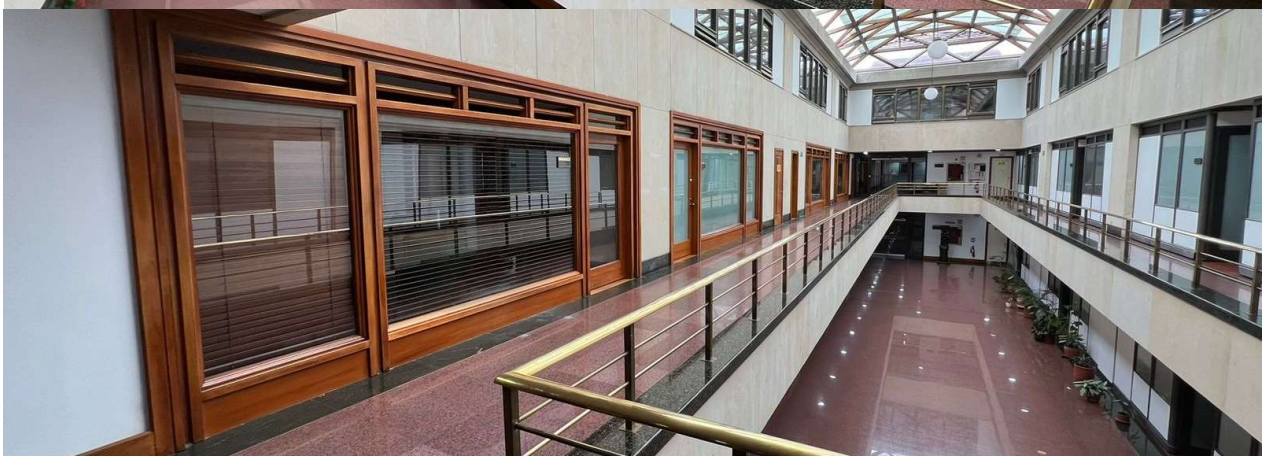

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 1 Acceso sala de audiencias
M2 6.83

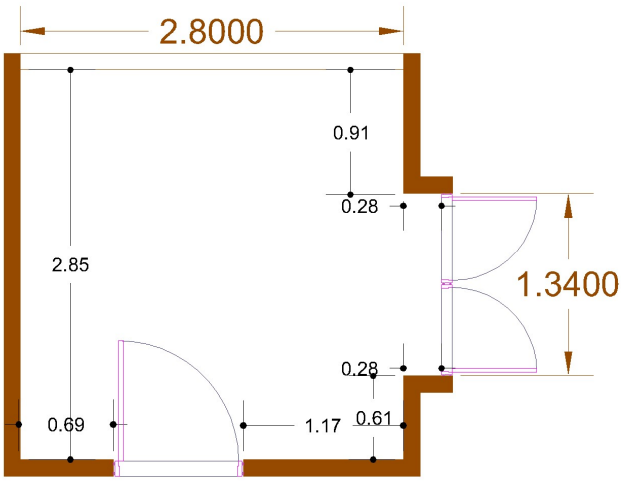



CONSEJO DE ESTADO

Ubicación.
Piso 3 Presidencia y sala de gobierno
M2 .20.53



ANTES



ANTES



ANTES



FINAL



FINAL




FINAL


ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

Ubicación.
Piso 4 Despacho 415
M2 12.71

ANTES

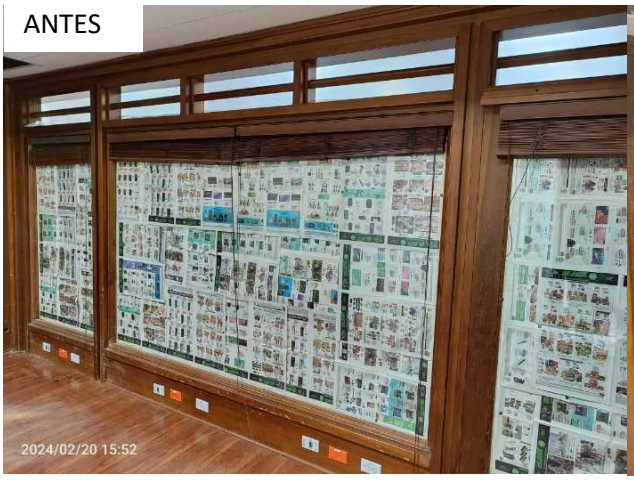

FINAL

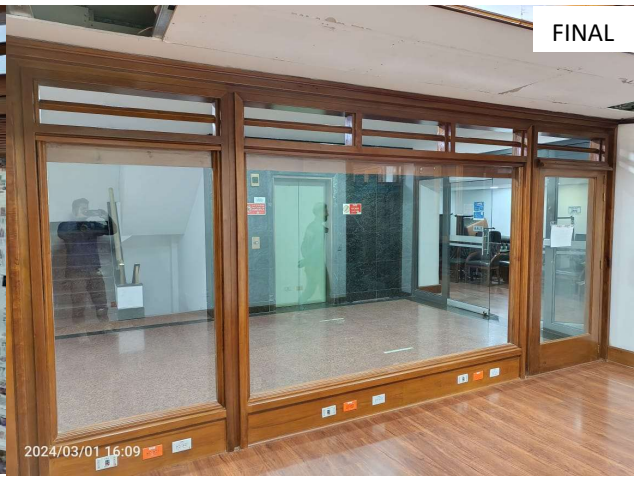

Ubicación.
Piso 4 Despacho 413
M2 12.81

Antes





Proceso



Proceso

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General






Ubicación.
Piso 5 Despacho 509
Montante superior puerta despacho
M2 1.00


Antes



Final

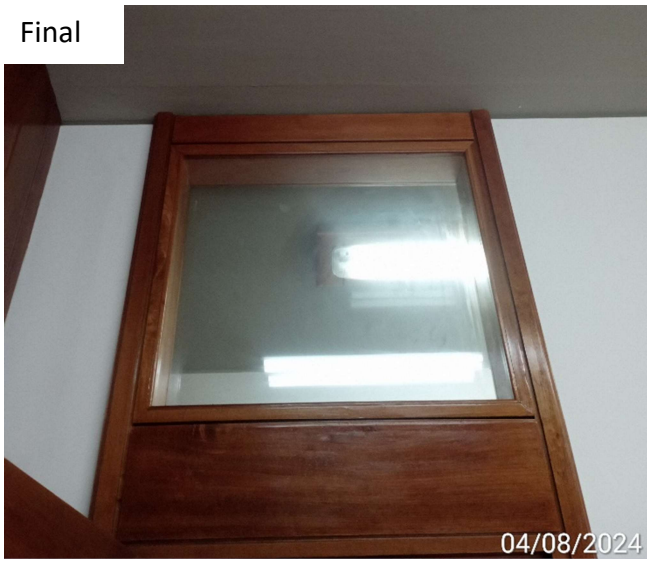

Proceso

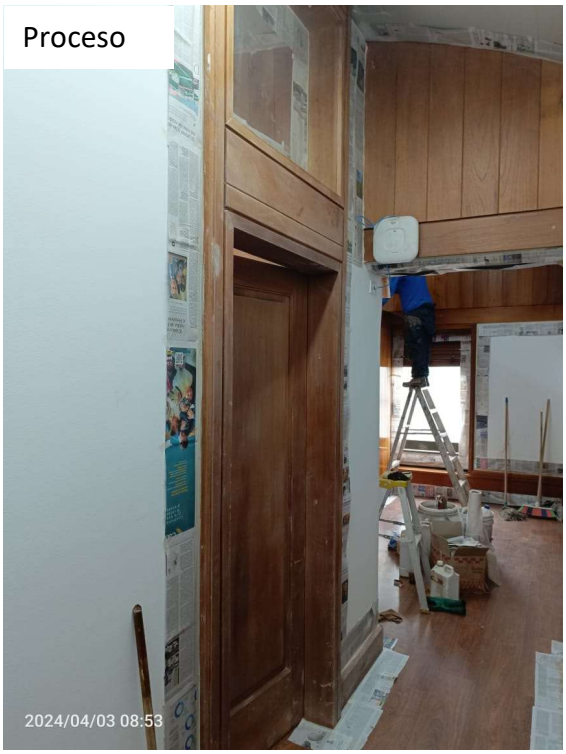

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CORTE CONSTITUCIONAL

Ubicación.
Piso 8 Despachos 801 y 802
M2 27.02









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

3.2 BIBLIOTECA EMPOTRADA DESPACHO

Restauración de biblioteca despacho en madera puertas en marco madera y vidrio. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. El metraje incluye frontales y parte interna, entrepaños y puertas marco en vidrio. Durante la ejecución de la actividad se protegerán los demás muebles, muros, piso y vidrios evitando afectaciones al área intervenida.

CORTE SUPREMA

Ubicación.
Piso 2 secretaria general
M2: 19.97

ANTES



MACILLADO



LIJADO



FINAL



Ubicación.
Piso 3 Sala de casación laboral
Biblioteca baja 1 cuerpo 2.50 *.88
Biblioteca baja 2 cuerpos 3.20 *.88
Biblioteca baja 1 cuerpo 1.38*1.13
M2 30.38+20.15

Observaciones:
Las bibliotecas se vuelven a ejecutar en el momento de la entrega de la restauración, le informan a el supervisor del contrato que al mobiliario se le debe unificar el tono, para esto se deben retirar la capa existente de pintura.







CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

ANTES



ANTES
















ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia








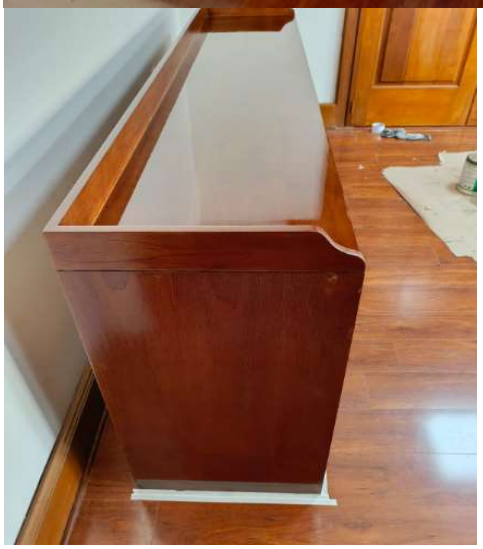

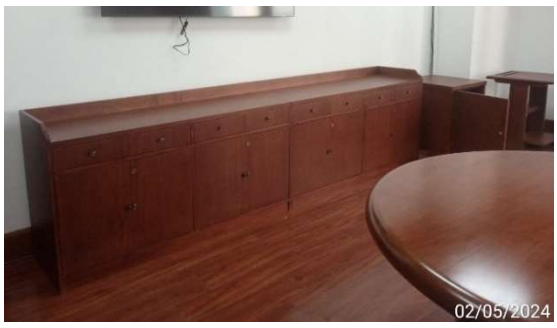

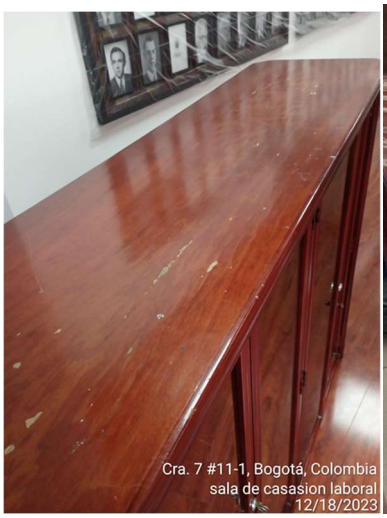





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


2024/01/24 10:52


2024/01/24 11:14


02/05/2024


02/05/2024

CONSEJO DE ESTADO

Ubicación.
Piso 3 Presidencia y Sala de gobierno
M2: 38.11

ANTES



PROCESO



FINAL



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 4 Despacho 415
M2: 40.51









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General





Ubicación.
Piso 4 Despacho 416
M2 46.63














Ubicación.
Piso 5 Despacho 509
M2 80.10


Antes

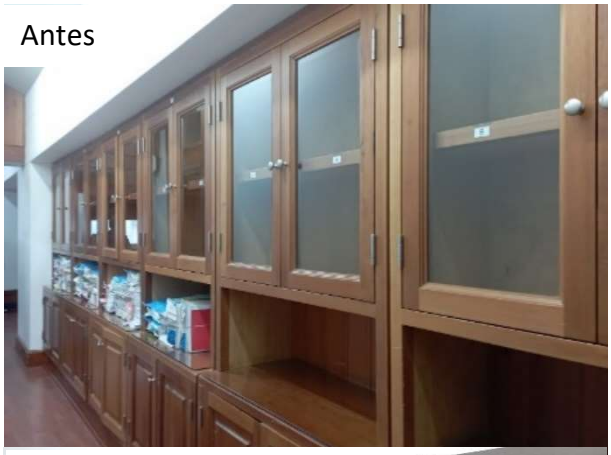


Antes



Antes

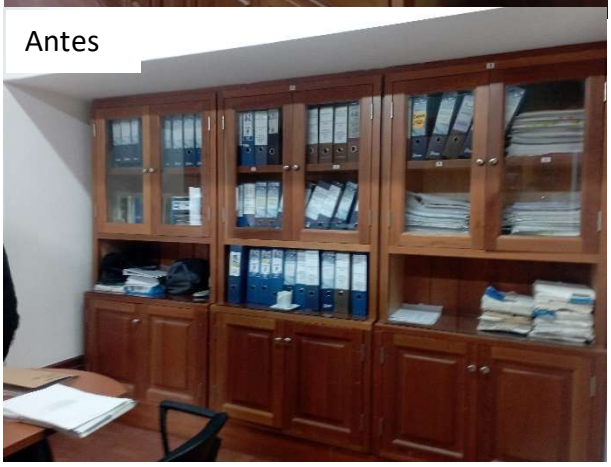

Antes

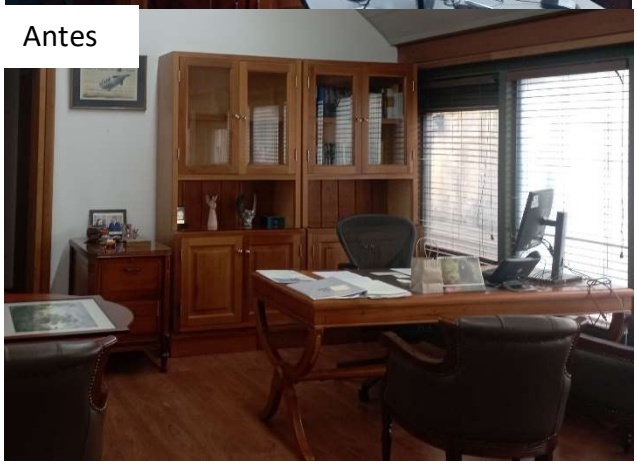



Proceso

Proceso



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

Proceso



Proceso



Proceso



Final



Final



ELABORADO POR: **Arq. Anngy Guerrero** Residente de obra	**REVISADO POR:** Carolina López	**APROBADO POR:** **Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Final



Final



Final



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

Ubicación.
Piso 4 Despacho 413
M2 41.04









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CORTE CONSTITUCIONAL

Ubicación.
Piso 8 Despachos 801 y 802
M2 72.25







ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

3..3 ANTEPECHO MADERA VENTANA FACHADA

Restauración de antepecho ventana fachada despacho en madera. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.

CORTE SUPREMA

Ubicación.

Piso 3 Sala de casación laboral

ML: 4.84



CONSEJO DE ESTADO

Ubicación.
Piso 2 s ala de audiencia 2
ML 4.14



Ubicación.
Piso 3 presidencia,
ML 6.26





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 4 Despacho 415
ML 6.25







Ubicación.
Piso 4 Despacho 416
ML 7.13





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 4 Despacho 413
ML 6.25











Ubicación.
Piso 5 Despacho 509
ML 9.22





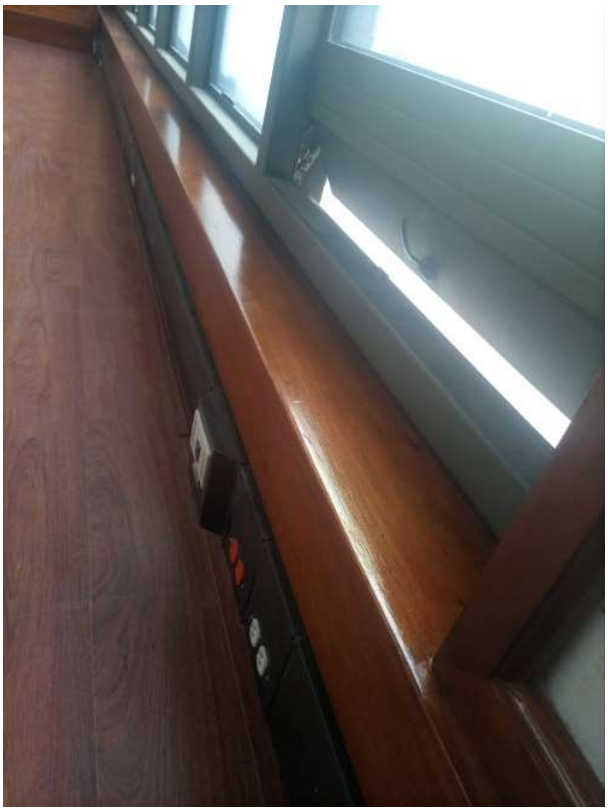

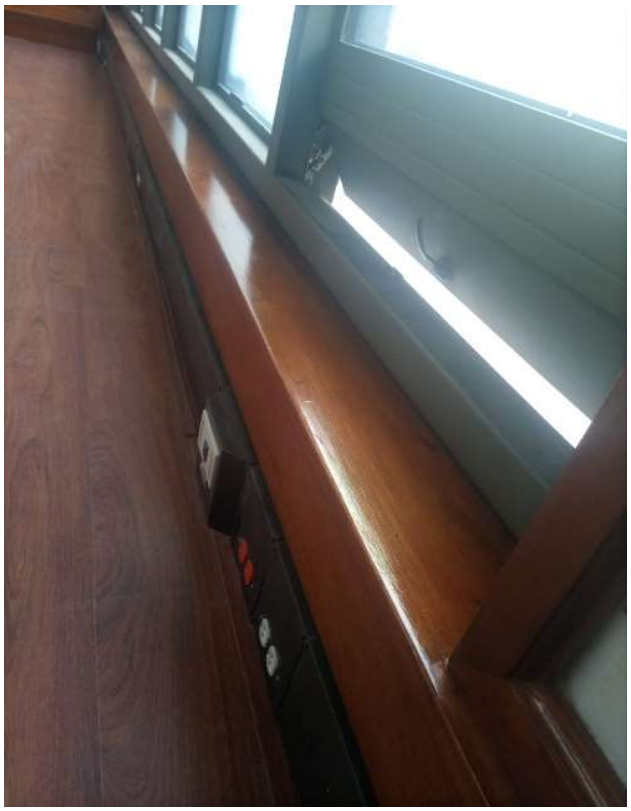

CORTE CONSTITUCIONAL

Ubicación.
Piso 8 Despachos 801 y 802
ML 12.36





3.4 CENEFA Y PLAFÓN EN MADERA

Restauración de cenefa cornisa en madera techo pared. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye cornisa y cenefa. h 8-15cm


CORTE SUPREMA

Ubicación

Piso 1 Sala de audiencias 1

Pasamanos Sala costado occidental y oriental tapa superior muros

ML 40.08









Guarda escoba acceso lateral

ML 6.04



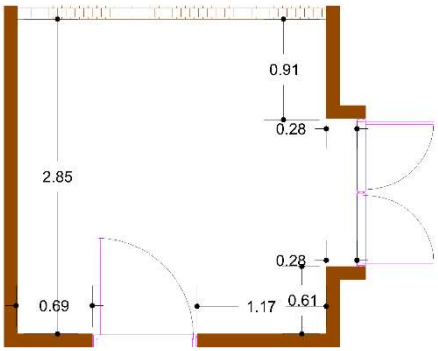

Ubicación.
Piso 2 secretaria general
ML16.14

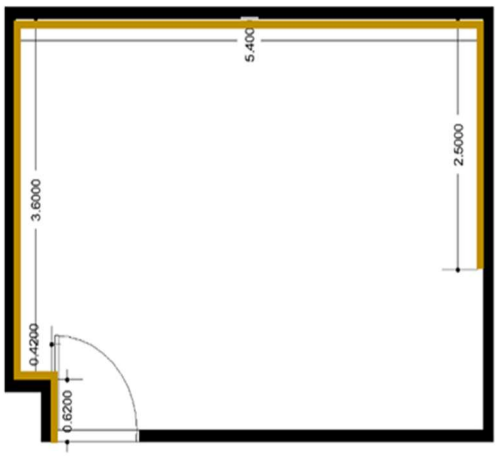










ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

Ubicación.
Piso 3 Sala de casación laboral
Plafón de madera techo
ML 74.63

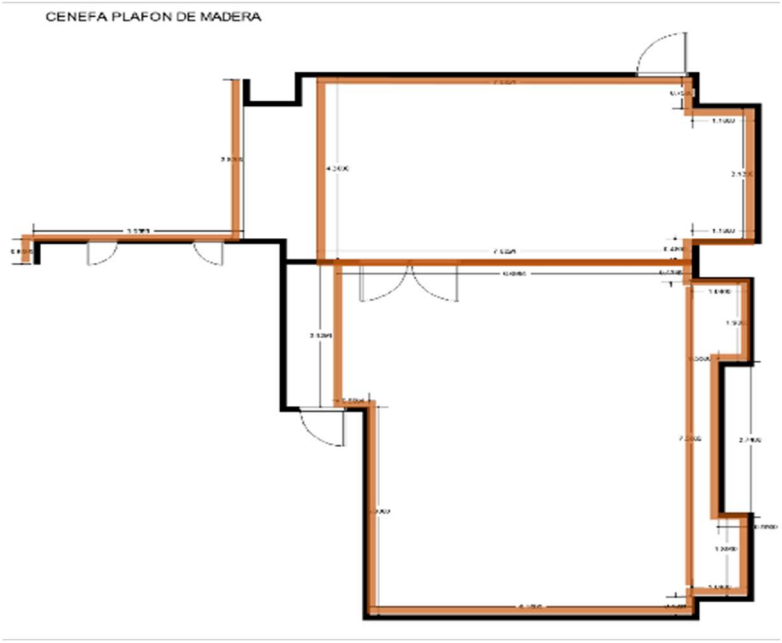










ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Guarda escoba, cenefa baño y pasamanos
ML 87.67


GUARDA ESCOBA Y PASAMANOS

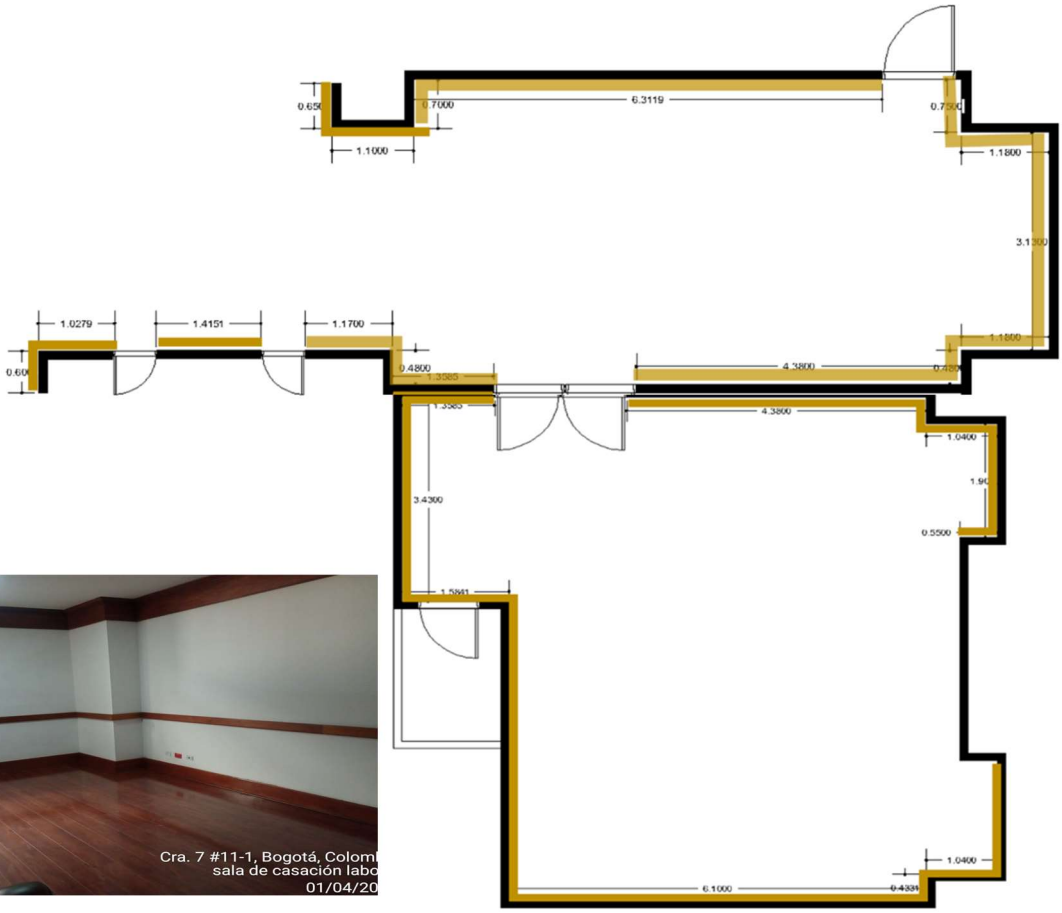



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 3 pasillo principal
ML 51.57
Plafón de madera

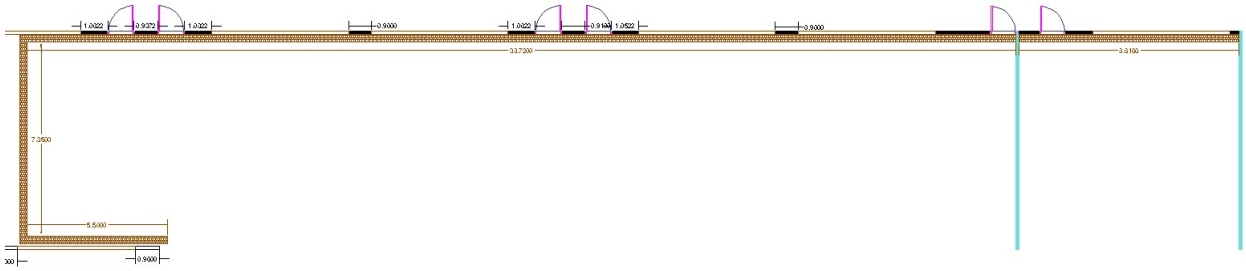










ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Piso 3 pasillo principal
ML 51.57
Guardaescoba

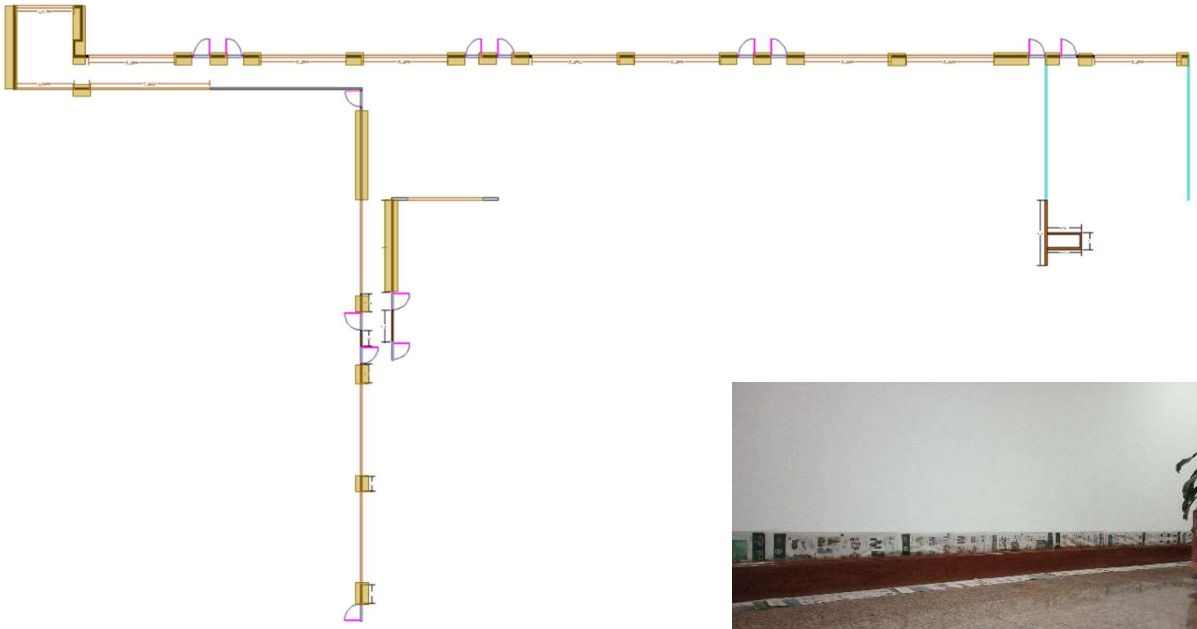












Ubicación.
Piso 4 pasillo principal
ML 57.63

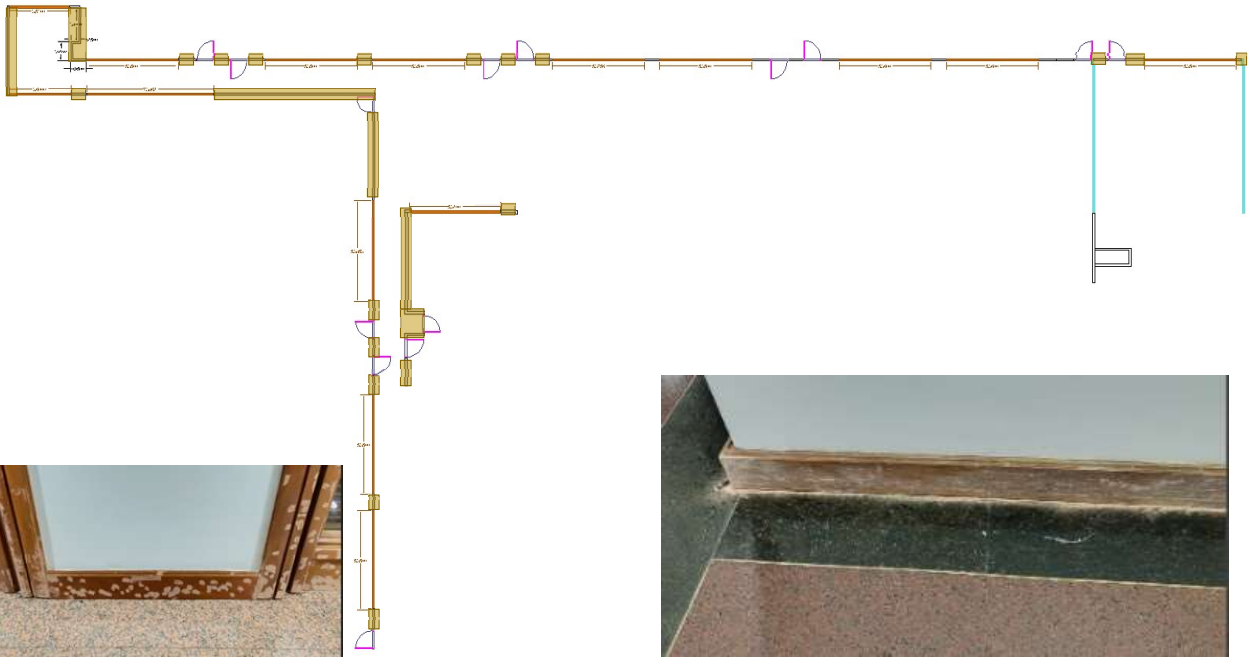
















ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CONSEJO DE ESTADO
Ubicación
Piso 1 Sala de audiencias 1
ML 18.51





Ubicación
Piso 1 Sala de audiencias 2
ML 32.00

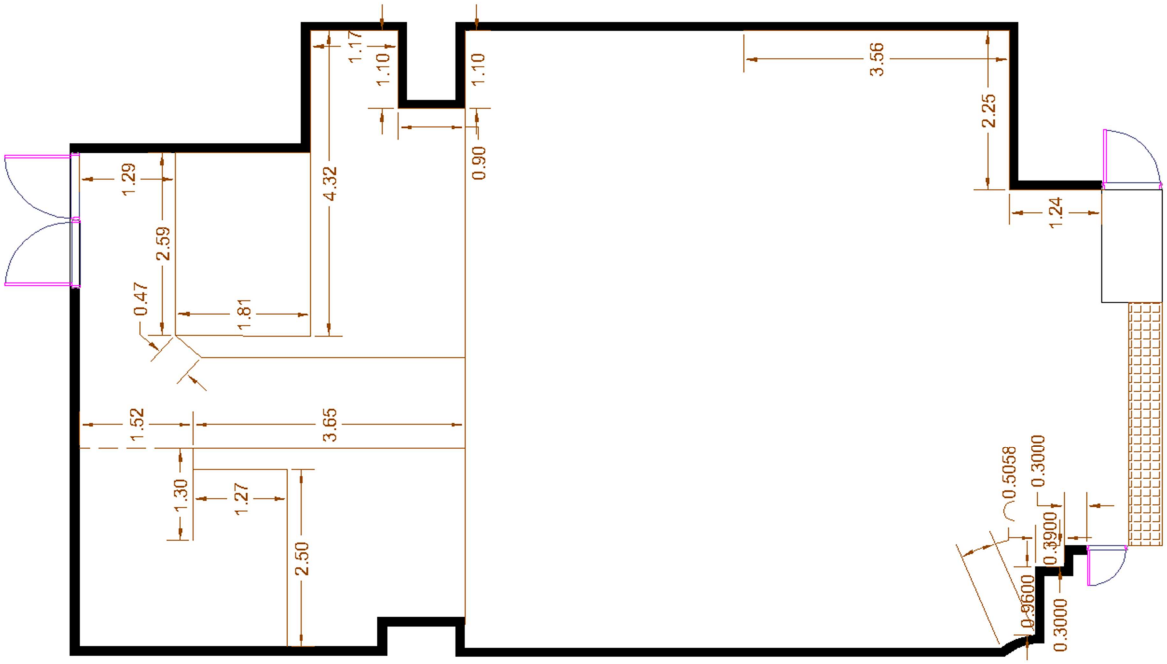














Ubicación.
Piso 3 presidencia, oficinas auxiliares, sala de gobierno
Guarda escoba
ML 43.34

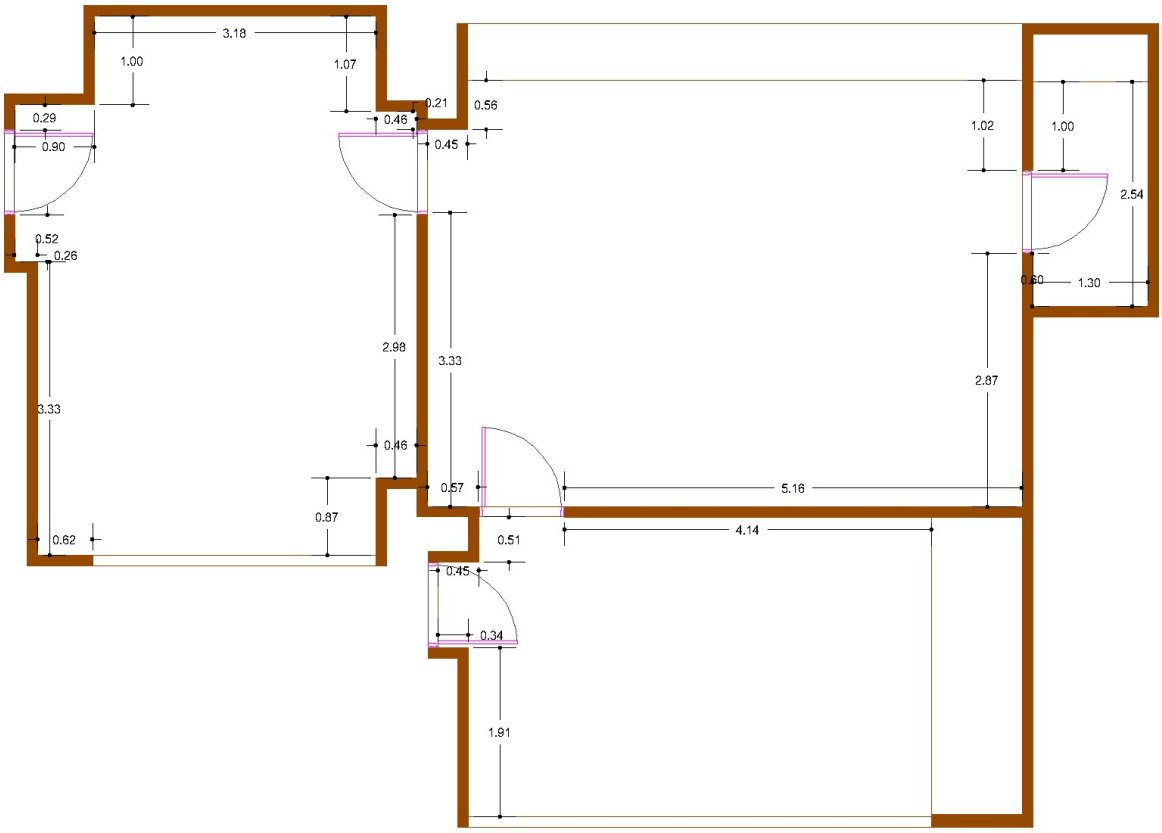








Guarda escoba
ML 43.34

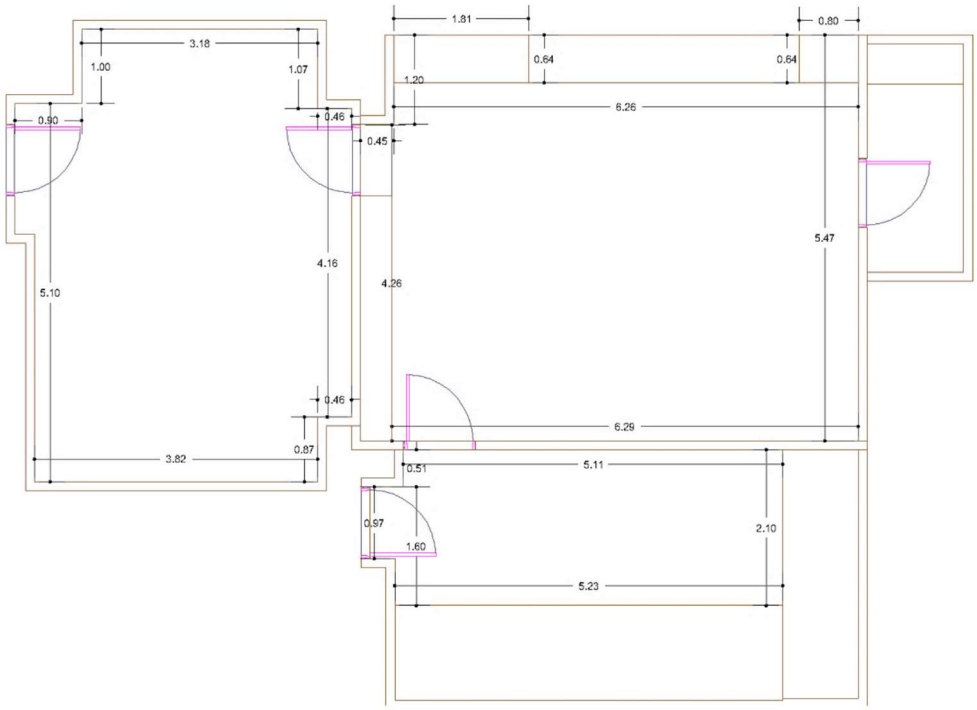










ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


Ubicación.
Piso 4 despacho 413
ML 78.98

CENEFA TECHO DE MADERA

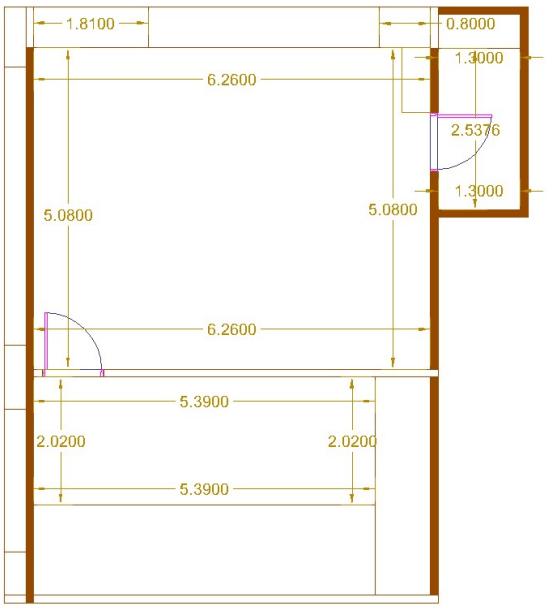

GUARDAESCOBA DE MADERA

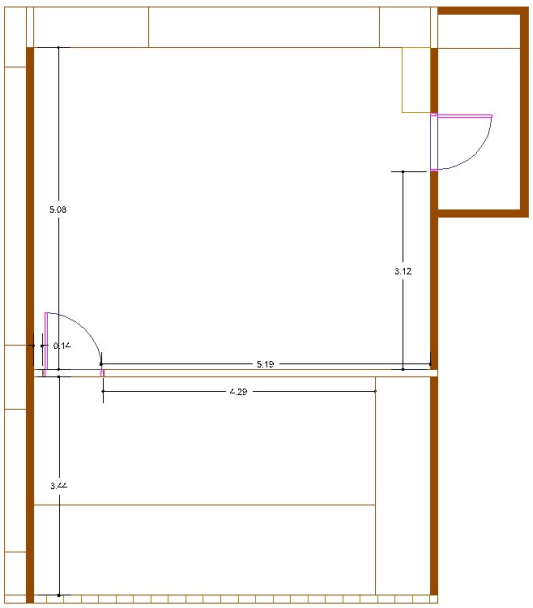

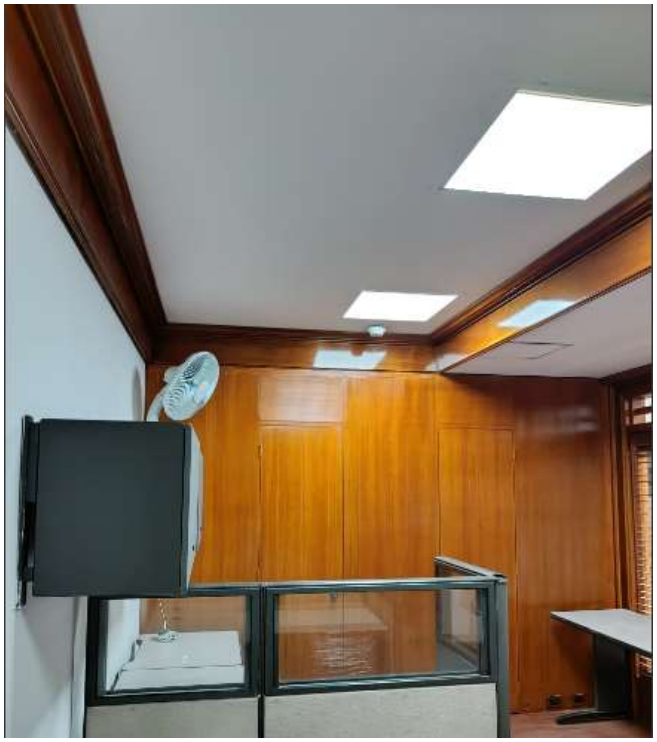





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia


Ubicación.
Piso 4 despacho 415
ML 81.21













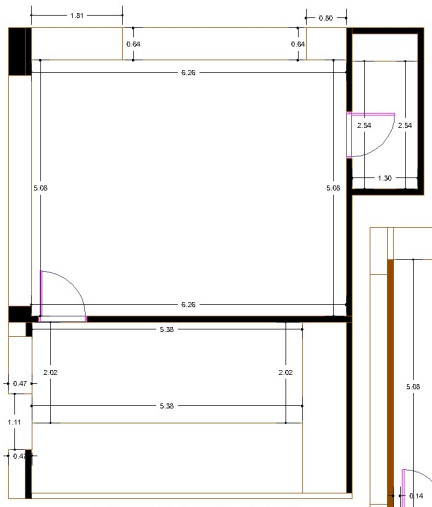

CENEFA PLAFON DE MADERA

GUARDAESCOBA DE MADERA

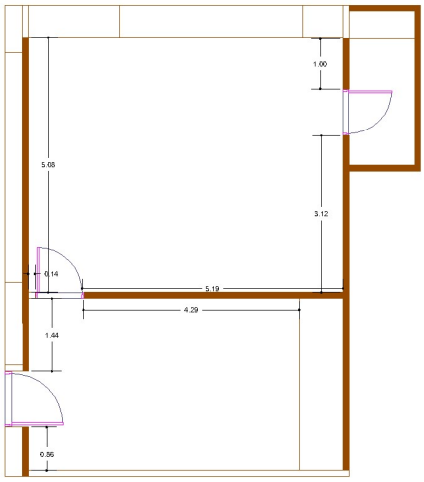








ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 4 despacho 416
ML 111.68

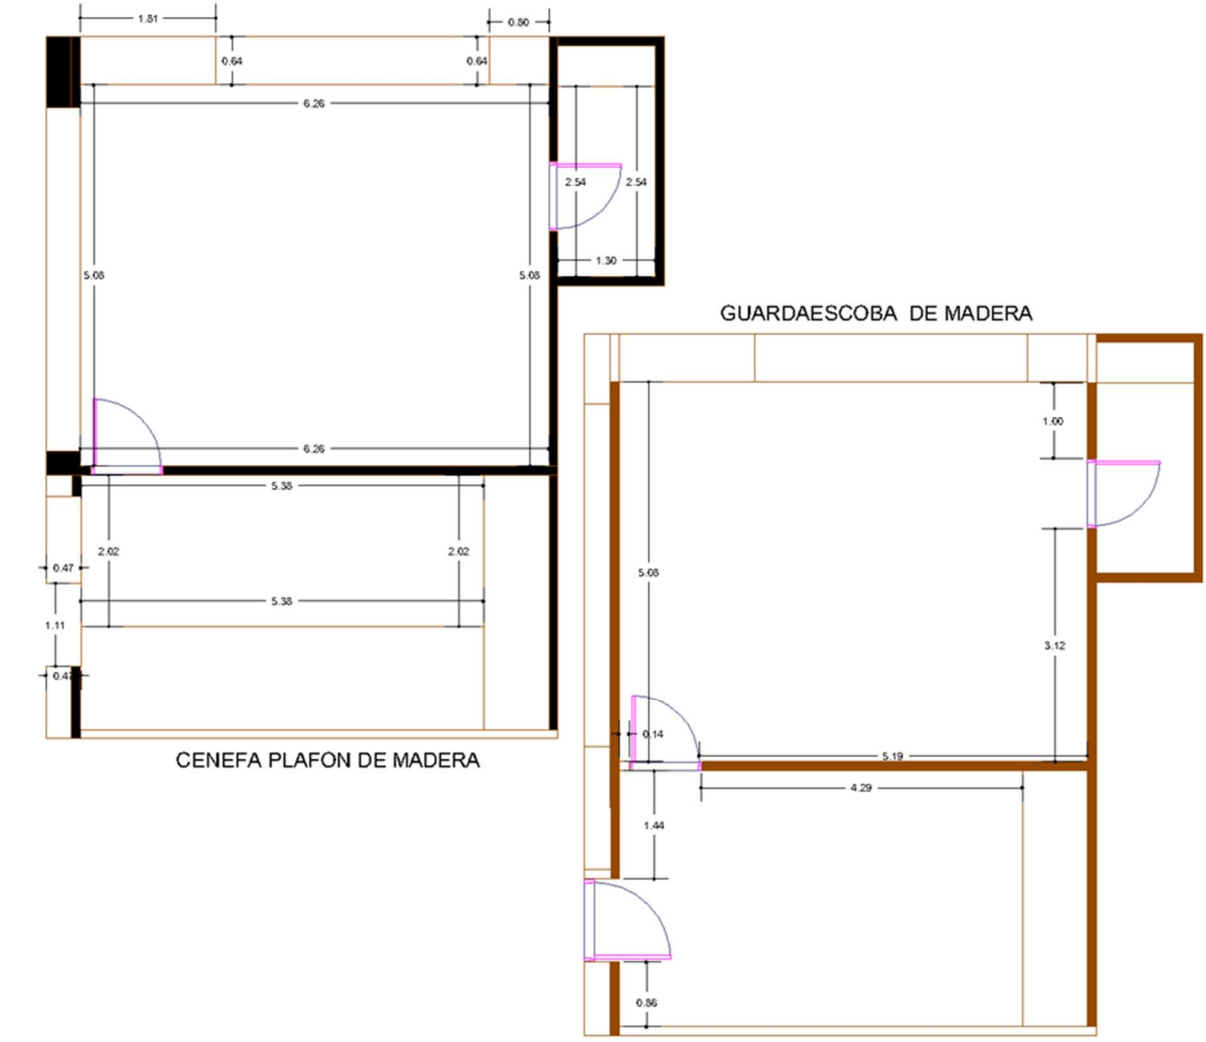












2024/03/06 19:02


2024/03/07 08:54






2024/03/06 19:03



Ubicación.
Piso 5 despacho 509
ML 61.73






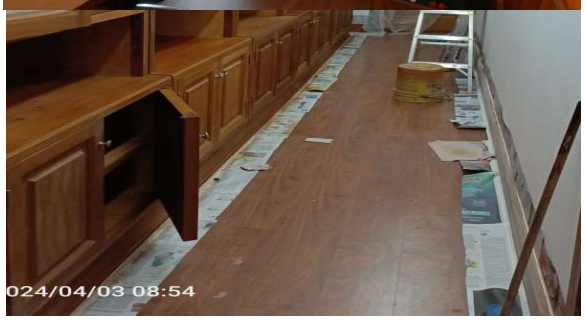



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

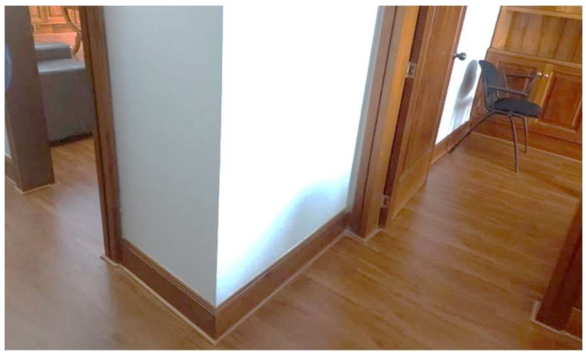








ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CORTE CONSTITUCIONAL

Ubicación


Piso 8 Despachos 801- 802 y pasillo exterior
ML 214.37

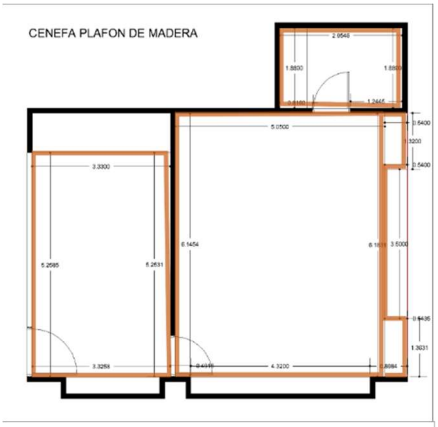









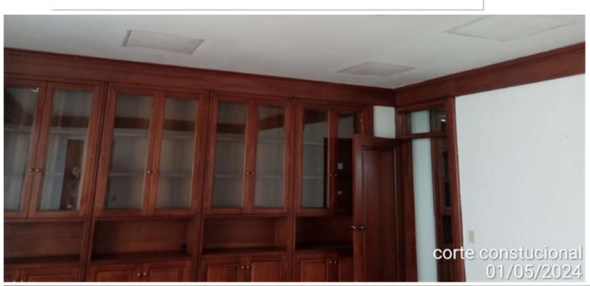

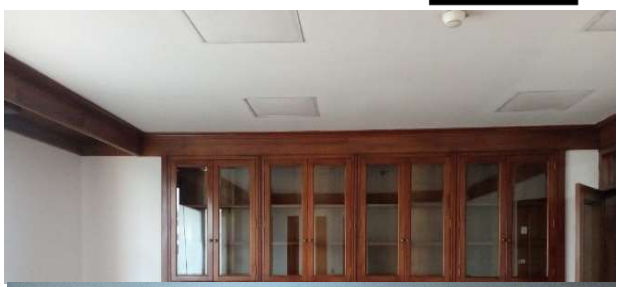



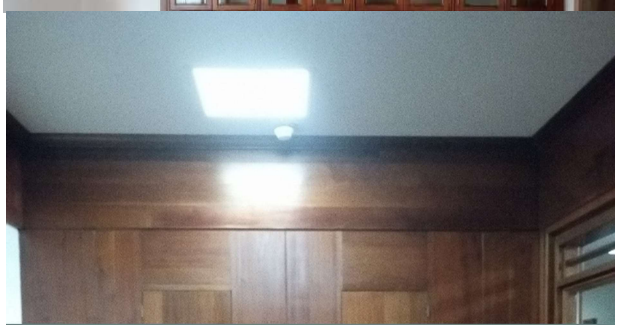


3.5 PUERTA TIPO ACCESO A DESPACHO.

Restauración de puerta y marco en madera acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (+- 1,00 x 2,4 m)

CORTE SUPREMA

Piso 2 secretaria general

UNIDAD 1

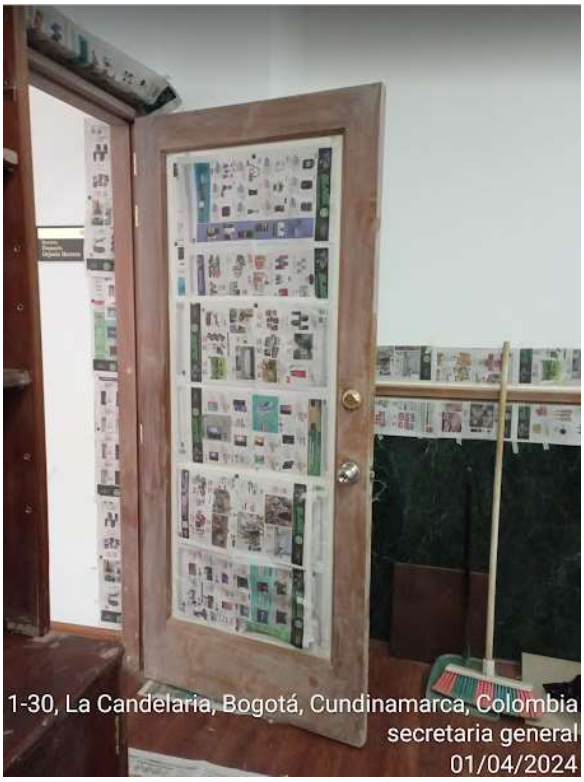



Ubicación.
Sala de audiencias 1
Puerta principal Sala de deliberaciones, puerta posterior sala de deliberaciones, Acceso magistrados, acceso general, acceso posterior Sala de audiencias 1
UNIDAD 5




Piso 3 Sala de casación laboral






ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

CONSEJO DE ESTADO
Sala de audiencias 1

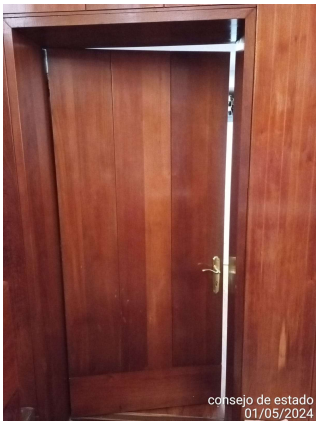



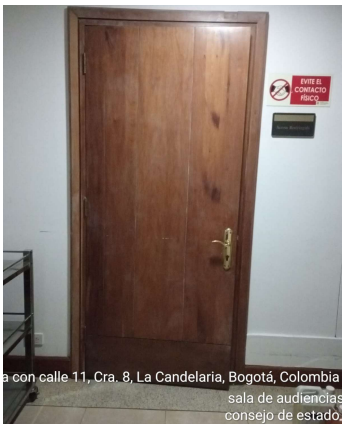

Ubicación.
Sala de audiencias 2 acceso Principal
Presidencia, Oficina Auxiliares, Sala de gobierno presidencia Cuarto técnico sala plena











ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 4 despacho 413



Ubicación.
Piso 4 despacho 415 416













Ubicación.
Piso 5 despacho 509





CORTE CONSTITUCIONAL
Ubicación.
Piso 8 Despachos 801 y 802







3.6 PUERTA TIPO BAÑO DESPACHO


Restauración de puerta y marco en madera acceso a baño. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (+- 0,85 x 2,4 m).

CORTE SUPREMA

Piso 3 Sala de casación laboral

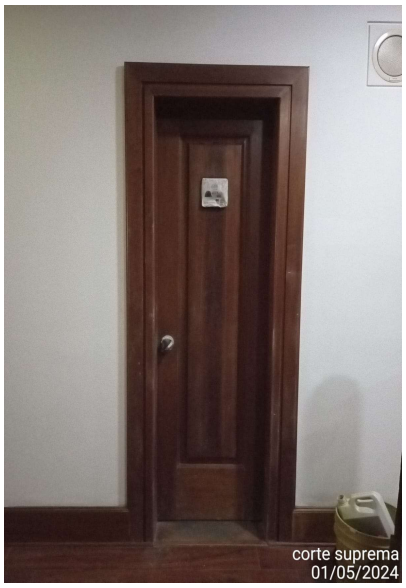

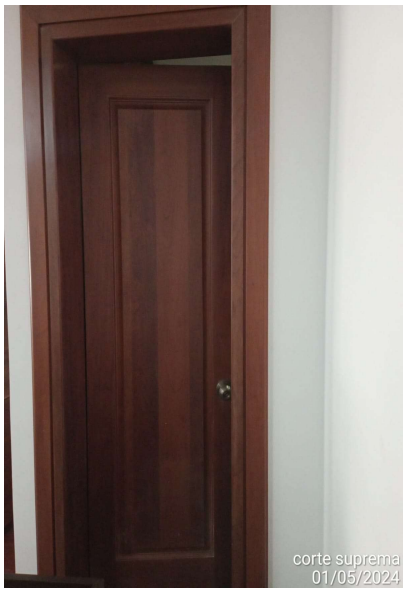

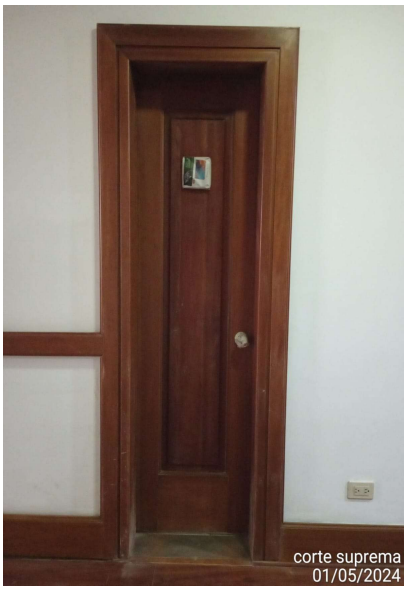

Ubicación.

Piso 3 pasillo principal, despachos magistrados









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General



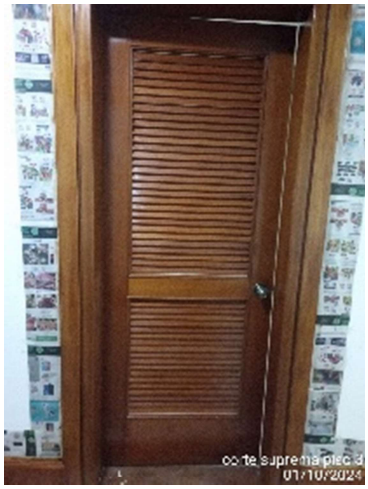

Ubicación.
Piso 3 pasillo lateral , despachos magistrados

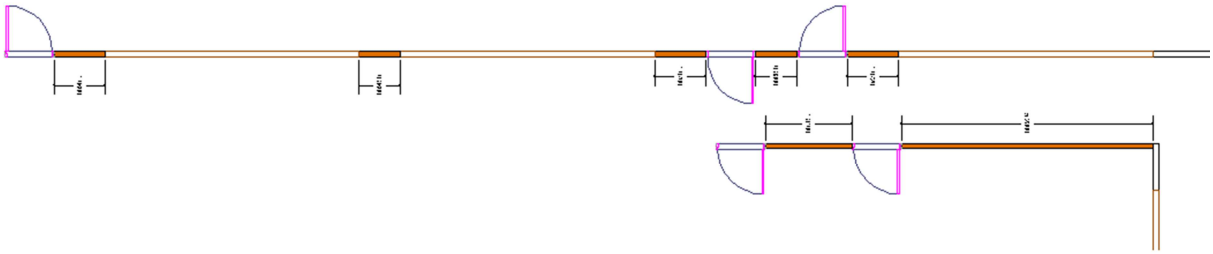






ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General


Ubicación.
Piso 4 pasillo principal, despachos magistrados

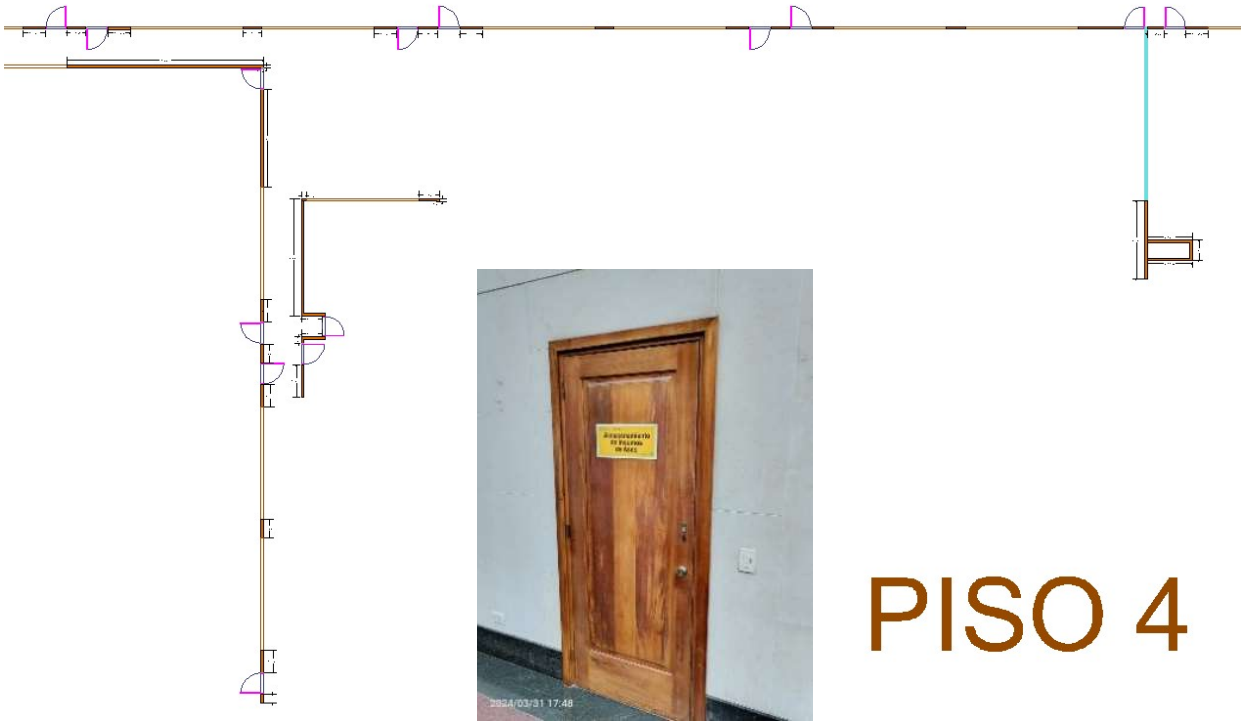




CONSEJO DE ESTADO

Ubicación.
Presidencia
Sala de audiencias 2 baño
sala de audiencias 2 cuarto técnico

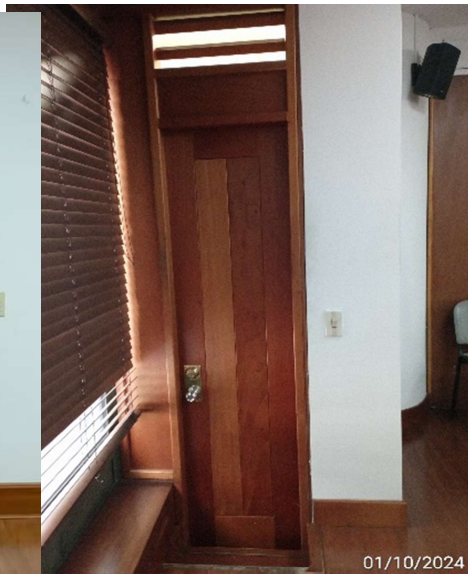

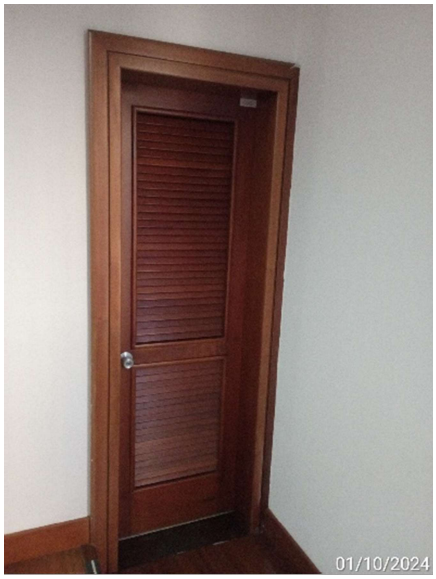
Ubicación.
Piso 4 despacho 413 – 415 - 416






ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 5 despacho 509

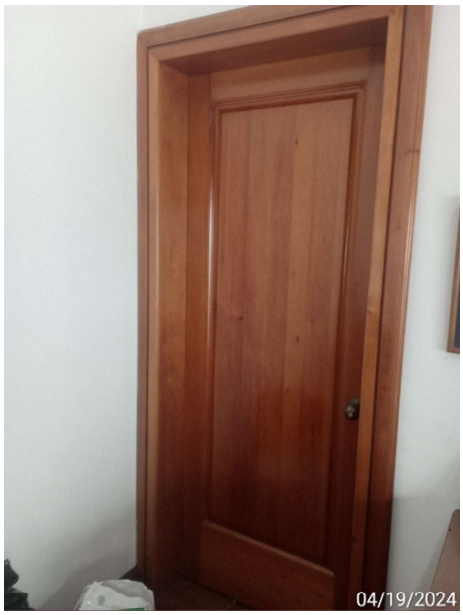

CORTE CONSTITUCIONAL
Ubicación.
Piso 8 Despachos 801 y 802





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

3.7 ENCHAPE MADERA MURO Y PUERTA ARCHIVO.

Restauración de muro enchapado en madera y puertas archivo secretaria acceso a despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa.


CORTE SUPREMA

Ubicación.

Piso 1 Acceso sala de audiencias 1

Muros costado oriental y occidental, frente mesas magistrados, frente mesas fiscalía, frente mesas procuraduría, frente mesas costado norte, frente atril

Paneles divisorios de sala de audiencia

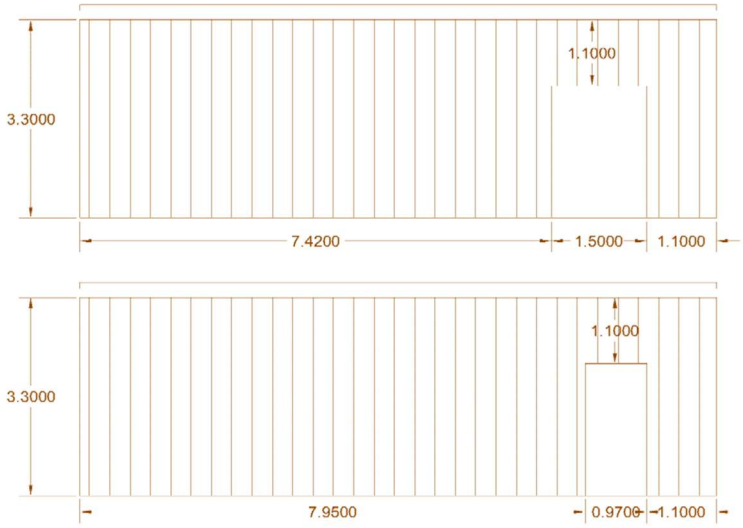











ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General



CONSEJO DE ESTADO

Ubicación.
Sala de audiencias
Piso 1 Acceso sala de audiencias 1
Muros costado oriental y occidental, frente mesas magistrados,





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Frente de mesas sala de audiencias 2
Panel divisorio sala de audiencias 2









Ubicación.
Piso 3 despacho 315
Archivo presidencia fachada closet baño







Ubicación.
Piso 4 despacho 413
Archivo presidencia fachada closet baño







ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Piso 4 despacho 415
Archivo presidencia fachada closet baño



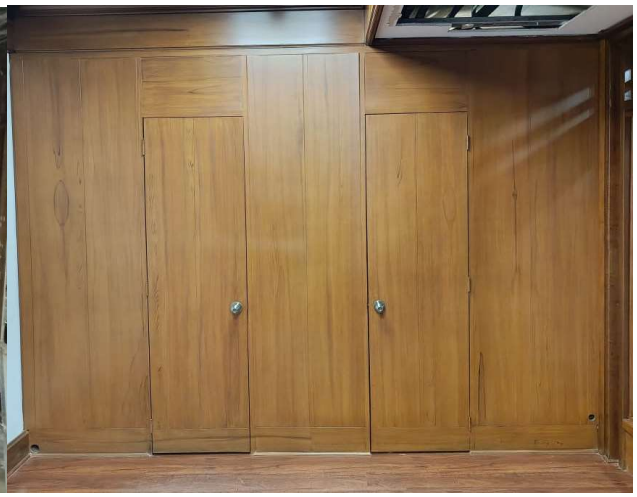


Ubicación.
Piso 4 despacho 415
Archivo






ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza**
Residente de obra		Director General

Ubicación.
Piso 5 despacho 509

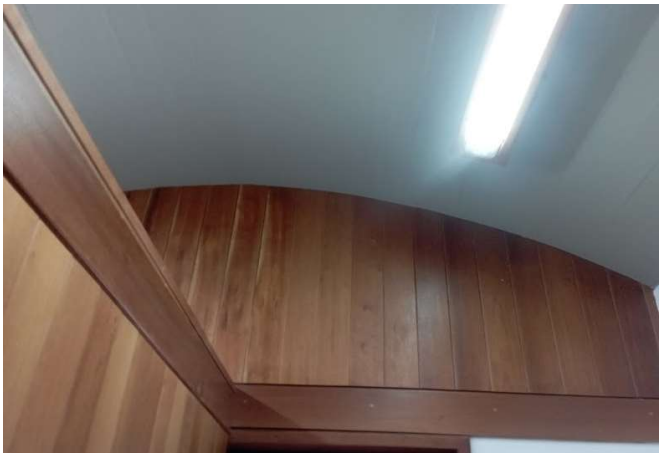



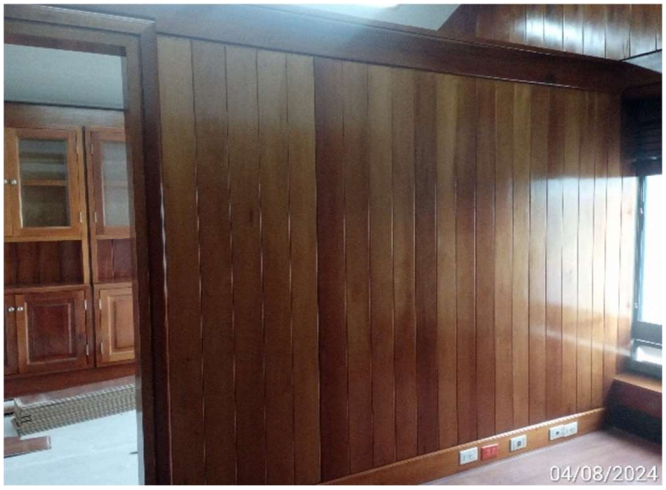





CORTE CONSTITUCIONAL
Ubicación.
Piso 5 despacho 509





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

3.8 MUEBLE BAÑO

Restauración de puertas mueble baño despacho. Incluye protección requerida en muebles, piso, muros, vidrios del área, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate. el metraje incluye superficie horizontal tipo mesa. (medidas cuando la medida es de menos de 1 m2 se cobra por pieza)

Ubicación.

Piso 5 despacho 315



Ubicación.

Piso 4 despacho 413



Ubicación.
Piso 4 despacho 415 416





CORTE CONSTITUCIONAL
Ubicación.
Piso #8 despacho 801 y 802








CAPITULO 4
RESTAURACION DE MOBILIARIO SOBRE PISO

4.1.1 ESCRITORIO PRINCIPAL RECTO TIPO 2. DESPACHO.

Restauración de pintura escritorio principal recto, cajones empotrados, superficie con vade enchapillado o vade en cuero. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalizada semi mate y cambio de superficies tapizadas en cuero.
CORTE SUPREMA

Ubicación
Sala de casación laboral

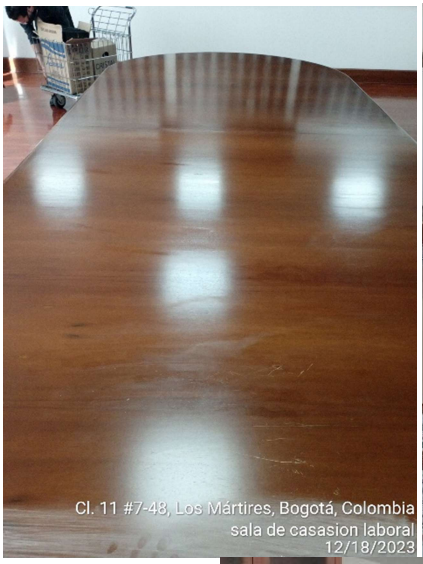





CDR a.r.q.u.i.t.e.c.t.u.r.a	**RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia













ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Observaciones:
La mesa se vuelven a ejecutar en el momento de la entrega de la restauración, le informan a el supervisor del contrato que al mobiliario se le debe unificar el tono, para esto se deben retirar la capa existente de pintura, después de la entrega en la instalación del vidrio por parte del personal de aseo de palacio se rallo la mesa, se vuelve a pelar y a pintar, el personal del contratista realiza la entrega final y la instalación del vidrio .

Ubicación
Secretaria general







CONSEJO DE ESTADO
Ubicación
Sala sección tercera











ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación
Despacho 315 y sala de Gobierno









ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

Ubicación.
Sala de audiencias 2



4.1.2 MESA AUXILIAR PUESTO DE TRABAJO

Restauración de mueble auxiliar a escritorio principal, cajones empotrados superficie con vade enchapillado o base con patas torneadas. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalizada semi mate y cambio de superficies tapizadas en cuero.

CORTE SUPREMA
Ubicación
Secretaria general







Ubicación

Sala de casación laboral












Ubicación
Sala de audiencias 1



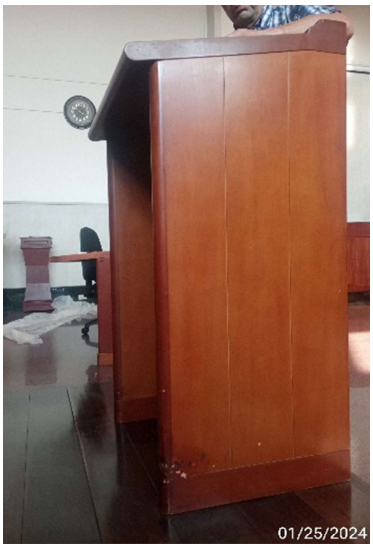



CONSEJO DE ESTADO
Ubicación
Presidencia Despacho 315





Ubicación
Sala de audiencias 2 Atril



4.1.3 MESA DE REUNION SUPERFICIE LISA

Restauración de mesa de juntas superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e enmasilladlo y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate.



4.1.4 MESA AUXILIAR BAJA LISA

Restauración de mesa auxiliar baja superficie lisa. Incluye traslado, transporte, lijado general, e enmasilladlo y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate

CORTE SUPREMA
Sala de casación laboral










Ubicación.
Sala de audiencias 1










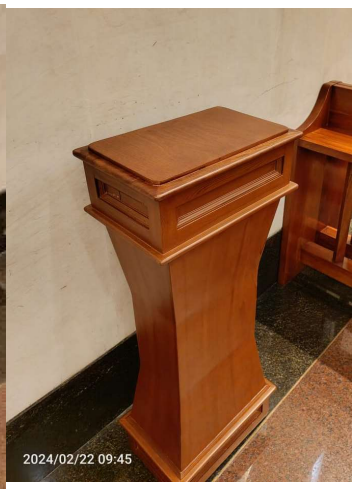

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General

CONSEJO DE ESTADO
Sala de audiencias 1 – presidencia

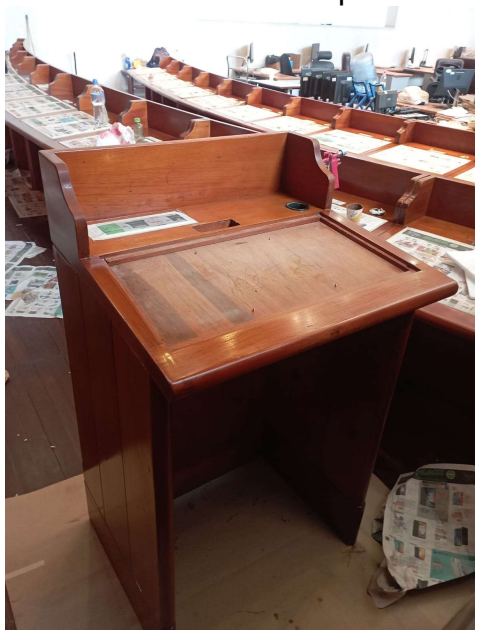



4.1.5 MESA AUXILIAR BAJA CON BADE

Restauración de mesa auxiliar baja superficie con bade. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente, acabado en laca catalizada semi mate y cambio de superficies tapizadas en cuero

CORTE SUPREMA
Secretaria General










Sala de audiencias 1



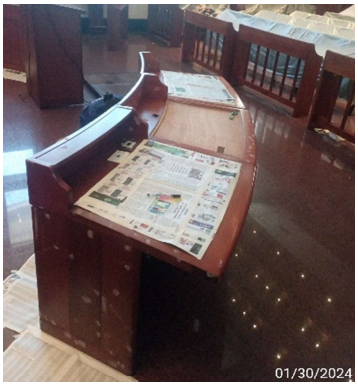

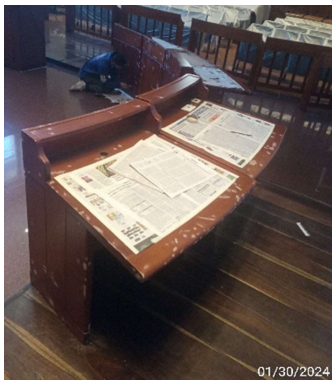




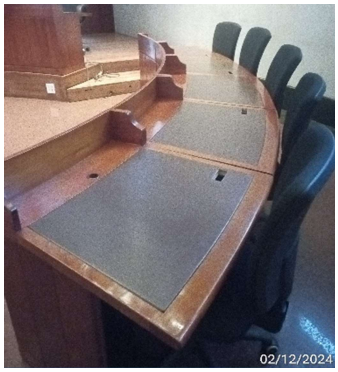



CONSEJO DE ESTADO
Sala de audiencias 1 – presidencia

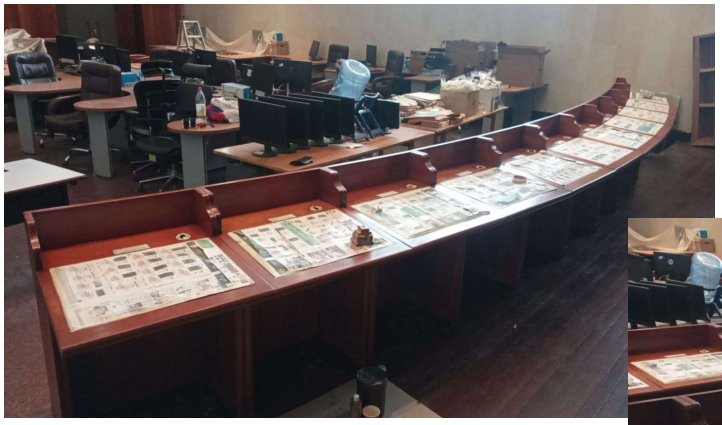




4.2.5 ASTA BANDERA / PERCHERO

Restauración Asta de bandera o Perchero. Incluye traslado, transporte, lijado general, enmasillado y restauración de áreas afectadas, base en tintilla color por definir similar al existente y acabado en laca catalizada semi mate



Cordialmente,

CARLOS RODOLFO DAZA
CONTRATISTA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Arq. Anngy Guerrero Residente de obra	Carolina López	**Arq. Carlos Rodolfo Daza** Director General
